



SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FENOG

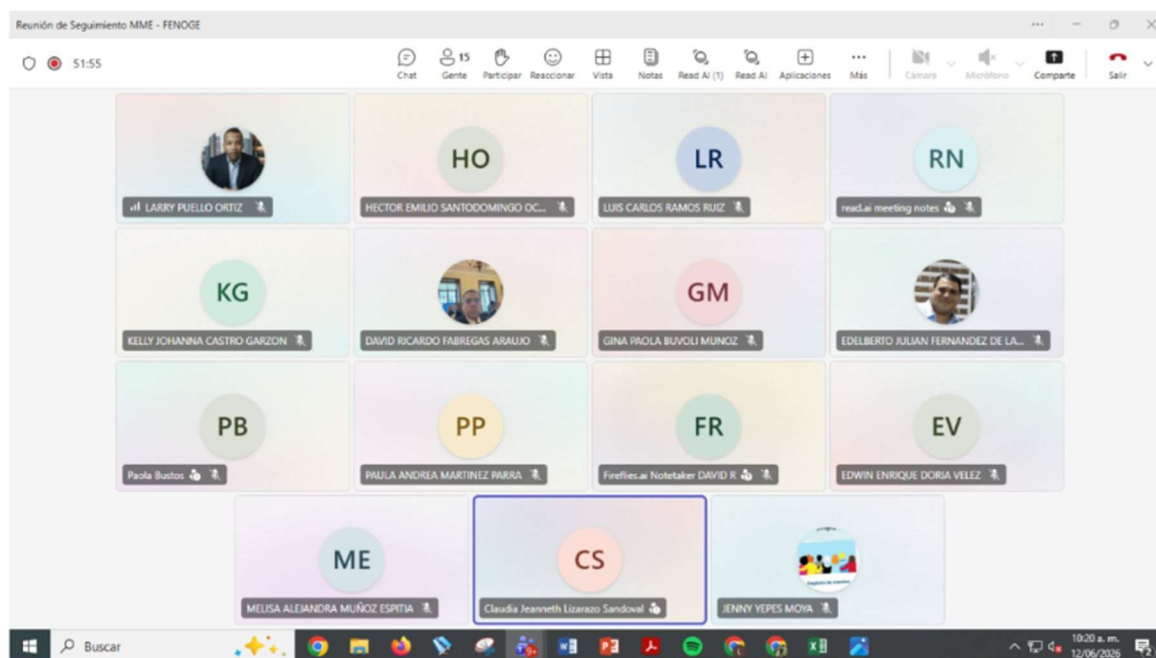


Reunion de Seguimiento FENOG (EXTERNA)

REUNION REVISION ESTADO DE AVANCE Y REVISION DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO EN LINK PUBLICO SECOP



Seguimiento Fenog

REVISION DE ACCESO A TERMINOS CONTRACTUALES Y SIP

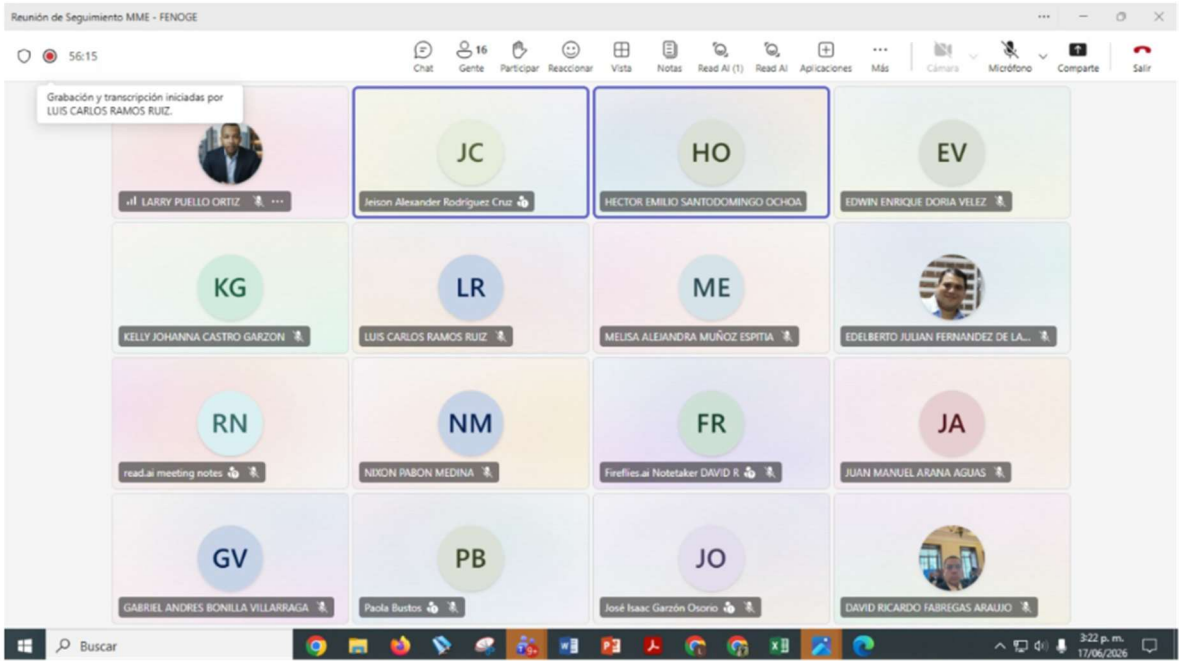

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 116231-100-226									
FENOG									
15%									
Departamento	Municipio	COMPONENTE	Actividad	Estado	% Avance		Vigencia	Responsable	Fecha
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 1.	Focalización - MINISTERIO, EL MINISTERIO	Completada	0,00	0,00	2025	HME	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 2.	Fase de diagnóstico de mercado - FENOG.	Pendiente	0,25	0,00	2025	FENOG	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 3.	Caracterización de beneficiarios - MINISTERIO y FENOG.	Pendiente	0,17	0,00	2025	HME-FENOG	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 4.	Evaluación y determinación de los asientos beneficiarios y tipo de solución - MINISTERIO y FENOG.	Pendiente	0,25	0,00	2025	HME-FENOG	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 5.	Implementación de los SSPV - FENOG.	Pendiente	0,00	0,00	2025	FENOG	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 6.	Seguimiento a la ejecución de los negocios jurídicos derivados de la iniciativa - FENOG.	Pendiente	0,00	0,00	2025	FENOG	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 7.	Propiedad de los activos, AOM y monitoreo - MINISTERIO y FENOG.	Pendiente	0,00	0,00	2025	HME-FENOG	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 8.	Scrituraciones, socializaciones, capacitaciones y divulgación - MINISTERIO y FENOG.	Pendiente	0,00	0,00	2025	HME-FENOG	

ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO

[illegible]

PROYECCOION FLUJO DE FONDOS

Año	Mes	SSFV construidas	SSFV legalizadas	Potencia instalada [kWn]	Recurso ejecutado
2026	Junio	-	-	-	\$ -
	Julio	-	-	-	\$ -
	Agosto	-	-	-	\$ -
	Septiembre	1.961	-	2.941,5	\$ 19.011.255.443,36
	Octubre	1.961	-	2.941,5	\$ -
	Noviembre	1.961	-	2.941,5	\$ -
	Diciembre	1.961	1.961	2.941,5	\$ -
Total ejecutado vigencia		7.844	1.961	11.766	\$ 19.011.255.443,36
Hitos	Fecha de inicio				
Contratació	Agosto				
Inicio de ejecución	Agosto				
Pruebas operacione s y puesta en	Septiembre				
Legalizació	Diciembre				
Notas:					
1. El recurso ejecutado corresponde al dinero que se pagará a los contratistas favorecidos en calidad de anticipo					
2. No se entregará más recurso antes del cierre del año ya que los hitos de pago se prevé que sean cumplidos al cierre de diciembre de 20256, por tanto la facturación sería efectiva hasta el mes de enero de 2027					
3. Se especifica que los sistemas fotovoltaicos construidos en octubre, noviembre y diciembre de 2026 serán legalizados en enero, febrero y marzo de 2027 respectivamente, por eso no se incluyen en el listado de SSFV legalizadas en 2026					
4. El cronograma planteado se actualizó de acuerdo con la proyección de tiempos emitida en la invitación abierta para el proceso de caracterización, implementación, AOM y monitoreo (IA-006) y la que saldrá publicada la siguiente semana (IA-009).					

PORTADA TCC Y SIP



FENOG

Términos y Condiciones Contractuales TCC

Invitación Abierta No. 006 DE 2026-FENOG

IA-006-2026-FENOG

El contratista se obliga con el contratante a realizar la implementación, la AOM y el monitoreo, a todo costo y riesgo, de Sistemas Solares Fotovoltaicos – SSFV en piso y/o en techo en áreas urbanas del Sistema Interconectado Nacional – SIN en el marco de la AFPEI “Implementación del Programa Colombia Solar” del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOG.

Junio 2026

Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOG

Cra 12 No 84A -12 Oficina 801



Solicitud de Información a Proveedores No. 003 de 2026 (SIP-003-2026-FENOGE) – Construcción y AOM de Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales de 1,5 kWn

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE, se permite invitar a todos los interesados a presentar cotización en el marco del sondeo de mercado el cual tiene como objetivo Determinar los valores de referencia del mercado para ejecutar la construcción, AOM, a todo costo y riesgo de sistemas solares fotovoltaicos en piso y/o techo en le SIN a nivel nacional en el marco de la iniciativa "Implementación del programa Colombia Solar"; por favor LEER ATENTAMENTE los documentos y anexos a la presente solicitud de información a proveedores No 03 de 2026 (SIP-003-2026-FENOGE).

Los anexos de esta SIP se relacionan a continuación:

- [SIP-003-2026](#)
- [Anexo 01 – Especificaciones técnicas mínimas para SSFV.](#)
- [Anexo 02 – Obligaciones, productos y equipo mínimo.](#)
- [Anexo 03 – Matriz de riesgo preliminar.](#)
- [Anexo 04 – Formato de cotización.](#)
- [Anexo 05 – Certificación de autenticidad y compromiso de transparencia.](#)
- [Anexo 06 – Lineamientos del PMA.](#)
- [Anexo 07 – Lineamientos del PGS.](#)
- [Anexo 08 – Contenido Informe de viabilidad ambiental.](#)
- [Anexo 09 – Obligaciones SST.](#)
- [Anexo 10 – Lineamientos trámite procedencia y oportunidad consulta previa.](#)
- [Anexo 11 – Cuestionario Decreto 1860 de 2021 y Decreto 0287 de 2026.](#)



Solicitud de Información a Proveedores No. 004 de 2026 (SIP-004-2026-FENOGÉ) – caracterización de potenciales beneficiarios y las actividades de sensibilización, socialización y capacitación requeridas para la implementación de SSFV en piso y/o techo en el SIN a nivel nacional en el marco de la iniciativa “implementación del programa Colombia Solar”

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGÉ, se permite invitar a todos los interesados a presentar cotización en el marco del sondeo de mercado el cual tiene como objetivo Determinar los valores de referencia del mercado para desarrollar la caracterización de potenciales beneficiarios y las actividades de sensibilización, socialización y capacitación requeridas para la implementación de SSFV en piso y/o techo en el SIN a nivel nacional en el marco de la iniciativa “implementación del programa Colombia Solar”; por favor LEER ATENTAMENTE los documentos y anexos a la presente solicitud de información a proveedores No 04 de 2026 (SIP-004-2026-FENOGÉ).

Documentos relacionados con el proceso:

- SIP-004-2026
- Anexo 01 – Especificaciones técnicas mínimas.
- Anexo 02 – Obligaciones generales, específicas y productos.
- Anexo 03 – equipo mínimo
- Anexo 04 – Matriz de riesgo preliminar.
- Anexo 05 – Formato de cotización.
- Anexo 06 – Certificación de autenticidad y compromiso de transparencia.
- Anexo 07 – Lineamientos del PGS
- Anexo 08 -Lineamientos del PCS.
- Anexo 09 – Obligaciones SST.
- Anexo 10 – Cuestionario Decreto 1860 de 2021 y Decreto 0287 de 2026
- Anexo 11 – Manual de marca programa Colombia Solar
- Anexo 12 – Manual de identidad visual FENOGÉ

CRONOGRAMA DE CONTRATACION

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA MÁXIMA	LUGAR
Publicación de los Términos y Condiciones Contractuales e Invitación	<u>17 de junio de 2026</u>	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Audiencia de aclaración de Términos y Condiciones Contractuales a las 11:00 am (actividad híbrida, presencial y virtual)	19 de junio de 2026 a las 11:00 horas	Sala de Juntas del FENOGÉ Cra 12 N. 84A-12 Of 801 o de manera virtual a través del aplicativo Teams. https://teams.microsoft.com/join/250079662694132?p=dznhD99Nii3kbAKjC Meeting ID: 250 079 662 694 132 Passcode: aK2L9Bz
Plazo para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales y a la Invitación.	23 de junio de 2026	A través del correo electrónico contratacion@fenoge.gov.co
Respuesta a las observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales y a la Invitación.	02 de julio de 2026.	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Plazo para expedir adendas a los Términos y Condiciones Contractuales e Invitación.	07 de julio de 2026	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Fecha máxima de presentación de ofertas y cierre del proceso	<u>10 de julio de 2026 a las 11:00 horas</u>	En las instalaciones del FENOGÉ Cra 12 N. 84A-12 Of 801
Acto público de apertura de ofertas	<u>10 de julio de 2026 a las 11:15 horas</u>	En las instalaciones del FENOGÉ Cra 12 N. 84A-12 Of 801
Publicación del informe preliminar de evaluación	21 de julio de 2026.	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Presentación de observaciones y subsanaciones al informe preliminar de evaluación	Hasta el 24 julio de 2026 hasta las 23:59 horas	A través del correo electrónico contratacion@fenoge.gov.co o de manera física en las instalaciones del FENOGÉ Cra 12 N. 84A-12 Of 801
Respuesta a las observaciones al informe preliminar de evaluación, publicación del informe final de evaluación y orden de elegibilidad	30 de julio de 2026	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Decisión del Ordenador del Gasto y comunicación de la aceptación de la oferta al oferente seleccionado o declaratoria de fallido del proceso de selección.	<u>03 de agosto de 2026</u>	Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Presentación de carta cupo crédito aprobado	19 de agosto de 2026	Trámite del oferente seleccionado

Consulta SARLAFT proponente seleccionado	19 de agosto de 2026	Trámite interno FENOGÉ
Plazo para la suscripción del contrato	19 de agosto de 2026	Trámite interno FENOGÉ
Inicio de ejecución del contrato	21 de agosto de 2026	Trámite interno FENOGÉ
Plazo de validez de las ofertas	3 meses	

Obligación No. 4: Apoyar los procesos de validación, análisis y sistematización de información primaria y secundaria requerida para la estructuración y ejecución de proyectos de energización rural, comunidades energéticas y demás líneas de implementación del Programa Colombia Solar.

1. Actividades Ejecutadas durante el Periodo

Durante el mes de junio de 2026, se consolidaron los hitos críticos de estructuración técnica y contractual para la fase de preinversión de la AFPEI "Implementación del Programa Colombia Solar". Las acciones principales se centraron en la validación de información secundaria provista por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la estructuración final del proceso de selección:

- **Sistematización de Datos de Focalización:** Se procesaron y validaron técnicamente las respuestas y bases de datos remitidas por el MME correspondientes a los perfiles de usuarios de estratos 1, 2 y 3 en las zonas priorizadas.
- **Consolidación del Modelo de Lotes Territoriales:** A partir del análisis técnico-operativo de la información de demanda (comunicaciones MME del 14 y 22 de mayo, recibidas formalmente el 2 de junio de 2026), se definieron las capacidades a instalar y se estructuró la intervención final del programa en 3 lotes regionales que optimizan la logística y la escala del proyecto.
- **Incorporación de Resultados de Mercado:** Se integraron los análisis financieros y de costos de las Solicitudes de Información a Proveedores SIP-003-2026 y SIP-004-2026 (publicados el 4 de junio de 2026) para fijar el presupuesto estimado oficial del proceso de contratación abierta.
- **Soporte en el Lanzamiento de los Pliegos Técnicos:** Se brindó apoyo técnico especializado para la estructuración y publicación de los Términos y Condiciones Contractuales (TCC) definitivos el pasado 17 de junio de 2026, participando activamente en la Audiencia de Aclaración del 19 de junio de 2026 y en el procesamiento técnico de las observaciones radicadas por los interesados hasta el 23 de junio de 2026.

2. Resultados Obtenidos

Como producto de la validación y sistematización de la información, se alcanzaron los siguientes resultados tangibles:

- **Estructuración Definitiva de Intervención por Lotes:** Clasificación técnica de la meta de implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV)

individuales de 1.5 kWn, distribuida con base en el potencial energético y la representatividad territorial validada con el MME:

No. de Lote	Región	Departamentos	Cantidad de SSFV a Implementar	Potencia Nominal Total (kWn)	Presupuesto Estimado por Lote (M/CTE)
1	11	Magdalena	4.730	7.095	\$62.111.665.416
2	10	Sucre	4.003	6.004,5	\$54.065.461.313
3	8 y 3	Santander / Arauca	3.033	4.549,5	\$49.315.598.446
TOTAL	—	—	11.766	17.649	\$165.492.725.175

- **Alineación del Cronograma Contractual:** Publicación formal en SECOP II bajo el radicado del proceso **IA-006-2026-FENOGE**, vinculando los entregables de preinversión (Estudios de Factibilidad e Ingeniería de Detalle) dentro del alcance obligatorio de los futuros contratistas.
- **Consolidación de Herramientas de Control Interno:** Se alimentaron y actualizaron las matrices técnicas y de programación financiera de los archivos "*Actualización Anexo 7. Cronograma y Flujo de Fondos-2026.xlsx*" y el "*Plan Seguimiento Proyectos Comunidades Priorizados_Gestión Contractual V2 LP (1) (1)_2.xlsx*", garantizando la trazabilidad entre el modelo de inversión y las metas físicas del programa.

3. Porcentaje de Cumplimiento de la Actividad

Porcentaje de Ejecución Mensual Estimado: 100% Las actividades programadas para el cierre de la estructuración y apertura del proceso de selección pública se ejecutaron en su totalidad dentro de los plazos normativos previstos por el FENOGE.

4. Próximos Pasos y Acciones Requeridas (Julio 2026)

Para dar continuidad al cronograma técnico del proceso IA-006-2026-FENOGÉ, se proyectan las siguientes tareas inmediatas:

- Consolidar y publicar las respuestas definitivas a las observaciones técnicas radicadas por los proponentes (programado para el 02 de julio de 2026).
- Monitorear el cierre del proceso de presentación de ofertas físicas (10 de julio de 2026) para iniciar el acompañamiento en la evaluación técnica del Comité Evaluador.
