	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA			SPO. – 130.30.03
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS			Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS			Página 1 de 8

Fecha de presentación del informe	Día	Mes	Año	Informe No.	Período de Informe						
	08	07	2026		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
				002	01	06	2026	a	30	06	2026

Contrato No. MC_020-2026

Nombre del Contratista: MARTHA MARIANA RIASCOS CHAMORRO

Número de documento contratista: 27.321.349

Área o dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

Supervisor del contrato: HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO

Tema del Informe: Presentación de Informe del contrato de prestación de servicios No. MC_020-2026, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA FLORESTA, EL GUARANGO Y GIGANTE MUNICIPIO DE LA LLANADA – NARIÑO

Fecha de inicio contrato: DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026.

Fecha terminación de contrato: TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.

Valor total del contrato: TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS (\$3.502.000) M/CTE

Tipo de Informe: Parcial	Tipo de Informe: Final	x
------------------------------------	----------------------------------	---

Numero de planilla seguridad social JUNIO: 8641907780

Descripción detallada de actividades
(Incluir todas las obligaciones contractuales y las actividades realizadas para su cumplimiento)

1. Garantizar la continuidad en la operación de los sistemas de acueducto de las veredas del La Floresta, El Guarango y Gigante del municipio de La Llanada (Nariño). Se garantizó la continuidad en la operación de los sistemas de acueducto de las veredas La Floresta, El Guarango y Gigante mediante la ejecución permanente de actividades de operación, inspección, mantenimiento y atención de las diferentes novedades presentadas durante el periodo contractual.

2. Atender de manera oportuna las emergencias operativas que afecten la prestación del servicio, procurando su restablecimiento en el menor tiempo posible. Se atendieron de manera oportuna las emergencias reportadas por la comunidad. El 11 de junio se recibió un llamado de los habitantes del sector La Floresta informando la suspensión del servicio de agua. Se realizó un recorrido de inspección para ubicar el daño; sin embargo, debido a la abundante vegetación fue necesario solicitar el apoyo de la comunidad para realizar una trocha que permitiera acceder a la red de conducción. Una vez localizado el daño, se evidenció que la tubería se encontraba desconectada, procediéndose a efectuar la reparación correspondiente. Para esta intervención se contó con la colaboración de la señora Mónica, del acueducto Manantial del Cedro, quien facilitó uniones y tubería de una y media (1½) pulgadas, permitiendo restablecer oportunamente el servicio.

Los días 22 y 23 de junio también se atendieron reportes de usuarios del sector La Floresta que manifestaban la falta de agua en algunas viviendas. En ambas visitas se verificó que la afectación obedecía a llaves de paso cerradas, las cuales fueron abiertas, restableciendo el

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 2 de 8

suministro de agua a los usuarios afectados.

3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes del sistema de acueducto, incluyendo bocatoma, desarenador, tanques de almacenamiento, redes de conducción, cámaras de quiebre, válvulas, ventosas y demás accesorios. Se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo en la infraestructura de los sistemas de acueducto. El 9 de junio se realizó la limpieza de los tanques y de la red de conducción del sector El Guarango. Igualmente, el 20 de junio se efectuó la limpieza de los tanques de distribución del sector La Floresta, contribuyendo a conservar las condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

4. Ejecutar la instalación de acometidas domiciliarias y la ampliación de redes de acueducto cuando sea requerido. Durante el mes de junio no fue necesario ejecutar instalaciones de nuevas acometidas domiciliarias ni ampliaciones de las redes de acueducto, toda vez que no se presentaron requerimientos para este tipo de actividades.

5. Detectar, diagnosticar y reparar daños en la red matriz y demás componentes del sistema. Se realizaron recorridos permanentes de inspección para identificar daños en las redes de conducción y distribución, efectuando las reparaciones requeridas para garantizar el funcionamiento de los sistemas. Como resultado de estas actividades se corrigió el daño presentado en la tubería de conducción del sector La Floresta y se solucionaron las afectaciones ocasionadas por el cierre de llaves de paso que impedían el suministro de agua a varios usuarios.

6. Operar, monitorear y mantener los sistemas de cloración, garantizando la dosificación adecuada conforme a la normatividad vigente; así como suministrar cloro en las cantidades y concentraciones requeridas para asegurar la calidad del agua y llevar registros del monitoreo de cloro residual y demás parámetros exigidos. Se operaron y monitorearon los sistemas de cloración, realizando la dosificación correspondiente y efectuando el seguimiento necesario para contribuir al mantenimiento de la calidad del agua suministrada a la comunidad.

7. Informar de manera inmediata cualquier situación que afecte o pueda afectar la calidad del agua suministrada. Se realizó seguimiento permanente al funcionamiento de los sistemas de acueducto. Durante el periodo informado no se presentaron situaciones que comprometieran la calidad del agua suministrada, por lo que no fue necesario emitir reportes relacionados con este aspecto.

8. Acompañar las jornadas de toma de muestras y visitas de control realizadas por autoridades sanitarias y ambientales. Se mantuvo disponibilidad para acompañar las jornadas de inspección y toma de muestras; sin embargo, durante el mes de junio no fueron programadas visitas por parte de las autoridades competentes.

9. Llevar bitácora de actividades ejecutadas, mantenimientos realizados, eventos ocurridos y novedades del sistema. Se registraron las actividades desarrolladas durante el periodo contractual y las novedades presentadas en los sistemas de acueducto, información que sirvió de soporte para la elaboración del presente informe final.

10. Presentar informes mensuales detallados de las actividades desarrolladas, incluyendo soportes técnicos y registros operativos. Se elaboró y presentó el informe final correspondiente al mes de junio de 2026, relacionando las actividades ejecutadas y los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

11. Realizar visitas de inspección cuando se identifiquen intervenciones externas que afecten las redes o sistemas de desinfección. Se realizaron visitas de inspección en los sectores donde se presentaron afectaciones al servicio, verificando el estado de las redes de conducción y



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 3 de 8

distribución para identificar las causas de las fallas y ejecutar las acciones correctivas necesarias.

12. Brindar atención oportuna a los usuarios del servicio cuando se requiera intervención. Se brindó atención permanente y oportuna a los usuarios que reportaron inconvenientes en la prestación del servicio, realizando las verificaciones correspondientes y adoptando las medidas necesarias para solucionar las situaciones presentadas.

13. Mantener el orden y la limpieza en las áreas intervenidas durante y después de la ejecución de actividades. Se mantuvieron las condiciones de orden y limpieza en las áreas intervenidas durante la ejecución de las labores de mantenimiento y reparación realizadas en los diferentes sectores atendidos.

14. Contar permanentemente con el personal y herramientas mínimas requeridas para la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en los estudios previos. Las actividades fueron ejecutadas directamente por el contratista, quien dispuso de las herramientas y elementos necesarios para el desarrollo de las labores contratadas. Asimismo, cuando fue necesario, se contó con el apoyo de la comunidad para facilitar el acceso a las zonas de difícil tránsito y lograr la atención oportuna de las emergencias presentadas.

Observaciones finales

Durante la ejecución de las actividades se identificaron necesidades de intervención que requieren atención por parte de la Administración Municipal. En el sector La Floresta y en el sector Gigante se evidenció el deterioro de tuberías y de las tapas de los tanques de almacenamiento, situación que hace necesaria su reposición para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema.

De igual manera, en el sector El Guarango se identificaron problemas en las tuberías de distribución, especialmente en los sectores La Corta Agua y El Tablón, donde la infraestructura presenta un avanzado estado de deterioro debido al tiempo de servicio. Como consecuencia de ello, algunas viviendas presentan deficiencias en el suministro de agua.

Respecto a la situación presentada los días 22 y 23 de junio en el sector La Floresta, se informó al presidente de la Junta Administradora del Acueducto, señor Parmenio Cadena, quien manifestó que la solución definitiva consiste en retirar las llaves de paso y dejar la conducción directa. Sin embargo, para ejecutar esta intervención se requieren materiales y recursos que no fue posible conseguir durante el periodo contractual, pese a las gestiones adelantadas ante la Administración Municipal, debido a que en la ferretería contratada no se encontraban disponibles los elementos requeridos, como tubería de una y media (1½) pulgadas, uniones y demás accesorios necesarios para la reparación definitiva.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Anexos:

- Cuenta de cobro Contratista. (1 folio)
- Informe de actividades. (8 folios)
- Constancia copia del pago de salud, pensión y riesgos. (1 folio).
- Si aplica exoneración de retención en la fuente para persona natural anexar constancia (1 folio)



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 4 de 8

- Paz y salvo de almacén (01 folio)
- Paz y salvo de archivo (01 folio)
- Bitácora (03 folios)


Nombre del Contratista	Firma
MARTHA MARIANA RIASCOS CHAMORRO Contratista	Martha Riascos

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor/a certifico que las actividades aquí consignadas, fueron verificadas y se han desarrollado conforme la información aquí presentada y anexada.

Vo.Bo. Interventor o Supervisor	Firma
HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS	

EVIDENCIA DETALLADA
(De acuerdo a las actividades realizadas)

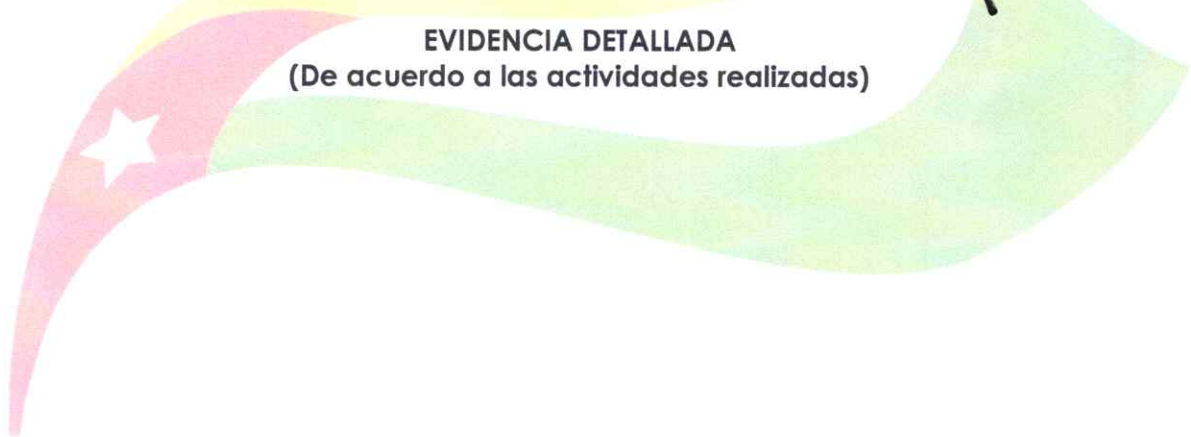



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 5 de 8

LIMPIEZA TANQUES SECTOR EL GUARANGO



Email: alcaldia@lallanada-narino.gov.co

[http:// www.lallanada-narino.gov.co/](http://www.lallanada-narino.gov.co/)

Código postal: 526501 Dirección: Calle 6 No. 4-09 Barrio San Juan Bosco


Celular: 3158466487



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 6 de 8



ARREGLO DE CONEXIÓN TUBO RED DE CONDUCCION- LA FLORESTA



Email: alcaldia@lallanada-narino.gov.co

[http:// www.lallanada-narino.gov.co/](http://www.lallanada-narino.gov.co/)

Código postal: 526501 Dirección: Calle 6 No. 4-09 Barrio San Juan Bosco

Celular: 3158466487



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 7 de 8



SON LAS LLAVES QUE ESTÁN EN PROBLEMAS Y TOCA SUSPENDER DISE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA FLORESTA



LIMPIEZA TANQUES LA FLORESTA



Email: alcaldia@lallanada-narino.gov.co

[http:// www.lallanada-narino.gov.co/](http://www.lallanada-narino.gov.co/)

Código postal: 526501 Dirección: Calle 6 No. 4-09 Barrio San Juan Bosco

Celular: 3158466487



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA	SPO. – 130.30.03
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS	Versión: 03
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 8 de 8



TAPAS DEL TANQUE LA FLORESTA QUE ESTAN DAÑADAS



TAPAS DEL TANQUE DEL GIGANTE DAÑADAS



BITÁCORA DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios MC_020-2026– Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto

Periodo: 19 de mayo al 30 de junio de 2026

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado
19 al 31 de mayo de 2026	Instalación de acometida domiciliaria para la señora Narsisa Yela, en el sector La Floresta.	Se garantizó el acceso al servicio de acueducto para la vivienda beneficiada.
19 al 31 de mayo de 2026	Instalación de acometidas domiciliarias para la señora Aura Rodríguez, el señor Javier Portillo y el señor Adán Chamorro, en el sector El Guarango.	Se habilitó el servicio de agua potable a los usuarios, previa coordinación con los representantes del acueducto.
Durante mayo de 2026	Recorridos de inspección y detección de daños en las redes de conducción y distribución.	Se identificaron y repararon las afectaciones encontradas, garantizando la continuidad del servicio.
Durante mayo de 2026	Operación y monitoreo de los sistemas de cloración.	Se realizó la dosificación de cloro y el control permanente para asegurar la calidad del agua.
Durante mayo de 2026	Inspección y acompañamiento técnico al proyecto de construcción del nuevo tanque en el sector El Guarango (vereda La Palma) y al trazado de la conducción desde la quebrada El Hondo hasta el tanque de distribución existente.	Se efectuó seguimiento técnico a las obras de mejoramiento del sistema de acueducto.
Durante mayo de 2026	Atención a usuarios y visitas de inspección por novedades reportadas.	Se brindó respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por la comunidad.
09 de junio de 2026	Limpieza de tanques y red de conducción del sector El Guarango.	Se mejoraron las condiciones de operación del sistema y se contribuyó al mantenimiento preventivo de la infraestructura.

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado
11 de junio de 2026	Atención de emergencia por suspensión del servicio en el sector La Floresta. Se realizó recorrido de inspección y, con apoyo de la comunidad, se abrió trocha para ubicar la tubería de conducción.	Se encontró la tubería desconectada y se efectuó la reparación utilizando uniones y tubería de 1½ pulgadas facilitadas por la señora Mónica, del acueducto Manantial del Cedro, restableciendo el servicio.
20 de junio de 2026	Limpieza de tanques de distribución del sector La Floresta.	Se efectuó mantenimiento preventivo para conservar la calidad del agua y el adecuado funcionamiento del sistema.
22 de junio de 2026	Atención de reporte por falta de agua en algunas viviendas del sector La Floresta.	Se verificó la red y se encontró una llave de paso cerrada; se procedió a abrirla, restableciendo el suministro a los usuarios afectados.
23 de junio de 2026	Nueva atención por falta de agua en el mismo sector.	Se identificaron otras llaves de paso cerradas, las cuales fueron abiertas, normalizando nuevamente el servicio. Se informó la situación al presidente de la Junta del Acueducto, señor Parmenio Cadena, quien recomendó retirar las llaves de paso y dejar la conducción directa, intervención que quedó pendiente por falta de materiales.
Durante junio de 2026	Gestión ante la Administración Municipal para la consecución de materiales requeridos para la reparación definitiva del sistema.	No fue posible obtener la totalidad de los materiales necesarios, debido a que no se encontraban disponibles en la ferretería contratada por el Municipio.
Durante junio de 2026	Inspección general del estado de la infraestructura de los sistemas de acueducto de La Floresta, El Guarango y Gigante.	Se evidenció deterioro en tuberías, tapas de tanques y redes de distribución, especialmente en los sectores La Corta Agua y El Tablón, recomendándose su reposición para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Fecha	Actividad desarrollada	Resultado
Durante todo el periodo contractual	Operación permanente de los sistemas de acueducto, atención de usuarios, monitoreo de cloración, inspecciones preventivas y correctivas, mantenimiento menor y seguimiento al funcionamiento de las redes.	Se garantizó la continuidad del servicio de acueducto y la atención oportuna de las novedades presentadas durante la ejecución del contrato.

Martha Riascos
 MARTHA MARIANA RIASCOS CHAMORRO
Contratista
