



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026
VILLAGARZÓN - PUTUMAYO



INFORME MENSUAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026

CONTRATISTA: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.
GENSA S.A. E.S.P.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
MME

MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA
ABRIL DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	3
3.	ALCANCE.....	3
4.	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	4
4.1	PÓLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4
4.2	GRUPO DE TRABAJO GENSA	4
5.	CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA.....	5
5.1	OBRA	5
5.2	INTERVENTORÍA	5
6.	AVANCE GENERAL DEL CONTRATO	5
7.	CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2052-2025	7
8.	COMPONENTE TÉCNICO	8
9.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8
10.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	9
11.	COMPONENTE SOCIAL	9
12.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	10
13.	COMENTARIOS.....	12
14.	ANEXOS.....	13

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

1. INTRODUCCIÓN

El MME y GENSA S.A. ESP., suscribieron el contrato interadministrativo GGC-2052-2025 el 9 de diciembre de 2025, cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

En ejecución del contrato en mención, se presenta a continuación el informe de las actividades adelantadas por GENSA durante meses de enero a abril de 2026.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto asociado al contrato interadministrativo GGC-2052-2025 se encuentra ubicado en el municipio de Villagarzón departamento de Putumayo.



3. ALCANCE

Realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en el municipio de Villagarzón del departamento de Putumayo, a través de las siguientes etapas:

- Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación
- Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura.
- Etapa 3 – Cierre.

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo	GGC-2052-2025
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Fecha de Suscripción	9/12/2025
Fecha de Inicio	22/01/2026
Plazo Inicial	31/07/2026
Valor del Contrato	NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS - \$ 9.349.545.113
Suscripción Encargo Fiduciario	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A 26/12/2025

4.1 PÓLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

GARANTÍA		SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
No.42-44-101165672	AMPARO		DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A Seguro de cumplimiento entidad estatal	Cumplimiento	\$ 1.869.909.022,60	9/12/2025	31/01/2029
	Calidad del servicio	\$ 1.869.909.022,60	9/12/2025	31/07/2027
	Prestaciones sociales	\$ 467.477.255,65	9/12/2025	31/07/2029

4.2 GRUPO DE TRABAJO GENSA

Se presenta a continuación el grupo de profesionales de GENSA asignado al seguimiento de los proyectos en el departamento de Putumayo:

PROFESIONALES GENSA	CARGO
Julio Mauricio Arce Posso	Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector Eléctrico
Paola Martínez Serna	Profesional de Proyectos
Julián Santiago Mejía Zuluaga	Profesional de Proyectos
Carlos Alberto Triana Grajales	Profesional Especializado en Proyectos

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

5. CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA

5.1 OBRA

Proceso contractual	SPO-213-GENSA-2026-LG
Apertura	Marzo 17 de 2026
Cierre	Abril 13 de 2026
Publicación evaluación	Abril 21 de 2026
Oferente seleccionado	CONSORCIO PUTUMAYO SOLAR NIT. 902.061.114-4 R.L ARNULFO CAMACHO
Carta de aceptación	Abril 23 de 2026
Estado	Trámite para la obtención del RUT del consorcio, inscripción como proveedor en GENSA.

5.2 INTERVENTORÍA

Proceso contractual	SPO-214-GENSA-2026-LG
Apertura	Marzo 17 de 2026
Cierre	Abril 6 de 2026
Publicación evaluación	Abril 21 de 2026
Oferente seleccionado	CONSORCIO ENERGÉTICO DE PUTUMAYO NIT. 902.061.126-2 R.L VERNER DANIEL ERAZO TORRES
Carta de aceptación	Abril 23 de 2026
Estado	Trámite para la obtención del RUT del consorcio, inscripción como proveedor en GENSA.

6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realiza la firma del acta de inicio del contrato interadministrativo GGC-2052-2025 con el MME el día 22 de enero de 2026.
- El día 23 de enero de 2026, se presenta ante el MME la solicitud de aprobación del primer desembolso, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato GGC-2052-2026:
 1. Suscripción del acta de inicio debidamente firmada;
 2. Aprobación por parte del MME de las garantías a cargo del contratista;
 3. Verificación por parte del MME, de la constitución del encargo fiduciario para el manejo de los recursos;
 4. Pago de seguridad social y parafiscales por parte de GENSA;
 5. Organigrama del equipo técnico y administrativo de GENSA;

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

6. Cronograma para los procesos de contratación de la interventoría derivada y del contratista derivado de implementación.

- El ingreso de estos recursos a la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A, se dio el día 12 de febrero de 2026, como se evidencia en el extracto anexo.
- El 25 de febrero de 2026, se solicita al MME la autorización para tramitar ante la entidad fiduciaria el retiro del valor correspondiente a la primera remuneración del 20% del contrato GGC-2052-2025, que equivale a la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$82.981.713), para ello se incluyeron los documentos requeridos en el contrato: copia del contrato de encargo fiduciario, entrega y aprobación de las pólizas y acta de inicio suscrita.
- Una vez aprobada la solicitud, se procede a descontar de la fiduciaria el primer pago de la remuneración a GENSA, esto se da el 24 de marzo de 2026.
- Durante febrero y marzo GENSA adelanta la elaboración de los pliegos de condiciones, para la contratación de obras e interventoría en el departamento de Putumayo. Acogiendo las consideraciones del MME y valorando las ventajas de realizar un solo proceso, se optó por agrupar los proyectos de Valle del Guamuez (GGC-2051-2025), Villagarzón (GGC-2052-2025), San Miguel (GGC-2055-2025) y Puerto Guzmán (GGC-2057-2025).
- Los pliegos de condiciones incluyen requisitos específicos en aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, que, permiten validar la experiencia, capacidad técnica y financiera de los oferentes, procurando minimizar riesgos al momento de la contratación.
- El día 17 de marzo se hace la publicación de las solicitudes públicas de ofertas SPO-213-GENSA-2026-LG – obras y SPO-214-GENSA-2026-LG interventoría.
- El día 19 de marzo de 2026 se llevan a cabo las visitas obligatorias de manera simultánea en zona rural de los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Guzmán, según lo estipulado en el pliego de condiciones, esta visita se hace con el fin que los posibles oferentes conozcan las condiciones en las que se adelantarán las labores.
- El cierre de los procesos se da en el 6 de abril de 2026 para interventoría y el 13 de abril de 2026 para obras. Durante los días siguientes se realiza por parte de GENSA la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica de las ofertas presentadas. Una vez concluidas las evaluaciones se procede a la publicación del informe de evaluación en la página GENSA, el día 21 de abril.
- El día 23 de abril de 2026 GENSA envía las cartas de aceptación a los oferentes seleccionados: CONSORCIO PUTUMAYO SOLAR – obras y CONSORCIO CONTROL ENERGÉTICO DE PUTUMAYO – interventoría.
- Posterior a la aceptación, los contratistas seleccionados tramitan el RUT ante la DIAN para cada uno de los consocios, una vez se obtiene este documento se debe realizar la inscripción como proveedor de GENSA. Surtidos los pasos anteriores, GENSA procede a la elaboración y firma de los contratos y su legalización que incluye la emisión de pólizas, firma de los pagarés y por último la firma del acta de inicio.
- A la fecha los contratistas seleccionados avanzan en el cumplimiento de requisitos previos a la firma de los contratos.
- Paralelamente se han adelantado acercamientos con las alcaldías municipales de Valle del Guamuez, Villagarzón, San Miguel y Puerto Guzmán y se están conformando los equipos de trabajo, elaborando el cronograma de ejecución y la planificación de actividades.
- Las socializaciones se tienen programadas para dar inicio la primera semana de mayo, así:
 - Valle del Guamuez: 5 de mayo de 2026
 - Villagarzón: 6 de mayo de 2026

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

- Puerto Guzmán: 9 de mayo de 2026
- San Miguel: 11 de mayo de 2026

7. CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2052-2025

A la fecha de corte de este informe, el contrato se encuentra en el desarrollo de la Etapa 1.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-2052-2025 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO						
Fecha de Suscripción Contrato: 09 Diciembre 2025			Contratista: GENSA S.A. ESP			28/04/2026
ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DIAS)	FECHA FINAL	%	% Ejec.
1	Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación	22/01/2026	58	20/03/2026	20%	13,0%
1.1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas Y Energía	22/01/2026	1	22/01/2026	1%	1%
1.2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	22/01/2026	3	24/01/2026	2%	2%
1.3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	25/01/2026	5	29/01/2026	1%	1%
1.4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable	30/01/2026	15	13/02/2026	2%	2%
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de Interventoría	13/02/2026	7	19/02/2026	2%	2%
1.6	Firma de contrato de Interventoría y suscripción de Acta de inicio	20/02/2026	6	25/02/2026	2%	0,5%
1.7	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de obra para la ejecución del proyecto	25/02/2026	10	6/03/2026	2%	2%
1.8	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de obra para la Implementación del proyecto	6/03/2026	7	12/03/2026	2%	2%
1.9	Firma de contrato de obra y suscripción de Acta de inicio	13/03/2026	6	18/03/2026	2%	0,5%
1.10	Cronograma del contratista derivado. Aprobados por interventoría y avalado por GENSA S.A. E.S.P.	18/03/2026	8	25/03/2026	1%	0%
1.11	Verificar la realización de las consultas previas, existencia de las servidumbres y/o permisos de paso, licencia o permiso ambientales, las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo (En caso de Aplicar)	13/03/2026	7	19/03/2026	2%	0%
1.12	Firma Acta de terminación actividades previas a la contratación y contratación, entre GENSA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	20/03/2026	1	20/03/2026	1%	0%
2	Etapa 2 - Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura	20/03/2026	126	24/07/2026	70%	0,0%
2.1	Verificación Comunidades Energéticas y usuarios beneficiarios del proyecto / Realizar socialización y verificación de usuarios	20/03/2026	30	18/04/2026	5%	0%
2.2	Entrega y aprobación de replanteo	20/03/2026	15	3/04/2026	5%	0%
2.3	Compra de equipos importados y materiales eléctricos y civiles, y transporte a bodegas del contratista	20/03/2026	80	7/06/2026	5%	0%
2.4	Avance de obra al 10%	19/04/2026	20	8/05/2026	5%	0%
2.5	Avance de obra al 60%	19/04/2026	80	7/07/2026	20%	0%
2.6	Acta de recibo final de obras 100%	19/04/2026	90	17/07/2026	15%	0%
2.7	Capacitación a las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados, en el marco de la Escuela TEJ	19/04/2026	90	17/07/2026	5%	0%
2.8	Acta de recibo y entrega final entre el administrador, contratista de obra e interventoría	17/07/2026	4	20/07/2026	5%	0%
2.9	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGETICA.	20/07/2026	5	24/07/2026	5%	0%
3	Etapa 3 - Actividades de Cierre	24/07/2026	7	31/07/2026	10%	0,0%
3.1	Suscribir acta de liquidación contrato derivado de implementación	24/07/2026	4	27/07/2026	1%	0%
3.2	Suscribir acta de liquidación contrato de Interventoría	27/07/2026	4	30/07/2026	1%	0%
3.3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre y liquidación del Encargo Fiduciario	27/07/2026	4	30/07/2026	2%	0%
3.4	Presentación informe final y documentación soporte por parte de GENSA S.A. E.S.P.	24/07/2026	7	31/07/2026	4%	0%
3.5	Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	24/07/2026	8	31/07/2026	2%	0%

8. COMPONENTE TÉCNICO

Los SISFV que se implementarán en Villagarzón, tienen las siguientes características técnicas:

SISFV - No. DE USUARIOS 719				
PANELES	INVERSORES	CONTROLADORES	BATERÍAS	SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
2 Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia del módulo de 22%,	Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C	Controlador MPPT de 60 A a 1600 W con eficiencia superior a 98%	Batería Litio 200 Ah a 25,6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80%	Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de GENSA, se realiza seguimiento al esquema de vacunación del personal que viaja a zonas endémicas; con el fin de actualizar la información relacionada con el estado de vacunación contra fiebre amarilla y tétano.

Si el destino de desplazamiento cuenta con riesgos por enfermedades transmitidas por vectores u otras condiciones ambientales, es fundamental contar con las medidas de prevención necesarias, incluyendo las vacunas requeridas

RIESGOS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Los desplazamientos a estas zonas pueden implicar exposición a riesgos como:



Enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos)



Fiebre amarilla, dengue, chikunguña o malaria (según la zona)



Condiciones climáticas y ambientales particulares



Otros factores epidemiológicos propios del territorio

! Las vacunas y medidas de prevención son fundamentales para su protección y la de su equipo de trabajo.

VACUNACIÓN: SU MEJOR PROTECCIÓN

Es importante contar con el esquema de vacunación completo para:

TÉTANO

Previene el tétano, una enfermedad grave que puede causar rigidez muscular y complicaciones mortales, producida por una bacteria presente en el suelo, polvo y heces de animales.

ESQUEMA	DOSIS	TIEMPO Y REFUERZOS (PAI - COLOMBIA)
Esquema básico	3 dosis	0 - 1 - 6 meses
Refuerzo	1 dosis	Cada 10 años después de completar el esquema básico.

 Aplica para todas las personas a partir de los 7 años y en especial para quienes tienen riesgo de heridas o exposición a ambientes contaminados.

FIEBRE AMARILLA

Previene la fiebre amarilla, una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos, que puede causar fiebre, ictericia (color amarillo en la piel) y daño hepático, con riesgo de muerte.

ESQUEMA	DOSIS	TIEMPO Y REFUERZOS (PAI - COLOMBIA)
Esquema básico	1 dosis	Dosis única
Refuerzo	No requiere refuerzo	Protección de por vida (desde 2017, según OMS) y lineamientos PAI).

 Aplica para personas de 1 año en adelante que viajen o residan en zonas de riesgo para fiebre amarilla.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) – Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Lineamientos Técnicos y Normativos de Vacunación PAI 2024.

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GENSA hace la verificación de la documentación de formulación entregada por el MME para cada proyecto, para ello, se cuenta con una lista de chequeo que permite validar la información existente y los posibles faltantes. Para los componentes social y ambiental se verifican entre otros los siguientes documentos:

- Certificación de Parque Nacionales Naturales en donde se establezca si las comunidades beneficiarias se encuentran o NO ubicadas en áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
- Certificación del trámite de la Licencia Ambiental y/o permisos ambientales complementarios o aval ambiental ante la autoridad ambiental competente, necesarios para la debida ejecución del proyecto.
- Presentar caracterización ambiental (línea base) de los recursos naturales.
- Identificación y evaluación de impactos ambientales.
- Plan de manejo ambiental (medidas de mitigación, corrección, compensación y/o prevención, entre otras).
- Determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa.
- Actas de socialización.

Para el proyecto de Villagarzón, se cuenta con la formulación para 293 usuarios. Anexo a este informe se encuentran la lista de chequeo realizada por GENSA.

11. COMPONENTE SOCIAL

- Los días 22 y 23 de enero de 2026, el ingeniero Julio Mauricio Arce Posso, como líder de proyectos de GENSA, asiste a las jornadas de capacitación y transferencia de conocimiento de la Escuela para la Transición Energética Justa en el marco de la estrategia Nacional de Comunidades Energéticas impartida por el MME.

En estas se marcaron como objetivos, el fortalecimiento de las capacidades; garantizar una aplicación real y coherente de los conceptos; y obtener una articulación entre los actores que se centran en los equipos que el MME ha definido como social, técnico y data. Así mismo, se manifestó que serían enviadas a GENSA las presentaciones de estas jornadas, con los ajustes realizados en función de los comentarios obtenidos. A la fecha no se ha recibido dicha información.

- El 12 de febrero de 2026, GENSA envía comunicación a la alcaldía de Villagarzón, informando la ejecución del proyecto en este municipio y solicitando el apoyo de esta entidad durante el desarrollo del mismo. En esta comunicación se solicita:
 1. Designar a un funcionario de la alcaldía de Villagarzón, para que reciba la información pertinente durante la ejecución del proyecto.
 2. Realizar el acompañamiento para los temas relacionados con socializaciones ante las comunidades.
 3. Realizar el acompañamiento en la gestión sobre las servidumbres que pueda generar el proyecto.

4. Obtener la certificación del órgano competente sobre la presencia o no de comunidades indígenas y/o afrodescendientes.
5. Obtener la certificación del órgano competente en cuanto a que las comunidades no se encuentran en zonas de alto riesgo.
6. Definir el sitio de instalación de las vallas que contienen la información general del proyecto.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El siguiente registro fotográfico corresponde a la visita técnica obligatoria para las solicitudes de ofertas SPO-213-GENSA-2026-LG – obras y SPO-214-GENSA-2026-LG – interventoría, realizada de manera simultánea el día 19 de marzo de 2026 a las 9:00 am, en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Guzmán.



Lugar de la reunión: Vereda Alianza
Puerto Guzmán - Putumayo



Lugar de la reunión: Vereda La Costeñita
Valle del Guamuez – Putumayo




Representantes de GENSA, oferentes de obra e interventoría
Puerto Guzmán – Putumayo



Representantes de GENSA, oferentes de obra e interventoría
 Valle del Guamuez – Putumayo

13. COMENTARIOS

- El avance general del Contrato Interadministrativo GGC-2052-2025 al 30 de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma, es del 13%, a continuación, se presenta la curva S:

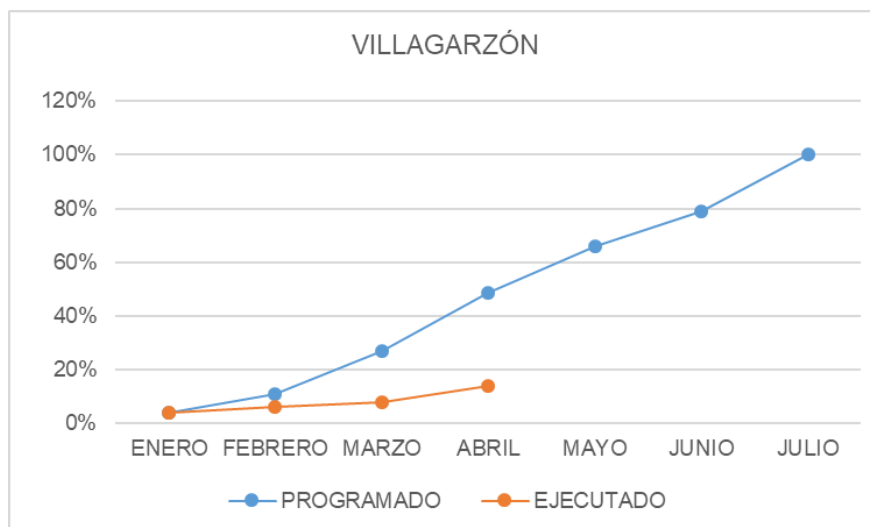

	<p style="text-align: center;">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2052-2026</p> <p style="text-align: center;">VILLAGARZÓN - PUTUMAYO</p>	
---	---	---

14. ANEXOS

- Cronograma general GGC-2052-2025
- Informe de la fiduciaria febrero y marzo de 2026
- Soporte consignación rendimientos
- Lista de chequeo documentación formulación

Elaborado por: Paola Martínez Serna- Profesional de Proyectos. 

Revisado por: Julio Mauricio Arce Posso - Líder de Proyectos de Infraestructura Sector Eléctrico.
