

INFORME DE INTERVENTORIA N°06

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2000.13.12.006-2025

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA N° 2000.13.04.004-2025 GRUPO 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

INTERVENTOR: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE: CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ
CARGO : REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:


Representante de la Interventoria

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2026

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

INFORME N° 06

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS BOLO ALIZAL PALMIRA, BOLO BARRIO NUEVO PALMIRA, LA MARÍA CORREGIMIENTO DE TENJO PALMIRA, MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA EN LA VICTORIA.

CONTRATO: 2000.13.12.004-2024

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S	Aspectos del contrato en curso	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S	Cumplimiento de obligaciones	
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S	Polizas vigentes	
2.1	SANCIONES	N			
3	CONTROL FINANCIERO	S	S		
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S		
4.1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	N			
5	SEGURIDAD SOCIAL	S	S	Se adjuntan las planillas del personal de consultoría e interventoría tanto técnico como administrativo.	
5.1	ANEXOS SST	N			
6	ANEXOS	N			
6.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S	Se adjuntan actas de reuniones, comites y correspondencia	
6.2	CONTROL DE CALIDAD	N			
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	N			
6.4	ASPECTOS SOCIALES	N			
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	N			
6.6	RECURSO HUMANO	N			
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	N			
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S	S	Se incluye Registro fotográfico	
6.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N			
6.10	ESTUDIOS Y DISEÑOS	S	S		
6.11	FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	N			
6.12	FICHA DE SEGUIMIENTO SGSST	N			
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S	S		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4	
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 4	
INFORME N°06		PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026			
PROYECTOS INCLUIDOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS BOLO ALIZAL PALMIRA, BOLO BARRIO NUEVO PALMIRA, LA MARÍA CORREGIMIENTO DE TENJO PALMIRA, MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA EN LA VICTORIA.					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	X	OBRA		OTRO	ESPECIFIQUE:
1. INFORMACION GENERAL					
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA			1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA		
CONTRATO N° 22000.13.12.006-2025			CONTRATO N° 2000.13.04.004-2025		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL SOBRE LOS CONTRATOS CUYO OBJETO SON: 1. "FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES SECTORES: 1) CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 2) CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 3) VEREDA LA MARÍA DEL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA; Y 4) SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA. 2. FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS: 1. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUA DE DIOS ABASTECE A LAS VEREDA ILAMA EL AGRADO Y AGUAS DE DIOS MUNICIPIO DE RESTREPO, 2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SONSITO INCLUYENDO LAS VEREDAS DEL MANANTIAL, LA UNIDAD E INCIVA DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE; EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS DE MUNICIPIO DE EL CERRITO, EL ÁGUILA, FLORIDA Y PRADERA, VALLE DEL CAUCA"			OBJETO DEL CONTRATO: FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES SECTORES: 1) CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 2) CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 3) VEREDA LA MARÍA DEL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA; Y 4) SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA		
CONTRATISTA: MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S			CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025.		
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ			REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA DE LOS REYES RESTREPO VILLARROEL		
PLAZO INICIAL: 13 meses a partir de la firma del acta de inicio			PLAZO INICIAL: 12 meses a partir de la firma del acta de inicio		
ACTA DE INICIO: 27 de noviembre de 2025			ACTA DE INICIO: 01 de diciembre de 2025		
VALOR INICIAL: Mil sesenta y seis millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos se			VALOR INICIAL: \$ 1.544.217.387,78		
CDR INICIAL No. 18201, 18213, 18211 del 07 de abril 2025 y 18511 del 8 de mayo de			CDR N° 18200, 18210, 18212 del 07 de abril 2025 y 18510 del 8 de mayo de 2025.		
FECHA DE TERMINACION: 27 de diciembre de 2026.			FECHA DE TERMINACION: 01 de diciembre de 2026		
DATOS DE LA SUPERVISIÓN					
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando			Ing. Diego Calderón		
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato			Ing. Camilo Andrés Erazo		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI		Código: FO-PDA.2.1-4
		INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 4
INFORME N°06		PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		
PROYECTOS INCLUIDOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS BOLO ALIZAL PALMIRA, BOLO BARRIO NUEVO PALMIRA, LA MARÍA CORREGIMIENTO DE TENJO PALMIRA, MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA EN LA VICTORIA.				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	X	OBRA	OTRO	ESPECIFIQUE:
1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
APORTES AL SISTEMA DE SALUD - EPS		SI	Contratista hace entrega de la correspondiente planilla que acredita el cumplimiento de esta obligación	pendiente seguridad social del director del proyecto
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES - AFP		SI	Contratista hace entrega de la correspondiente planilla que acredita el cumplimiento de esta obligación	pendiente seguridad social del director del proyecto
APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - ARL		SI	Contratista hace entrega de la correspondiente planilla que acredita el cumplimiento de esta obligación	pendiente seguridad social del director del proyecto
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio		NO		
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)		Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Específicas del Contrato y/o Convenio		NO		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

VALLE CAUCANO DE AGUAS S.A. E.S.P.

PDA
AUTORIDAD DEL VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

Código: FO-PDA.2.1-4

Versión: 4

Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME DE INTERVENTORIA

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

INFORME N°06

2. CONTROL DE GARANTÍAS

2.2. CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta					Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 213.323.693,00	45-44-101171320	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2025	31/7/2027	Cumplimiento	\$ 308.843.477,56	M-100283629	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1/12/2025	31/5/2027
Buen Manejo del Anticipo	\$ -					Buen Manejo del Anticipo	\$ 463.265.216,33	M-100283629	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1/12/2025	31/5/2027
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 53.330.923,00	45-44-101171320	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2025	31/1/2030	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 77.210.869,39	M-100283629	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1/12/2025	1/12/2029
Calidad del Servicio	\$ 319.985.539,00	45-44-101171320	SEGUROS DEL ESTADO	31/1/2027	31/1/2032	Calidad del Servicio	\$ 463.265.216,33	M-100283629	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1/12/2025	1/12/2031
Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 284.700.000,00	45-40-101104543	SEGUROS DEL ESTADO	27/11/2025	31/1/2027	Responsabilidad Civil extracontractual	\$ 569.400.000,00	M-100073313	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1/12/2025	1/12/2026

2.1 SANCIONES

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa		
Cláusula Penal		
Caducidad		
Ninguna		

 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP			 PDA PROMOCIÓN DEL AGUA VALLE DEL CAUCA			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA						Código: FO-PDA.2.1-4	
												Versión: 4	
												Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
INFORME N°06						PERIODO:01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026							
3. CONTROL FINANCIERO													
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA						3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA							
Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar	Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar		
Pago Anticipado (0%)	5/12/2025	\$210.846.357	19,77%	N/A	\$210.846.357	Pago Anticipado (30%)	5/12/2025	\$463.265.216	30,00%	N/A	\$463.265.216		
										</			

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME No. 06

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

4. CONTROL DE EJECUCION

GRUPO 1	Valor por diseño	Productos	Porcentaje por producto	Valor por producto	Porcentaje por contrato	Antes de IVA	IVA	EJECUTADO
Diseño 1 -Palmira Bolo Alizal	\$ 242.037.417,00	Producto 0	30%	\$ 72.611.225,00	4,70%	\$ 61.017.836,13	\$ 11.593.388,87	\$ 72.611.225,00
		Producto 1	10%	\$ 24.203.741,00	1,57%	\$ 20.339.278,15	\$ 11.593.389,87	
		Producto 2	10%	\$ 24.203.741,00	1,57%	\$ 20.339.278,15	\$ 11.593.390,87	
		Producto 3	30%	\$ 72.611.225,00	4,70%	\$ 61.017.836,13	\$ 11.593.391,87	
		Producto 4	10%	\$ 24.203.741,00	1,57%	\$ 20.339.278,15	\$ 11.593.392,87	
		Producto 5	10%	\$ 24.203.744,00	1,57%	\$ 20.339.280,67	\$ 11.593.393,87	
Diseño 2 -Palmira Bolo Barrio Nuevo	\$ 244.020.538,00	Producto 0	30%	\$ 73.206.161,00	4,74%	\$ 61.517.782,35	\$ 11.593.394,87	\$ 73.206.161,00
		Producto 1	10%	\$ 24.402.053,00	1,58%	\$ 20.505.926,89	\$ 11.593.395,87	
		Producto 2	10%	\$ 24.402.053,00	1,58%	\$ 20.505.926,89	\$ 11.593.396,87	
		Producto 3	30%	\$ 73.206.161,00	4,74%	\$ 61.517.782,35	\$ 11.593.397,87	
		Producto 4	10%	\$ 24.402.053,00	1,58%	\$ 20.505.926,89	\$ 11.593.398,87	
		Producto 5	10%	\$ 24.402.057,00	1,58%	\$ 20.505.930,25	\$ 11.593.399,87	
Diseño 3 -Palmira Tenjo	\$ 394.034.699,00	Producto 0	30%	\$ 118.210.409,00	7,66%	\$ 99.336.478,15	\$ 11.593.400,87	\$ 118.210.409,00
		Producto 1	10%	\$ 39.403.469,00	2,55%	\$ 33.112.158,82	\$ 11.593.401,87	
		Producto 2	10%	\$ 39.403.469,00	2,55%	\$ 33.112.158,82	\$ 11.593.402,87	
		Producto 3	30%	\$ 118.210.409,00	7,66%	\$ 99.336.478,15	\$ 11.593.403,87	
		Producto 4	10%	\$ 39.403.469,00	2,55%	\$ 33.112.158,82	\$ 11.593.404,87	
		Producto 5	10%	\$ 39.403.474,00	2,55%	\$ 33.112.163,03	\$ 11.593.405,87	
Diseño 4 -La Victoria	\$ 664.124.733,78	Producto 0	30%	\$ 199.237.420,00	12,90%	\$ 167.426.403,36	\$ 11.593.406,87	\$ 199.237.420,00
		Producto 1	10%	\$ 66.412.473,00	4,30%	\$ 55.808.800,84	\$ 11.593.407,87	
		Producto 2	10%	\$ 66.412.473,00	4,30%	\$ 55.808.800,84	\$ 11.593.408,87	
		Producto 3	30%	\$ 199.237.420,00	12,90%	\$ 167.426.403,36	\$ 11.593.409,87	
		Producto 4	10%	\$ 66.412.473,00	4,30%	\$ 55.808.800,84	\$ 11.593.410,87	
		Producto 5	10%	\$ 66.412.474,78	4,30%	\$ 55.808.802,34	\$ 11.593.411,87	

Acumulado = \$ 463.265.215,00

INFORME DE INTERVENTORIA

INFORME N° 6

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjuntó la planilla de seguridad social de solamente dos de los profesionales abscritos al proyecto y pendiente el certificado de los adicionales y el pago de los parafiscales.

Firma del Interventor Contrato N° 2000.13.04.004-2025

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el mes de mayo de 2026 se entregó el PRODUCTO 1 y se avanzó en las actividades correspondientes al PRODUCTO 2, particularmente en la Formulación de Alternativas, el diseño preliminar de las alternativas y la estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada. Por último, el informe expone los logros obtenidos en el período analizado, respaldados por registros técnicos, actas, comunicaciones y otras evidencias documentales, además de señalar las próximas actividades requeridas para completar el planteamiento, selección de alternativas, gestión de trámites y permisos

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1	Se realizó la entrega del PRODUCTO 1	Se recibe en la oficina de interventoria el producto 1 el 11 de mayo de 2026. PRODUCTO 1. FASE I: ACTIVIDADES PRELIMINARES, CATASTRO Y DIAGNÓSTICO. Actividades preliminares, de contextualización, catastro del sistema de acueducto y/o alcantarillado y estudio topográfico, La interventoria procede a revisarlo.
2	Análisis de alternativas	En el marco de la actividad de formulación de alternativas, se avanzó en la identificación y definición de posibles soluciones técnicas para atender las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable en las zonas objeto del proyecto, considerando las condiciones de las fuentes de abastecimiento, la infraestructura existente, la demanda proyectada y las restricciones técnicas, ambientales y prediales identificadas.
4	Gestión de trámites y permisos (Parte I),	Se adelantó la recopilación y análisis de información institucional, ambiental y predial requerida para la identificación de los permisos, autorizaciones y gestiones necesarias para la ejecución futura de las obras. se encuentra en desarrollo el informe de identificación y requisitos para adelantar permisos ambientales, permisos de ocupación o cruce de vías, así como la identificación preliminar de predios requeridos para estructuras puntuales y posibles áreas sujetas a servidumbre para la ejecución de obras lineales.
5	Plan de Gestión Social	Se desarrollaron actividades de socialización de los resultados obtenidos en la Fase I del proyecto, correspondiente a las actividades preliminares, contextualización, catastro y diagnóstico de los sistemas de acueducto objeto de intervención

	Segunda socialización con la comunidad. Fase de diagnostico	Se expusieron los resultados del diagnóstico integral desarrollado para cada sistema, incluyendo la evaluación de estudios y proyectos existentes, el análisis de población y demanda, la revisión de consumos y pérdidas de agua, la identificación de capacidades limitantes de la infraestructura, los resultados de mediciones de caudal y calidad del agua, los estudios hidrológicos efectuados y el diagnóstico físico, técnico y operativo de los sistemas de abastecimiento. Las jornadas permitieron presentar a las comunidades y entidades participantes el estado actual de los sistemas de acueducto, validar información obtenida durante el proceso de diagnóstico, resolver inquietudes de los actores involucrados y generar espacios de retroalimentación que contribuyen al fortalecimiento de la formulación de alternativas actualmente en desarrollo dentro de la Fase II del proyecto.
--	---	--

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
11'	Acta No 16 -mayo 5	La reunión se centró en los atrasos, riesgos contractuales y dudas jurídicas asociadas al contrato de consultoría 2013-04-004-2025, que agrupa varios frentes de diseño y estudios para sistemas de acueducto rural en Valle del Cauca.
12	Acta No 17-mayo 13	La reunión se centró en el avance técnico y administrativo del proyecto, con especial énfasis en la estrategia de cobro por porcentajes para el nuevo proyecto y en la necesidad de revisar el componente social con la abogada Lorena. También se presentó el estado de avance del proyecto, indicando un progreso proyectado del 42,5% y la entrega próxima de un informe y presupuesto de San Pablo.
13	Acta No 18- mayo 21	La reunión se centró en el avance técnico y administrativo del proyecto, con especial énfasis en la estrategia de cobro por porcentajes para el nuevo proyecto y en la necesidad de revisar el componente social con la abogada Lorena. También se presentó el estado de avance del proyecto, indicando un progreso proyectado del 43,8% y la entrega próxima de un informe y presupuesto de San Pablo.
14	Acta No 19- mayo 28	La reunión se centró en el avance técnico y administrativo del proyecto, con especial énfasis en la revisión del avance del Producto 2 (formulación y selección de alternativas) y estado de la gestión de trámites/permisos; se definieron próximos hitos de socialización en terreno y se aclararon requerimientos para radicación de informes y facturación.

III. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA ENVIADA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	Correo electronico 7 de mayo de 2026	Según las directrices de Vallecaucana, la fecha límite para la entrega de los informes mensuales de la Interventoría a vallecaucana es el día 5 de cada mes. A la fecha (7 de mayo), el plazo se ha cumplido y observamos con preocupación que aún no se ha recibido la siguiente documentación obligatoria:
1	Revision de seguridad social. Mayo 19 de 2026	Se solicita subsanar la seguridad social pendiente.
4	Envío de actas digitales y solicitud de informes físicos (Febrero - Abril). Mayo 19 de 2026	El correo tiene como objetivo coordinar la entrega de documentación pendiente y agilizar los trámites digitales tras la entrega física de las actas el pasado lunes 11 de mayo. Para ello, se solicita al contratista el envío del informe de abril junto con dos copias físicas, una copia física adicional de los informes de febrero y marzo para completar la radicación ante Vallecaucana, y la devolución de las actas adjuntas firmadas digitalmente para adelantar el registro de los soportes virtuales


IV. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA RECIBIDA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
-----	-------------	-----------

1	Correo electronico 7 de mayo de 2026	Se adjunta informe de abril por parte del consultor
2	Correo electronico 7 de mayo de 2026	Se adjunta planillas de seguridad social
1	Socialización Avance proyecto Acueducto Interveredal Siberia, Miravalles, Taguales y Riveralta. Mayo 19 de 2026	Fecha: Miércoles, 27 de mayo de 2026 Hora: 10:00 a. m. Lugar: Polideportivo Corregimiento de Miravalles
5	Entrega del Plan de Gestión Social e informes de gestión social correspondientes al periodo diciembre de 2025 – abril de 2026	Informe de Gestión Social diciembre 2025 – abril 2026, municipio de Palmira, Informe de Gestión Social diciembre 2025 – abril 2026, municipio la victoria.

INFORME DE INTERVENTORIA

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Radicado producto 1



Convocatoria Jornadas de Socialización



Socialización Bolo Barrio Nuevo



Socialización Bolo Alizal



Jornada de socialización Miravalles, Taguales, Siberia y Riveralta
– La Victoria.



Jornada de socialización Miravalles, Taguales, Siberia y Riveralta
– La Victoria.

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA				Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019		
ANEXO 10 - SEGUIMIENTO DE AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
INFORME N° 06								
Actividades		FECHAS DE EJECUCIÓN		DÍAS	VALOR CONTRATO %	VR. ACUM. PERIODO ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE NUEVO ACUMULADO	OBSERVACIONES
Ítem		INICIAL	FINAL					
0	PRODUCTO INICIAL Plan de trabajo, cronograma, hojas de vida de personal consultoría FASE I				100%	35,21%	35,21%	
					30,00%	30,00%	30,00%	
					10,00%	5,21%	5,21%	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACION, CATASTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO				5,00%	4,80%	4,80%	
1.1	Actividades preliminares y de contextualización				0,50%	0,50%	0,50%	
1.2	Reunión con Administración municipal para revisión y/o concertación del alcance de proyecto, incluir registro fotográfico y lista de asistencia.				0,50%	0,50%	0,50%	
1.3	Reunión informativa del inicio de los estudios y diseños con la comunidad beneficiada, incluir registro fotográfico y lista de asistencia.				0,50%	0,50%	0,50%	
1.4	Reconocimiento físico de campo				0,50%	0,50%	0,50%	
1.5	Recolección de información existente: Memorias, planos, esquemas, archivos				0,50%	0,50%	0,50%	
1.6	Levantamiento de campo				0,50%	0,50%	0,50%	
1.7	Levantamiento del Catastro del sistema de acueducto y/o alcantarillado				0,50%	0,50%	0,50%	
1.8	Elaboración de fichas técnicas				0,50%	0,50%	0,50%	
1.9	Estudio Topográficos general				0,50%	0,50%	0,50%	
1.10	Informe de las actividades realizadas con registro fotográfico, planos esquemas, actas de reuniones y demás soportes.				0,50%	0,30%	0,30%	
2	DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y / O ALCANTARILLADO				5,00%	0,41%	0,41%	
2.1	Análisis y evaluación de diagnósticos, estudios y proyectos existentes				0,38%	0,21%	0,21%	
2.2	Proyección de Población				0,38%	0,10%	0,10%	
2.3	Análisis del consumo de agua, pérdidas y dotación bruta				0,38%	0,00%	0,00%	
2.4	Proyección de la Demanda				0,38%	0,00%	0,00%	
2.5	Análisis de la capacidad limitante del sistema				0,38%	0,00%	0,00%	
2.6	Medición de caudales y Análisis de Calidad del agua				0,38%	0,10%	0,10%	
2.7	Aforos y caracterización de aguas residuales				0,38%	0,00%	0,00%	
2.8	Estudio de tratabilidad y/o toxicidad				0,38%	0,00%	0,00%	
2.9	Estudio Hidrológico				0,38%	0,00%	0,00%	
2.10	Diagnostico Físico, técnico y operativo del Sistema				0,38%	0,00%	0,00%	
2.11	Diligenciamiento del formato: Anexo V Diagnostico Prestadores de servicios públicos, de la Resolución 0379 de 2012 emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio				0,38%	0,00%	0,00%	
2.12	Informe de Diagnóstico Técnico Operativo y Físico				0,38%	0,00%	0,00%	
2.13	Socialización del Informe de Diagnóstico a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Administración municipal, Operador del servicio y Comunidad beneficiada. Se debe llenar lista de asistencia y				0,38%	0,00%	0,00%	
	FASE II				10,00%	0,00%	0,00%	
3	PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS				5,00%	0,00%	0,00%	
3.1	Formulación de Alternativas				0,83%	0,00%	0,00%	
3.2	Diseño preliminar de las alternativas				0,83%	0,00%	0,00%	
3.3	Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada				0,83%	0,00%	0,00%	
3.4	Cuantificación de Costos de las alternativas				0,83%	0,00%	0,00%	
3.5	Evaluación de las alternativas (económica, técnica, administrativa operativa etc.)				0,83%	0,00%	0,00%	

3.6	Informe de Formulación y Evaluación de las Alternativas					0,83%			0,00%
4	GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE I)					5,00%		0,00%	0,00%
4.1	Informe de identificación y requisitos para adelantar los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto: Permiso o renovación de Concesión de Agua, Exploración de Pozo, Licencia Ambiental, Vertimiento. (Ver Anexo Técnico)					1,67%			0,00%
4.2	Informe de identificación y requisitos para adelantar Permiso para Uso de Zona de Carreteras o Permisos de cruce sobre la vía					1,67%			0,00%
4.3	Informe de identificación y requisitos para tramite de predios necesarios para la ejecución de estructuras puntuales y servidumbre necesarias para la ejecución de obras lineales. Incluir plano general y formato suministrado por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. (Ver Anexo Técnico)					1,67%			0,00%
5	DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA								
	FASE III								
5.1	Topografía de las Zonas de Interés Para el Diseño					30,00%		0,00%	0,00%
5.2	Sistema de información geográfico (SIG)					20,00%		0,00%	0,00%
5.3	Diseños Detallados Hidráulicos de los Componentes					2,50%			0,00%
5.4	Estudios de Suelos, Geológicos y Geotécnicos					2,50%			0,00%
5.5	Diseños Detallados Estructurales de los Componentes					2,50%			0,00%
5.6	Diseños Detallados Eléctricos de los Componentes					2,50%			0,00%
5.7	Estudios Ambientales de las Obras Proyectadas en el Sistema					2,50%			0,00%
5.8	Informe de Diseños Definitivos					2,50%			0,00%
6	PRESUPUESTOS - APU - ESPECIFICACIONES					10,00%		0,00%	0,00%
6.1	Cuantificación de Cantidades de las Obras Proyectadas					1,11%			0,00%
6.2	Cálculo y Definición de los APU de los Items del Proyecto					1,11%			0,00%
6.3	Cálculo del Presupuesto Total de las Obras del Proyecto y POI					1,11%			0,00%
6.4	Cotizaciones de los materiales, mano de obra especializada, equipos no incluidos en la					1,11%			0,00%
6.5	Cuantificación de recursos					1,11%			0,00%
6.6	Plan financiero					1,11%			0,00%
6.7	Especificaciones Técnicas del Proyecto por cada ítem del presupuesto					1,11%			0,00%
6.8	Cronograma de obra					1,11%			0,00%
6.9	Flujo de fondos de inversión					1,11%			0,00%
7	GESTION DE TRAMITES Y PERMISOS (PARTE II)								
	FASE IV								
7.1	Informe de Gestión con los documentos que evidencie la aprobación de los permisos ambientales según corresponda permiso de concesión de agua, permiso de exploración pozo profundo.					10,00%		0,00%	0,00%
7.2	Informe de Gestión con los documentos debidamente diligenciados y firmado que acredite la propiedad, o posesión y/o permiso de servidumbre necesarios para la ejecución del proyecto.					3,33%			0,00%
7.3	Informe de Gestión con los documentos que evidencien la aprobación de permisos de intervenciones en vías, en caso de encontrarse en trámite anexar carta de radicación ante la					3,33%			0,00%
	FASE V								
8	DOCUMENTOS, PRESENTACION Y VIABILIZACION DEL PROYECTO ANTE MVCT según					10,00%		0,00%	0,00%
	Resoluciones No.0379 de 2012 y No.0504 de 2013					10,00%		0,00%	0,00%
8.1	Elaboración Ficha Resumen del proyecto					0,77%			0,00%
8.2	Estructuración de la Metodología General Ajustada (MGA) / Elaboración Ficha EBI					0,77%			0,00%
8.3	Certificación del ente territorial en la cual se asegura el cumplimiento a lo previsto en la Ley 142					0,77%			0,00%
8.4	Certificación que el proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo, en el Plan de Ordenamiento					0,77%			0,00%
8.5	Certificación que el proyecto está incluido en el Banco de proyectos de inversión del municipio					0,77%			0,00%
8.6	Certificación del municipio en la cual acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de					0,77%			0,00%
8.7	Para proyectos en los que el municipio aporta recursos, certificar la disponibilidad de los mismos y					0,77%			0,00%
8.8	Carta de presentación del proyecto					0,77%			0,00%
8.9	Radicación del Proyecto ante MVCT					0,77%			0,00%
8.10	Sustentación Técnica del Proyecto ante MVCT					0,77%			0,00%
8.11	Corrección y ajustes del Proyecto según MVCT					0,77%			0,00%

8.12	Entrega original y en CD del proyecto completo con su respectiva carta de viabilidad a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.					0,77%			0,00%
8.13	Sustentación y socialización del proyecto a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Administración municipal, Operador del servicio y Comunidad beneficiada. Se debe llenar lista de asistencia y					0,77%			0,00%
ACUMULADO TOTAL							#, NOMBRE?	100,00%	35,21%
									35,21%

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI	Código: FO-PDA.2.1-4
			Versión: 4
		INFORME DE INTERVENTORIA	Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME N°05		PERIODO:01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES			
ITEM	ACTIVIDAD Y/O ELEMENTO	DESCRIPCION	
1	Avance ejecución del contrato	Durante mayo de 2026, el contrato de consultoría alcanzó un 45% de ejecución acumulado, logrando la culminación de la Fase I (catastro y diagnóstico en Palmira y La Victoria) y un avance sustancial en la Fase II. En esta última, el hito principal fue la estructuración de la Matriz Multicriterio de Valoración Ponderada (Método AHP) para la selección de alternativas técnicas en los corregimientos de Bolo Alizal, Bolo Barrio Nuevo y el sistema interveredal (Miravalles, Taguales, La Siberia y Riveralta), cuyos componentes de ingeniería y evaluación se encuentran en proceso de consolidación. En el componente social, se desarrollaron con éxito las jornadas de socialización de los diagnósticos junto a las comunidades, Vallecaucana de Aguas y las administraciones locales; mientras que en la gestión de trámites se avanzó en la recopilación de información ambiental y predial, reportando únicamente restricciones de ritmo en la vereda La María (corregimiento de Tenjo) debido a condiciones de orden público que limitan las actividades de campo.	

MAYO DE 2026



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

"FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- GRUPO 1"

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025
Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.004-2025

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
2.1	Localización general del proyecto	4
3.	ASPECTOS CONTRACTUALES.....	6
3.1	Contrato de consultoría	6
3.2	Control y seguimiento de pólizas	7
3.3	Representantes de las entidades involucradas en el proyecto	8
4.	ACTIVIDADES PARA EJECUTAR POR LA CONSULTORÍA.....	9
4.1	Alcance contractual y Plan de trabajo	9
4.2	Avance del contrato de consultoría.....	11
4.2.2	Actividades próximas para iniciar	22
4.2.3	Porcentaje (%) de avance	22
5.	CONCLUSIONES	23

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe del mes de mayo de 2026, elaborado en el marco de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 2000.13.04.004-2025, cuyo objeto es la *"Formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del Valle del Cauca"*, específicamente en los siguientes sectores: (i) corregimiento Bolo Alizal del municipio de Palmira; (ii) corregimiento Bolo Barrio Nuevo del municipio de Palmira; (iii) vereda La María del corregimiento de Tenjo, municipio de Palmira; y (iv) sistema de acueducto interveredal Miravalles, Taguales, Siberia y Riveralta del municipio de La Victoria.

El informe tiene como propósito documentar el avance formal de la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de mayo de 2026, presentar el estado de avance de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado y dejar constancia de las acciones adelantadas en cumplimiento de la terminación del Producto 1 – Fase I: Actividades preliminares, catastro y diagnóstico, de conformidad con el cronograma de trabajo y los lineamientos técnicos y normativos aplicables y del avance del producto 2 – Fase II Planteamiento, selección de alternativas, gestión de trámites y permisos (Parte I).

Durante el mes de mayo de 2026 se entregó el PRODUCTO 1 y se avanzó en las actividades correspondientes al PRODUCTO 2, particularmente en la Formulación de Alternativas, el diseño preliminar de las alternativas y la estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada. Por último, el informe expone los logros obtenidos en el período analizado, respaldados por registros técnicos, actas, comunicaciones y otras evidencias documentales, además de señalar las próximas actividades requeridas para completar el planteamiento, selección de alternativas, gestión de trámites y permisos (Parte I).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Localización general del proyecto

La formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del Valle del Cauca se desarrolla en los municipios de Palmira y La Victoria. En el municipio de Palmira, el alcance del proyecto comprende el corregimiento Bolo Alizal, la vereda Bolo Barrio Nuevo y la vereda La María del corregimiento de Tenjo; mientras que, en el municipio de La Victoria, el proyecto incluye la vereda La Siberia y los corregimientos Miravalles, Taguales y Riveralta.

El municipio de Palmira, localizado en la región sur del departamento del Valle del Cauca, limita al norte con el municipio de El Cerrito, al oriente con el departamento del Tolima, al sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al occidente con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes. Cuenta con una superficie aproximada de 1.123 km². Su territorio, que comprende zonas planas y de ladera, corresponde a un sistema de asentamientos de distinto orden, tanto poblacionales como industriales e institucionales. La división político-administrativa del municipio se estructura en dos sistemas: uno urbano, conformado por las comunas de la uno (1) a la siete (7), y uno rural, que abarca las comunas de la ocho (8) a la dieciséis (16) (Municipio de Palmira, 2021).

El área rural del municipio de Palmira está conformada por los corregimientos de Rozo, La Torre, La Acequia, Matapalo, Obando, La Herradura, Palmaseca, Coronado (rural), Zamorano (rural), La Dolores, Guanabanal, Caucaseco, Juanchito, Bolo San Isidro, Bolo Italia, Bolo Alizal, Amaime, Boyacá, La Pampa, Tablones, Tienda Nueva, Guayabal, Barrancas, La Zapata, Aguaclara, Ayacucho, Combia, Toche, Potrerillo, Caluce y Tenjo, dentro de los cuales se localizan los sistemas de acueducto objeto del presente proyecto.

Por su parte, el municipio de La Victoria se ubica aproximadamente a 154 kilómetros al norte de la ciudad de Cali, en el sector nororiental del departamento del Valle del Cauca, sobre la margen derecha del río Cauca y en el ramal occidental de la cordillera Central. Limita al norte con el municipio de Obando, al sur con el municipio de Zarzal, al occidente con el municipio de La Unión y al oriente con el departamento del Quindío, específicamente con los municipios de Montenegro y La Tebaida.

El área urbana del municipio se divide en seis barrios, mientras que su zona rural está conformada por los corregimientos de San Pedro, San José, Holguín, Miravalles, Taguales y Riveralta, dentro de los cuales se encuentran los sistemas de acueducto incluidos en el alcance del proyecto.

La *Figura 1* y la *Figura 2* presentan la localización general de los municipios y el área de influencia del proyecto.

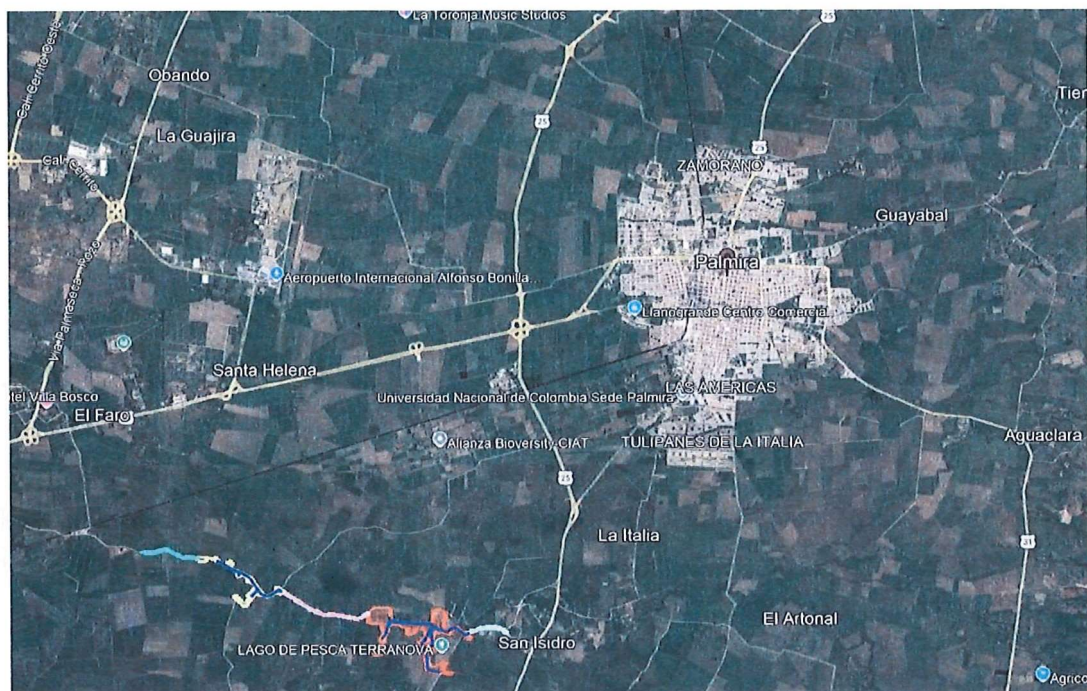


Figura 1. Localización del municipio de Palmira y área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia a partir de CVC (2024), SIAC (2022), IGAC (2024).

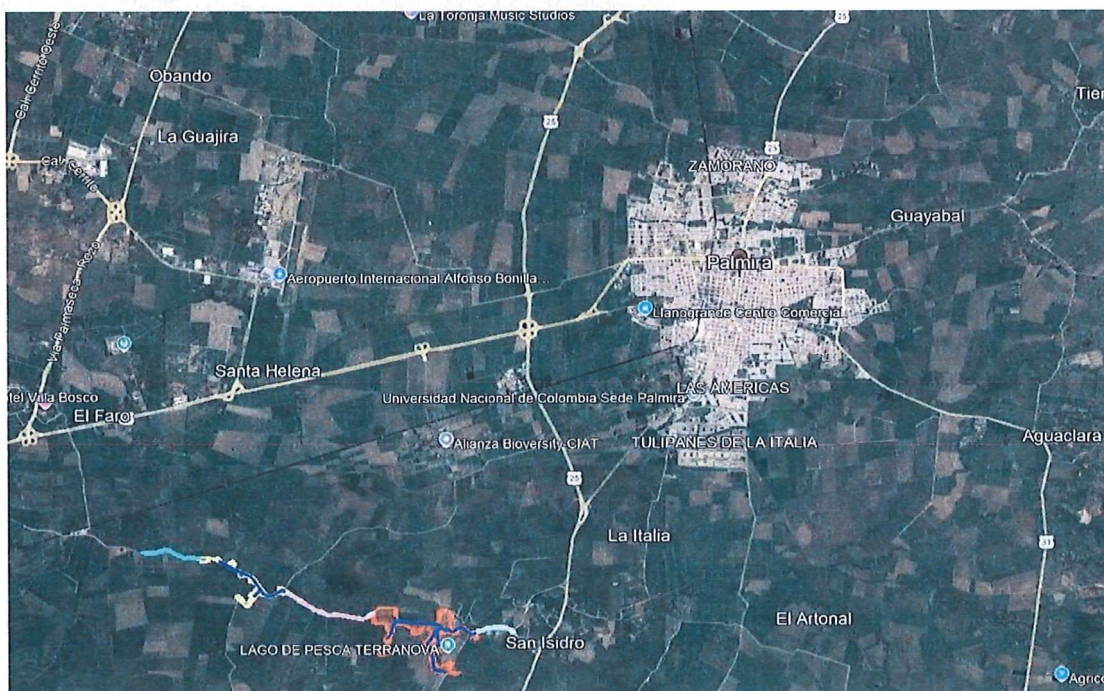


Figura 2. Localización del municipio de La Victoria y área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia a partir de CVC (2024), SIAC (2022), IGAC (2024).

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 Contrato de consultoría

A continuación, la información contractual en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Información Contractual

Entidad Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Contratista	CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025
Contrato	DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
Contrato número:	2000.13.04.004 2025
Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDRS):	18200, 18210, 18212 EXPEDIDOS POR EL ADMINISTRADOR Y VOCERO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA (CONSORCION FIA)
Valor:	\$ 1.544.217.387,78
Objeto:	"FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES SECTORES (i) CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; (ii) CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; (iii) VEREDA LA MARÍA DEL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA y (iv) SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL MIRAVALLE, TAGUALES, SIBERIA Y RIVERALTA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA".
Plazo contractual:	DOCE (12) MESES
Fecha de Inicio:	01 DICIEMBRE 2025
Fecha Terminación:	01 DICIEMBRE 2026

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Control y seguimiento de pólizas

En las Tabla 2 y Tabla 3 se relaciona el valor y la vigencia de las pólizas presentadas por el contratista, que garantizan el desarrollo del contrato.

Tabla 2. Seguimiento a Póliza Cumplimiento entidades Públicas

COMPAÑÍA	No. GARANTÍA	TOMADOR	FECHA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	M-100283629	CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025	07-12-2025
AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		INICIA	TERMINA
Cumplimiento del Contrato	\$308.843.477,56	01-12-2025	31-05-2027
Buen manejo del anticipo	\$463.265.216,33	01-12-2025	31-05-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones laborales	\$77.210.869,39	01-12-2025	01-12-2029
Calidad y Estabilidad de la Obra	\$463.265.216,33	01-12-2026	01-12-2031

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Seguimiento a Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

COMPAÑÍA	No. GARANTÍA	TOMADOR	FECHA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	M-100073313	CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025	09-12-2025
AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		INICIA	TERMINA
Responsabilidad Civil Extracontractual		01-12-2025	01-12-2026
• Amparo básico – predios, labores y operaciones	\$569.400.000		
• Patronal	\$569.400.000		
• Contratistas y subcontratistas	\$569.400.000		
• Vehículos propios y no propios	\$569.400.000		

Fuente: Elaboración propia

3.3 Representantes de las entidades involucradas en el proyecto

Los representantes de las entidades involucradas en el proyecto se presentan a continuación, en la Tabla 4:

Tabla 4. Representantes partes del Contrato

ENTIDAD CONTRATANTE O PROMOTORA	
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	MOISES CEPEDA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIEGO JOSE CALDERÓN
CONTRATISTA DE CONSULTORIA	
Contratista de Consultoría	CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025
Representante Legal	MARIA DE LOS REYES RESTREPO VILLARROEL
CONSORCIADOS CONTRATISTA DE CONSULTORIA	
RENACER GROUP S.A.S.	60,0%
ARMANDO LEÓN JIMÉNEZ	40,0%
INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
Interventoría	Martínez & Manrique Arquitectura e Ingeniería S.A.S
Representante Legal	Carlos David Martínez Vélez
Director de Interventoría	Paula Andrea Aluma

Fuente: Elaboración propia

Para el desarrollo de las actividades descritas, se dispone de un equipo de trabajo idóneo y especializado, conformado por profesionales con experiencia en estudios y diseños de sistemas de acueducto rural, gestión de recursos hídricos, topografía, sistemas de información geográfica y gestión de proyectos. El equipo de la consultoría se encuentra integrado por el Director del Proyecto, profesionales en Ingeniería Sanitaria-Hidráulica, Ingeniería Estructural, Ingeniería y Administración Ambiental, Profesional Social e Ingeniería Topográfica, así como especialistas en Recursos Hídricos, Gestión de Proyectos, Topografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG), garantizando la capacidad técnica y operativa necesaria para el cumplimiento del alcance contractual.

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR POR LA CONSULTORÍA

4.1 Alcance contractual y Plan de trabajo

La formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de cada uno de los sistemas de acueducto en las zonas rurales de los municipios de Palmira y de la Victoria anteriormente mencionados, se desarrolla cumpliendo los requisitos de presentación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, establecidos en el Decreto No. 475 de 2015 y la Resolución 0661 de 2019 y están enmarcados en el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS- Resolución 0330 de 2017. Cumplirá además con los criterios de estabilidad estructural y seguridad sísmica establecidos en la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), así como con los requisitos eléctricos definidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), todas aquellas demás especificaciones y normas técnicas aplicables a proyectos de agua y saneamiento vigentes y demás aspectos técnicos que, sin perjuicio de lo anterior, se concierten con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. En ese sentido, la elaboración de los estudios tendrá en sus PRODUCTOS y ALCANCE, los siguientes elementos principales según aplique, listados en la **Tabla 5**.

ALCANCE GENERAL: "FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES SECTORES:

- CORREGIMIENTO BOLO ALIZAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
- CORREGIMIENTO BOLO BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
- VEREDA LA MARÍA DEL CORREGIMIENTO DE TENJO, MUNICIPIO DE PALMIRA
- VEREDA LA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA
- CORREGIMIENTO TAGUALES DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA
- CORREGIMIENTO MIRAVALLES DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA
- CORREGIMIENTO RIVERALTA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA

Tabla 5. Actividades contractuales

ITEM	ALCANCE
1.00	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
1.10	PRODUCTO 1. FASE I: ACTIVIDADES PRELIMINARES, CATASTRO Y DIAGNÓSTICO

1.1.1	Actividades preliminares, de contextualización, catastro del sistema de acueducto y/o alcantarillado y estudio topográfico
1.1.1.1	Actividades preliminares y de contextualización
1.1.1.2	Reunión con Administración municipal para revisión y/o concertación del alcance de proyecto. Reunión informativa del inicio de los estudios y diseños con la comunidad beneficiada.
1.1.1.3	Reconocimiento físico de campo.
1.1.1.4	Recolección de información existente: Memorias, planos, esquemas, archivos
1.1.1.5	Levantamiento de campo. Levantamiento del Catastro del sistema de acueducto y/o alcantarillado. Elaboración de fichas técnicas. Estudio Topográficos general.
1.1.2	Diagnóstico del estado actual del sistema de acueducto y/o alcantarillado
1.1.2.1	Análisis y evaluación de diagnósticos, estudios y proyectos existentes
1.1.2.2	Proyección de Población, análisis del consumo de agua, pérdidas y dotación bruta, proyección de la Demanda, análisis de la capacidad limitante del sistema
1.1.2.3	Medición de caudales y Análisis de Calidad del agua, aforos y caracterización de aguas
1.1.2.4	Estudio Hidrológico
1.1.2.5	Diagnostico Físico, técnico y operativo del Sistema, diligenciamiento del formato: Anexo V Diagnostico Prestadores de servicios públicos.
1.1.2.6	Socialización del Informe de Diagnóstico
1.2	PRODUCTO 2. FASE II: PLANTEAMIENTO, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE I)
1.2.1	Planteamiento y Selección de Alternativas
1.2.1.1	Formulación de Alternativas
1.2.1.2	Diseño preliminar de las alternativas
1.2.1.3	Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada
1.2.1.4	Cuantificación de Costos de las alternativas
1.2.1.5	Evaluación de las alternativas (económica, técnica, administrativa operativa etc.)
1.2.1.6	Informe de Formulación y Evaluación de las Alternativas
1.2.2	Gestión de Trámites y Permisos (parte I)
1.2.2.1	Informe de identificación y requisitos para adelantar los permisos ambientales, para Uso de Zona de Carreteras o Permisos de cruce sobre la vía, de predios necesarios para la ejecución de estructuras puntuales y servidumbres necesarias para la ejecución de obras lineales.
1.3	PRODUCTO 3. FASE III: DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
1.3.1	Diseños definitivos de la alternativa seleccionada:
1.3.1.1	Topografía de las Zonas de Interés Para el Diseño

1.3.1.2	Sistema de información geográfico (SIG)
1.3.1.3	Diseños Detallados Hidráulicos de los Componentes
1.3.1.4	Estudios de Suelos, Geológicos y Geotécnicos
1.3.1.5	Diseños Detallados Estructurales de los Componentes
1.3.1.6	Diseños Detallados Eléctricos de los Componentes
1.3.1.7	Estudios Ambientales de las Obras Proyectadas en el Sistema
1.3.1.8	Informe de Diseños Definitivos
1.3.2	Presupuestos - APU – Especificaciones:
1.4	PRODUCTO 4. FASE IV GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE II)
	Informe de Gestión con los documentos (ambientales, prediales y viales, entre otros)
1.5	PRODUCTO 5. FASE V: DOCUMENTOS, PRESENTACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO
1.5.1	Sustentación Técnica del Proyecto.
1.5.2	Entrega original y en archivos digitales.
1.5.3	Sustentación y socialización del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

4.2 Avance del contrato de consultoría.

4.2.1 Actividades desarrolladas

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 se dio continuidad al desarrollo de las actividades correspondientes a la Fase II del proyecto, orientadas a la formulación, análisis y selección de alternativas para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto rural en el corregimiento de Bolo Alizal y la vereda Bolo Barrio Nuevo, en el municipio de Palmira, así como en el sistema de acueducto interveredal de Miravalles, Taguales, La Siberia y Riveralta, en el municipio de La Victoria.

En el marco de la actividad de formulación de alternativas, se avanzó en la identificación y definición de posibles soluciones técnicas para atender las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable en las zonas objeto del proyecto, considerando las condiciones de las fuentes de abastecimiento, la infraestructura existente, la demanda proyectada y las restricciones técnicas, ambientales y prediales identificadas.

De manera complementaria, se avanza en la conceptualización de las alternativas planteadas, definiendo los componentes requeridos para cada opción de intervención, incluyendo obras de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento y distribución, según las condiciones particulares de cada sistema. Como parte del proceso de selección de alternativas, se elaboró la matriz de valoración ponderada, estableciendo los criterios

técnicos, económicos, ambientales, sociales, operativos e institucionales necesarios para la evaluación comparativa de las diferentes opciones formuladas. Este producto constituye uno de los principales avances alcanzados durante el periodo reportado.

Asimismo, se avanzó en la evaluación de las alternativas desde los componentes técnico, económico, administrativo, operativo y ambiental, con el propósito de identificar la opción más viable para cada uno de los sistemas objeto de estudio. Los resultados obtenidos a la fecha se encuentran siendo consolidados para su incorporación en el informe de formulación y evaluación de alternativas, actualmente en elaboración.

En relación con la gestión de trámites y permisos (Parte I), se adelantó la recopilación y análisis de información institucional, ambiental y predial requerida para la identificación de los permisos, autorizaciones y gestiones necesarias para la ejecución futura de las obras. En este sentido, se encuentra en desarrollo el informe de identificación y requisitos para adelantar permisos ambientales, permisos de ocupación o cruce de vías, así como la identificación preliminar de predios requeridos para estructuras puntuales y posibles áreas sujetas a servidumbre para la ejecución de obras lineales.

En el marco del Plan de Gestión Social, se desarrollaron actividades de socialización de los resultados obtenidos en la Fase I del proyecto, correspondiente a las actividades preliminares, contextualización, catastro y diagnóstico de los sistemas de acueducto objeto de intervención. Estas jornadas fueron programadas y coordinadas con las administraciones municipales, la interventoría, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y las comunidades beneficiarias de los municipios de Palmira y La Victoria.

Durante las reuniones de socialización se presentaron los principales resultados obtenidos en las actividades preliminares y de contextualización del proyecto, incluyendo el reconocimiento físico de campo, la recopilación y análisis de la información existente, los levantamientos topográficos y catastrales realizados sobre la infraestructura de los sistemas de acueducto, así como la elaboración de las fichas técnicas de los diferentes componentes identificados.

De igual manera, se expusieron los resultados del diagnóstico integral desarrollado para cada sistema, incluyendo la evaluación de estudios y proyectos existentes, el análisis de población y demanda, la revisión de consumos y pérdidas de agua, la identificación de capacidades limitantes de la infraestructura, los resultados de mediciones de caudal y calidad del agua, los estudios hidrológicos efectuados y el diagnóstico físico, técnico y operativo de los sistemas de abastecimiento. Las jornadas permitieron presentar a las comunidades y entidades participantes el estado actual de los sistemas de acueducto, validar información obtenida durante el proceso de diagnóstico, resolver inquietudes de los actores involucrados y generar espacios de retroalimentación que contribuyen al fortalecimiento de la formulación de alternativas actualmente en desarrollo dentro de la Fase II del proyecto.

Con la realización de estas actividades se dio cumplimiento al proceso de divulgación y participación comunitaria asociado a la culminación del Producto 1, garantizando la apropiación social de los resultados obtenidos y fortaleciendo la articulación institucional necesaria para el desarrollo de las etapas posteriores de formulación y evaluación de alternativas.

4.2.1.1 Relación de actividades desarrolladas durante el periodo evaluado

Tabla 6. Actividades desarrolladas durante el mes de mayo 2026

1.2	PRODUCTO 2. FASE II: PLANTEAMIENTO, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS, GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE I)
1.2.1	Planteamiento y Selección de Alternativas
1.2.1.1	Formulación de Alternativas
1.2.1.2	Diseño preliminar de las alternativas
1.2.1.3	Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada
1.2.1.4	Cuantificación de Costos de las alternativas
1.2.1.5	Evaluación de las alternativas (económica, técnica, administrativa operativa etc.)
1.2.1.6	Informe de Formulación y Evaluación de las Alternativas
1.2.2	Gestión de Trámites y Permisos (parte I)
1.2.2.1	Informe de identificación y requisitos para adelantar los permisos ambientales, para Uso de Zona de Carreteras o Permisos de cruce sobre la vía, de predios necesarios para la ejecución de estructuras puntuales y servidumbres necesarias para la ejecución de obras lineales.

Fuente: Elaboración propia

4.2.1.2 Descripción de las actividades desarrolladas y soporte de evidencias

A continuación, se presenta una breve descripción de las actividades listadas como desarrolladas durante el periodo del presente informe, con sus respectivas evidencias anexas.

Se realizó la entrega del PRODUCTO 1 a la interventoría, como se muestra en la **Figura 3**.




Figura 3. Radicado entrega Producto 1

Componente social – Plan de Gestión Social

A continuación, en la **Figura 4** se muestran las piezas graficas de convocatoria a las jornadas de socialización de avance en las comunidades objeto del proyecto.



Figura 4. Piezas graficas convocatoria jornadas de socialización

A continuación, se muestra el registro fotográfico de las jornadas de socialización realizadas en las comunidades de Palmira y La Victoria.

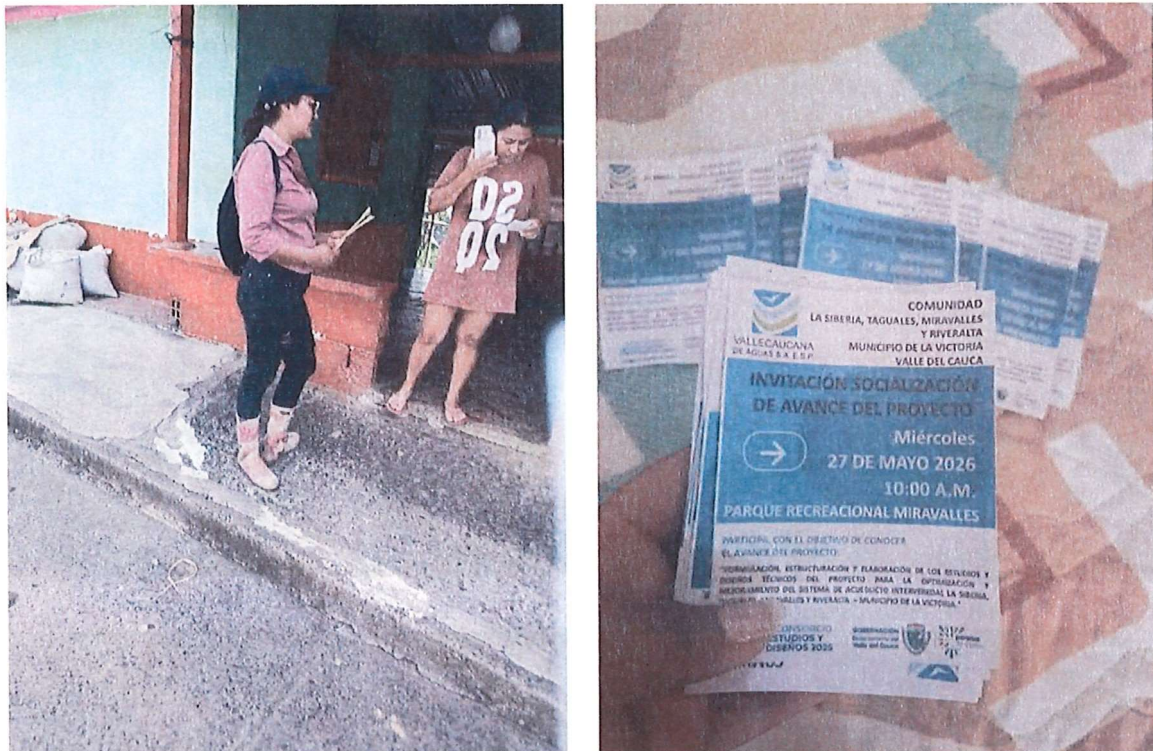


Figura 5. Difusión piezas graficas convocatoria jornadas de socialización



Figura 6. Jornada de socialización Barrio Nuevo



Figura 7. Jornada de socialización Bolo Alizal



Figura 8. Jornada de socialización Miravalles, Taguales, Siberia y Rivalta – La Victoria.

A continuación se presentan los listados de asistencia de las jornadas de socialización:

LISTADO DE ASISTENCIA		LISTADO DE ASISTENCIA No EYD-44-000-0000-14			
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
FECHA:	22.05.26	HORA INICIAL:	10:00 AM	HORA FINAL:	11:40 AM
LUGAR:		CASA COMUNAL			
OBJETIVO:					
REUNION DE SOCIALIZACION PROYECTO 1 PROYECTO OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO BOLA BARRIO UREDO Y BOLA ALIZAL.					
ASISTENTES					
No.	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Vicente Hugo Jimenez U	Bola Alisal	313615820	vicente.jimenez.103@ccc	[Firma]
2	Andrés Alvarado	Bola Alisal	312872246		[Firma]
3	José Miguel Velasco Leal	JAC San Pablo	302831804	mxvelasco	[Firma]
4	Alberto Benito		3103877072		[Firma]
5	Cristian René Valencia	JAC Bola San Pablo	327815440	valencia.cristian@ccc	[Firma]
6	Quilanda Martínez	Bola Alisal	312763565		[Firma]
7	Miryana Ramírez	Bola Alisal	3142050432	HI	[Firma]
8	Brenda Villanueva Díaz	Bola Alisal	3135993488		[Firma]
9	SALVADOR LOZANO	Bola Alisal	3152381722		[Firma]
10	Kevin Londono	Bola Alisal	3152517972		[Firma]
11	Ayde Lozano Elguera	Ver. San Pablo	322756602	ayde.lozano.20@gmail.com	[Firma]
12	Jaceline Páramo V	JAC Bola Alisal	3100629613	lorano2012@hotmail.com	[Firma]
13	Martha Serrano elija	Bola Alisal	3167351111		[Firma]
14	Enrique Paredes	Bola Alisal	3114559583		[Firma]
15	Lameba Inocencio Quintana	JAC San Pablo	321239714	lameba.inocencioquintana@gmail.com	[Firma]
16	Yolanda Vaneza Pineda	Ver. San Pablo	3215254532	marcoflores.pineda@gmail.com	[Firma]

LISTADO DE ASISTENCIA		LISTADO DE ASISTENCIA No EYD-44-000-0000-14			
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
FECHA:	27.05.26	HORA INICIAL:	10:00 AM	HORA FINAL:	11:40 AM
LUGAR:		CASA COMUNAL			
OBJETIVO:					
REUNION DE SOCIALIZACION PROYECTO 1 PROYECTO OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO BOLA ALIZAL.					
ASISTENTES					
No.	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Holmes Inocencio Quintana	JAC San Pablo	319192577	inocencioquintana.holmes@gmail.com	[Firma]
2	Oliver Alvarado Quintana	JAC San Pablo	312763565	oliver.alvarado@ccc	[Firma]
3	Luis A. Naranjo	Bola Alisal	3164583045	afredelashojas@hotmail.com	[Firma]
4	María Quintero Paredes	Bola Alisal	312872246		[Firma]
5	José Darío Brito	Bola Alisal	312872246		[Firma]
6	José Hernán Caballero	Bola Alisal	314734382		[Firma]
7	CONSORCIO DAVID CHAVEZ	CONSORCIO EAD 2025	3165226611	CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025@vallecauca.gov.co	[Firma]
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Figura 9. Listado de asistencia socialización Bolo Alizal

LISTADO DE ASISTENCIA			LISTADO DE ASISTENCIA No EYD-65-mm-aaaa-1"		
			FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
FECHA: 22/05/26 DD MM AAAA	HORA INICIAL: 7:00PM	HORA FINAL: 3:00PM	LUGAR: CASA COMUNAL		
OBJETIVO: REUNION DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO 1 PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA BOLO BARRIO NUEVO					
ASISTENTES					
No	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Giselle Karina González	Habitante	3213010835	gisetgumalas@gmail.com	Giselle G.
2	Albalucia Buitrago	Presidente del agua	3118234101	albalucia81@hotmail.com	Alba
3	Suleidy Ortiz Hernandez	Habitante	3154337657		Suleidy Ortiz
4	Rita Ramos	Habitante			Rita Ramos
5	Amr Juliesha Gauria Arriola	Habitante	3043743579	gauriajuliesha@gmail.com	Amr
6	Sandra Patricia B P	Habitante	3159760052		Sandra P.B.P.
7	Patricia Ramos	Habitante			Patricia
8	Gloria A Guzman R	SAC Blnuevo	3113424548	gloriaaguiansunima@gmail.com	Gloria A Guzman
9	Ale Mufvi Mandanayro	Habitante	3206572217		Ale
10	Berny Ramos	Habitante	3113206736		Berny Ramos
11	Roberto Barrero	Habitante	3155631135		Roberto
12	Viviana Stella Hurtado Vargas	SIRUV	3164038051	vivianahurtadovargas@gmail.com	Viviana
13	Mª Nancy Escobar	Habitante	3226764457		Nancy
14	Fernando España B	SAC Blnuevo	3153171214		Fernando
15	Paula A Aluma	Intercomunicación	3126301289	paola2.mym@gmail.com	Paula
16	Alba Segura	Intercomunicación	3013225131		Alba
17. CRISTINA NAVO CHARRAS		CONSORCIO EBO 2025		CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025	

Figura 10. Listado de asistencia socialización Bolo Barrio Nuevo.

LISTADO DE ASISTENCIA			LISTADO DE ASISTENCIA No EYD-65-mm-aaaa-11"		
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
FECHA: 23/05/26 DD MM AAAA		HORA INICIAL: 10:15 AM		HORA FINAL: 11:40 AM	
LUGAR: PARQUE RECREACIONAL MIAMINES					
OBJETIVO: Socialización de avance de la "Formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del valle del cauca."					
ASISTENTES					
No	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Don Amel Moreno Astorio		3177281471	amelmoreno80@gmail.com	Amel
2	Lino y Janio Masquera		3103028347	mosquera.lino1977@gmail.com	Lino
3	José Benavides		3106949127		José
4	Rafael Orlando Medina		3175353050		Rafael
5	Cristian L. Cardona Ortiz		319943991	c.cardona.ortiz@gmail.com	Cristian
6	María G. González	Alcaldía M.	3193124551	maria460270@gmail.com	María
7	Adriana Salazar		3158365105		Adriana
8	María Brigid. Ortiz		3154997457		María
9	NERIETH ORTIZ PINO	ALCALDIA SAC PLANTANO	3215978531	planacionortiz@barranquilla.gov.co	Nerieth
10	F. Zaverio	presidencia	3197663189		F. Zaverio
11	María Isabel Soto P.	Planación	3233509219	mariaisabelsotop@gmail.com	María
12	Diego Fernando Ponce B	SAC PLANTANO	3127345503	planacionbarranquilla@gmail.com	Diego
13	Diana María Gubiera	enlace planación Rural	3133137102	dianayubiera@gmail.com	Diana
14	Carla Edwin Muñoz S.		3206856077	charleserzeh@gmail.com	Carla
15	Edelberto Mateus		314002102		Edelberto
16	ANCIRZA GARCIA LUNA	Fontanero	320771374		Ancirza







LISTADO DE ASISTENCIA			LISTADO DE ASISTENCIA No. EYD del mm aaaa II"		
			FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
FECHA:	23 5 26 DD MM AAAA	HORA INICIAL: 10:15 AM	HORA FINAL: 11:40 AM	LUGAR: PARQUE RECREACIONAL MIRAVALLAS.	
OBJETIVO: Socialización de avance de la formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del valle del cauca.					
ASISTENTES					
No.	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Felix Cano		3187815058	FelixCano@gmail.com	
2	Belle Luby Cuatrecasas		3184204107	belasanc219812@gmail.com	
3	Carli Rivas		3186288866		
4	Kelly Johana Castañero		3207835646		
5	Francis Velaz D.	Intendencia H.M. Social	3188617157	profesionalsocialpud@gmail.com	
6	Alay Soler	Consorcio E.D. 2015	3013228533		
7	Carolina Dario Camenas U	Consorcio E.D. 2015	3163597649	consorcio.estudiosydisenos2025@vallecauca.com	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Figura 11. Listado de asistencia socialización Miravalles, Taguales, La Siberia y Riveralta.

Análisis de alternativas- Estructuración de la matriz de valoración ponderada

Se avanzó en la estructuración final del documento correspondiente al PRODUCTO 2., incorporando los aspectos relacionados con la estructuración de la matriz de alternativas.

Con el propósito de identificar la alternativa más adecuada para la optimización de los sistemas de acueducto en las localidades objeto del alcance en los municipios de palmira y La Victoria, se desarrolló una Matriz Multicriterio fundamentada en el Método Analítico Jerárquico (AHP). Esta metodología permite estructurar decisiones complejas mediante la comparación pareada de criterios y alternativas, integrando de forma ponderada juicios técnicos, económicos, ambientales y sociales en un único indicador de desempeño. A continuación, se presenta la descripción del avance de la estructuración de la matriz ponderada. Las ponderaciones estarán sujetas a cambio una vez se termine de consolidar las alternativas, la socialización con la comunidad y los aspectos interinstitucionales particulares según la localidad, por ejemplo, el caso de las alternativas de suministro de agua en bloque o conexión hacia otros sistemas de acueducto como Aquaoccidente E.S.P. (para Bolo Alizal y Bolo Barrio Nuevo).

La ponderación adoptada para seis factores generales fue la siguiente: Estado del recurso hídrico (26%), Económico (26%), Técnico operativo (14%), Amenaza, vulnerabilidad y riesgo (14%), Ambiental (14%) y Social e institucional (7%). Cada factor general se desagregó a su vez en subcriterios con pesos internos, también definidos mediante AHP, los cuales determinaron el peso general ponderado de cada criterio en la calificación total.

A. Estado del recurso hídrico (peso general: 26%). Este factor agrupó dos subcriterios. El primero, oferta hídrica (peso interno: 61%, peso general: 15,86%), evaluó si la fuente puede satisfacer la totalidad de la demanda objetivo proyectada, asignando puntaje proporcional a la cobertura alcanzada según la relación entre la oferta disponible Q95 y la demanda objetivo, con un factor de corrección según si la fuente cumple función de abastecimiento principal o de contingencia. El segundo subcriterio, calidad del agua (peso interno: 39%, peso general: 10,14%), analizó la calidad del recurso hídrico a través del Índice de Calidad del Agua (ICA).

B. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo (peso general: 14%). Este factor se desagregó en dos subcriterios. El primero (peso interno: 71%, peso general: 9,94%) estimó el nivel de riesgo global de cada alternativa frente a cuatro tipos de eventos amenazantes: sismos, movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Para ello se evaluó, por componente de infraestructura, la probabilidad histórica de ocurrencia de cada evento, el nivel de impacto sobre el sistema y el grado de vulnerabilidad de los componentes expuestos. La combinación de amenaza y vulnerabilidad determinó el nivel de riesgo (Alto, Medio o Bajo), al que correspondió un puntaje bajo el criterio de beneficio máximo con el menor riesgo. La probabilidad de ocurrencia de los eventos fue caracterizada a partir de registros históricos de emergencias y reportes institucionales, clasificándose en cinco categorías: muy probable, probable, ocasional, remota e improbable. El segundo subcriterio (peso interno: 29%, peso general: 4,06%) evaluó específicamente el riesgo por erosión fluvial en el punto de captación, diferenciando entre alternativas con captación directa en el cauce, captaciones derivadas y fuentes subterráneas (este último caso Bolo Alizal y Bolo Barrio Nuevo).

C. Técnico operativo (peso general: 14%). Este factor integró cuatro subcriterios. La autonomía operacional (peso interno: 28%, peso general: 3,92%) valoró la capacidad de cada alternativa para operar durante episodios de lluvia o estiaje, la complejidad del mantenimiento requerido, la necesidad de reparación o reemplazo de componentes antes del fin de la vida útil, y el requerimiento de personal especializado. El análisis de distancia (peso interno: 15%, peso general: 2,10%) clasificó la separación entre el punto de captación hasta las comunidades. La flexibilidad para operación y mantenimiento (peso interno: 30%, peso general: 4,20%) evaluó la accesibilidad en todo clima, la cercanía a vías pavimentadas, la disponibilidad de caminos de acceso y la necesidad de respaldo energético. La compatibilidad con la capacidad del sistema (peso interno: 27%, peso general: 3,78%) analizó si la cantidad y calidad del agua captada son adecuadas para los procesos de tratamiento existentes y si se requieren nuevas infraestructuras o procesos adicionales.

D. Económico (peso general: 26%). Este factor comprendió tres subcriterios. El análisis predial (peso interno: 13%, peso general: 3,38%) cuantificó la afectación en términos de predios de adquisición requeridos y servidumbres necesarias para la instalación de las obras, ponderando ambas variables según su contribución relativa al costo y conflictividad del proceso. El análisis de costos de operación y mantenimiento (peso interno: 56%, peso general: 14,56%) estimó los costos anuales recurrentes de cada alternativa, asignando la mayor puntuación a la alternativa más económica y calculando puntuaciones proporcionales para las demás. El análisis de costos de inversión inicial (peso interno: 31%, peso general: 8,06%) siguió la misma lógica de costo mínimo, con base en estimaciones de inversión construidas para cada alternativa y sus etapas o escenarios de implementación.

E. Ambiental (peso general: 14%). La evaluación ambiental se realizó mediante el método Conesa simplificado, aplicado de forma independiente a cada alternativa en dos fases: construcción y operación y mantenimiento. Para cada fase se identificaron

las categorías de impacto específico sobre componentes del medio abiótico (atmosférico, geotecnia, hidrológico, hidrogeológico, suelo), biótico (cobertura vegetal, fauna, flora) y socioeconómico (cultural, demográfico, económico, espacial, político-organizativo). Cada impacto fue calificado según diez atributos: intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad, obteniendo un índice de importancia mediante la fórmula $I = (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)$. La calificación ambiental de cada alternativa se determinó como el promedio de las importancias de los impactos negativos en cada fase, ponderado por el número de categorías evaluadas. La puntuación final se expresó en escala de 0 a 100, donde el mayor puntaje corresponde a la alternativa con menor impacto ambiental relativo. F. Social e institucional (peso general: 7%). La evaluación social consideró diez criterios con pesos diferenciados: aceptación social, accesibilidad y equidad territorial, viabilidad predial y afectación a propietarios, fortalecimiento institucional y comunitario, generación de empleo y beneficios colaterales, riesgo de conflicto o resistencia social, equidad en el acceso a servicios, viabilidad en términos de compensación social, estabilidad política y social de la zona, y conservación del entorno cultural. Cada criterio fue calificado en una escala de 1 a 5 y ponderado según su peso asignado, obteniendo un resultado final expresado en porcentaje. La **Figura 12** muestra un esquema de la matriz de valoración ponderada en proceso de elaboración.

Matriz de comparación de criterios Método Análisis Jerárquico (AHP)															
PUNTUACIONES CATEGORÍAS GENERALES															
	A	B	C	D	E	F	Matriz normalizada						Ponderación	Adoptado	Final
	Estado Recurso Hídrico	Técnico	Económico	Social	Ambiental	Amenaza, vuln, riesgo									
1	Estado Recurso Hídrico	1	2/3	1	3/1/9	1/5/7	2	0.2540	0.3137	0.2500	0.1995	0.2210	0.2770	0.25	25%
2	Técnico	3/8	1	2/3	3/2/7	1/2	1	0.1008	0.1197	0.1820	0.2117	0.0645	0.1385	0.14	14%
3	Económico	1	1/3/7	1	4/2/3	2/1/7	2/1/7	0.2540	0.1711	0.2600	0.2977	0.2779	0.2978	0.25	25%
4	Social e Institucional	1/3	1/3	2/9	1	4/5	4/9	0.0849	0.0363	0.0560	0.0541	0.1021	0.0509	0.07	7%
5	Ambiental	3/5	2	1/2	1/1/4	1	5/8	0.1544	0.2395	0.1209	0.0812	0.1292	0.0873	0.14	14%
6	Amenaza, vuln, riesgo	1/2	1	1/2	2/2/7	1/3/5	1	0.1320	0.1197	0.1209	0.1458	0.2051	0.1385	0.14	14%
	Total	3.79	8.35	3.65	15.59	7.74	7.22								

(a)

				MATRIZ MULTICRITERIO			
FACTOR	CRITERIO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CRITERIO	METODOLOGÍA	Peso ponderado por aspecto (%)		Peso general ponderado por criterio
					General categoría	Subcategoría	
ESTADO RECURSO HÍDRICO	Análisis de oferta hídrica	OH	Oferta hídrica	Se evaluó si la fuente era principal (puede abarcar toda la demanda) o si es de contingencia	26.00	61.00	15.86
	Análisis de calidad del recurso hídrico	CAL	ICA	Se evaluó a través del ICA y la vulnerabilidad por turbiedades		39.00	10.14
Puntuación aspecto							
AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO	Análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	AVR	amenazantes e impacto del evento sobre componentes del sistema, para la estimación del nivel de amenaza. Nivel de vulnerabilidad de los componentes expuestos y nivel de amenaza, para estimar el nivel de riesgo.	Beneficio máximo / Menor riesgo	14.00	71.00	3.94
	Riesgo por erosión fluvial	AVR_Erosión	Riesgo por erosión fluvial en la captación de agua	Beneficio máximo / Menor riesgo		29.00	4.06
	Puntuación aspecto						

(b)

Figura 12. Matriz de valoración ponderada

4.2.2 Actividades próximas para iniciar

Para el mes de junio se tiene programada la socialización de las alternativas y su incorporación a la matriz ponderada, donde el criterio social será un aspecto de gran importancia para el ajuste y definición de las mismas, según las necesidades de las comunidades.

Paralelamente, se ejecutará el **diseño preliminar de las alternativas**, permitiendo visualizar su viabilidad técnica, operativa y económica, y estableciendo los criterios de comparación necesarios para su evaluación en el contexto particular de cada corregimiento.

4.2.3 Porcentaje (%) de avance

Al corte del 31 de mayo de 2026, el avance acumulado de la consultoría asciende al **45% del total del proyecto**, correspondiente a la culminación de las actividades asociadas al Producto 1 – Fase I: Actividades preliminares, catastro y diagnóstico, ejecutadas en los municipios de Palmira y La Victoria y al avance en producto 2 – Fase II Planteamiento, selección de alternativas, gestión de trámites y permisos (Parte I).

El avance del periodo se encuentra debidamente soportado mediante actas de reunión, registros fotográficos, oficios de gestión institucional, fichas de campo, documentos técnicos y demás evidencias documentales, las cuales dan cuenta de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2026 en los corregimientos Bolo Alizal, Bolo Barrio Nuevo y Tenjo del municipio de Palmira, así como en el sistema interveredal del municipio de La Victoria.

Nombre de tarea	%proyectado	% completado	%retraso	Observación
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS GRUPO 1	45%			
BOLO ALIZAL	45%	45%	0%	En elaboración de matriz de alternativas. Avance PRODUCTO 2.
BOLO BARRIO NUEVO	45%	45%	0%	En elaboración de matriz de alternativas. Avance PRODUCTO 2.
LA MARIA – CORREGIMIENTO DE TENJO	45%	22%	23%	Retraso asociado a limitaciones para el desarrollo de actividades de campo por condiciones de orden público y falta de acompañamiento institucional.
INTERVEREDAL – LA VICTORIA	45%	45%	0%	En elaboración de matriz de alternativas. Avance PRODUCTO 2.

5. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2026 se registró un avance técnico significativo en el desarrollo del contrato de consultoría, alcanzando un porcentaje de ejecución acumulado del 45% del total del proyecto. Este avance refleja la culminación del Producto 1 – Fase I, correspondiente a las actividades preliminares, catastro y diagnóstico de los sistemas de acueducto objeto de intervención en los municipios de Palmira y La Victoria, así como el progreso sustancial en el Producto 2 – Fase II, orientado al planteamiento y selección de alternativas, y a la gestión de trámites y permisos (Parte I).

En el marco de la Fase II, el principal logro del periodo fue la estructuración de la Matriz Multicriterio de Valoración Ponderada, desarrollada mediante el Método Analítico Jerárquico (AHP) e integrada por seis factores de evaluación: estado del recurso hídrico, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, técnico operativo, económico, ambiental y social e institucional. Esta herramienta constituye el instrumento técnico central para la evaluación comparativa y selección de la alternativa más viable en cada uno de los sistemas de acueducto objeto del proyecto. Cabe señalar que las ponderaciones adoptadas estarán sujetas a ajuste una vez se consolide la totalidad de las alternativas formuladas, los resultados de la socialización con las comunidades y los aspectos interinstitucionales particulares de cada localidad.

De manera paralela, se avanzó en la formulación y conceptualización de las alternativas técnicas para los corregimientos de Bolo Alizal, Bolo Barrio Nuevo y el sistema interveredal de Miravalles, Taguales, La Siberia y Riveralta, definiendo los componentes de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento y distribución requeridos en cada caso. Igualmente, se inició la evaluación técnica, económica, operativa y ambiental de las alternativas planteadas, cuyos resultados se encuentran en proceso de consolidación para su incorporación al informe de formulación y evaluación de alternativas actualmente en elaboración.

En el componente de gestión social, se llevaron a cabo las jornadas de socialización del Producto 1 con las comunidades beneficiarias de los corregimientos de Bolo Alizal, Bolo Barrio Nuevo y el sistema interveredal del municipio de La Victoria, con la participación de las administraciones municipales, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y la interventoría. Estas jornadas permitieron presentar los resultados del diagnóstico, validar información de campo, resolver inquietudes de los actores involucrados y generar espacios de retroalimentación que fortalecen el proceso de formulación de alternativas en curso.

En relación con la gestión de trámites y permisos, se adelantó la recopilación y análisis de información institucional, ambiental y predial necesaria para identificar los requerimientos de permisos, autorizaciones y gestiones que deberán tramitarse para la ejecución futura de las obras, encontrándose en elaboración el informe correspondiente. Así mismo, se continúan las acciones de articulación institucional orientadas a viabilizar la ejecución de actividades en la vereda La María del corregimiento de Tenjo, frente en el cual persisten limitaciones para el desarrollo de actividades de campo, asociadas a condiciones de orden público y a la necesidad de acompañamiento institucional, lo cual ha incidido en el ritmo de ejecución de este componente específico del proyecto.

En términos generales, el comportamiento del proyecto durante el mes de mayo evidencia una evolución técnica consistente, caracterizada por el cumplimiento de los hitos programados para el periodo, el fortalecimiento de la participación comunitaria e institucional y la consolidación de los insumos técnicos necesarios para avanzar hacia la definición de la alternativa seleccionada en cada sistema. Para el mes de junio se prevé continuar con la socialización de las alternativas, el ajuste de la matriz de valoración ponderada con base en los resultados de dicha socialización y el inicio del diseño preliminar de las alternativas, lo que permitirá establecer las bases técnicas y operativas para el desarrollo de la Fase III del proyecto.



CRISTIAN DAVID CARDENAS URBANO

Coordinador técnico consorcio estudios y diseños 2025

Abril 30 de 2026

OF-EYD-30-04-2026-1

Ingeniera

PAULA ANDREA ALUMA

DIRECTORA INTERVENTORÍA

MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

Asunto: Entrega del Plan de Gestión Social e informes de gestión social correspondientes al periodo diciembre de 2025 – abril de 2026.

Cordial saludo.

En el marco de la ejecución del proyecto “Formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del valle del cauca – Grupo 1”, de manera atenta nos permitimos remitir a la Interventoría los documentos correspondientes al componente de gestión social.

Los documentos que se entregan son los siguientes:

No.	Documento	Anexos / soportes
1	Plan de Gestión Social — PGS	Formatos anexos del PGS: PQRS, registro de visita de campo, taller de diagnóstico participativo y base de datos de actores sociales.
2	Informe de Gestión Social diciembre 2025 – abril 2026, municipio de Palmira	Correos, oficios, actas de socialización, actas de conformación de veeduría ciudadana, registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes correspondientes a Palmira, específicamente Bolo Alizal, Barrio Nuevo y vereda La María – corregimiento de Tenjo.
3	Informe de Gestión Social diciembre 2025 – abril	Correos, oficios, actas de socialización, acta de conformación de veeduría ciudadana, registros fotográficos, listados de

No.	Documento	Anexos / soportes
	2026, municipio de La Victoria	asistencia y demás soportes correspondientes a La Victoria, específicamente La Siberia, Taguales, Miravalles y Riveralta.

La entrega de estos documentos tiene como finalidad dejar trazabilidad del cumplimiento de las actividades asociadas al Plan de Gestión Social, así como de las gestiones de divulgación, participación comunitaria, articulación institucional, relacionamiento con comunidades durante actividades de campo y seguimiento a inquietudes o requerimientos presentados en las zonas rurales objeto del proyecto.

Quedamos atentos a las observaciones, recomendaciones o requerimientos adicionales que se consideren pertinentes.

Atentamente,


CRISTIAN DAVID CÁRDENAS URBANO

Coordinador Técnico

Consorcio Estudios y Diseños 2025



Director Interventoria Mym <director2.mym@gmail.com>

Incumplimiento plazo de entrega informe mensual Abril y Seguridad Social

Construtech Edificar S.A.S. <construtech.edificar@gmail.com>

21 de mayo de 2026 a las 16:17

Para: Director Interventoria Mym <director2.mym@gmail.com>

Cc: Consorcio Estudios y disenos <consorcio.estudiosydisenos2025@gmail.com>, "jfontalvo@martinezymanrique.com.co" <jfontalvo@martinezymanrique.com.co>

Buen dia, adjunto seguridad social de AMPARO GUTIERREZ

[El texto citado está oculto]

--

ANALISTA CONTABLE
CONSTRUTECH EDIFICAR SAS
Tel. 3188117971

6 adjuntos **NOVIEMBRE 2025 AMPARO.pdf**
52K **ABRIL 2026 AMPARO.pdf**
52K **MARZO 2026 AMPARO.pdf**
52K **ENERO 2026 AMPARO.pdf**
52K **FEBRERO 2026 AMPARO.pdf**
52K **DICIEMBRE 2025 AMPARO.pdf**
52K



Director Interventoria Mym <director2.mym@gmail.com>

Incumplimiento plazo de entrega informe mensual Abril y Seguridad Social

Construtech Edificar S.A.S. <construtech.edificar@gmail.com>
Para: Director Interventoria Mym <director2.mym@gmail.com>

7 de mayo de 2026 a las 21:47

Buen dia.

Adjunto planillas de seguridad social

Rossana Rodriguez
Contabilidad

[El texto citado está oculto]

--

ANALISTA CONTABLE
CONSTRUTECH EDIFICAR SAS
Tel. 3188117971

9 adjuntos

-  **PLANILLA ABRIL 2026 CARDENAS CRISTIAN.pdf**
172K
-  **PLANILLA MARZO 2026 NATALIA PAZ MINA.pdf**
172K
-  **PLANILLA ABRIL 2026 FELIPE GOMEZ TORRES.pdf**
77K
-  **PLANILLA ABIRL 2026 SUAREZ TREJOS LIZETH DAHIANA.pdf**
400K
-  **PLANILLA MARZO 2026 OCHOA HERNANDEZ OMAR DE JESU.pdf**
529K
-  **PLANILLA MARZO 2026 JAIRO PEREIRA.pdf**
52K
-  **PLANILLA ABRIL ANGIE VALENTINA SANCHEZ.pdf**
196K
-  **PLANILLA ABRIL 2026 PEÑARANDA ANGULO BREINER.pdf**
905K
-  **PLANILLA ABRIL 2026 GIRON IZQUIERDO JUAN SEBASTIAN.pdf**
399K

Abril 30 de 2026

OF-EYD-30-04-2026-1

Ingeniera

PAULA ANDREA ALUMA

DIRECTORA INTERVENTORÍA

MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

Asunto: Entrega del Plan de Gestión Social e informes de gestión social correspondientes al periodo diciembre de 2025 – abril de 2026.

Cordial saludo.

En el marco de la ejecución del proyecto “Formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del valle del cauca – Grupo 1”, de manera atenta nos permitimos remitir a la Interventoría los documentos correspondientes al componente de gestión social.

Los documentos que se entregan son los siguientes:

No.	Documento	Anexos / soportes
1	Plan de Gestión Social — PGS	Formatos anexos del PGS: PQRS, registro de visita de campo, taller de diagnóstico participativo y base de datos de actores sociales.
2	Informe de Gestión Social diciembre 2025 – abril 2026, municipio de Palmira	Correos, oficios, actas de socialización, actas de conformación de veeduría ciudadana, registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes correspondientes a Palmira, específicamente Bolo Alizal, Barrio Nuevo y vereda La María – corregimiento de Tenjo.
3	Informe de Gestión Social diciembre 2025 – abril	Correos, oficios, actas de socialización, acta de conformación de veeduría ciudadana, registros fotográficos, listados de

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025

Calle 4N # 1n-10 Oficina 1003, Centenario. Santiago de Cali (Valle del Cauca)

No.	Documento	Anexos / soportes
	2026, municipio de La Victoria	asistencia y demás soportes correspondientes a La Victoria, específicamente La Siberia, Taguales, Miravalles y Riveralta.

La entrega de estos documentos tiene como finalidad dejar trazabilidad del cumplimiento de las actividades asociadas al Plan de Gestión Social, así como de las gestiones de divulgación, participación comunitaria, articulación institucional, relacionamiento con comunidades durante actividades de campo y seguimiento a inquietudes o requerimientos presentados en las zonas rurales objeto del proyecto.

Quedamos atentos a las observaciones, recomendaciones o requerimientos adicionales que se consideren pertinentes.

Atentamente,



CRISTIAN DAVID CÁRDENAS URBANO
Coordinador Técnico
Consorcio Estudios y Diseños 2025



Director Interventoria Mym <director2.mym@gmail.com>

Socialización Avance proyecto Acueducto Interveredal Siberia, Miravalles, Taguales y Riveralta y

Consortio Estudios y disenos <consorcio.estudiosydisenos2025@gmail.com>

19 de mayo de 2026 a las 14:51

Para: contactenos@lavictoria-valle.gov.co, alcaldia@lavictoria-valle.gov.co, planeacion@lavictoria-valle.gov.co
Cc: cae@eva.gov.co, construtech.edificar@gmail.com, Director Interventoria Mym <director2.mym@gmail.com>, djc@eva.gov.co

Secretaria de Planeación e Infraestructura

NERIETH ORTIZ**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA****ALCALDÍA MUNICIPAL****MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE)**

Ingeniera

PAULA ANDREA ALUMA

DIRECTORA INTERVENTORÍA

MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

Doctor

MOISÉS CEPEDA RESTREPO

GERENTE

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

Saludo cordial.

En cumplimiento del proyecto *"Formulación, estructuración y elaboración de los estudios y diseños técnicos para la optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto en zonas rurales del departamento del Valle del Cauca"*, desarrollado por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., a través de la consultoría especializada CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS 2025 y cuyo alcance incluye el sistema de acueducto interveredal Miravalles, Taguales, Siberia y Riveralta en el municipio de La Victoria, de manera atenta nos permitimos informar la programación de socialización de avance que se llevará a cabo conforme al detalle descrito a continuación y mediante oficio adjunto OF-EYD-19-05-2026-2 (se anexa pieza gráfica):

Fecha: Miércoles, 27 de mayo de 2026**Hora:** 10:00 a. m.**Lugar:** Polideportivo Corregimiento de Miravalles

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier coordinación adicional.

Atentamente,

CRISTIAN DAVID CARDENAS URBANO

Coordinador Técnico

Consortio Estudios y Diseños 2025

2 adjuntos



VF OF-EYD-19-05-2026-2 OFICIO SOCIALIZACION AVANCES LA VICTORIA.pdf
189K



VF PIEZA INVITACION_LA VICTORIA.pdf
185K



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 03:29:31 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1080266840
Período Cotización: febrero de 2026 Período Servicio: febrero de 2026

PAGADO 06/03/2026

OS DEL APORTANTE

Social	AMPARO GUTIERREZ RODRIGUEZ		
nento	CC31881201	Dirección	CL 16 #61 - 06 APTO 402 BLOQUE 55
le Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0000000
ersona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
d	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
sentante Legal		Identificación	
Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
ión	Apellidos y Nombres	Tipo Colizante	Subtipo Colizante	RET P	RET E	TAE	TAP	VSP	COR	VST	IGE	VAC	AVP	VCT	INAP	Dias AFP	Dias EPS	Dias Cof	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SERA	Aporte ICAP	ESAP	Aporta Ministerio	Total
	AMPARO GUTIERREZ RODRIGUEZ	03	02					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 230.

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 500	\$ 230.500





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 03:28:43 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078864372
Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 16/01/2026

OS DEL APORTANTE

i Social	AMPARO GUTIERREZ RODRIGUEZ
nento	CC31881201
le Empresa	INDEPENDIENTE
ersona	NATURAL
d	CALI
sentante Legal	
Afiliados	1

FALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total						
	Apellidos y Nombres	Tipo Colizante	Subtipo Colizante	RET	RET P	TAE	TAP	VSP	CON	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	INP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
ión	AMPARO GUTIERREZ RODRIGUEZ	03	02												0	0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPF037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.840.000	\$ 230.000	0.000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000

TOTALES

C	Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
	\$ 0	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 1.500	\$ 231.500





PAGADO 15/05/2026

Social	AMPARO GUTIERREZ RODRIGUEZ
--------	----------------------------

VALLE DEL APORTANTE**TOTALES**Página 1 de 1

