


INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME						
No. del Informe	1	Periodo del Informe			Fecha de Elaboración del Informe	
		Desde	05-09-2025	Hasta	30-09-2025	14-10-2025
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
No. del Contrato de Interventoría	246-2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		20-08-2025		05-09-2025	31-12-2025	31-12-2025
Contratista	Nombre		Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CIVALL INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S		DIRECCIÓN Diag. 59 No. 24 - 20 Barrio San Luis – Bogotá, Tel. (1) 7587901.	901787290-5	3112118531	interventoria.civall@gmail.com
	Representante legal		MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZON			
Información del Contrato de Interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	0,00	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice/View/Index?prevCbtId=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1-NTC-8145625	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice/View/Index?prevCbtId=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1-NTC-8145625	\$ 2.222.740.267,00	\$ 2.222.740.267,00
Objeto del contrato de Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DESDE EL PUNTO CAPTACIÓN HASTA EL PUNTO DE ENTREGA INCLUYE DISTRIBUCIÓN INTERNA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC					
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA						
No. del Contrato de Obra	212-2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		13-06-2025	6 MESES	01-07-2025	31-12-2025	31-12-2025
Contratista	Nombre		Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CONSORCIO AQUAERON		Calle 108 No. 16-55 Of 202	901954014-5	315 512 69 09	aquaeron@ingenieria.com
	Representante legal		OMAR FERNANDO CANO SUAREZ			
Información del Contrato de Obra	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	4 MESES	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice/View/Index?prevCbtId=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1-NTC-8078667	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice/View/Index?prevCbtId=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1-NTC-8078667	\$ 24.631.398.850,00	\$ 24.631.398.850,00
Objeto del contrato de obra	CONTRATACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.					
Avance de Cupos Generados o Rehabilitados del Contrato de Obra	Cupos Rehabilitados Programados	Cupos Rehabilitados	% Cupos Rehabilitados	Cupos Generados Programados	Cupos Generados	% Cupos Generados
	N/A	0	N.A.	N.A.	0	N.A.
Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	Regional_Central	Amazonas	LETICIA	EPMSC LETICIA	4,3600000	-70,5788889
	Regional_Central	Boyacá	CHIGUINQUIRA	CPMS CHIGUINQUIRA	5,5927700	-73,8338880
	Regional_Central	Boyacá	MONQUIA	CPMS MONQUIA	5,8901540	-73,5788270
	Regional_Central	Boyacá	SANTA ROSA DE VITERBO	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	5,9591667	-72,9533333
	Regional_Central	Boyacá	EL BARNE COMBITA	CPAMS EL BARNE COMBITA	5,6769444	-73,2658333
	Regional_Central	Cauquetá	HELICONIAS FLORENCIA	EP LAS HELICONIAS FLORENCIA	1,5691667	-75,6402778
	Regional_Central	Casanare	YOPAL	EPC YOPAL	5,2829361	-72,4551528
	Regional_Central	Cundinamarca	LA ESPERANZA GUADUAS	EP LA ESPERANZA GUADUAS	5,1663889	-74,6875000
	Regional_Central	Huila	NEIVA	EPC NEIVA	2,7972222	-75,3058333
	Regional_Central	Huila	LA PLATA	EPMSC LA PLATA	2,3958333	-75,8802778
	Regional_Central	Meta	ACACIAS	CPAMS ACACIAS	4,0084167	-73,7724722
	Regional_Central	Meta	ACACIAS	EPMSC ACACIAS	4,0113889	-73,7846111
	Regional_Noroccidente	Antioquia	APARTADO	EPMSC APARTADO	7,8049200	-76,6513000
	Regional_Noroccidente	Antioquia	PUERTO TRIUNFO	EP PUERTO TRIUNFO EL	5,9060833	-74,7263889
	Regional_Noroccidente	Chocó	ISTMINA	EPMSC ISTMINA	5,1552778	-76,6866667
	Regional_Noroccidente	Chocó	QUIBDO	EPMSC QUIBDO	5,6902778	-76,6566667
	Regional_Occidental	Cauca	POPAYAN	CPAMS POPAYAN	2,4702778	-76,5455556
	Regional_Occidental	Nariño	TUMACO	EPMSC TUMACO	1,7058333	-76,7700000
	Regional_Occidental	Valle del Cauca	JAMUNDÍ	COJAM JAMUNDÍ	3,2536111	-76,5033333
	Regional_Occidental	Nariño	PIALES	CPMS PIALES	0,8363889	-77,6241667
	Regional_Viejo_Caldas	Cauca	LA DORADA	CPAMS LA DORADA	5,4811111	-74,6780556
	Regional_Viejo_Caldas	Quindío	CALARCÁ	EPMSC CALARCÁ	4,5144444	-76,4888889
	Regional_Norte	Bolívar	MAGANGÜE	EPMSC MAGANGÜE	9,2688889	-74,7955555
	Regional_Norte	Magdalena	SANTA MARTA	EPMSC SANTA MARTA	10,7664167	-75,1166666
	Regional_Norte	San Andrés y Providencia	NEUEVA ESPERANZA SAN ANDRES	EPMSC LA NUEVA ESPERANZA SAN	12,5560400	-81,7246100
	Regional_Norte	Córdoba	TIERRALTA	EPMSC TIERRALTA	8,0272222	-76,1641667
	Regional_Norte	Cesar	VALLEDUPAR	CPAMS VALLEDUPAR	10,4469444	-73,3075000
	Regional_Oriente	Norte de Santander	CUQUITA	CCP METROPOLITANO	7,9400000	-72,4900000
	Regional_Oriente	Santander	SOCORRO	EPMSC SOCORRO	6,5002200	-73,2384600
	Regional_Oriente	Santander	BUCARAMANGA	CPMSM BUCARAMANGA	7,0983333	-73,1625000
Regional_Oriente	Santander	GIROÑ	EPAMS GIROÑ	6,9769444	-73,1394444	
Regional_Oriente	Santander	VELEZ	EPMSC VELEZ*	6,0188900	-73,6703400	
4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR						
Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1.065.372.283	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ	Sub. De Construcción y Conservación		05-09-2025	31-12-2025
Apoyos a la supervisión	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1.06.8671.386	PAULA MARIANA ARGUMENTO ANDRADE	CONTRATISTA APOYO - SCC	N/A	01-07-2025	31-12-2025
	1.069.434.530	JULIÁN IGNACIO GONZALEZ RUBIO	CONTRATISTA APOYO - SCC	N/A	01-07-2025	31-12-2025
	1.013.655.084	DIEGO CHAVES CAMACHO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	N/A	01-07-2025	31-12-2025
Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	Nº de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita			
Relación de Comités Realizados	Nº de Comites	Fecha del comité	Compromisos			
	1	03-09-2025	1. Acta de inicio interventoría para el 4 de septiembre de 2025. 2. Remisión de hojas de vida interventoría con ajustes para el 3 de septiembre de 2025. 3. Documentación contrato 212-2025 para el 8 de septiembre de 2025. 4. Oficio devolución de ODS para generar alcance fecha posterior al acta de inicio de interventoría para el 3 de septiembre de 2025. 5. Diagnóstico de interventoría para el 4 de octubre de 2025.			
	2	10-09-2025	1. Cronograma de visita para el 15 de septiembre de 2025. 2. Áreas de limpieza y poda de los 32 establecimientos para el 30 de septiembre de 2025. 3. Diagnóstico para el 8 de octubre de 2025. 4. Priorización por parte de interventoría de mantenimiento preventivo y correctivo.			

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL					
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP		
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	14025	13-02-2025	2.861.373.068,00	110625	21-08-2025	\$ 2.222.740.267,00
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Modificaciones al contrato	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
Total de Modificaciones				\$	-	\$ -
7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Relación de Actas	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
	Acta N°. 1	Acta de Inicio	N/A	N/A	N/A	N/A

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	\$ 2.222.740.267,00	N/A			0	0
Pagos Realizados	Periodo Facturado		N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
	Desde	Hasta				
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		\$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		\$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		\$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		\$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		\$ -
Valor Acumulado Pagado						\$ -
Facturación del contrato	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Total facturado:	\$ -	Saldo del Contrato:	\$ -			
Porcentaje del Plazo de Ejecución						
Fecha de Corte	30-09-2025	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)
Mes	Septiembre					
% Plazo	21,37%					
Inversión Programada	INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE \$)					
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	\$ 189.788.345,50	\$ 740.112.493,11	\$ 740.112.493,11	\$ 740.112.493,11		
	Inversión Ejecutada	\$ 158.259.107,01				
	Inversión Pagada	\$ -				
9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
% Programada	8,54%					
% Ejecutada	7,12%					
% Atraso Acumulado	1,42%					
Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo técnico)	Contrato de interventoría inicia posterior al contrato de operación y manetimiento, por lo que se solicita a la interventoría realzar plan de contingencias y programacion de ejecucion del presupuesto.					

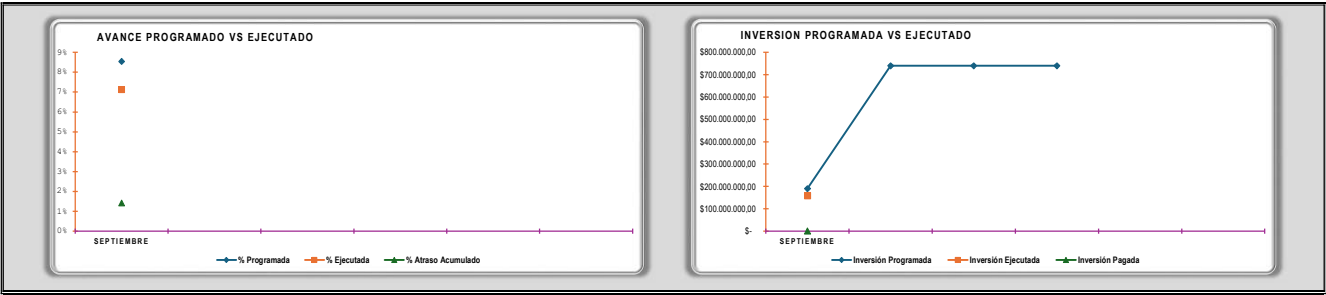

10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Actividades Ejecutadas del Contrato	ERON	Observación
	EPMSC LETICIA	
	CPMS CHIOQUIRÁ	
	CPMS MONQUIRÁ	
	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	
	CPAMS EL BARNE COMBITA	
	EP LAS HELICONIAS FLORENCIA	
	EPC YOPAL	
	EP LA ESPERANZA GUADUAS	
	EPC NEIVA	
	EPMSC LA PLATA	
	CAMS ACACIAS	
	EPMSC ACACIAS	
	EPMSC APARTADO	
	EP PUERTO TRIUNFO ELPESEBRE	
	EPMSC ISTMINA	
	EPMSC QUIBDO	
	CPAMS POPAYÁN	
	EPMSC TUMACO	
	COJAM JAMUNDI	
	CPMS IPIALES	
	CPAMS LA DORADA	
	EPMSC CALARCÁ	
	EPMSC MAGANGÜE	
	EPMSC SANTA MARTA	
	EPMSC LA NUEVA ESPERANZA SAN ANDRES	
	EPMSC TIERRALTA	
	CPAMS VALLEDUPAR	
	CCP METROPOLITANOCOCU CÚCUTA	
	EPMSC SOCORRO	
	CPMSM BUCARAMANGA	
	EPAMS GIRÓN	
	EPMSC VELEZ*	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento a Pólizas del Contrato:	Póliza No.	14-44-101242683	Nombre de la Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA.	Anexo No.	0
	Descripción del amparo	Vigencia			Valor Asegurado	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 20-08-2025	Hasta 31-10-2026	\$	666.822.080,10	
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-08-2025	31-10-2028	\$	222.274.026,70	
	CALIDAD DEL SERVICIO	31-12-2025	31-10-2030	\$	666.822.080,10	
Aclaración:	FECHA DE APROBACION: 28-08-2025					

Seguimiento a Pólizas del Contrato	Póliza No.	14-44-101242683	Nombre de la Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO SA.	Anexo No.	01 Y 02
	Descripción del amparo		Vigencia		Valor Asegurado	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-08-2025	31-10-2026	\$	666.822.080,10	
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20-08-2025	31-10-2028	\$	222.274.026,70	
	CAIDAD DEL SERVICIO	31-12-2025	31-10-2030	\$	666.822.080,10	
Aclaración:	FECHA DE APROBACION:					

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	PROFESIONAL DE PROCESOS	% Dedicación	Observaciones
		WILMER ALVEIRO PARRA ACEROS	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%	
		MEBYS SEGRIT DE LA OSSA LOPEZ	INGENIERO CIVIL	PROFESIONAL DE PROCESOS	100%	
		FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE		
		STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	200%	
		DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	100%	
		DIANA ALEXANDRA TRIANA BARRERA	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	100%	
		PAULA ALEJANDRA RAMIREZ RESTREPO	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	100%	
		DANIEL FERNANDO CORREDOR PELAEZ	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	100%	
		DIEGO MAURICIO CORTES OBANDO	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	100%	
		JOSE EDIL TON HIGUERA CRUZ	ARQUITECTO	RESIDENTE	100%	
		GONZALO RAMOS GUZMAN	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE	100%	
		PEDRO FRANCISCO MUÑOZ MEDINA	INGENIERO MECANICO	INGENIERO MECANICO	100%	
		OMAR OLARTE TRIANA	INGENIERO ELECTRICO	INGENIERO ELECTRICO	100%	
		ANDREA DEL CARMEN BEDOYA AGUDELO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL SST	100%	
		HAROLD EDUARDO BONILLA MURILLO	TEGNOLOGO EN GESTION DE TALENTO HUMANO	AUXILIAR TECNICO O TEGNOLOGO EN AREAS AREAS ADMINISTRATIVA	100%	
		INDRI LIZEE AYALA CABRERA	TEGNOLOGO EN GESTION ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100%	
		LUISA MARIA GARZON LEON	TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100%	
		DARWIN MENA RENTERIA	INGENIERO AMBIENTAL	COORDINADOR DE RESIDENTES EN ASUNTOS HIDRICOS	100%	
		LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ	INGENIERO CIVIL	COORDINADOR DE RESIDENTES EN ASUNTOS CIVILES Y AFINES	100%	
	INGRIT OMAIRA VILLAMIL AGUILAR	ABOGADO	COORDINADOR JURIDICO	100%		
	MARIA FERNANDA LOPEZ ORTIZ	INGENIERO AMBIENTAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	100%		
	WILLIAM ALFREDO LATORRE FURQUE	CONTADOR PUBLICO	COORDINADOR FINANCIERO	100%		
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombrey Apellido	N°. identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	Periodo		
					No. de planilla	Desde	Hasta
WILMER ALVERO PARRA ACEROS	88239605	\$308.000	\$1.309.000	\$536.000	9494408260	05 al 30 de septiembre de 2025	
MEYB SEGRIT DE LA OSSA LOPEZ	1015446268	\$218.000	\$872.000	\$28.500	9494173011	05 al 30 de septiembre de 2025	
FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON	80088977	\$284.000	\$1.122.000	\$459.400	9491985224	05 al 30 de septiembre de 2025	
STEPHAN IVAN VALJO PACHON	80198860	\$284.000	\$1.122.000	\$264.000	9493734144	05 al 30 de septiembre de 2025	
DIANA ALEJANDRA MALAGON	52257028	\$260.000	\$1.105.000	\$452.400	9493650244	05 al 30 de septiembre de 2025	
DIANA ALEXANDRA TRIANA	1019022840	\$218.100	\$872.100	\$379.400	9494176060	05 al 30 de septiembre de 2025	
PAULA ALEJANDRA RAMIREZ	1110555463	\$218.100	\$872.100	\$379.400	9494175959	05 al 30 de septiembre de 2025	
DANIEL FERNANDO CORREDOR	86058519	\$218.000	\$872.000	\$379.400	9494173094	05 al 30 de septiembre de 2025	
DIEGO MAURICIO CORTES OBANDO	70786453	\$218.000	\$872.000	\$379.400	9494173289	05 al 30 de septiembre de 2025	
JOSE EDILTON HIGUERA CRUZ	79801433	\$218.000	\$872.000	\$379.400	9494409376	05 al 30 de septiembre de 2025	
GONZALO RAMOS GUZMAN	39406541	\$218.000	\$872.100	\$379.400	9494175718	05 al 30 de septiembre de 2025	
PEDRO FRANCISCO MUÑOZ	17137811	\$198.300	\$0	\$341.500	9494175479	05 al 30 de septiembre de 2025	
OMAR QUARTE TRIANA	19332090	\$218.000	\$872.000	\$379.400	9494409085	05 al 30 de septiembre de 2025	
ANDREA DEL CARMEN BEDOYA	43101110	\$218.000	\$872.000	\$379.400	9494173414	05 al 30 de septiembre de 2025	
HAROLD EDUARDO BONILLA	0425458986	\$160.000	\$840.000	\$20.900	9493650244	05 al 30 de septiembre de 2025	
INDY LIZ AYLZA CARRERA	1013520867	\$36.000	\$384.000	\$167.100	9494173542	05 al 30 de septiembre de 2025	
LUSIA MARIA GARZON LEON	1025542228	\$100.000	\$400.000	\$174.000	9493247012	05 al 30 de septiembre de 2025	
DARWIN MENA RENTERIA	79807373	\$272.000	\$1.156.000	\$473.300	9494172739	05 al 30 de septiembre de 2025	
LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ	13003506	\$765.000	\$0	\$426.000	9494175015	05 al 30 de septiembre de 2025	
INGRIT OMAR VILLAMIL AGUILAR	22803630	\$272.000	\$1.156.000	\$473.300	9494173817	05 al 30 de septiembre de 2025	
MARIA FERNANDA LOPEZ ORTIZ	1121937645	\$218.000	\$872.000	\$379.400	9494174070	05 al 30 de septiembre de 2025	
WILLIAM ALFREDO LATORRE	43251120	\$236.300	\$1.004.200	\$471.400	9494174789	05 al 30 de septiembre de 2025	

Observaciones	LUIS OSWALDO CAMPAÑA DIAZ: Se encuentra pensionado. EDRO FRANCISCO MUÑOZ MEDINA: Se encuentra pensionado.
---------------	---

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
Relación de Informes de Supervisión	Informe N1	05-09-2025	30-09-2025	septiembre	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ	No
Observaciones						

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
230-212-2025	01-09-2025	Solicitud de ingreso personal en establecimiento penitenciario EPMSC SAN ANDRÉS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision
231-212-2025	01-09-2025	Reiteración ODS 007 y reporte de novedad en EPMSC SOCORRO.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision
232-212-2025	01-09-2025	Informe de programación de toma de muestra de fuente hídrica receptora – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) RM Bucaramanga – Orden de Servicio 020	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision
233-212-2026	02-09-2025	Remisión ODS 022 EPMSC MONQUIRÁ.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision
234-212-2025	25-08-2025	Exceso de alimentos y presencia de carbón en caudal de ingreso a PTAR	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revision y analisis de interventoria y posterior aprobacion de la supervision

		INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL				
235-212-2025	02-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS COMBITA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
236-212-2025	04-09-2025	Reiteración ODS 015 y reporte de novedad en el EPC YOPAL	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
237-212-2025	03-09-2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículo al ERON – EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
238-212-2025	04-09-2025	Solicitud de autorización de ingreso al ERON – EPMSC SOCORRO.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
239-212-2025	04-09-2025	Solicitud de ingreso personal de ARL Bolívar para capacitación en brigada de emergencia personal PTAR EPAMS CAS GIRÓN.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
240-212-2025	04-09-2025	Remisión ODS 023 EPC LA ESPERANZA GUADUAS	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
241-212-2024	04-09-2025	Respuesta a radicado 04256000767- trasladado por la USPEC	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
242-212-2025	04-09-2025	Solicitud de ingreso personal técnico para inspección de equipos PTAR EPAMS CAS GIRÓN.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
243-212-2025	04-09-2025	Renuncia expresa al anticipo – Contrato No.212-2025.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
244-212-2025	04-09-2025	Remisión INFORME DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA SUPERACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS NORMATIVOS AMBIENTALES EN LOS ERON – monitoreo mayo de 2025	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
245-212-2025	05-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC SANTA MARTA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
246-212-2025	05-09-2025	Solicitud de ingreso de vehículos a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
247-212-2025	05-09-2025	ENTREGA PARCIAL DE RESULTADOS DE MONITOREO CAMPAÑA No 2 (AGOSTO 2025).	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
248-212-2025	08-08-2025	Remisión informe de operación y Acta No. 2 – agosto 2025	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
249-212-2025	09-09-2025	Respuesta a solicitud de Plan de acción Agua para Consumo Humano EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
250-212-2025	08-09-2025	Remisión ODS 024 EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
251-212-2025	08-09-2025	Solicitud de autorización de ingreso de vehículo al ERON – EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
252-212-2025	08-09-2025	Segunda Reiteración de la ODS 015 y de novedades presentadas en EPC YOPAL	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
253-212-2025	09-09-2025	Respuesta a R-2025-02006 - EPC YOPAL	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
254-212-2025	09-09-2025	Reporte de novedad presentada en EPC YOPAL	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
255-212-2025	09-09-2025	Respuesta al radicado No. R-2025-020600 Traslado por la USPEC - COJAM JAMUNDI	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
256-212-2025	10-09-2025	Remisión de documentación adelantada contrato 212 de 2025.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
257-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 014 CPAMS VALLEDUPAR V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
258-212-2025	10-09-2025	Traslado ODS 010 EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE – V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
259-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 003 EPAMS PC ERE LA DORADA V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
260-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 008 CPMSCHI CHIQUINQUIRA V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
261-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 007 EPMSC SOCORRO V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
262-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 009 EPMSC SANTA MARTA V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
263-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 015 EPC YOPAL V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
264-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 021 EPMSC SOCORRO V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
265-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 024 EPC YOPAL V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
266-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 019 EPMSC APARTADO V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
267-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 020 RM BUCARAMANGA V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
268-212-2025	10-09-2025	Traslado de ODS 022 EPMSC MONIQUIRA V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
269-212-2025	10-09-2025	Traslado ODS 006 CAMIS ERE ACACÍAS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
270-212-2025	10-09-2025	Traslado ODS 011 EPMSC ACACÍAS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
271-212-2025	10-09-2025	Traslado ODS 017 EPAMS CAS CÓMBITA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
272-212-2025	10-09-2025	Solicitud de autorización de ingreso al ERON – EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
273-212-2025	10-09-2025	Devolución de las cuentas No.1 & No.2 CONTRATO 212-2025	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
274-212-2025	10-09-2025	Solicitud de autorización de ingreso al ERON – EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
275-212-2025	10-09-2025	Respuesta a radicados R-20182010034352 Traslado por la Uspec.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
276-212-2025	10-09-2025	ENTREGA TOTAL DE RESULTADOS DE MONITOREO CAMPAÑA No 2 (AGOSTO 2025).	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
277-212-2025	10-09-2025	Respuesta oficio No. 2025EE0232037 Traslado por la USPEC – EPMSC ISTMINA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
278-212-2025	10-09-2025	Respuesta a oficio 2025IE012862 trasladado por la USPEC- EPC LA ESPERANZA GUADUAS	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
279-212-2025	01-09-2025	Notificación de ejecución de Prueba de Bombeo en pozo EPMSC Santa Rosa de Viterbo, por novedad presentada.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
280-212-2025	10-09-2025	Remisión ODS 025 EPMSC MAGANGUÉ – Mantenimiento general.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
281-212-2025	10-09-2025	Remisión ODS 026 EPAMS CAS CÓMBITA – Cambio de lechos filtrantes.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
282-212-2025	11-09-2025	Solicitud de ingreso personal en establecimiento penitenciario EPMSC SAN ANDRÉS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
283-212-2025	11-09-2025	Remisión ODS 023 EPC LA ESPERANZA GUADUAS V2.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
284-212-2025	11-09-2025	Respuesta a radicado E-2025-009242 – Estado ODS 007	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión

285-212-2025	11-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario COIAM JAMUNDI.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
286-212-2025	12-09-2025	Remisión ODS 027 EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
287-212-2025	12-09-2025	Remisión informe mensual PTAP y PTAR – campaña 1; monitoreo julio del 2025	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
288-212-2025	12-09-2025	Respuesta a Insumos para respuesta R-2025-019607 BARNE	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
289-212-2025	12-09-2025	Respuesta a requerimiento R-2025-020721 – Defensoría del Pueblo El BARNE	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
290-212-2025	12-09-2025	Novedad solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 3 PTAR-PTAP – septiembre 2025	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
291-212-2025	12-09-2025	Remisión ODS 029 EPAMS CAS CÓMBITA – Mantenimiento tablero MEDIANA.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
292-212-2025	12-09-2025	Solicitud de ingreso personal a EPAMS CAS ERE POPAYÁN.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
293-212-2025	15-09-2025	Reporte de novedad presentada en EP FLORENCIA (HELICONIAS)	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
294-212-2025	15-09-2025	Finalización ODS 001 suministro de agua – EPMSC ISTMINA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
295-212-2025	15-09-2025	Remisión ODS 030 EPMSC MONQUIRÁ.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
296-212-2025	15-09-2025	Reiteración de la orden de servicio 009 EPMSC SANTA MARTA.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
297-212-2025	15-09-2025	Nueva reiteración de la planta de tratamiento de agua potable sin servicio de energía.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
298-212-2025	15-09-2025	Solicitud de ingreso vehículo vactor a establecimiento penitenciario EPAMS CAS CÓMBITA.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
299-212-2025	16-09-2025	Reiteración No. 2 ODS 007 – Intervención equipos de dosificación PTAP y sumergibles PTAR.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
300-212-2025	15-09-2025	Remisión ODS 028 EPMSC IPIALES	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
301-212-2025	16-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
302-212-2025	16-09-2025	Remisión ODS 031 EPMSC APARTADO.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
303-212-2025	16-09-2025	Reiteración reporte de novedades presentadas en EPC YOPAL	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
304-212-2025	16-09-2025	Suspensión de suministro de agua acueducto a EPMSC ACACIAS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
305-212-2025	16-09-2025	Respuesta a 2025EEO211548- trasladado por la USPEC	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
306-212-2025	16-09-2025	Remisión ODS 032 EPAMS CAS GIRÓN – Reparación tubería 6"	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
307-212-2025	17-09-2025	Solicitud de autorización de ingreso al ERON – EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
308-212-2025	17-09-2025	Cronograma de actividades ODS 023 para el establecimiento EPC LA ESPERANZA GUADUAS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
309-212-2025	17-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC SOCORRO.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
310-212-2025	17-09-2025	Remisión informe de cadenas de custodia y registro fotográfico – campaña 2; monitoreo agosto del 2025	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
311-212-2025	17-09-2025	Remisión ODS 033 EPMSC ISTMINA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
312-212-2025	18-09-2025	Solicitud de ingreso personal en establecimiento penitenciario EPMSC SAN ANDRÉS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
313-212-2025	18-09-2025	Solicitud de diagnóstico técnico actualizado – PTAR EPMSC Tierraalta	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
314-212-2025	18-09-2025	Solicitud de ingreso personal COCUC CUCUTA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
315-212-2025	19-09-2025	Remisión de ODS No. 003 ajustada – EPAMS PC ERE La Dorada.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
316-212-2025	19-09-2025	Novedad solicitud de ingreso a ERON para ejecución de Campaña de Monitoreo No. 3 PTAR-PTAP – septiembre 2025.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
317-212-2025	22-09-2025	Remisión ODS 034 EPC LA ESPERANZA GUADUAS	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
318-212-2025	22-09-2025	Reporte de novedad presentada en EPC YOPAL	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
319-212-2025	22-09-2025	Solicitud de ingreso a EPC LA ESPERANZA GUADUAS	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
320-212-2025	22-09-2025	Solicitud de ingreso personal en establecimiento penitenciario EPAMS VALLEDUPAR TRAMACUA.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
321-212-2025	22-09-2025	Remisión de la situación eléctrica en COIAM JAMUNDI	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
322-212-2025	23-09-2025	Solicitud de ingreso de vehículos a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión

 USPEC INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL						
323-212-2025	23-09-2025	Traslado de ODS 009 EPMSC SANTA MARTA V3.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
324-212-2025	23-09-2025	emisión ODS 034 EPC LA ESPERANZA GUADUAS V2	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
325-212-2025	23-09-2025	Respuesta a radicado CIVALL 246-2025-0023 – Complemento de documentación solicitud de inicio de gestión administrativa para modificadorio contractual	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
326-212-2025	23-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS ERE POPAYÁN	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
327-212-2025	23-09-2025	Disminución del caudal en las fuentes hídricas Cañada 1, Cañada 2 y Mate Bore, abastecedoras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
328-212-2025	23-09-2025	Remisión ODS 035 EPC TIERRALTA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
329-212-2025	23-09-2025	Solicitud de ingreso vehículos retiro de lodos EPAMS CAS GIRON	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
330-212-2025	24-09-2025	Solicitud de ingreso de personal al establecimiento penitenciario EPMSC RM NEIVA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
331-212-2025	24-09-2025	Solicitud de ingreso de personal al establecimiento penitenciario EPMSC LA PLATA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
332-212-2025	24-09-2025	Solicitud de ingreso de personal al establecimiento penitenciario EC LA ESPERANZA GUADUAS	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
333-212-2025	24-09-2025	Respuesta a radicado CIVALL 246-2025-0023 – Complemento de documentación solicitud de inicio de gestión administrativa para modificadorio contractual.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
334-212-2025	24-09-2025	Solicitud ingreso de personal a establecimiento EPMSC ACACIAS	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
335-212-2025	24-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario CAMIS ERE ACACIAS.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
336-212-2025	25-09-2025	Respuesta Radicado E-2025-011172 Y CIVALL-246-2025-0031	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
337-212-2025	25-09-2025	Remisión alcance ODS 029 EPAMS CAS CÓMBITA – Mantenimiento tablero v2 MEDIANA.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
338-212-2025	26-09-2025	Remisión alcance ODS 019 EPMSC APARTADO. V3	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
339-212-2025	26-09-2025	Respuesta Radicado 2025E0176534.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
340-212-2025	26-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPMSC SOCORRO.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
341-212-2025	26-09-2025	Solicitud de ingreso a PTAP PTAR - CPAMS EL BARNE COMBITA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
342-212-2025	29-09-2025	Solicitud de ingreso personal de interventoría al establecimiento EPAMS PC ERE LA DORADA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
343-212-2025	01-10-2025	Respuesta oficio No. tutela radicada 15001 33 33 007 2018 00064-00 EPAMS CAS CÓMBITA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
344-212-2025	29-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPAMS CAS ERE POPAYÁN	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
345-212-2025	29-09-2025	Remisión ODS 036 COCUC CUCUTA	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
346-212-2026	29-09-2025	Reporte novedad operación EPMSC TUMACO	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
347-212-2026	29-09-2025	Reporte novedad EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión
348-212-2026	30-09-2025	Solicitud de ingreso personal a establecimiento penitenciario EPC YOPAL.	Contratista	Correo electrónico	Septiembre de 2025	Revisión y análisis de interventoría y posterior aprobación de la supervisión

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato

El riesgo del contrato se fundamenta principalmente en la baja ejecución contractual, debido a la imperiosidad de inicio del contrato de operación y mantenimiento dada la necesidad de operación continua por ser la prestación de servicio de agua potable y el saneamiento de aguas residuales la supervisión dió inicio al contrato entre tanto se perfeccionó el proceso contractual de la interventoría limitado únicamente a la ejecución de actividades de operación. En consecuencia, las actividades de mantenimiento iniciaron hasta la suscripción del contrato de interventoría. El control a implementar se centrará en la adecuada programación de actividades que permita hacer seguimiento y corregir los retrasos presentados.

Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato

De acuerdo con la información entregada por la interventoría, el promedio general de cumplimiento ambiental se mantiene en un rango favorable (superior al 85%), evidenciando control operativo y aplicación de medidas preventivas, aunque con oportunidades de mejora en la planeación de actividades de campo y consolidación de evidencias. Se ha hecho seguimiento al control de permisos ambientales y seguimiento al programa de manejo ambiental.

Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización

De la evaluación realizada por la interventoría se evidencia una calificación favorable en la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), reflejando el cumplimiento de la mayoría de los criterios establecidos, especialmente en la ejecución del cronograma de actividades, capacitaciones, señalización y control de condiciones de seguridad.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO



17. CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Pronostico basado en la programación

Se observa un desfase significativo en la ejecución de los contratos. El contrato de interventoría a la operación y mantenimiento presenta un avance programado del 8,54%, mientras que el avance real ejecutado alcanza únicamente el 7,12%, evidenciando un retraso del 1,42%. Por su parte, De mantenerse esta tendencia, se proyecta, que la ejecución del contrato no alcanzará los hitos establecidos dentro del cronograma inicial, por lo que será necesario ajustar la planificación y fortalecer las estrategias de control para mitigar el rezago identificado.

En consecuencia la supervisión realiza llamado de atención a la interventoría y contratista en el respectivo seguimiento a la ejecución y alerta pues en caso de continuar el retraso se iniciarán las acciones contractuales y jurídicas a que haya lugar.

Diagnostico basado en la programación

El atraso en la ejecución del contrato de operación y mantenimiento se origina principalmente en la no ejecución de las actividades de mantenimiento previstas para los dos primeros cortes. Estas actividades representan un componente significativo dentro del presupuesto del contrato y no pudieron desarrollarse debido a que, durante ese periodo, el contrato de interventoría aún no había iniciado, lo que impidió su supervisión y aprobación.

Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas

El atraso en la ejecución contractual se debe a la no realización de las actividades de mantenimiento en los dos primeros cortes, de alto impacto presupuestal, debido al inicio tardío de la interventoría. Esta situación generó un desfase entre lo programado y lo ejecutado. Se propone reprogramar las actividades críticas y fortalecer el seguimiento para optimizar la ejecución física y financiera.

Desempeño de la Interventoría

Para el periodo, la interventoría se encuentra en fase de alistamiento; no obstante, considerando los atrasos evidenciados en la ejecución del contrato de operación y mantenimiento, es necesario que se formulen los planes de contingencia correspondientes, se realicen los ajustes a la programación y se emitan las alertas tempranas sobre posibles modificaciones contractuales, en caso de que estas sean requeridas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Alertas jurídicas del contrato

Como alerta jurídica, se destaca que la interventoría solicitó la modificación contractual considerando la renuncia al anticipo por parte del contratista, situación que requiere el ajuste de las condiciones contractuales y financieras para garantizar la correcta ejecución y continuidad del objeto contractual.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI/NO
1	ACTAS DE SEGUIMIENTO	4	SI
2	INFORME No.1 CTO-246-2025 SEPTIEMBRE	50	SI
3	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO		

Firmas

Nombre del supervisor: KARINA JOHANA ROMERO SUAREZFirma: Nombre del apoyo a la supervisión: JULIAN IGNACIO GONZALEZ RUBIOFirma: 
