



ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GC-017

VERSION: 5

FECHA MOD: DICIEMBRE 03 DE 2021

Página 1 de 1

NOMBRE :

LISTADO

- TODOS LOS DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR EN UNA CARPETA CUATRO ALETAS, TODO LOS DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO, SIN HUECOS, SIN GANCHOS DE COSEDORA, NÍTIDOS Y LEGIBLES.
- PRESENTAR DOS (2) PAQUETES IGUALES CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO A LA OFICINA DE HACIENDA CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL ORIGINAL DEL INFORME IMPRESO A COLOR Y LA COPIA BLANCO Y NEGRO, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO: contrato de obra N° 177-2026

CONSECUTIVO CUENTA DE COBRO: 02

PERIODO DE COBRO: 22 de MAYO al 17 de JULIO 2026

NOMBRE DE CONTRATISTA: IDECOS SAS.

No.	DOCUMENTOS	Vo. bo.		
		SUPERVISOR	folios	HACIENDA
1	FACTURA ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN COMÚN)		2	
2	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN SIMPLIFICADO) DONDE SE DESCRIBA QUE ACTA DE PAGO ES ACTA DE PAGO PARCIAL ETC.			
3	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- (PERSONA NATURAL)		-	
4	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE		-	
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CON SOPORTES)		37	
6	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CONV. B. DEL SUPERVISOR).		4	
7	COPIA CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS EL CUAL FUE EXPEDIDO OR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL			
8	COPIA CERTIFICACION DE ESTAR DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2025 EXPEDIDO POR CADA SUPERVISOR			
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)			
10	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO)			
11	INFORME DE SUPERVISION (PARCIAL o FINAL SEGÚN EL CASO)		42	
12	ACTA PAGO (PARCIAL O FINAL SEGUN EL CASO)		5	
13	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL)			
14	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES			
15	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES.		1	
16	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTÍAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTÍAS. (PARA CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO)			
17	COPIA CONTRATO Y/O ADICIONALES (SEGUN SEA EL CASO PARA LA PRIMERA CUENTA)			
18	COPIA ACTA DE INICIO (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)			
19	COPIA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN (CONTRATO DE SUMINISTRO) HACIENDA			
20	COPIA DEL EGRESO - HACIENDA			

FIRMA CONTRATISTA

REVISIÓN DEL SUPERVISOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7eadc6bd00e533b230ff8be4b3813c5c6a79182364f141c42e0e91dd40490053e2c7635cbfeda538561d86d02a8f4cd5

Número de Factura: IDEC-15

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 27/07/2026

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Vencimiento: 27/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IDECOB S.A.S

Nombre Comercial: IDECOB S.A.S

Nít del Emisor: 901850692

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Curití

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: VDA LLANO DE NAVAS FCA VILLA MAYITA

Actividad Económica: 7020

Teléfono / Móvil: 3112202351

Correo: IDECOBSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CURITI

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800099489

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Curití

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Dirección: CL 8 N 8-55 BRR CENTRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3158082803

Correo: secretariahacienda@curiti-santander.gov.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO N 111 DE 2026	MANTENIMIENTO PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MAJILLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADOR A Y MATERIAL DE SUBBASE	NIU	1,00	\$ 120.767.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.767.200,00

Notas Finales

ACTA DE PAGO PARCIAL N 002

Línea de negocio: CONTRATO No. 111-2026

Datos Totales



Documento generado el:
27/07/2026 15:50:38
Documento validado por la
DIAN:
27/07/2026 15:50:39
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	120767200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120767200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	120767200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 120767200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	120.767.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120.767.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	120.767.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 120.767.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

**MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS
CRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL
MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER MEDIANTE EL USO
DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE.**



**CONTRATISTA:
IDECOB SAS
NIT: 901.850.692-1**

**INFORME No. 2
CONTRATO DE OBRA No. 111-2026**

JULIO 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	4
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	9
2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA	10
3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.	10
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS	10
4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS.....	10
4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:	11
4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:	11
5. AVANCE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO:	11
6. OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN	11
7. RELACIÓN DE EQUIPO EN OBRA:	11
8. BALANCE FINANCIERO:	12
9. RELACIÓN DE PAGOS	12

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Curití, ubicado en el departamento de Santander, cuenta con una estructura territorial conformada por 18 veredas y 40 sectores comunitarios. Su economía se sustenta principalmente en las actividades agrícolas y agropecuarias, gracias a la diversidad de productos que se cultivan en su territorio, entre los que se destacan el frijol, maíz, plátano, café, yuca, tabaco, fique, tomate, caña panelera y diversos cítricos, entre otros. Estos productos representan una fuente significativa de ingreso para las familias rurales y son comercializados no solo dentro del municipio, sino también en la región, contribuyendo de manera importante al dinamismo económico local.

Se definen como ejes viales estructurales del componente rural las vías que comunican a las diferentes veredas y sus respectivos sectores. En el marco del presente contrato, las intervenciones se concentran en los puntos críticos identificados en las veredas Cuchicute Alto, Palo Cortado, Rodeo, Tapias, La Laja – Árbol Solo, Cantabara, Piedra Gorda y San Carlos, sectores cuya conectividad con el casco urbano reviste especial importancia para el desarrollo económico y social de las comunidades asentadas en dichos territorios.

Las vías y caminos rurales representan un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de una región, ya que permiten el flujo de bienes, servicios y personas, impulsando la productividad y la integración territorial. Una red vial adecuada no solo facilita la movilidad y la conexión entre las comunidades, sino que también posibilita la presencia y acción del Estado en los territorios, promoviendo el progreso y el bienestar colectivo mediante la ejecución de programas y proyectos de desarrollo local.


En este contexto, resulta indispensable adelantar labores de mantenimiento, perfilado y cuneteo sobre los puntos críticos de la malla vial terciaria del municipio, mediante el uso de motoniveladora y la aplicación de material de subbase granular. Estas intervenciones tienen como propósito restablecer el perfil transversal y longitudinal de las vías afectadas, garantizar la adecuada evacuación de aguas superficiales a través de las cunetas y mejorar las condiciones de transitabilidad en los sectores más deteriorados. Mantener una red vial rural funcional y en buen estado asegura la movilidad de las comunidades, facilita el transporte de productos agrícolas y contribuye al desarrollo de las actividades económicas, sociales y cotidianas de la población.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	111-2026
PROCESO:	SAMC-004-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER
CONTRATISTA:	IDECOB SAS NIT. 901.850.692-1
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de Planeación Municipio de Curití
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRÍTICOS DE LA MALLA VIAL Terciaria del Municipio de Curití, Santander mediante el uso de motoniveladora y material de subbase".
PLAZO:	TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS (\$326.622.421,00) M/CTE.
VALOR COBRADO PRESENTE ACTA:	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$120.767.200,00) M/CTE.
PORCENTAJE EJECUTADO EN ESTA ACTA:	36,97%
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	04 DE AGOSTO DEL 2026
PERIODO DE PAGO:	DEL VEINTIDOS (22) DE MAYO AL DIECISIETE (17) DE JULIO DEL 2026

Vías De Acceso Interveredal Tabla 1.

VIA	LONGITUD Km.	ESTADO	VIA	LONGITUD Km.	ESTADO
PALO BLANCO ALTO	6	B	CASA DEL CONDE	7	R
PALO BLANCO BAJO	4	B	LA MESA	30	B
CUCHICUTE	7	B	MANCHADORES	26	B
PESCADERITO ALTO	9	B	TAPIAS	20	B
AGUA SEMBRADA	3	B	EL PINO	18	B
LA PEÑA	4	B	PIEDRA GORDA	20	B
LAS VUELTAS	6	R	CANTABARA	16	B
SAN CARLOS	5	B	MACAREGUA	13	B
ZAMORANO	5	R	ZAMORANO	6	B
ARENALES	9	B	POTRERO GRANDE	3	B
IRAPIRE	15	B	EL PALMAR	2	B
CUCHICUTE ALTO	10	B	EL CARMEN	3	B
RODEO	20	B	LA CEIBA	21	B
MACANILLO	24	B	EL UVO	7	B
PALO CORTADO	26	R	ARBOL SOLO	9	B
EL COMUN	1	R	QUEBRADA SECA	15	B
CANTERA	3	B	LA LAJA	17	B
TIRAPAZA	6	B	SAN FRANCISCO	13	B
TOTAL Km	409				

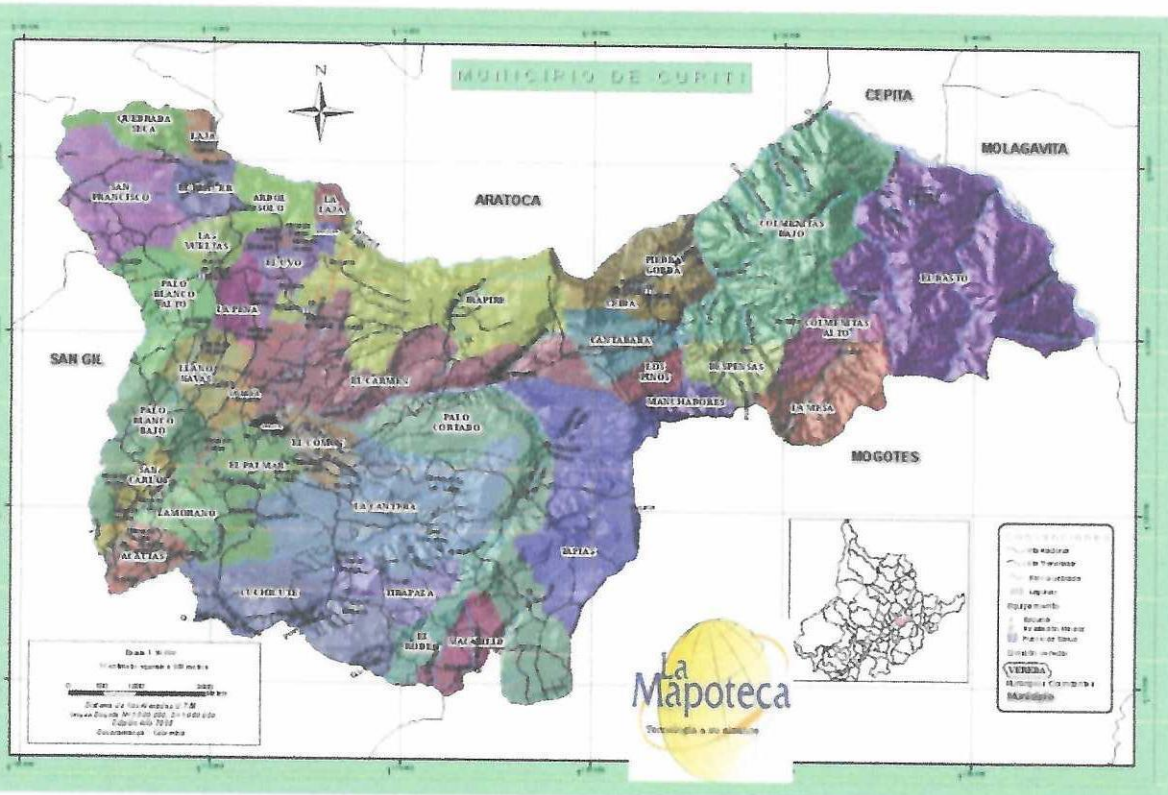

Veredas y Sectores de Curití - Santander

VIAS A INTERVENIR MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS PUNTOS CRITICOS CURITI		
No.	VIA	LONGITUD DE VIA (KM)
1	CUCHICUTE SECTOR ALTO	10
2	RODEO	20
3	SAN CARLOS	5
4	LA LAJA - ARBOLSOLO	17
5	CANTABARA - PIEDRA GORDA	36
6	PALO CORTADO	26
7	TAPIAS	20
TOTAL=		134

De conformidad con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de Curití, Santander, la Zona de Interés del presente proceso se encuentra delimitada por una estructura territorial compuesta por dieciocho (18) veredas y cuarenta (40) sectores comunitarios, los cuales constituyen las unidades básicas de organización social y espacial dentro del área de análisis.

Durante la segunda fase del proceso de mantenimiento vial de la red terciaria, se intervino un tramo estratégico del municipio, correspondiente a una zona de alta confluencia turística y que a su vez constituye una arteria principal de comunicación y acceso con diversas veredas del sector.

Dada la importancia de este corredor vial para la movilidad de la población rural y el flujo de visitantes, se evidenció un deterioro considerable en la estructura de la vía, que afectaba la transpirabilidad y la seguridad vial.

En atención a lo anterior, se ejecutaron actividades de mantenimiento rutinario y periódico, las cuales comprendieron:

1. Conformación de la calzada existente
2. Perfilado y reconfiguración de la banca
3. Suministro, extendido, humedecimiento en algunos casos y compactación de material granular tipo afirmado/subbase en los sectores críticos y puntos de mayor ahuellamiento, previamente identificados mediante inspección técnica de campo.

Con esta intervención se busca garantizar la conectividad entre el casco urbano y las veredas, así como optimizar las condiciones para el desarrollo de la actividad turística en la zona.

VEREDA	SECTOR COMUNITARIO	LONGITUD DE VIA (KM)
CUCHICUTE SECTOR ALTO Y BAJO		10
TIRAPAZA		6
	SAN CARLOS	5
	LA LAJA – ARBOL SOLO	17
PALO CORTADO		20

Por otra parte, el área de intervención correspondiente a los puntos críticos comprende una extensión aproximada cinco (5) kilómetros lineales, lo que representa el 10% de los más de cincuenta (58) kilómetros lineales que conforman las veredas relacionadas en la tabla anterior.

Se presenta la relación de veredas y sectores comunitarios intervenidos mediante actividades de conformación y compactación de la estructura de rodadura, empleando equipo de motoniveladora y vibro compactador, en el marco del mantenimiento de la red vial terciaria del municipio.


MOTONIVELADORA – VIBRO COMPACTADOR

VEREDA O SECTOR	MAQUINARIA AMARILLA	LONGITUD DE VIA
CUCHICUTE SECTOR ALTO	MOTONIVELADORA - VIBRO	3.088 KILOMETROS
CUCHICUTE BAJO	MOTONIVELADORA – VIBRO	983 METROS
CUCHICUTE VIA ALTERNA AL TABOR	MOTONIVELADORA – VIBRO	1.12 KILOMETROS
PALO BLANCO SECTOR COMUNITARIO SAN CARLOS	MOTONIVELADORA - VIBRO	2.014 KILOMETROS
PALO CORTADO	MOTONIVELADORA	1.72 KILOMETROS


A continuación, se presentan los trazados de las vías intervenidas en las veredas previamente relacionadas. Las actividades ejecutadas corresponden a perfilado, cuneteo y compactación de la estructura de rodadura. Las ilustraciones anexas corresponden a capturas de pantalla georreferenciadas, cotejadas y extraídas de la plataforma Google Earth.

Los trazados presentados corresponden a capturas de pantalla de la plataforma Google Earth Pro, Los polígonos y líneas son de carácter indicativo y fueron validados en campo mediante recorrido y georreferenciación con GPS. La información espacial aquí consignada no reemplaza un levantamiento topográfico, pero sirve como soporte de la ubicación y extensión de las actividades de perfilado, cuneteo y compactación ejecutadas.


CUCHICUTE ALTO

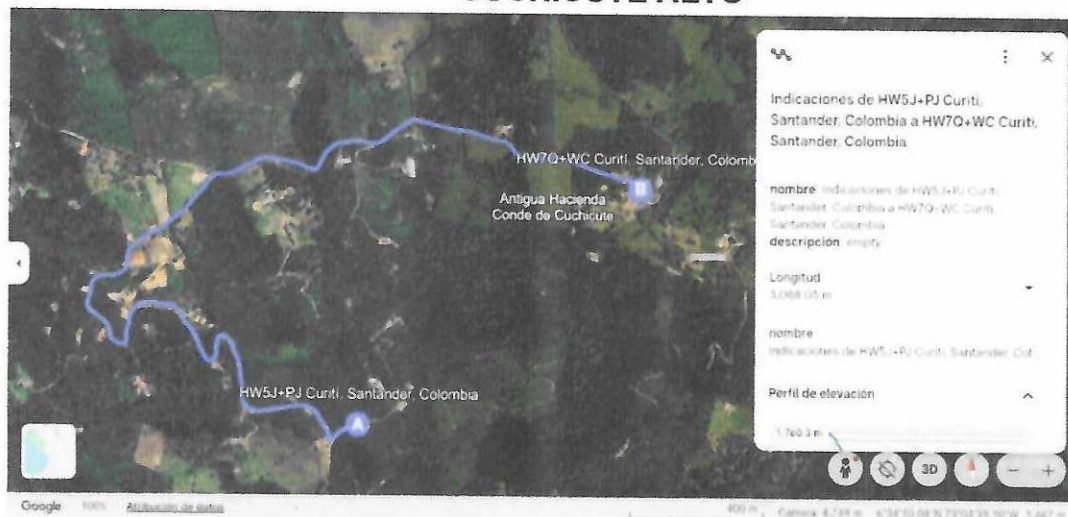

CUCHICUTE BAJO

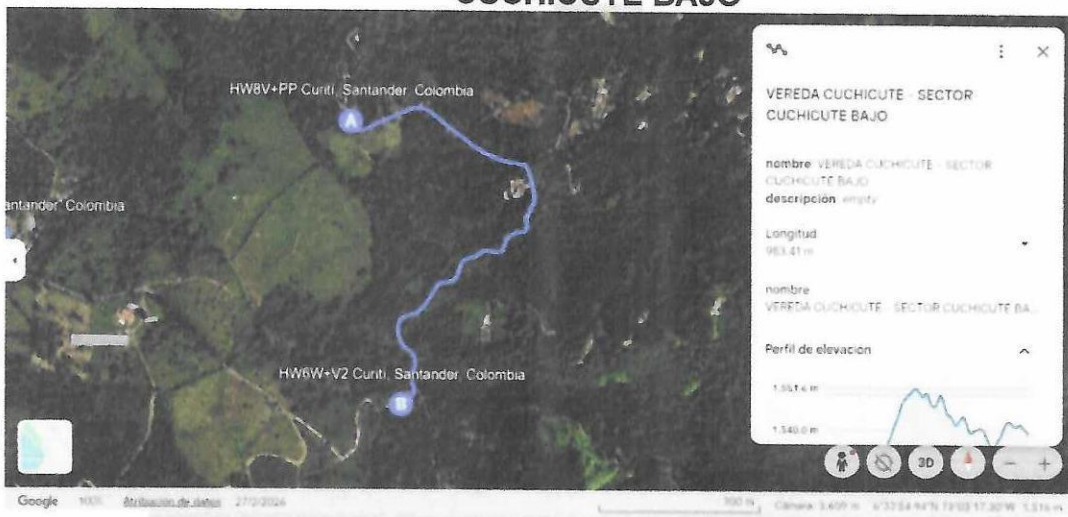

CUCHICUTE PARTE ALTA VEREDA ALTERNA AL TABOR

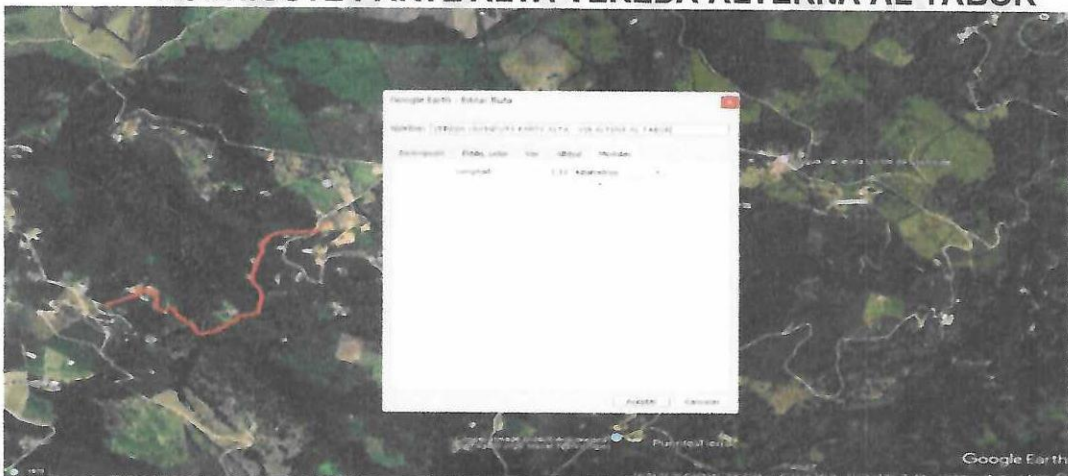

SECTOR COMUNITARIO SAN CARLOS

HWX3+04 Cúnti, Santander, Colombia



PALO CORTADO

HX2J+W5 Cúnti, Santander, Colombia



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de labores de mantenimiento vial en la red terciaria del municipio de Cúnti, Santander, con el propósito de mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad en los caminos rurales que comunican las diferentes veredas y sectores del municipio.

Las actividades principales incluyen el perfilado y cuneteo de puntos críticos de la malla vial, así como la intervención con maquinaria pesada y aplicación de material de subbase para estabilizar y rehabilitar los tramos afectados por el deterioro y la erosión. Estas labores

se realizarán de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, estudios previos y presupuesto oficial aprobados.

El contrato fue adjudicado a la empresa IDECOB SAS, seleccionada mediante un proceso de selección abreviada de menor cuantía (SAMC-004-2026). El proyecto cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal, respaldada por el CDP N.º 26-00155 del 04 de marzo de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, y se encuentra incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Banco de Programas y Proyectos del municipio.

Con la ejecución de este contrato, el Municipio de Curití busca fortalecer la infraestructura vial rural, facilitando el acceso a los servicios básicos, el transporte de productos agrícolas y la integración entre comunidades, contribuyendo así al desarrollo social, económico y territorial del municipio.

2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Durante la ejecución del proyecto se suscribieron diferentes actas, de acuerdo a la necesidad que surgiera, con el fin de dejar plasmado en ellas todos los por menores de la obra, es así, como existen en la actualidad las siguientes actas suscritas:

No.	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Acta de inicio	05 de mayo del 2026
2	Acta de Pago Parcial No. 1	22 de mayo del 2026

3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Durante el desarrollo del contrato en mención no se han presentado modificaciones ni ajustes algunos a las cantidades iniciales.

En el presente periodo se ha ejecutado un **avance parcial del 36,97%**, para un **avance consolidado total del 82,79%** de todas las obras contratadas por parte del contratista y recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Las actividades contractuales ejecutadas para esta acta según el presupuesto son:

		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL N.01			CANTIDADES A COBRAR ACTA PARCIAL N.02		
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% AVANCE	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% AVANCE
1.1	PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L= 13,00 KM Aprom = 4,50m)	M2	45.000,00	\$ 608,00	\$ 27.360.000,00	0,00	\$ 0,00	0%	45.000,00	\$ 27.360.000,00	100%
1.2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.281,54	\$ 233.518,00	\$ 299.262.421,00	640,77	\$ 149.631.210,50	50%	400,00	\$ 93.407.200,00	31%
VALOR TOTAL					\$ 326.622.421,00		\$ 149.631.210,50	45,81%		\$ 120.767.200,00	36,97%

4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

El contratista realizó las siguientes actividades:

- ✓ Permanente comunicación con la administración municipal y supervisión.
- ✓ El personal calificado del contratista estuvo en permanente comunicación con el residente de obra para validar la ejecución de todas las actividades técnicas.
- ✓ Se llevó actualizado el archivo documental del proyecto.
- ✓ Gestión para el cumplimiento del programa de obra presentado.
- ✓ Verificación y control del pago de seguridad social del personal.

4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:

En el transcurso de este periodo se ejecutó el proyecto con recursos propios, el acta a pagar en este informe corresponde al 36,97% de avance parcial.

5. AVANCE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO:

Desde el 22 de mayo hasta el 17 de julio de 2026, se ha ejecutado un avance parcial del 36,97% y un avance consolidado total del 82,79% de las actividades contratadas del proyecto cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE”.

6. OBSERVACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN

La ejecución de la obra se ha desarrollado de acuerdo al cronograma de actividades, no se han presentado mayores lluvias que puedan afectar la ejecución de las actividades programadas de acuerdo a cronograma de obra, lo que ha permitido tener un avance consolidado a la fecha del 82,79%.

7. RELACIÓN DE EQUIPO EN OBRA:

Para las diferentes actividades se han utilizado las siguientes herramientas y equipos:

Herramienta y Equipo	Cantidad
VOLQUETAS	4
MOTONIVELADORA	1
VIBRO COMPACTADOR	1
HERRAMIENTA MENOR	2

8. BALANCE FINANCIERO:

El balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	\$326.622.421,00	
Valor Ejecutado Acta Pago Parcial N.1		\$ 149,631,210,50
Porcentaje Ejecutado Acta Parcial N.1		45,81 %
Valor Ejecutado Presente Acta		\$ 120.767.200,00
Porcentaje Ejecutado Presente Acta		36.97%
Valor Sin Ejecutar		\$ 56.224.010,50
SUMAS IGUALES	\$326.622.421,00	\$326.622.421,00

9. RELACIÓN DE PAGOS

Valor Ejecutado Acta Parcial N.1	\$ 149,631,210,50
Valor ejecutado Acta Anterior	\$0,00
Menos saldo amortización anticipo	\$ 0,00
Valor Ejecutado Presente Acta	\$ 120.767.200,00
Valor a Pagar Presente Acta	\$ 120.767.200,00


En constancia, el presente informe parcial No. 2, se firma a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026, en Curitiba - Santander.




ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON
R.L. IDECOB SAS
NIT: 901.850.692-1
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO No. 1


MEMORIAS DE CÁLCULO

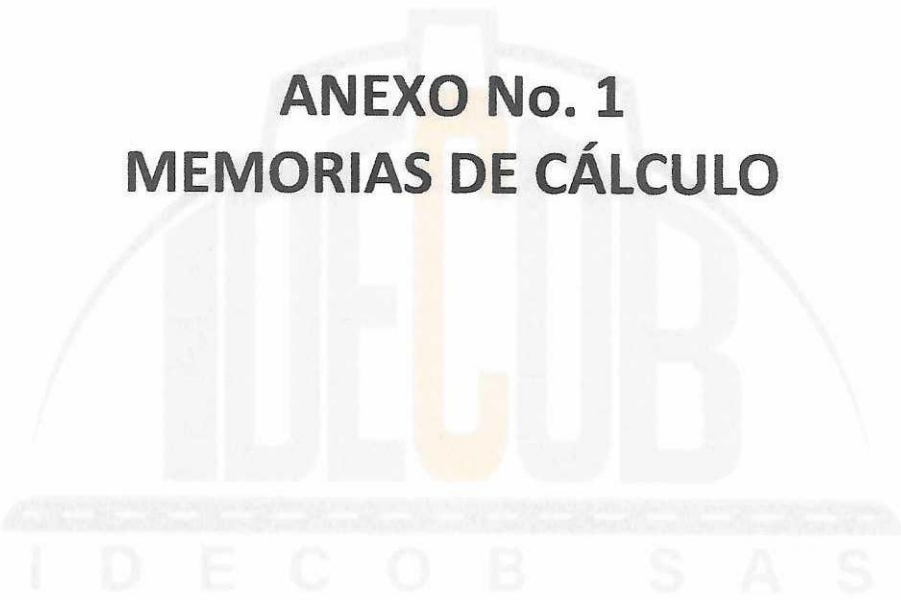



		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL N.01				CANTIDADES A COBRAR ACTA PARCIAL N.02				CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% AVANCE	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% AVANCE	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% PENDIENTE			
1,1	PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L ≈ 13,00 KM Aprom ≈ 4,50m)	M2	45.000,00	\$ 608,00	\$ 27.360.000,00	0,00	\$ 0,00	0%	45.000,00	\$ 27.360.000,00	100%	0,00	\$ 0,00	0%			
1,2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1.281,54	\$ 233.518,00	\$ 299.262.421,00	640,77	\$ 149.631.210,50	50%	400,00	\$ 93.407.200,00	31%	240,77	\$ 56.224.010,50	19%			
VALOR TOTAL					\$ 326.622.421,00		\$ 149.631.210,50	45,81%		\$ 120.767.200,00	36,97%		\$ 56.224.010,50	17,21%			





ING. SERGIO ANDRÉS MARTÍNEZ AGÓN
CONTRATISTA



ING. NICOLÁS PENADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CURITI

FECHA	21	MM	7	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORO	IDECOB SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRITICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE								
SUPERVISOR	NICOLAS PEINADO VANEGAS			CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			MUNICIPIO	CURITI - SANTANDER
CONTRATISTA	IDECOB SAS			NIT O C.C.	901.850.692-1			CONTRATO N°	111 DE 2026
ITEM	PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA (L ≈ 13,00 KM Aprox ≈ 4,50m)				UNID.	M2	UBICACIÓN	CURITI	
	Localización	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL			
	CUCHICUTE SECTOR ALTO	2000,00	4,50			9,000,00			
	CUCHICUTE BAJO	3000,00	4,50			13,500,00			
	CUCHICUTE VIA ALTERNA AL TABOR	1000,00	4,50			4,500,00			
	PALO BLANCO SECTOR COMUNITARIO SAN CARLOS	2500,00	4,50			11,250,00			
	PALO CORTADO	1500,00	4,50			6,750,00			
Subtotal					45,000,00				
TOTAL					45,000,00				
OBSERVACIONES:									
CONTRATISTA	 ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON IDECOB SAS				 ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE CURITI SUPERVISOR				

FECHA	21	MM	7	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	IDECOB SAS		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE										
SUPERVISOR	NICOLAS PEINADO VANEGAS				CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				MUNICIPIO	CURITÍ - SANTANDER
CONTRATISTA	IDECOB SAS				NIT O C.C.	901.850.692-1				CONTRATO N°	111 DE 2026
ITEM	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C				UNID.	M3	UBICACIÓN		CURITI		
					Localización		Dimensiones		TOTAL		
					LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD			
					VEREDA CUCHICUTE SECTOR ALTO Y BAJO	950.00	4.50	0.02	85.50		
					SECTOR TIRAPAZA	810.00	4.50	0.02	72.90		
					SECTOR SAN CARLOS	900.00	4.50	0.02	81.00		
					SECTOR LA LAJA - ARBOL SOLO	940.00	4.50	0.02	84.60		
					VEREDA PALO CORTADO	844.40	4.50	0.02	76.00		
OBSERVACIONES:					Subtotal				400,00		
CONTRATISTA					Supervisor		TOTAL		400,00		
 ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON IDECOB SAS					 ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE CURITÍ SUPERVISOR						

ANEXO No. 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO




**PERFILADO Y CUNETEO DE LA CALZADA EXISTENTE MEDIANTE EL USO
DE MOTONIVELADORA (L $\approx$ 13,00 KM Aprom $\approx$ 4,50m)**















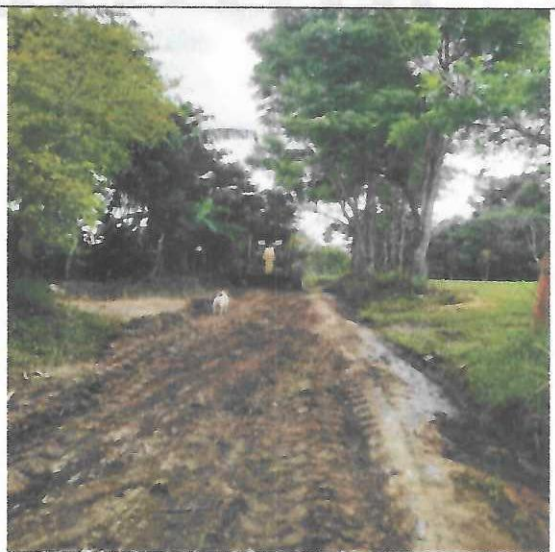





SUMINISTRO, EXTENDIDO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO SUBBASE GRANULAR CLASE C




CUCHICUTE BAJO, ALTO Y TIRAPAZA

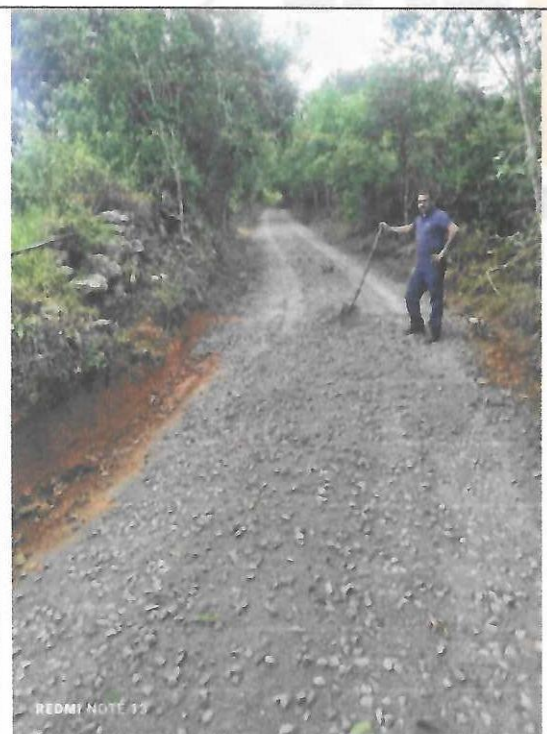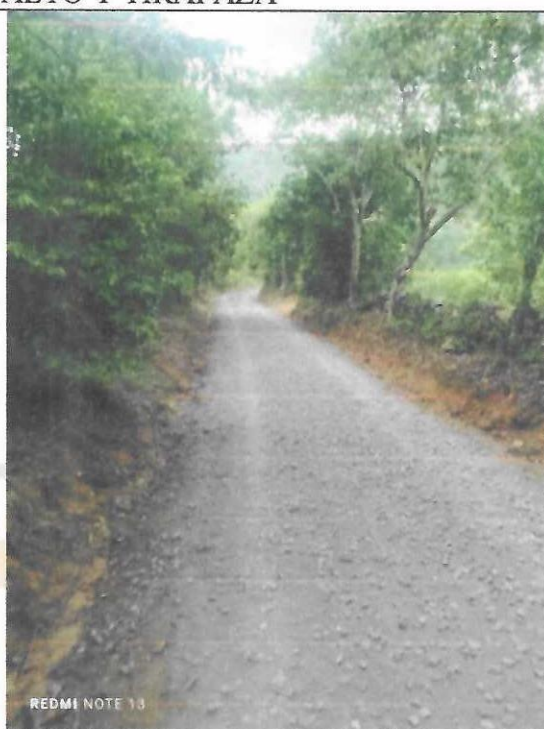

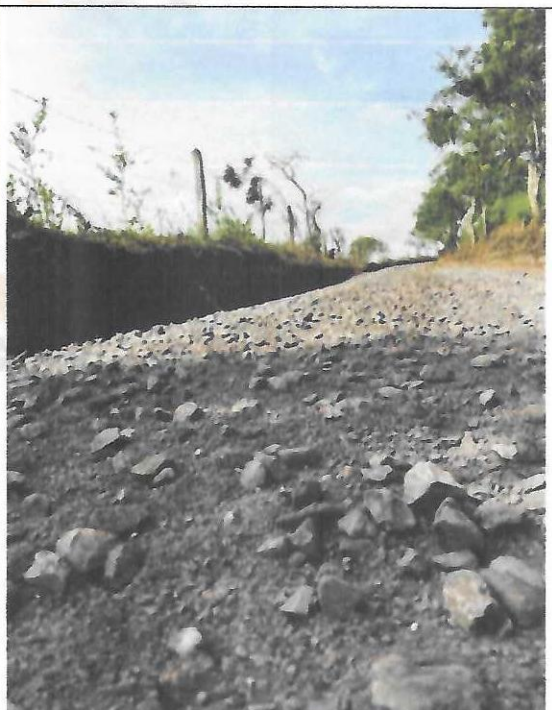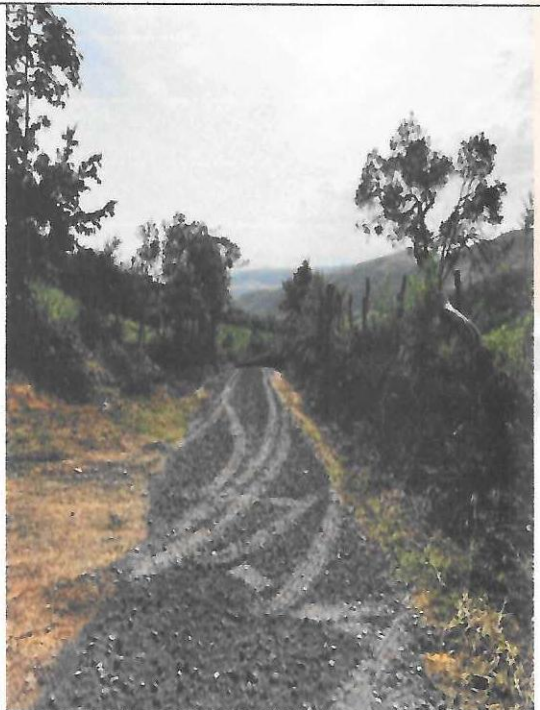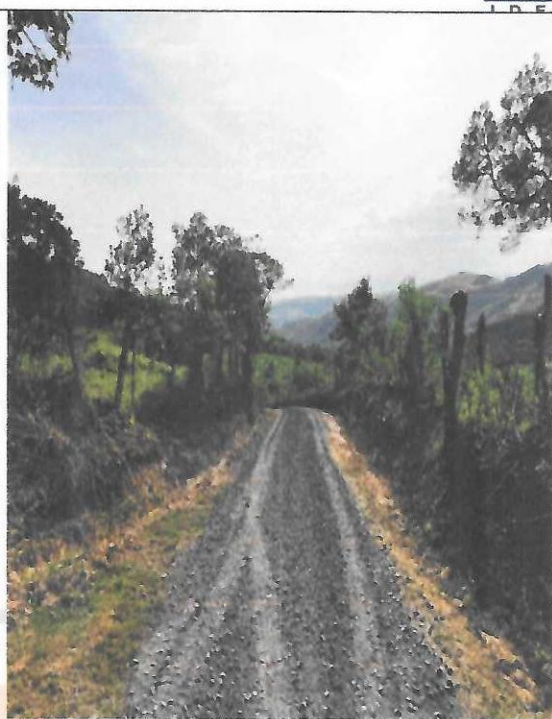

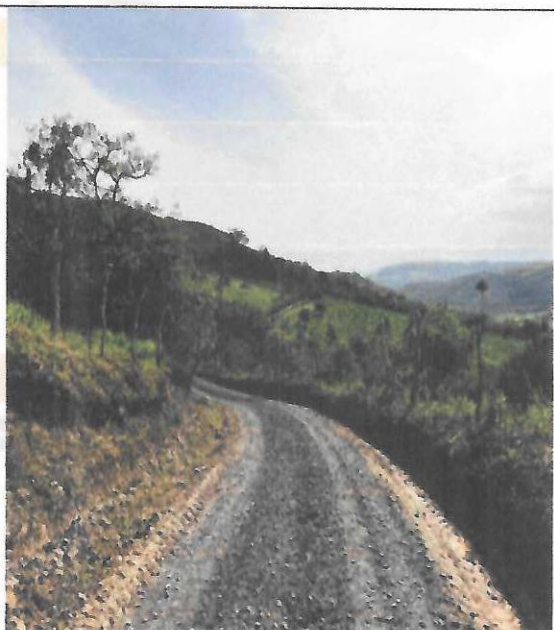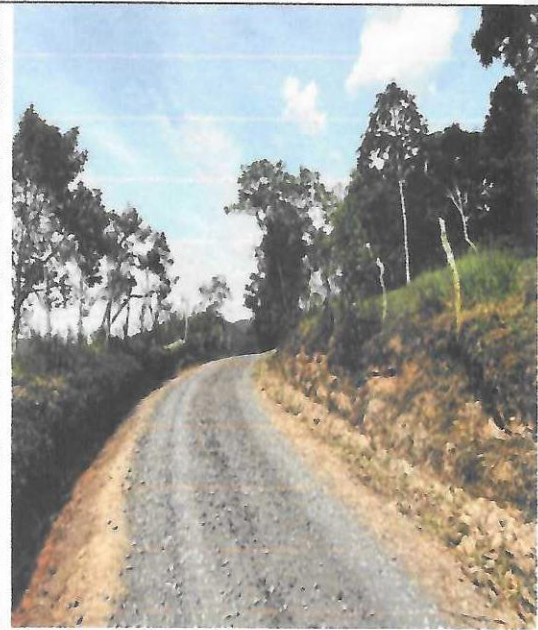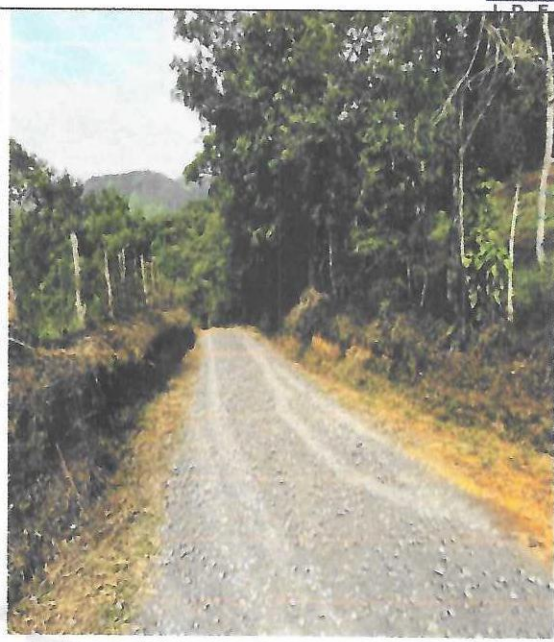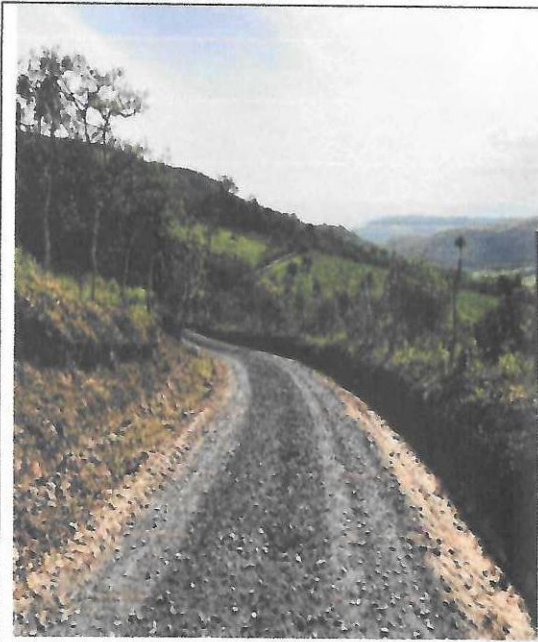

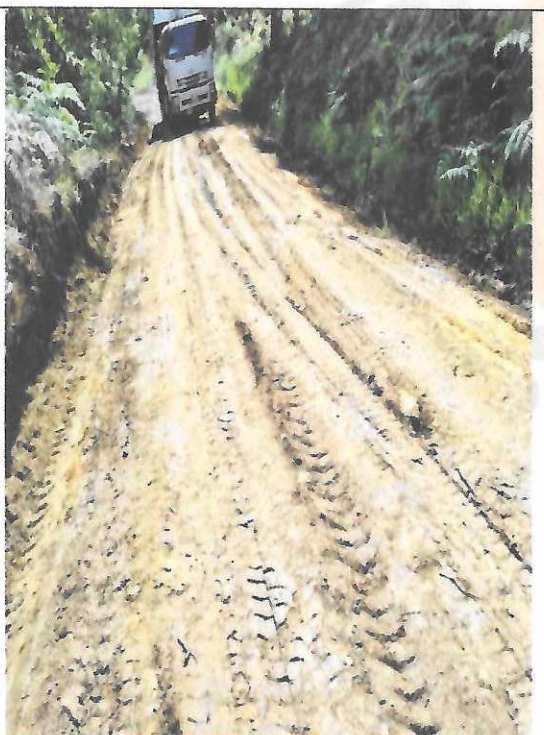
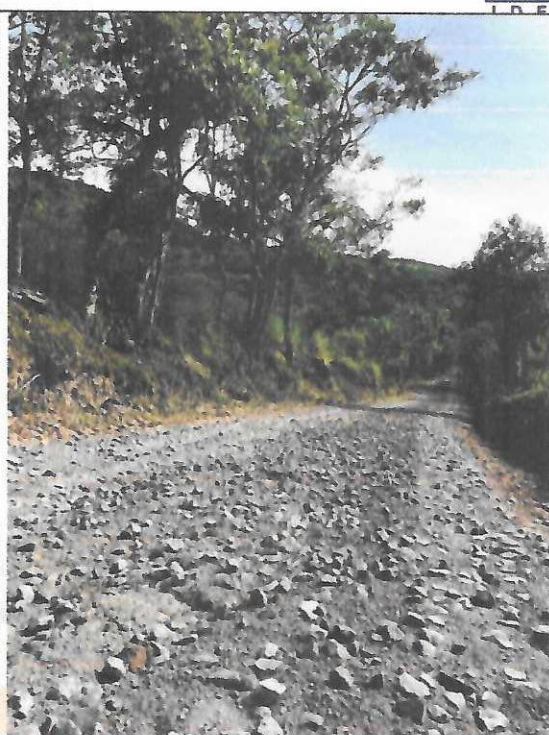
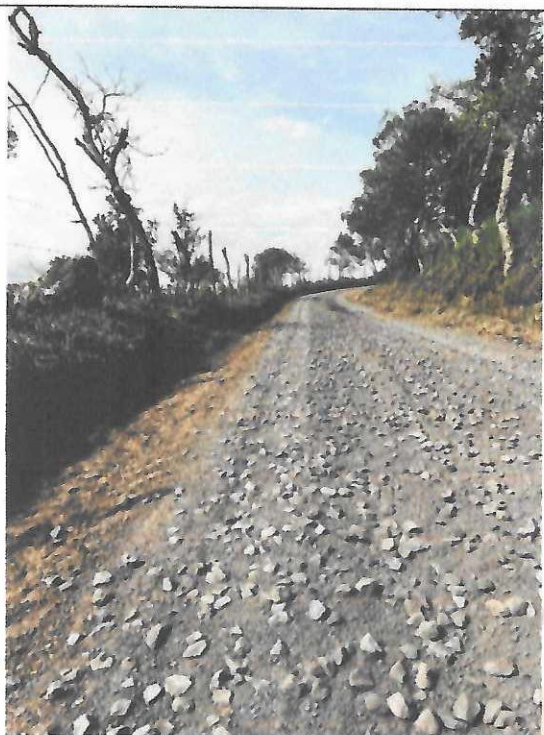



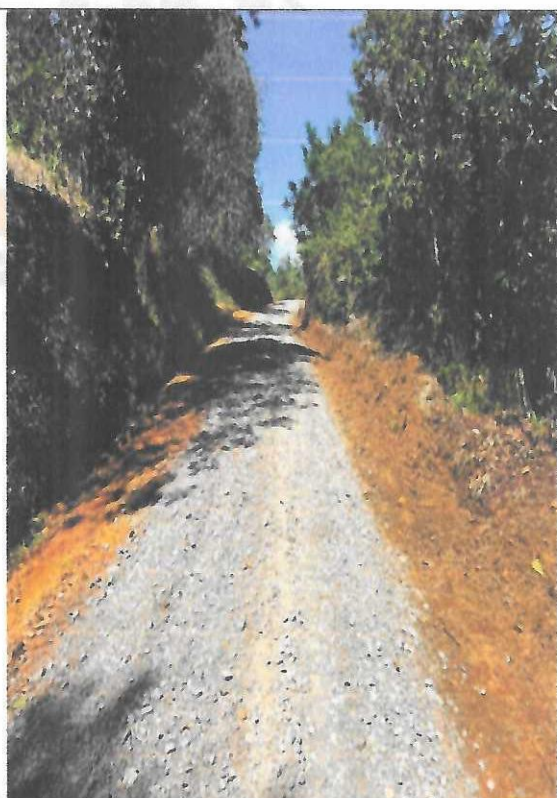
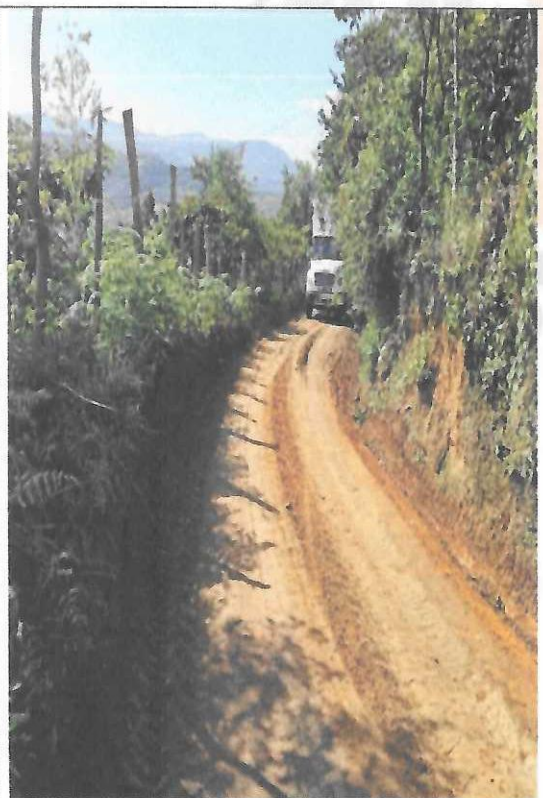
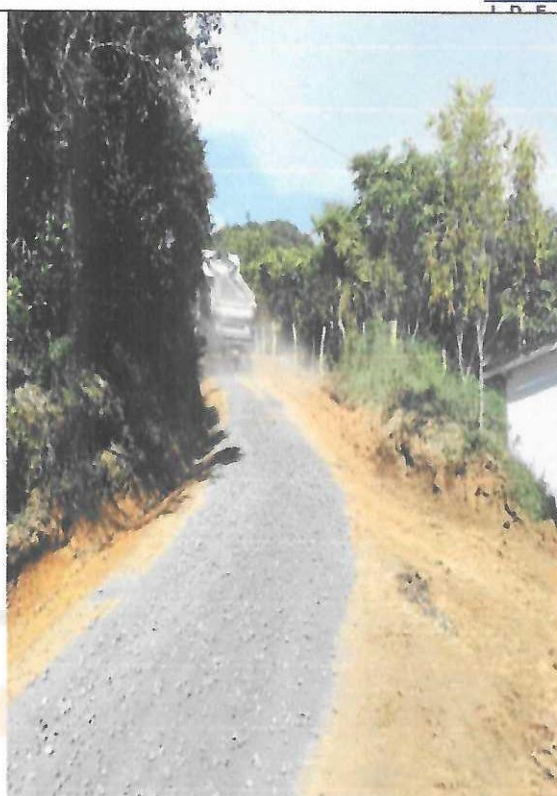




VEREDA PALO CORTADO






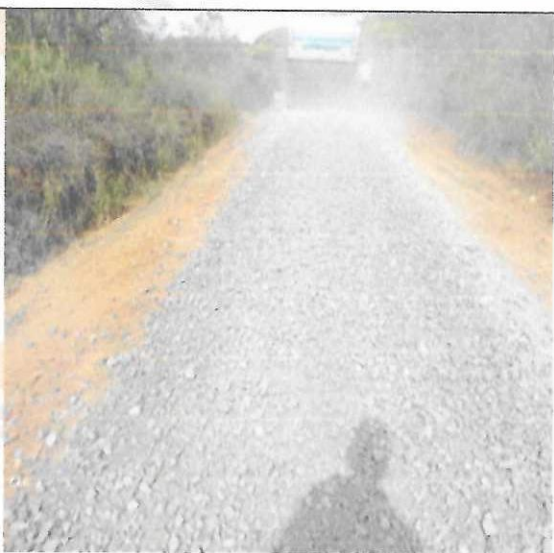
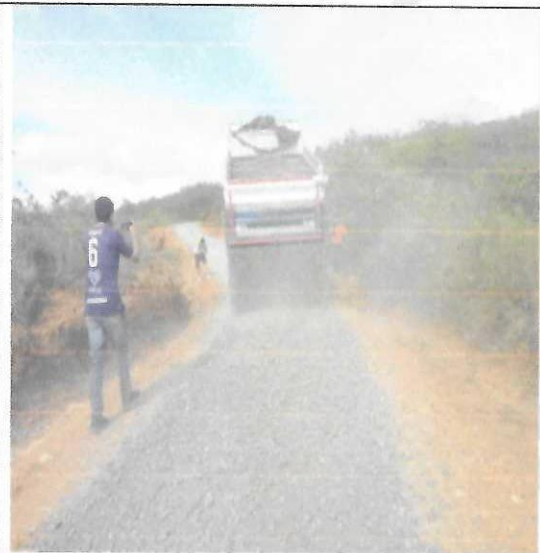
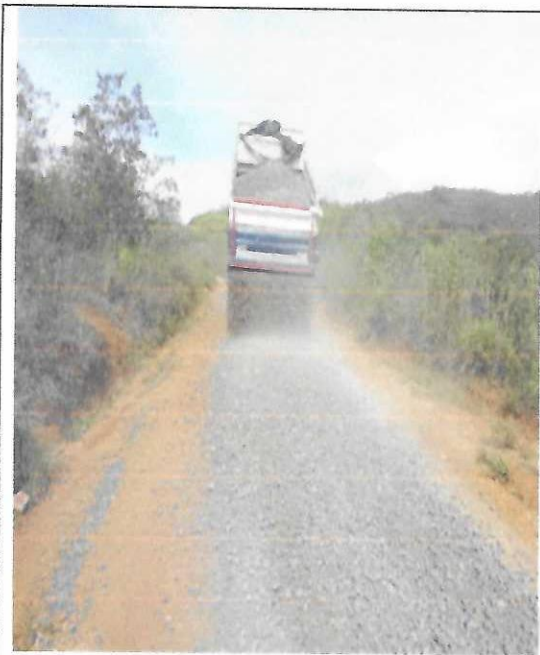


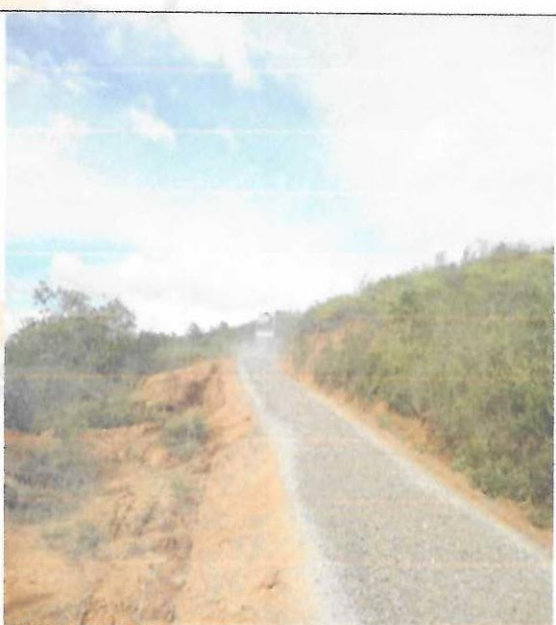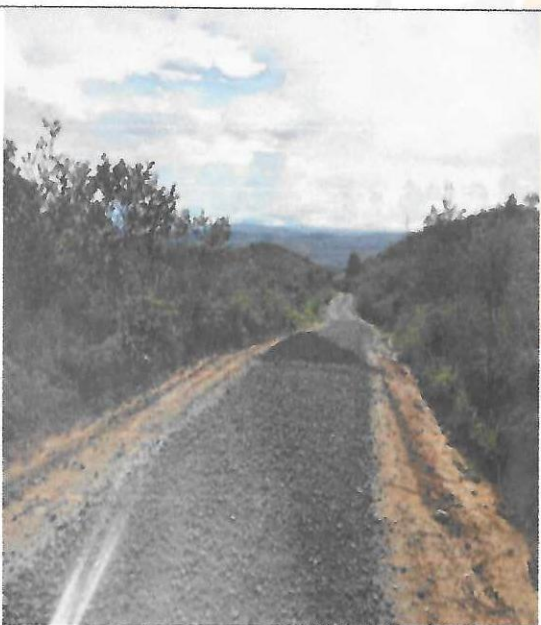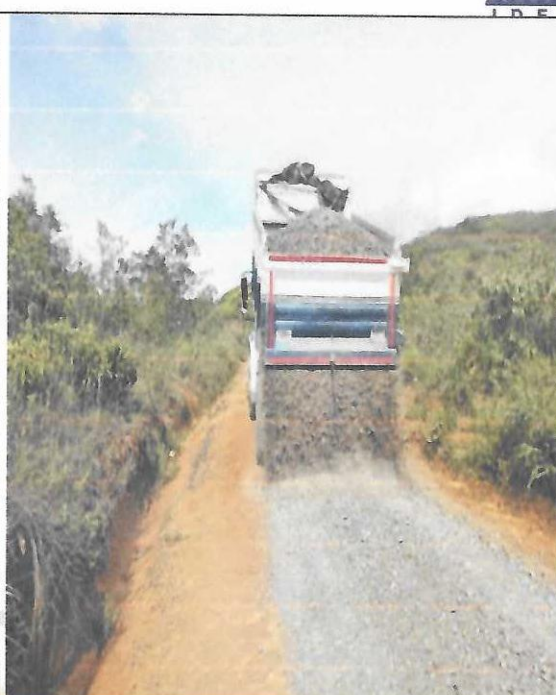
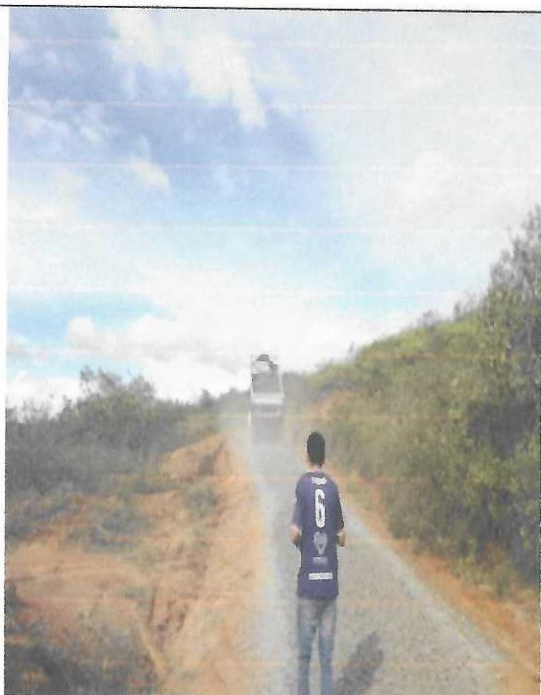


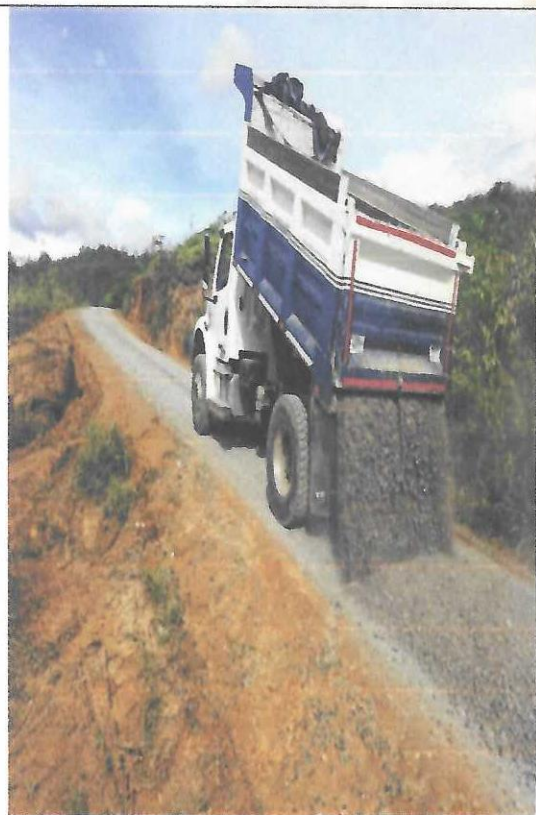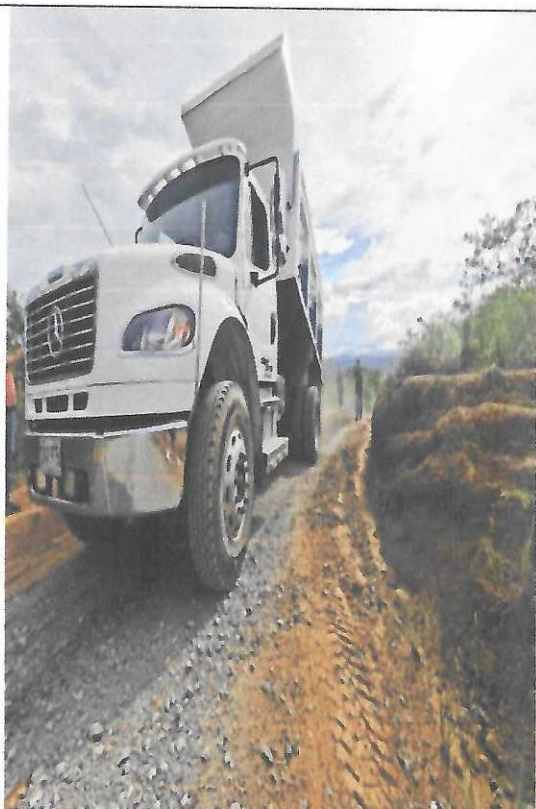





SECTOR LA LAJA – ARBOL SOLO


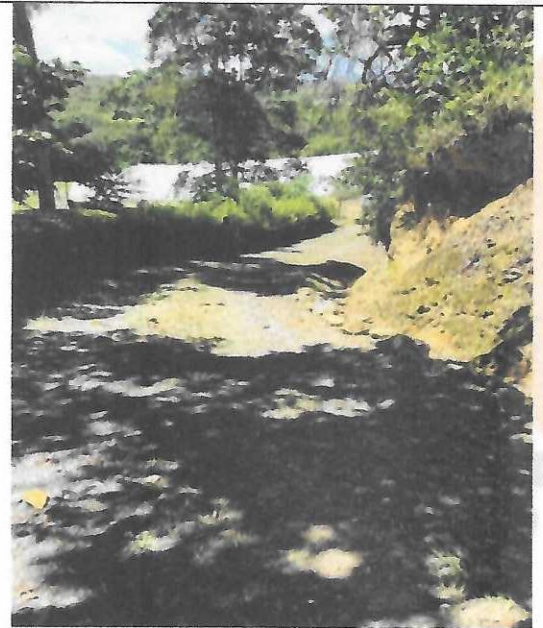


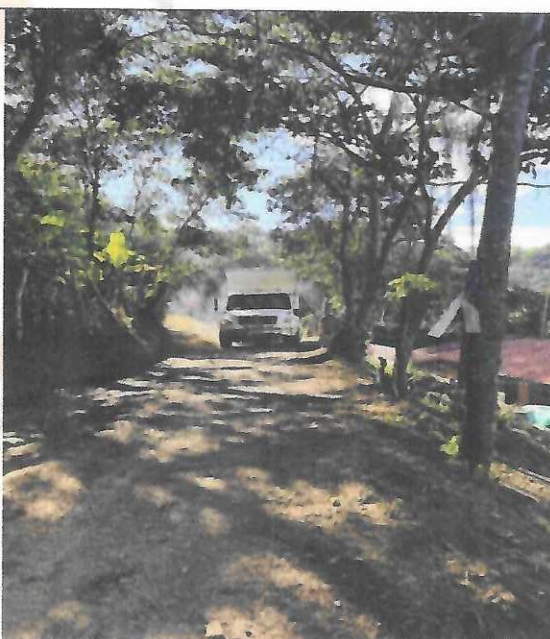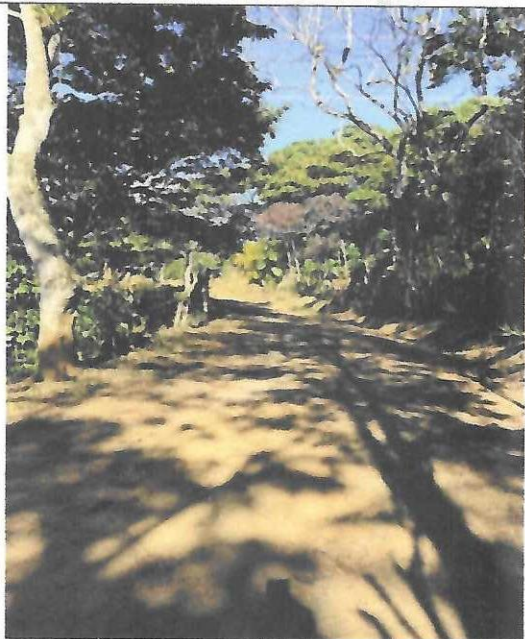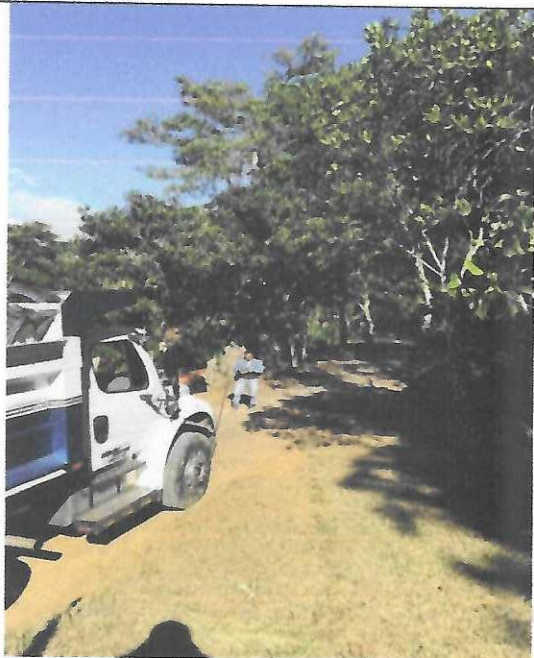

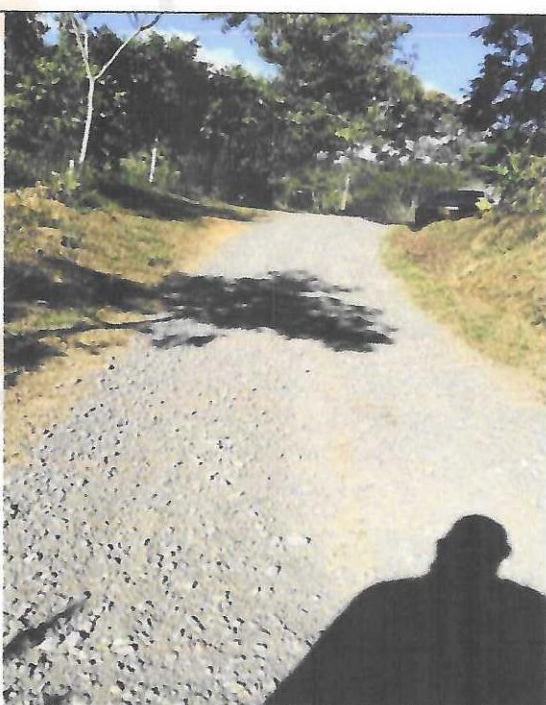
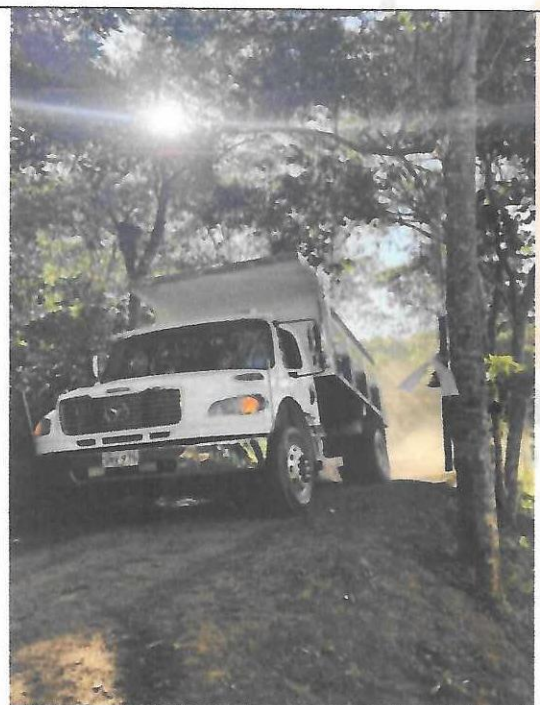



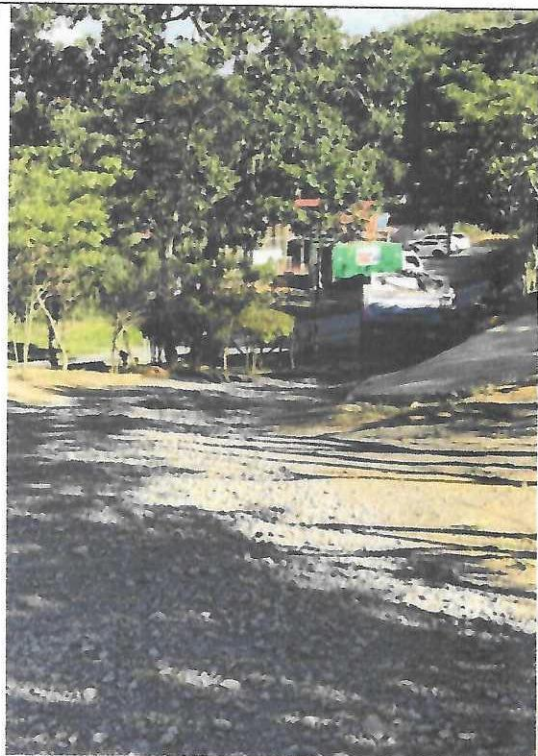


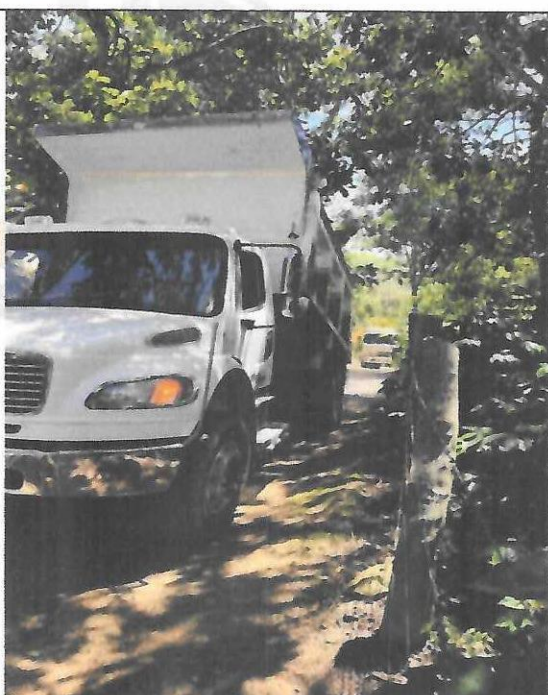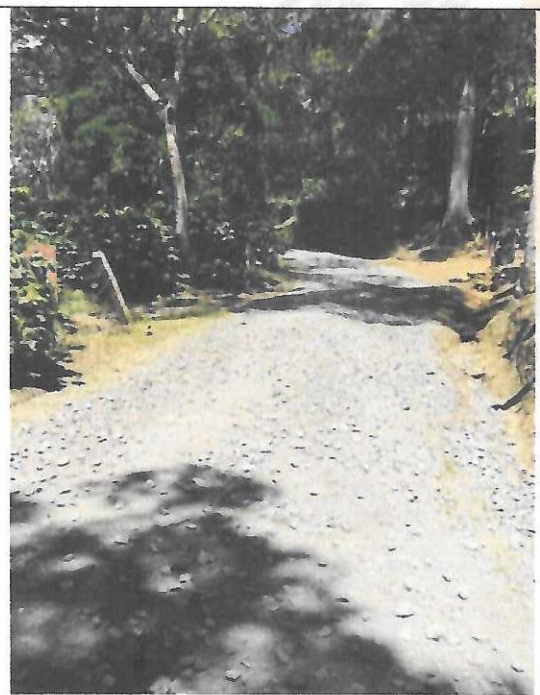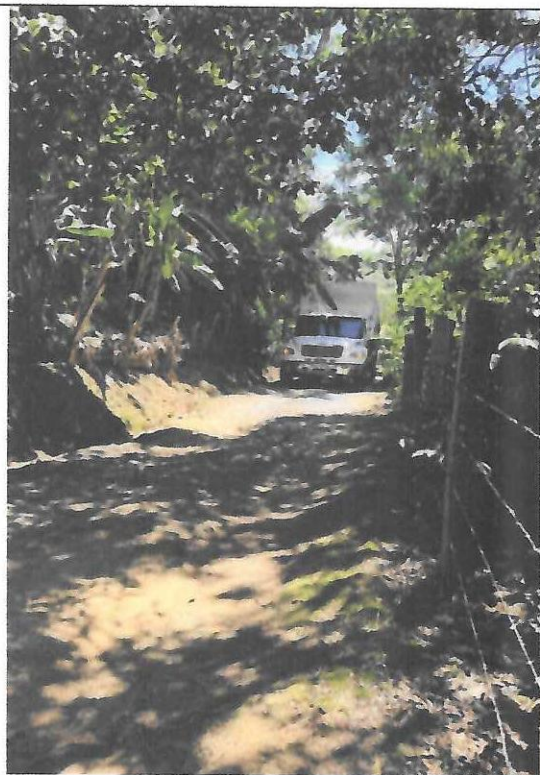


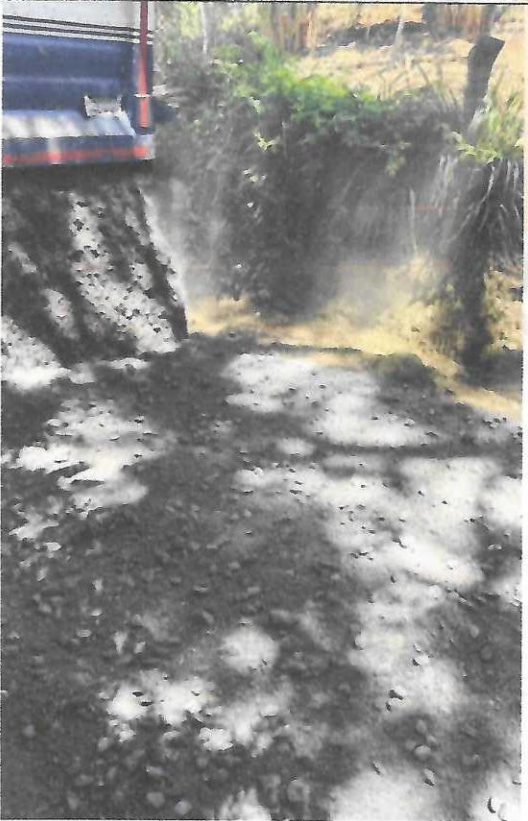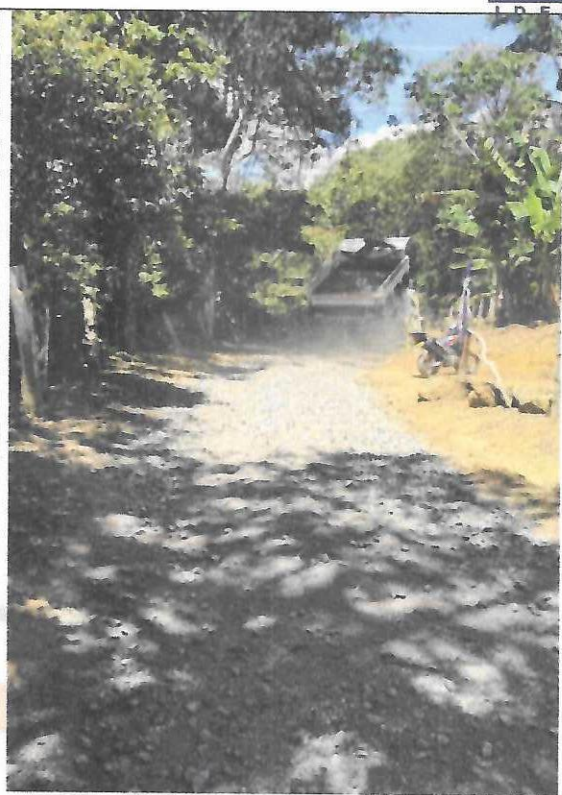

SECTOR COMUNITARIO SAN CARLOS

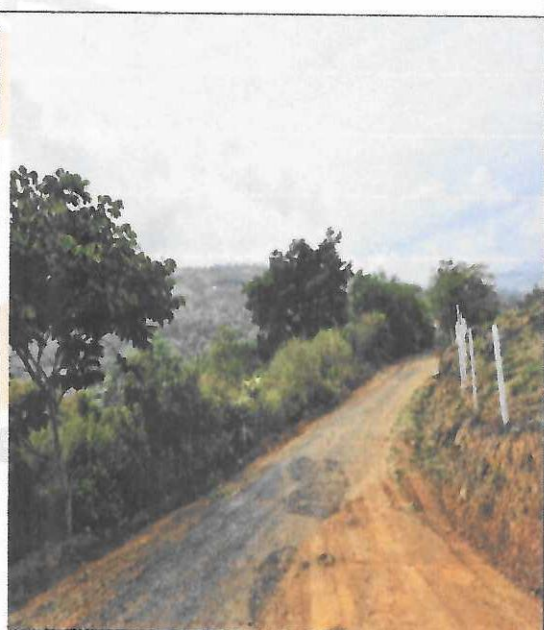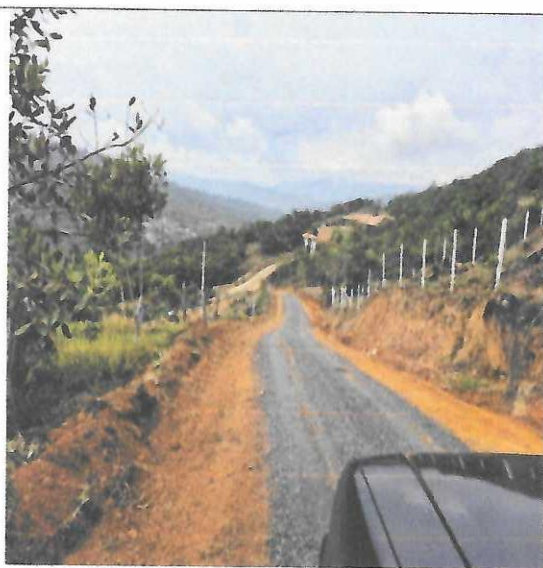

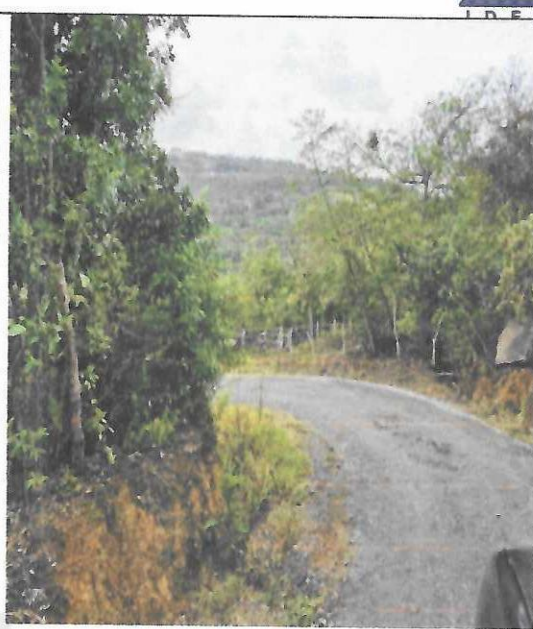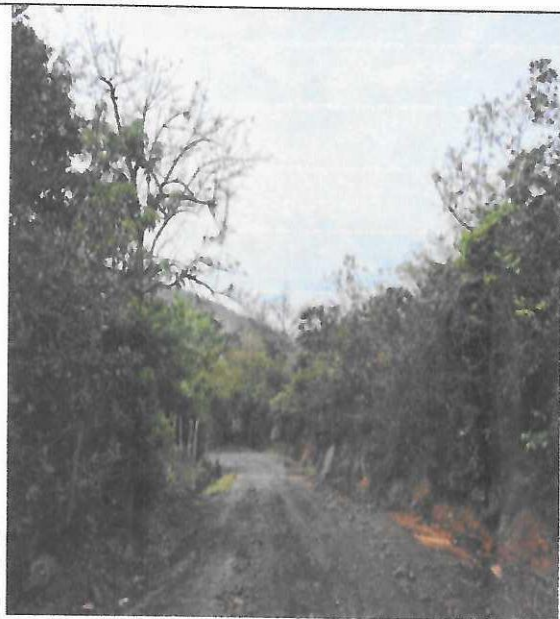

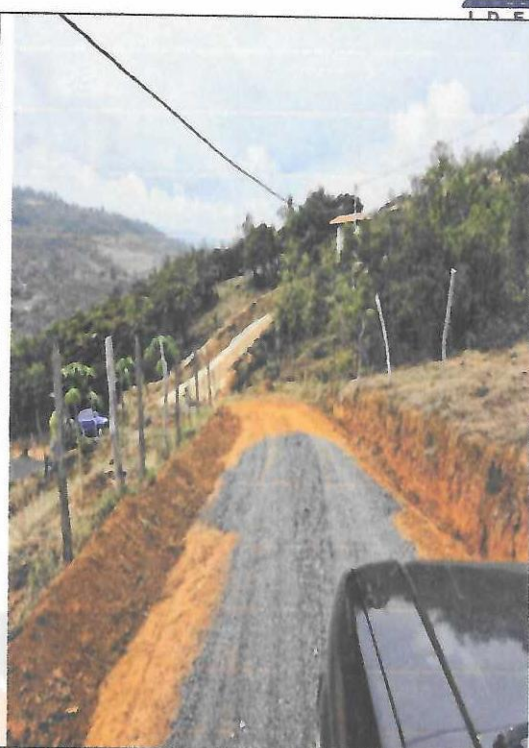

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.098.759.675 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de IDECOB SAS identificada con Nit 901.850.692-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MARLENE NOVA MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 37.658.200 de San Vicente de Chucuri y con Tarjeta Profesional No. 135597 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de IDECOB SAS identificada con Nit 901.850.692-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Curití, a los DIECISIETE (17) días del mes de Julio de 2026.



SERGIO ANDRÉS MARTÍNEZ AGÓN
CC No: 1.098.759.675 Bucaramanga
R/L: IDECOB
Nit: 901.850.692-1



MARLENE NOVA MARTINEZ
CC No: 37.658.200 San Vicente de Chucuri
Contador Público T.P: 135597-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

135597-T

MARLENE
NOVA MARTINEZ
C.C. 37658200

RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 145649




FECHA 03/07/2008

FIRMA DEL TITULAR

58447

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
37.558.200

NOVA MARTINEZ
APELLIDO

MARLENE
NOMRE





FECHA DE NACIMIENTO
26-MAY-1972
SAN VICENTE DE CHUCURI
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.45
O+


ESTATURA
G.S. RH
SEXO
F

12-SEP-1990 SAN VICENTE DE CHUCURI

FECHA Y LUGAR DE EMISION



NOSE DERECHO





Certificado No:

3 5 9 6 1 7 3 F C 4 1 7 B 3 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARLENE NOVA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37658200 de SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 135597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901850692-1	IDECOB SAS	VEREDA LLANO DE NAVAS-FINCA VILLA
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO
UNICA		A - Más de 200 cot	SANTANDER
CORREO		CIUDAD / MUNICIPIO	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		CURITI	
SI			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS037	Nueva EPS	900150204-2	120.000
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Porvenir	800224608-8	280.200
25-14	Compensaciones	900336004-7	460.000

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SURA	800903780-5	227.100

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre
CCF39	Cajasan

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		93180838	02/07/2026	2
PERIODO PENSIÓN	2026-06	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-07		E	\$4.750.505	\$1.367.500

TOTALES PENSIÓN			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS037	Nueva EPS	900150204-2	120.000
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Porvenir	800224608-8	280.200
25-14	Compensaciones	900336004-7	460.000

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SURA	800903780-5	227.100

Código CCF	Nombre
CCF39	Cajasan

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	190.100	190.100
Pensión	2	750.200	750.200
Riesgos Laborales	1	227.100	227.100
CCF	1	190.100	190.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.367.500	1.367.500

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901850692-1	IDECOB SAS	VEREDA LLANO DE NAVAS FINCA VILLA	3112202351	idecobas@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	A - Más de 200 cot			SANTANDER	CURITI	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (CALENDARIO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (CALENDARIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93160998	02/07/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$4,750,905	\$1,367,900	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
Tipo y Número de identificación	Asellidos y Nombres de identificación	Cotizante	Subgrupo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado		
																														Exonerado	Exonerado
CC	MARTINEZ AGON SENC O	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CC	APARICIO ANGARTIA JHON ALEXANDER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CONTRIO
NI	901850692-1	IDECOB SAS		VEREDA LLANO DE NAVAS FINCA VILLA	3112202351	idecobasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		código	DEPARTAMENTO	
ÚNICA	A - Más de 200 cdt				SANTANDER	
						CURTI
						SI

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS037	Nueva EPS	900156284-2
ESSC24	EPS-S Coosolid	900226715-3
		120 000
		70 100

TOTALES PENSIÓN

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	227 100				227 100	0	0	227 100			2.271	227 100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	190.100	0	0	190.100	2

TOTALES PARAFISCALES

TOTALS FROM SCHEDULE					No. Aliados
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
				SENA	
0	0	0	0		0
				ICBF	
0	0	0	0		0
				ESAP	
				IMEN	

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y MORA	Total a Pagar
	Salud	2	190,100	190,100
	Pensión	2	760,200	760,200
	Riesgos Laborales	1	227,100	227,100
	CCF	1	190,100	190,100
	ESAP	0	0	0
	ICBF	0	0	0
	MEN	0	0	0
	SENA	0	0	0
	TOTALES	6	1,367,500	1,367,500

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901850692-1	IDECOB SAS	VEREDA LLANO DE NAVAS-FINCA VILLA
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CODIGO
ÚNICA		A - Más de 200 cot	

DATOS DEL APORTANTE			
TELÉFONO	CORREO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
3112202351	idecobas@gmail.com		
CIUDAD / MUNICIPIO			
CURITI			
SANTANDER		SI	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	CANTIDAD EMPLEADOS
		93530610	22/07/2026	2
PERIODO SALUD				CANTIDAD UPC
2026-08				0
PERIODO PENSION				TOTAL A PAGAR
2026-07				\$1,367,900
TOTAL NÓMINA				\$4,750,905
E				

TALLE POR COTIZANTE

Tipo y Número de Identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION		SALUD		RIESGOS LABORALES					CCF		PARAFISCALES				
	Anellidos y Nombres	Celular	Correo	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente	Excedente
CC	MARTINEZ ACON SERGIO	1	0	S																								
CC	APARICIO ANGARTIA JHON ALEXANDER	1	0	S																								



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ

CÓDIGO: CT-GD-004

VERSIÓN: 4

FECHA MOD: 13-febrero de
2020.

PAGINA: 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA DE PAGO PARCIAL No.2

CONTRATO:	111-2026		
PROCESO	SAMC-004-2026		
FECHA DEL CONTRATO:	30 de abril de 2026		
CONTRATISTA:	IDECOB S.A.S. identificado con NIT 901.850.692-1, con Representante Legal SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS Secretario de Planeación Municipio de Curití		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIAIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE"		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS (\$326.622.421,00) M/CTE		
VALOR TOTAL (RUBRO)	RUBRO	VALOR	PORCENTAJE %
	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	\$326.622.421,00	100%
ANTICIPO INICIAL:	N.A.		
MODALIDAD DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del Contrato al Contratista de la siguiente manera: El Noventa y cinco por ciento (95%) por Actas Parciales de avance, una vez sean presentados los informes mensuales y la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE y el Supervisor por parte del MUNICIPIO y el cinco (5%) al Acta de Recibo Final, previo el Informe de ejecución debidamente soportado con material fotográfico por parte del Contratista con el aval del Supervisor del Contrato. para el pago final se requiere del Acta de Liquidación, la cual deberá ser concordante con el plan general de inversiones. Previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, y certificación de cumplimiento por parte del Supervisor, que para el presente será el titular de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Curití. Todo pago Parcial o final y los cheques que se giren requerirán para		

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CÓDIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; contactenos@curiti-santander.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ

CÓDIGO: CT-GD-004

VERSIÓN: 4

FECHA MOD: 13-febrero de 2020.

PAGINA: 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL

ser pagados la firma del Tesorero del Municipio, el Supervisor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado por el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los Aportes a los Sistemas de Salud, Pensión ARP y Parafiscales.

PARÁGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que, por conducto de la Tesorería del Municipio, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

PARÁGRAFO TERCERO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO y en caso de ser recursos girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos

PLAZO INICIAL:

El plazo para la ejecución será de **TRES (03) MESES** contados a partir de la fecha en que se firma el acta de inicio.

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CÓDIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; contactenos@curiti-santander.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ

CÓDIGO: CT-GD-004

VERSIÓN: 4

FECHA MOD: 13-febrero de 2020.

PAGINA: 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL

PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
ACTA DE REINICIO:	N.A.
VALOR CDP:	TRECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS (\$326.622.421,00) M/CTE, respaldado con los CDP: 26-00154 DEL 04 DE MARZO DEL 2026 bajo el rubro: 2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2026
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PERIODO DE PAGO	DEL VEINTIDOS (22) DE MAYO AL DIECISIETE (17) DE JULIO DEL 2026

En Curití, Santander a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026, se reunieron en la Secretaría de Planeación, el **ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS** secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisor del Contrato de Obra Pública N° 111-2026 del proceso SAMC-004-2026, e **IDECOB SAS** identificada con NIT 901.850.692-1 con Representante Legal **SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.759.675 de Bucaramanga, en calidad de Contratista, con el fin de realizar la presente **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2** del Contrato de Obra Pública N° 111-2026 del proceso SAMC-004-2026, donde se incluyen las actividades realizadas durante el periodo de pago mencionado.

CONSIDERANDO

- Que, el Contratista de Obra, presentó ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura, el informe de obra, para el Acta de Pago Parcial No. 2 del Contrato de Obra Pública No. 111-2026 del 30 de abril de 2026 del proceso SAMC-004-2026, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE" con el cual se soporta el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
- Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato y las indicaciones del supervisor, acatando cada una de las observaciones y peticiones del municipio y la comunidad.

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CÓDIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; contactenos@curiti-santander.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ

CÓDIGO: CT-GD-004

VERSIÓN: 4

FECHA MOD: 13-febrero de 2020.

PAGINA: 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL

3. SOPORTE FINANCIERO:

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP N°	26-00154	04 DE MARZO DE 2026	\$ 326.622.421
RP N°	26-00487	05 DE MAYO DEL 2026	\$ 326.622.421

4. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITÍ	\$ 326.622.421,00
TOTAL DE CONTRATO	\$ 326.622.421,00

5. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial N.2, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL N.2	\$120.767.200,00
TOTAL DE PAGOS	\$120.767.200,00

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
	\$326.622.421,00	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0.00	N/A	
VALOR ACTA PARCIAL N.1		2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	\$149.631.210,50
VALOR PRESENTE ACTA		2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	\$120.767.200,00
SALDO POR EJECUTAR			\$ 56.224.010,50
SUMAS IGUALES	\$326.622.421,00		\$326.622.421,00

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CÓDIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; contactenos@curiti-santander.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ	CÓDIGO: CT-GD-004
		VERSIÓN: 4
		FECHA MOD: 13-febrero de 2020.
		PAGINA: 1 de 1
ACTA DE PAGO PARCIAL		

7. Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Con las siguientes planillas: Junio - No. 93180898 con fecha de pago del 02/07/2026 y Julio – No. 93630610 con fecha de pago del 22/07/2026.
8. Que el porcentaje de ejecución acumulada corresponde al 82,79% de las actividades proyectadas, tanto en calidad como en cantidad.

ANEXOS

Ver anexos correspondientes al Acta de Pago Parcial No. 2 en donde se indica sus respectivas memorias de cantidades.


Por lo anteriormente expuesto, las partes involucradas en este proceso.

ACUERDAN

- Autorizar el **PAGO PARCIAL N.2** por la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$120.767.200,00) M/CTE..**
- Recibir a satisfacción las actividades de obra ejecutadas en la presente Acta del Contrato de Obra Pública cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOCRÍTICOS DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA Y MATERIAL DE SUBBASE" dejando constancia que el Contratista cumplió a cabalidad con las labores y actividades contempladas en el acta.

En constancia, se firma la presente Acta de Pago Parcial No.2, por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.


ING. NICOLÁS PEINADO VANEGAS
 SECRETARIO DE PLANEACION E
 INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


ING. SERGIO ANDRES MARTINEZ A.
 C.C 1.098.759.675 de Bucaramanga
 R.L. IDECOB SAS
 NIT: 901.850.692-1
CONTRATISTA DE OBRA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600483234

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO UIS
PRO HOSPITAL

\$ 2.415.300
\$ 2.415.300

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9018506921
Nombre IDECOB SAS SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709990020439(0020)02502600483234(3900)00000004830600(95)20260803

VALOR BASE \$ 120.767.200
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 326.622.421
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 120.767.200
FECHA CONTRATO 30/04/2026
NRO. CONTRATO 111
NUMERO ORDEN DE PAGO IDEC15

Total a Pagar \$ 4.830.600

Fecha de Expedición 2026/07/27

Fecha Límite de Pago 2026/08/03

Con destino a: Alcaldía de Curil



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600483234

PRO UIS \$ 2.415.300
PRO HOSPITAL \$ 2.415.300

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: Alcaldía de Curil

Tipo de Doc. NIT

Nombre: IDECOB SAS SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON

Dirección:

Número: 9018506921

Teléfono:

VALOR BASE \$ 120.767.200
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 326.622.421
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 120.767.200
FECHA CONTRATO 30/04/2026
NRO. CONTRATO 111

Total a Pagar \$ 4.830.600



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600483234

Recibo N°

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: Alcaldía de Curil

PRO UIS
PRO HOSPITAL

\$ 2.415.300
\$ 2.415.300

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9018506921
Nombre IDECOB SAS SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(0020)02502600483234(3900)00000004830600(95)20260803

VALOR BASE \$ 120.767.200
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 326.622.421
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 120.767.200
FECHA CONTRATO 30/04/2026
NRO. CONTRATO 111

Total a Pagar \$ 4.830.600

Fecha de Expedición 2026/07/27

Fecha Límite de Pago 2026/08/03



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600483234

Recibo N°

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9018506921

Nombre IDECOB SAS SERGIO ANDRES MARTINEZ AGON

Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)8902012356005(0020)02502600483234(3900)00000004830600(95)20260803

PRO UIS \$ 2.415.300
PRO HOSPITAL \$ 2.415.300

Con destino a: Alcaldía de Curil

Fecha de Expedición 2026/07/27

Total a Pagar \$ 4.830.600

Total Estampillas \$ 4.830.600

Banco
