


Reunión seguimiento GECELCA – Colombia Solar – Julio 24 de 2026

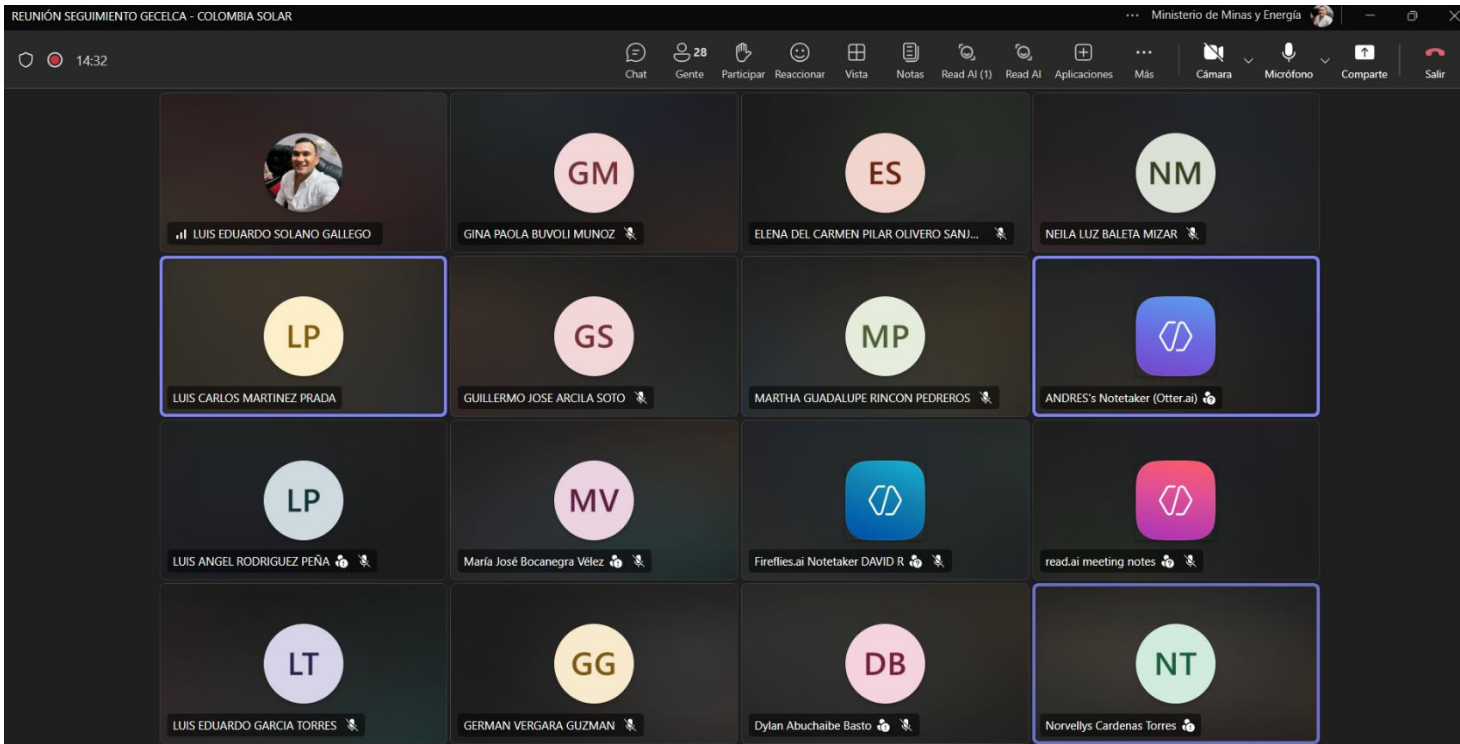

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

16:44

Controlar, Anotar, Separar, Chat, Gente (29), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Read AI (1), Read AI, Aplicaciones, Más, Cámara, Micrófono, Compartir, Salir

AVANCE DETALLADO POR COMPONENTE

C1

FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

- Se analizó junto con el Ministerio de Minas y Energías la ruta de trabajo
- Se presentó la ruta de trabajo en la Mesa Técnica número 6 para iniciar en los nuevos barrios
- Esperando Evaluación de Ministerio para ir a Mesa de Aprobación

A la espera de cerrar contrato de caracterización

A la espera de Interventoría de Caracterización

C2

FASE DE ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL

Se avanzó en la estructuración de dos nuevos procesos abiertos de ofertas que se tienen para la ejecución de la vigencia 2026 de acuerdo con el otrosí y un proceso cerrado de ofertas

- Para la implementación de 7.740 soluciones individuales
- Para la interventoría de la implementación de las 7.740 soluciones
- Interventoría para la caracterización de los usuarios de las soluciones individuales

Se volvió a abrir proceso de solicitud de cotización para interventoría de Caracterización

Se hizo evaluación técnica del único oferente que presentó propuesta: Bureau Veritas con un presupuesto seleccionado de \$164.590.951 (13% del valor de la inversión.)

C3

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

Contrato de caracterización en proceso de firma de OTROSÍ

La suscripción del acta de inicio del contrato requiere contar previamente con la interventoría de caracterización, indispensable para la aprobación del PIA y del PDT

CRÍTICO

Este componente es clave para poder continuar con nuevos usuarios

OFICIO 0463- SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTO.pdf

GM, ES, NM, LP, NT, MP, LP, MV, read.ai meeting notes, LT, GG, DB, NT

1/3

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

20:56

ControlarAnotarSepararChatGente30ParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIAplicacionesMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

AVANCE DETALLADO POR COMPONENTE

C4

EVALUACIÓN Y FAVORABILIDAD

- Se presentó ante la Mesa Técnica los usuarios caracterizados para poder recomendar y llevarlos a la Mesa de Aprobación.

C5

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN

- Contrato implementación 2378:** Avance del 16%, con una desviación del 37% conforme al cronograma maestro presentado
- Contrato de Caracterización de 10118:** En proceso de firma OTROSÍ, de acuerdo con la selección del interventor

C6

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS DE CONTRATOS DERIVADOS

- La supervisión la lleva GECELCA en donde se cuenta con toda la trazabilidad del seguimiento de la ejecución y supervisión de los procesos.
- Contrato de interventoría de implementación.

C7

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y AOM

- A la espera de la legalización de los usuarios para la etapa de AOM.

C8

SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN

- Este componente se desarrolla en paralelo con la ejecución de todo el proceso (enfoque social).

PROCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

GGC -2144-2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Corte21/07/2026

	AVANCE VIGENCIA 2026	% COMPLETADO	% FALTANTE
% AVANCE PROGRAMADO	22,39%	77,61%	
% AVANCE EJECUTADO	17,84%		82,16%
DESVIACIÓN	-4,55%		

AVANCE VIGENCIA 2026

Norvellys Cardenas Torres

GMES

NMLP

NTMP

LP

MV

LT

1/3

REUNIÓN SEGUIMIENTO GECELCA - COLOMBIA SOLAR

Ministerio de Minas y Energía

24:00

ControlarAnotarSepararChatGente31ParticiparReaccionarVistaNotasRead AI (1)Read AIAplicacionesMásCámaraMicrófonoCompartirSalir

AVANCE DETALLADO POR COMPONENTE

C1

FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

- Se analizó junto con el Ministerio de Minas y Energías la ruta de trabajo
- Se presentó la ruta de trabajo en la Mesa Técnica número 6 para iniciar en los nuevos barrios
- Esperando Evaluación de Ministerio para ir a Mesa de Aprobación

A la espera de cerrar contrato de caracterización

A la espera de Interventoría de Caracterización

C2

FASE DE ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL

Se avanzó en la estructuración de dos nuevos procesos abiertos de ofertas que se tienen para la ejecución de la vigencia 2026 de acuerdo con el otrosí y un proceso cerrado de ofertas

- Para la implementación de 7.740 soluciones individuales
- Para la interventoría de la implementación de las 7.740 soluciones
- Interventoría para la caracterización de los usuarios de las soluciones individuales

Se volvió a abrir proceso de solicitud de cotización para Interventoría de Caracterización

Se hizo evaluación técnica del único oferente que presentó propuesta: Bureau Veritas con un presupuesto seleccionado de \$164.590.951 (13% del valor de la inversión.)

C3

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

Contrato de caracterización en proceso de firma de OTROSÍ

La suscripción del acta de inicio del contrato requiere contar previamente con la interventoría de caracterización, indispensable para la aprobación del PIA y del PDT

CRÍTICO

Este componente es clave para poder continuar con nuevos usuarios

Norvellys Cardenas Torres

GMES

NMLP


NTMP

JF

MV

LT


1/3

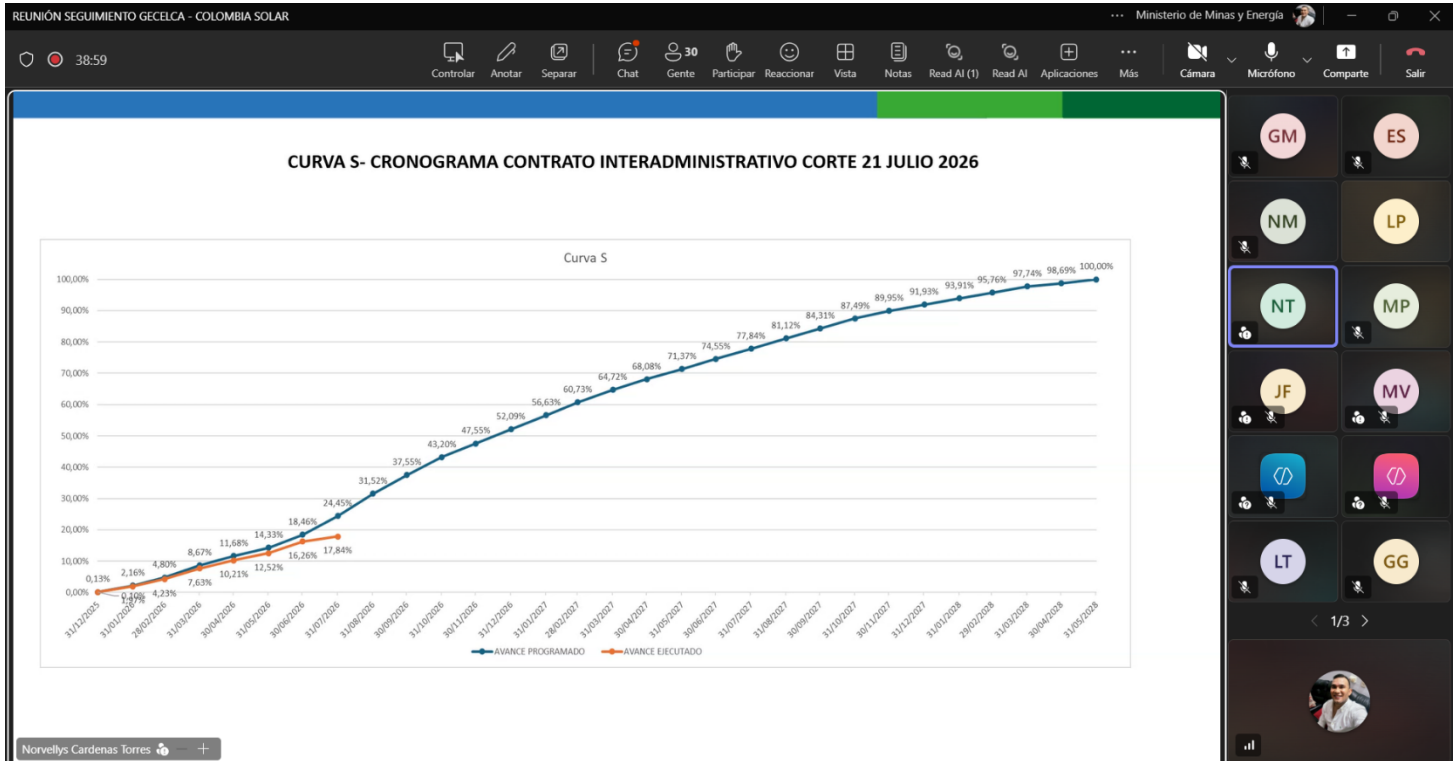

Ministerio de Minas y Energía

GM ES NM LP NT MP JF MV LT GG

1/3

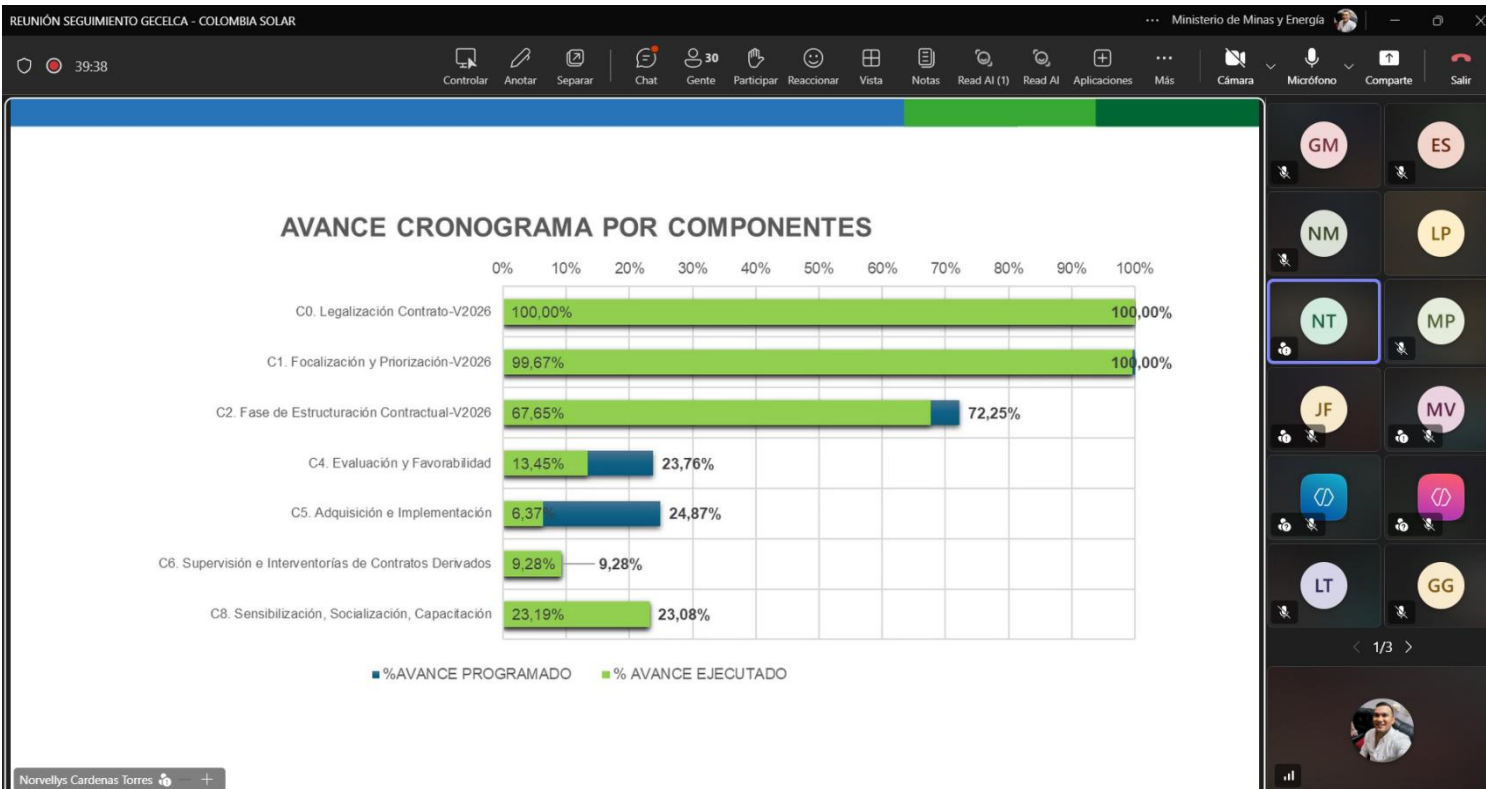

Ministerio de Minas y Energía

GM ES NM LP NT MP JF MV LT GG

1/3

Notas:

- Se aclara que estos avances porcentuales corresponden a la completitud de la información documental requerida para tal proceso.
- Hay viviendas con mayor porcentaje de avances.
- Para el componente de certificación RETIE se tiene el pendiente de corrección de comentarios en el diagrama unificar por parte del consorcio.
- Para la legalización ante O.R (Air-e), el consorcio no ha enviado el documento de cumplimiento de CNO para los microinversores y se encuentra en proceso la actualización del firmware en estos equipos.

- 17 Jul: Visita certificador RETIPROYECTO

- **17 Jul: Visita certificador RETIPROYECTO**
Se recopilaron recomendaciones y se realizó planificación de trabajo, priorizando viviendas con medidores instalados.
- **17 – 24 Jul: Corrección de marquillado**
Los sub-contratistas realizaron las instalaciones de marquillado, según recomendaciones del certificador.
- **27 Jul en adelante: Certificación de viviendas**



- **17 Jul: Visita Air-E revisión de Micro-Inversores**
Se verificó la actualización de Firmware con tiempo de reconexión de 5 minutos.
- **27 Jul en adelante: Air-E Iniciaré estudio de conexión a 42 usuarios.**

