

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 1 de 7	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
Nº DE CONTRATO	SA-SP-003-2026	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA CC/ NIT	INGEOBRAS QHSE S.A.S NIT: 900.629.789-8 R/L: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C: 1.048.849.895 DE GARAGOA	
OBJETO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	
SUPERVISOR(A)	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	26 DE MAYO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	
PRORROGA Nº	FECHA: N/A	PLAZO: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$108'868.108,59) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN Nº1	FECHA: 23/06/2026	VALOR: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$51'077.781,65) M/CTE.
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$159'945.890,24) M/CTE.	
CDP INICIAL	Nº 202604016	FECHA: 14/04/2026
CDP ADICIÓN Nº1	Nº 202606060	FECHA: 23/06/2026
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	Nº 202605019	FECHA: 21/05/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN Nº1	Nº 202606110	FECHA: 30/06/2026
SUSPENSIÓN Nº1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN Nº1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A
REINICIO Nº1	FECHA: N/A	PLAZO POR EJECUTAR: N/A

Direccion: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6
 Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820
 Correo: contratacion@santamaria-boyaca.gov.co

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03	Pág. 2 de 7
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026	



MODIFICATORIO N°1	FECHA: N/A	ASUNTO: N/A
ACLARATORIO N°1	FECHA: N/A	ASUNTO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 12 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE JULIO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE JULIO DEL 2026	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°1

EDWIN RAMOS RIVERA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-05	2026-06-12	\$ 48.700
SALUD	2026-05	2026-06-12	\$ 11.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05	2026-06-12	\$ 20.400
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-12	\$ 11.700

GELVER YESID RIVERA RAMOS

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-05	2026-06-12	\$ 48.700
SALUD	2026-05	2026-06-12	\$ 11.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05	2026-06-12	\$ 20.400
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-12	\$ 11.700

WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-05	2026-06-12	\$ 9.400
SALUD	2026-05	2026-06-12	\$ 2.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05	2026-06-12	\$ 4.100
PARAFISCALES	2026-05	2026-06-12	\$ 2.400

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°2

EDWIN RAMOS RIVERA

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-03	\$ 280.200
SALUD	2026-06	2026-07-03	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-03	\$ 121.900
PARAFISCALES	2026-06	2026-07-03	\$ 70.100

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03	Pág. 3 de 7	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026		

GELVER YESID RIVERA RAMOS

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-03	\$ 280.200
SALUD	2026-06	2026-07-03	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-03	\$ 121.900
PARAFISCALES	2026-06	2026-07-03	\$ 70.100

WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-03	\$ 28.100
SALUD	2026-06	2026-07-03	\$ 21.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-03	\$ 12.200
PARAFISCALES	2026-06	2026-07-03	\$ 7.100

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°3

EDWIN RAMOS RIVERA

ITEM	PERIODO DE PAGO (AÑO – MES)	FECHA DE PAGO (AÑO – MES – DÍA)	VALOR
PENSION	2026-07	2026-07-03	\$ 28.100
SALUD	2026-07	2026-07-03	\$ 21.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-07	2026-07-03	\$ 12.200
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-03	\$ 7.100

GELVER YESID RIVERA RAMOS

ITEM	PERIODO DE PAGO (AÑO – MES)	FECHA DE PAGO (AÑO – MES – DÍA)	VALOR
PENSION	2026-07	2026-07-03	\$ 28.100
SALUD	2026-07	2026-07-03	\$ 21.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-07	2026-07-03	\$ 12.200
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-03	\$ 7.100


WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ

ITEM	PERIODO DE PAGO (AÑO – MES)	FECHA DE PAGO (AÑO – MES – DÍA)	VALOR
PENSION	2026-07	2026-07-03	\$ 9.400
SALUD	2026-07	2026-07-03	\$ 7.300
RIESGOS PROFESIONALES	2026-07	2026-07-03	\$ 4.100
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-03	\$ 2.400

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

TOMADOR:

Direccion: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6
 Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820
 Correo: contratacion@santamaria-boyaca.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03	Pág. 4 de 7	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026		

ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DE AMPARO	CONDICIÓN/REQUISITO	VIGENCIA		No. POLIZA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO GENERAL	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia Hasta la liquidación del contrato.	23/06/2026	10/11/2026	CPL-100001135
	\$15.994.589,02			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	Equivalente al 5% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más	23/06/2026	10/07/2029	CPL-100001135
	\$7.997.294,51			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia por un término no inferior a 2 años contados a partir de la fecha en la cual la entidad reciba a satisfacción la obra.	03/07/2026	03/07/2028	CPL-100001135
	\$15.994.589,02			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES)	Equivalente a 200 SMMLV, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato	21/05/2026	10/07/2026	CPL-100000259
	\$350'181.000,00			

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA.

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 0	\$ 108.868.108,59
VALOR ADICIONAL	\$ 0	\$ 51.077.781,65
VALOR ANTICIPO	\$ 0	\$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1	\$ 64.435.403,60	\$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 95.510.486,64	\$ 0
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 159.945.890,24	\$ 159.945.890,24

Direccion: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6
 Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820
 Correo: contratacion@santamaria-boyaca.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 5 de 7	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.	

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100 %	100 %
	\$159'945.890,24	\$159'945.890,24

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, FACTURA N°FE72, NOTA DE RETENCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 6023883694; 6026414458; 6026406935.		

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

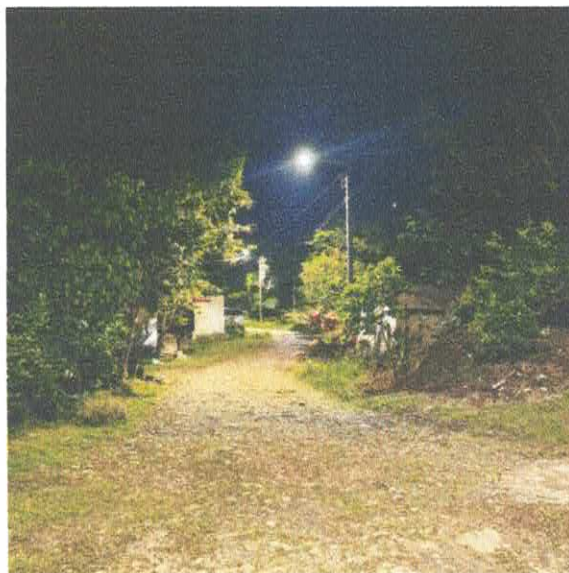
- Se realiza informe de supervisión de acuerdo al informe entregado por el contratista y las actividades ejecutadas por el contratista.
- Otras observaciones.

Evidencias fotográficas de la supervisión:


ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 6 de 7	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		



	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 7 de 7	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026	




ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ
 Secretaria de Planeación e Infraestructura
 Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ	RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 

Direccion: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6
 Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820
 Correo: contratacion@santamaria-boyaca.gov.co
