

 Energía	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	E-ME-F-14	
			01-06-2023	
			V-5	

ACTA REUNIÓN
INDAGACIÓN PRELIMINAR No. IP-86112-2025-513244 - CONTRATO- PRONE GGC No. 676 DE 2021

Ciudad: Presencial

Lugar: Carrera 22 # 22-46 - OFICINA ENELAR

Fecha: 16 / 07 / 2026

Hora: De las 8:00 am a la 10:00 am

VISITA: MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA: 10:00 am a 5pm

Fecha: 17 / 07 / 2026

Hora: De las 09:00 am a la 12:00 pm

Asistentes:

Ministerio de Minas y Energía

Carlos Arturo Rodríguez Castrillón. -SUPERVISOR DDE-MINISTERIO

Leidy Yohana Torres B—Abogada DDE.

ENELAR | Empresa de Energía Eléctrica de Arauca

Edgar Alonso Reyes Chaparro-GERENTE ENELAR

Sara Anzola- JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN

Sandra Mendivelso- SECRETARIA GENERAL

Mayra Lorena Pastrana Calderon -SUBDIRECTORA DEL PROYECTO

Sergio Hernando Bedoya Anave-DIRECTOR TECNICO, OPERATIVO Y MEDIO AMBIENTE - TOPMA

Albeiro Acosta-DIRECTOR DE OBRA

William H, acero- Sigma

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión PRESENCIAL ENELAR 16/07/2026.
2. Visita del supervisor al MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.16/07/2026.

Página 1 de 6

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



3. Reunión PRESENCIAL ENELAR 17/07/2026.
4. Revisar condiciones del INDAGACIÓN PRELIMINAR No. IP-86112-2025-513244 - CONTRATO- PRONE GGC No. 676 DE 2021; ejecución del proceso.
5. ESTADO DEL CONTRATO-

DESARROLLO:

1. Antecedentes

CONTRATO PRONE GGC No. 676 DE 2021

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

VALOR TOTAL

VALOR OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$8.363.818.392,00), IVA incluido.

USUARIOS BENEFICIADOS APORTE PRONE 2.324

VIGENCIA PRONE 2021 \$3.345.527.357,00

VIGENCIA PRONE 2022 \$5.018.291.035,00

VALOR TOTAL \$8.363.818.392,00

1. Visita del supervisor al MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.16/07/2026.

EL SUPERVISOR el día 16/07/2026 realiza visita en la Zona MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” donde se evidencio y visito la instalación de 37 transformadores- red media tensión y red de baja tensión en compañía de Julio cesar Amézquita; Doctor Obregón; Tecnico Miguel Sebato Capatas de La Obra.

Página 2 de 6

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía	E-ME-F-14	
			01-06-2023	V-5

FELIX

2.Preocupación de INDAGACIÓN PRELIMINAR No. IP-86112-2025-513244 - CONTRATO-PRONE GGC No. 676 DE 2021-1024.

- ✓ 1024 HACEN FALTA MEDIDORES ACOMETIDA Y MEDIDOR COMPLETA CAJA CON -MEDIDOR.
 - ✓ 300-LISTO
 - ✓ FALTA INSTALAR 724-
 - ✓ AVANCE DE EJECUCIÓN 76.20% - 80%
- Se hacen compromisos para finalizar la instalación.

2. Una vez culminadas las intervenciones se procedió a asumir compromisos.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Instalación de 400 MEDIDORES ACOMETIDA Y MEDIDOR COMPLETA CAJA CON MEDIDOR.	Mayra Lorena Pastrana Calderon	24/07/2026
Envío de informe actualizado de OR	Mayra Lorena Pastrana Calderon – GERENTE Edgar Reyes	27/07/2026
Envío de informe actualizado de interventoría.	Mayra Lorena Pastrana Calderon -GERENTE Edgar Reyes	27/07/2026
Verificar pólizas y enviar GGC.	MME	21/07/2026
Polizas cargadas en SECOPII.	Mayra Lorena Pastrana Calderon -GERENTE Edgar Reyes-MME	21/07/2026
Remitir doc Neón para plan de pagos	MME	21/07/2026

Página 3 de 6

Ministerio de Minas y Energía
 Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180


1



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIGI Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía
		E-ME-F-14
		01-06-2023 V-5


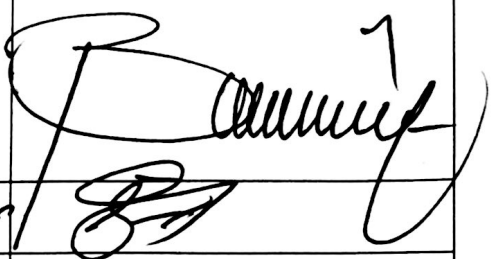
Cargar y publicar SECOP II informes- plan de pagos,;	Mayra Lorena Pastrana Calderon -GERENTE Edgar Reyes-MME	22/07/2026
Contratación de RETIE	Mayra Lorena Pastrana Calderon- GERENTE Edgar Reyes- GERENTE Edgar Reyes	31/07/2026
Cronograma de inspección de RETIE.	Mayra Lorena Pastrana Calderon- GERENTE Edgar Reyes	03/08/2026
REUNIÓN VIRTUAL	Mayra Lorena Pastrana Calderon-SUPERVISOR MME	03/08/2026
Instalación de 624-MEDIDORES ACOMETIDA Y MEDIDOR COMPLETA CAJA CON MEDIDOR.	Mayra Lorena Pastrana Calderon.-GERENTE Edgar Reyes	23/08/2026
REUNIÓN VIRTUAL	Mayra Lorena Pastrana Calderon-SUPERVISOR MME	24/08/2026
VISITA ENELAR PARA ENTREGA DE EQUIPOS INSTALDOS Y FUNCIONAR.	Mayra Lorena Pastrana Calderon.- GERENTE Edgar Reyes	28/08/2026
REUNIÓN VIRTUAL	Mayra Lorena Pastrana Calderon-SUPERVISOR MME	29/08/2026

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

NOMBRE	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO	GERENTE ENELAR	Gerencia@enelar.com.co/ 1156	

Página 4 de 6

Ministerio de Minas y Energía
 Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
 Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador: (60) +1 220 0300
 Línea Gratuita: 01 8000 910 180

SARA ANZOLA	JEFE DE OFICINA PLANEACIÓN	planeación@enelar.com.co/1171	
SANDRA MENDIVELSO	SECRETARIA GENERAL	secretaria@enelar.com.co/1157	
MAYRA LORENA PASTRANA CALDERON	SUBDIRECTORA DEL PROYECTO	Subdirproyectos@enelar.com.co/1134	
SERGIO HERNANDO BEDOYA ANAVE	DIRECTOR TECNICO, OPERATIVO Y MEDIO AMBIENTE - TOPMA	topma@enelar.com.co/1147	
ALBEIRO ACOSTA R	DIRECTOR D OBRA	albeiroacosta@enelar.com.co	
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLO N.	SUPERVISOR DDE-MINISTERIO	Carodriguez@minenergia.gov.co	
WILLIAM H ACERO	RL SIGMA	wwacero@live.com-3125195959	

Anexos: 1 folio

Elaboró Leidy Yohana Torres -contratista
