



Caparrapí, 14 de Agosto de 2026

Doctor:

YERSON STID MEDINA QUIJANO
Jefe Oficina Jurídica y Contratación

Recab: Caparrapí
Borin

Agosto 14 2026

12:49 pm

18 folios.

Asunto: ENTREGA DE SOLICITUD DE SUSPENSION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-002-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de SOLICITUD DE SUSPENSION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025 cuyo objeto es "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA.", Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-002-2025. cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-001-2025 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION Y DOTACION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA.", con el fin de realizar los trámites correspondientes con la ejecución del proceso.

Cordialmente,

RIVEROS

ING. YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
Secretario de Planeación e Infraestructura

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No.2
CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025

Caparrapí, Cundinamarca; 14 de agosto de 2026

PARA: ALCALDE
DE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisor del Contrato
ASUNTO: Solicitud de Suspensión No.2 al Contrato de Obra No. LP-001-2025

En mi condición de Supervisor del Contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el Suspensión No.2 al Contrato de Obra No. LP-001-2025, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que, el municipio de Caparrapí Cundinamarca, celebro el contrato LP-001-2025, el cual tiene por objeto **“PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI, CUNDINAMARCA”**, suscrito el día 08 de octubre de 2025, con acta de inicio del 30 de diciembre de 2025 y un plazo de ejecución de DOS (2) MESES contados a partir de la firma del acta de Inicio y/o hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
2. Teniendo en cuenta diferentes situaciones que han impedido la terminación de la obra, se hace necesario una prórroga por SIETE (07) meses, adjudicado al contratista MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT 901241893-2, representado legalmente por el(a) señor(a) MARILUZ VARGAS GONZALEZ
3. Que, el día 30 de diciembre de 2025, se suscribió la Prórroga No.1 por un término de siete (7) meses garantizando que la ejecución del contrato se realice de manera integral, con la debida supervisión e interventoría, y dentro de la vigencia fiscal 2026, asegurando así la correcta planeación, ejecución y control de los recursos públicos, quedando como fecha de terminación el día PRIMERO (01) DE JULIO DE 2026
4. Que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y previo al inicio de las actividades constructivas del Contratista de Obra, se llevó a cabo una revisión integral de los estudios y diseños del proyecto, con el propósito de verificar su coherencia técnica, su conformidad con la normativa vigente y su viabilidad para la adecuada ejecución del objeto contractual, y como resultado de este proceso, resulta procedente adelantar una revisión integral del presupuesto, que incluya la actualización de cantidades, costos y análisis de precios unitarios, con el fin de garantizar la correspondencia entre el alcance real del proyecto y los recursos necesarios para su ejecución, lo que dio lugar suscribir la Suspensión No.1 el día VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2026 por un término de TREINTA (30) DÍAS

CALENDARIO con una fecha prevista de reinicio el VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2026.

5. Que, el Contratista MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S., en cumplimiento de los principios de responsabilidad, planeación y debida diligencia contractual, manifiesta que su actuación se orienta a garantizar la correcta ejecución del proyecto bajo condiciones técnicas idóneas, seguras y conformes a la normativa vigente. En tal sentido, se abstendrá de iniciar actividades constructivas hasta tanto se cuente con los ajustes, validaciones y aprobaciones correspondientes por parte de la interventoría y las entidades competentes, asegurando que la ejecución de la obra se desarrolle con criterios de calidad, estabilidad estructural, funcionalidad y sostenibilidad, en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la NSR-10, por lo cual se suscribe la Ampliación No.1 Suspensión No.1 el VEINTIDOS (22) DE MAYO DEL 2026 por un término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO quedando como fecha prevista de reinicio el OCHO (8) DE JUNIO DE 2026.
6. Que, en cumplimiento de las funciones de seguimiento técnico, administrativo y financiero propias de la Interventoría se emite un concepto de revisión, verificación y análisis del balance de cantidades de obra y se remitió ante el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca- ICCU el 16 DE JULIO DEL 2026 bajo radicado 140-2166 Asunto: Solicitud de Ajuste Presupuestal y Prorroga del Convenio de Obra Cubierta Polideportivo San Ramon y anexos requeridos a fin de, ajustar las cantidades de obra y presupuesto, con lo cual se adjudicó la Solicitud de Modificadorio No.1 del Convenio Interadministrativo ICCU-627-2024, lo que dio lugar al Acta de Reinicio No.1 el 08 DE JUNIO DEL 2026, quedando como nueva fecha de terminación el QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2026.
7. Que, en atención a las condiciones climáticas que se vienen presentando en el territorio nacional y departamental, asociadas al posible desarrollo y consolidación del Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026, y teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el IDEAM y la Gobernación de Cundinamarca, se analiza la situación actual del municipio de Caparrapi frente a los riesgos derivados de la temporada seca y de menos lluvias, de acuerdo con las orientaciones y acciones de preparación adoptadas por el departamento de Cundinamarca frente al Fenómeno de El Niño, se advierte un incremento en la probabilidad de presentarse condiciones de disminución de las precipitaciones, aumento de las temperaturas, desabastecimiento de agua e incendios de la cobertura vegetal. Durante la vigencia 2026 se han presentado y reportado en el municipio situaciones relacionadas con disminución de la disponibilidad del recurso hídrico.
8. Que, en el mes de agosto el Centro Poblado de San Ramon ha venido presentando afectaciones por sequias, sumado a que la comunidad se encuentra afectada sin fundamentales servicios básicos, la falta de fluido eléctrico ha dejado fuera de servicio las plantas de bombeo del acueducto veredal, por lo que no cuentan con abastecimiento de agua potable. La temporada de sequias que se presenta actualmente en el municipio, las fallas eléctricas y la falta de abastecimiento de agua

han dificultado las labores de Contratista de Obra construcción para la ejecución de los ítems contractuales.

9. Que, de conformidad con lo anterior se establece la viabilidad técnica por parte de la Supervisión del Contrato para la realización del Suspensión No.2 al Contrato de Obra LP-001-2025 hasta dar por subsanadas las razones que dieron lugar a la suscripción de la suspensión, con lo cual, se solicita al ordenador del gasto aprobar el Suspensión No.2 al Contrato LP-001-2025
10. Que la Ley 80 de 1993 señaló en su artículo 3 “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, así mismo, el artículo 40 del mencionado Estatuto de Contratación permite a las entidades modificar los contratos celebrados dentro de ello, realizar las prórrogas razonables que permitan el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contraídas.

Por lo anterior se solicita:

- a) Suscribir la Suspensión No.2 al plazo de ejecución del Contrato de Obra LP-001-2025 hasta dar por subsanadas las razones que dieron lugar a la suscripción de la misma sin que ello implique modificación alguna del objeto contractual, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Cordialmente,



YANNY FERNANDO RIVEROS VERGARA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Alejandra Triana Beltrán- Profesional Apoyo SPI
Revisó: Yanny Fernando Riveros Vergara Secretario de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Yerson Stid Medina Quijano- Jefe Oficina de Jurídica y de Contratación



BOLETÍN METEOROLÓGICO JURISDICCIÓN CAR

Fecha: 14 de Agosto del 2026

Hora: 11:00 am

No. 226

CONDICIONES AGOSTO

En agosto históricamente se acentúa el periodo seco en el centro y occidente en la Jurisdicción CAR, mientras que en el extremo oriente aumentan las precipitaciones. De acuerdo con las previsiones del IDEAM, el comportamiento del clima estará influenciado por la evolución de las condiciones del fenómeno ENSO y también por las oscilaciones intraestacionales y la actividad atmosférica en El Caribe, se esperan disminuciones de humedad.


BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental



CONTENIDO



Condiciones meteorológicas.



Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas Jurisdicción CAR

Río Bogotá

Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio

Río Negro


Río Garagoa

Río Minero

Cuenca vertiente río Magdalena

Río Sumapaz


Río Balsillas



Temperaturas máximas Jurisdicción CAR últimas 24 horas

Para consultar los boletines e informes meteorológicos anteriores te invitamos a consultar el siguiente link:

<https://www.car.gov.co/vercontenido/3687>



BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental




Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas Jurisdicción CAR

Río Bogotá

Precipitaciones Río Bogotá

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

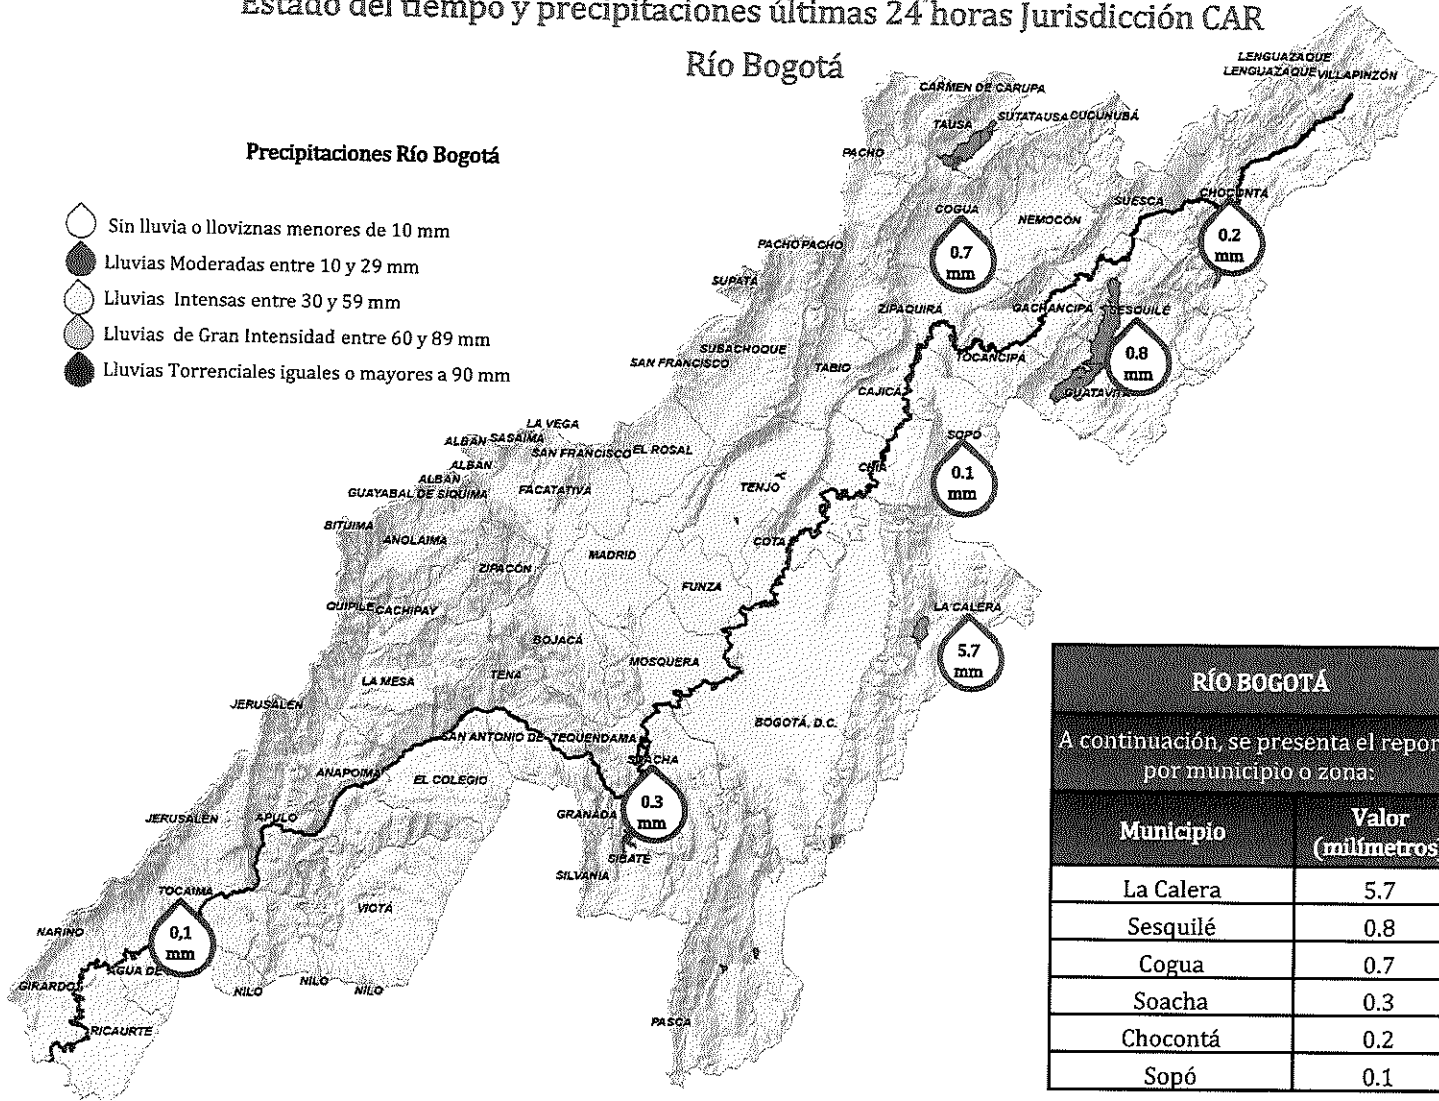

RÍO BOGOTÁ

A continuación, se presenta el reporte por municipio o zona:

Municipio	Valor (milímetros)
La Calera	5.7
Sesquilé	0.8
Cogua	0.7
Soacha	0.3
Chocontá	0.2
Sopó	0.1

¿QUÉ PASÓ?:

Predominó el tiempo seco a lo largo de la cuenca, con presencia de lloviznas puntualmente en el municipio de **La Calera**.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental



Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio


¿QUÉ PASÓ?:

En el complejo lagunar prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

COMPLEJO LAGUNAR	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	Valor (milímetros)
Carmen de Carupa	0.9
Ubaté	0.6

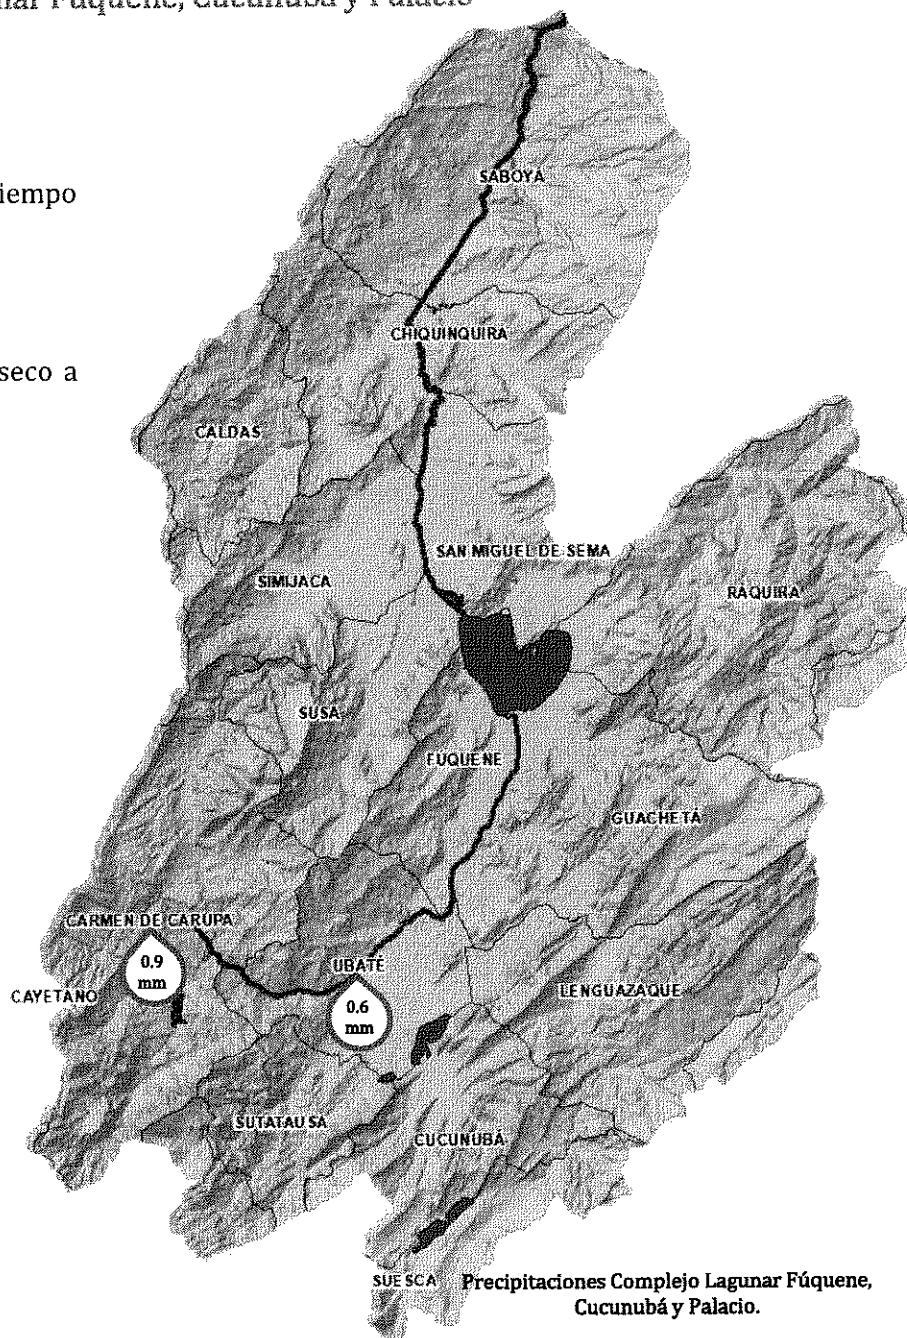

- Precipitaciones Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio.
- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
 - Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
 - ◐ Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
 - ◑ Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
 - Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental




¿QUÉ PASÓ?:

Predominó el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

RÍO NEGRO	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	Valor (milímetros)
Villete	0.0

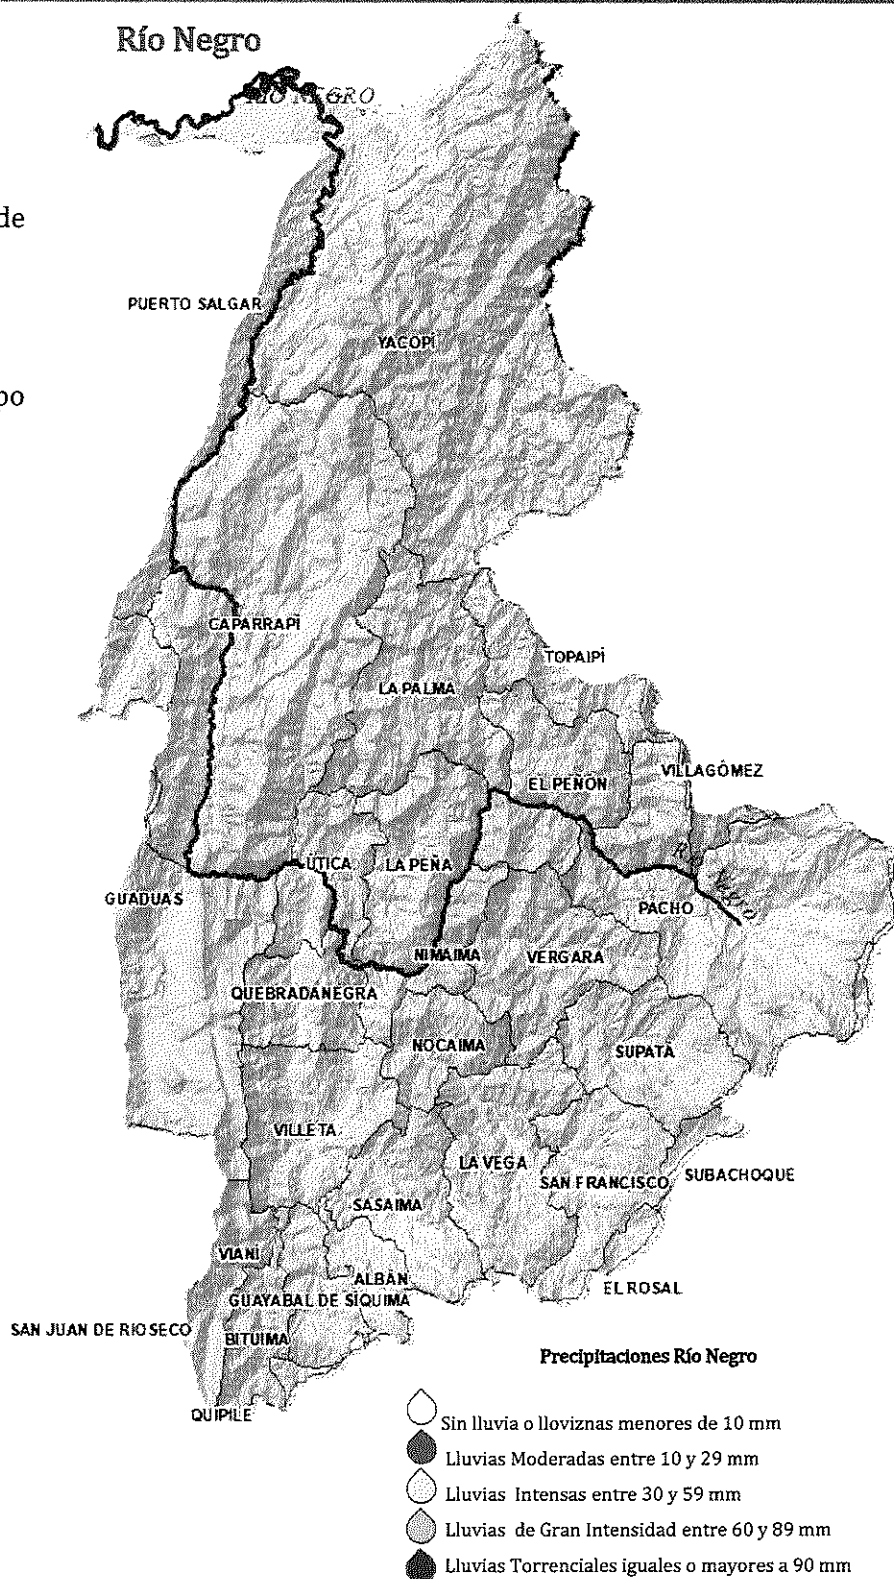

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental



Río Garagoa

Precipitaciones Río Garagoa

-  Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
-  Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
-  Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
-  Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
-  Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

VILLAPINZÓN


¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

RÍO GARAGOA	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	Valor (milímetros)
Machetá	0.0

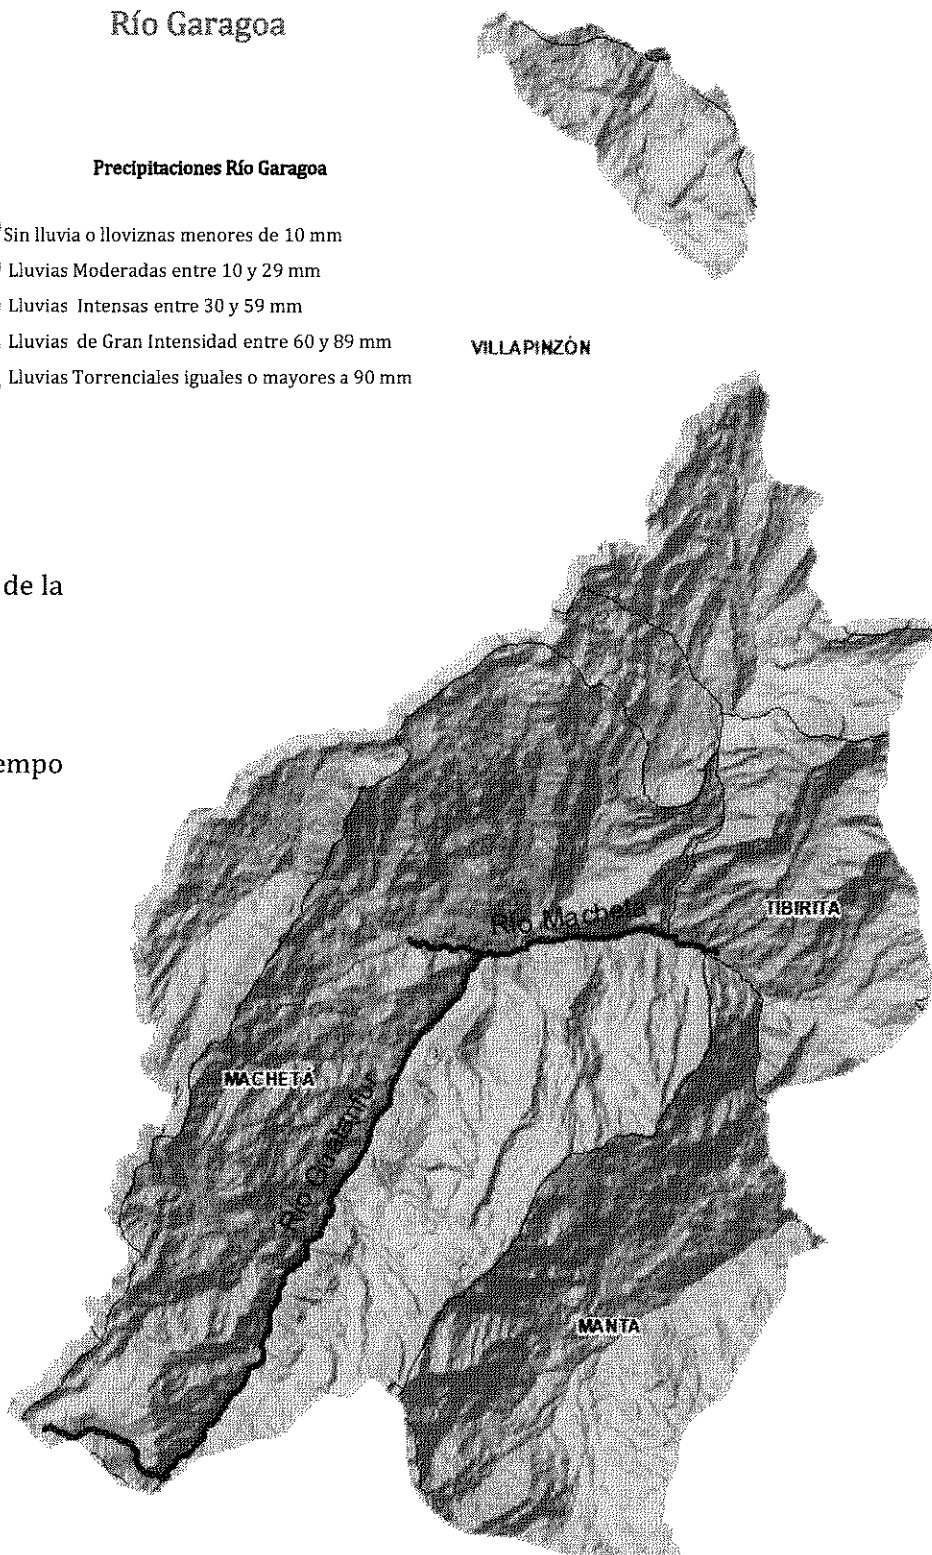

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR



Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental



Río Minero

Precipitaciones Río Minero

-  Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
-  Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
-  Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
-  Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
-  Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

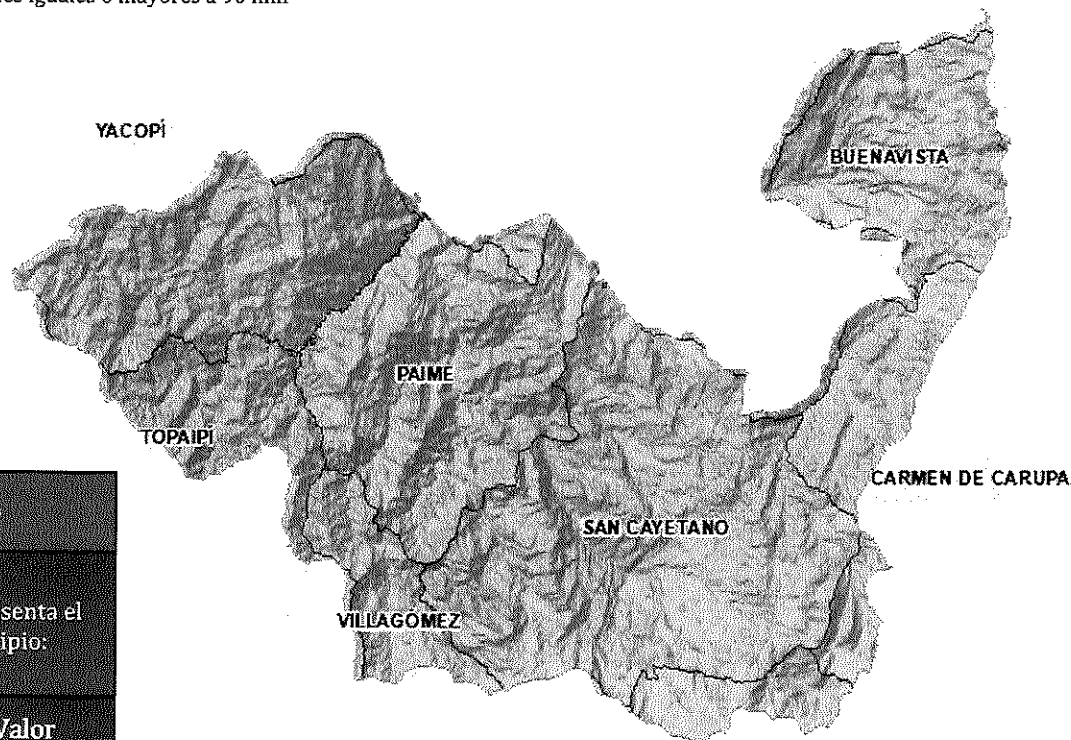

RÍO MINERO

A continuación se presenta el
reporte por municipio:

Municipio	Valor (milímetros)
Paime	0.0

¿QUÉ PASÓ?:

Predominó el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental



Cuenca vertiente río Magdalena


¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

RÍO MAGDALENA	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	Valor (milímetros)
Pulí	0.0

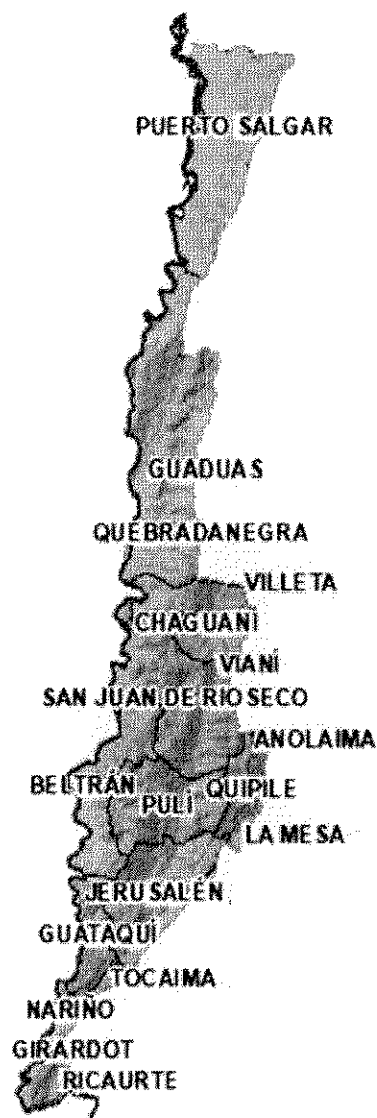

Precipitaciones cuenca vertiente Río Magdalena

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- ◐ Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- ◑ Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental




Río Sumapaz

¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

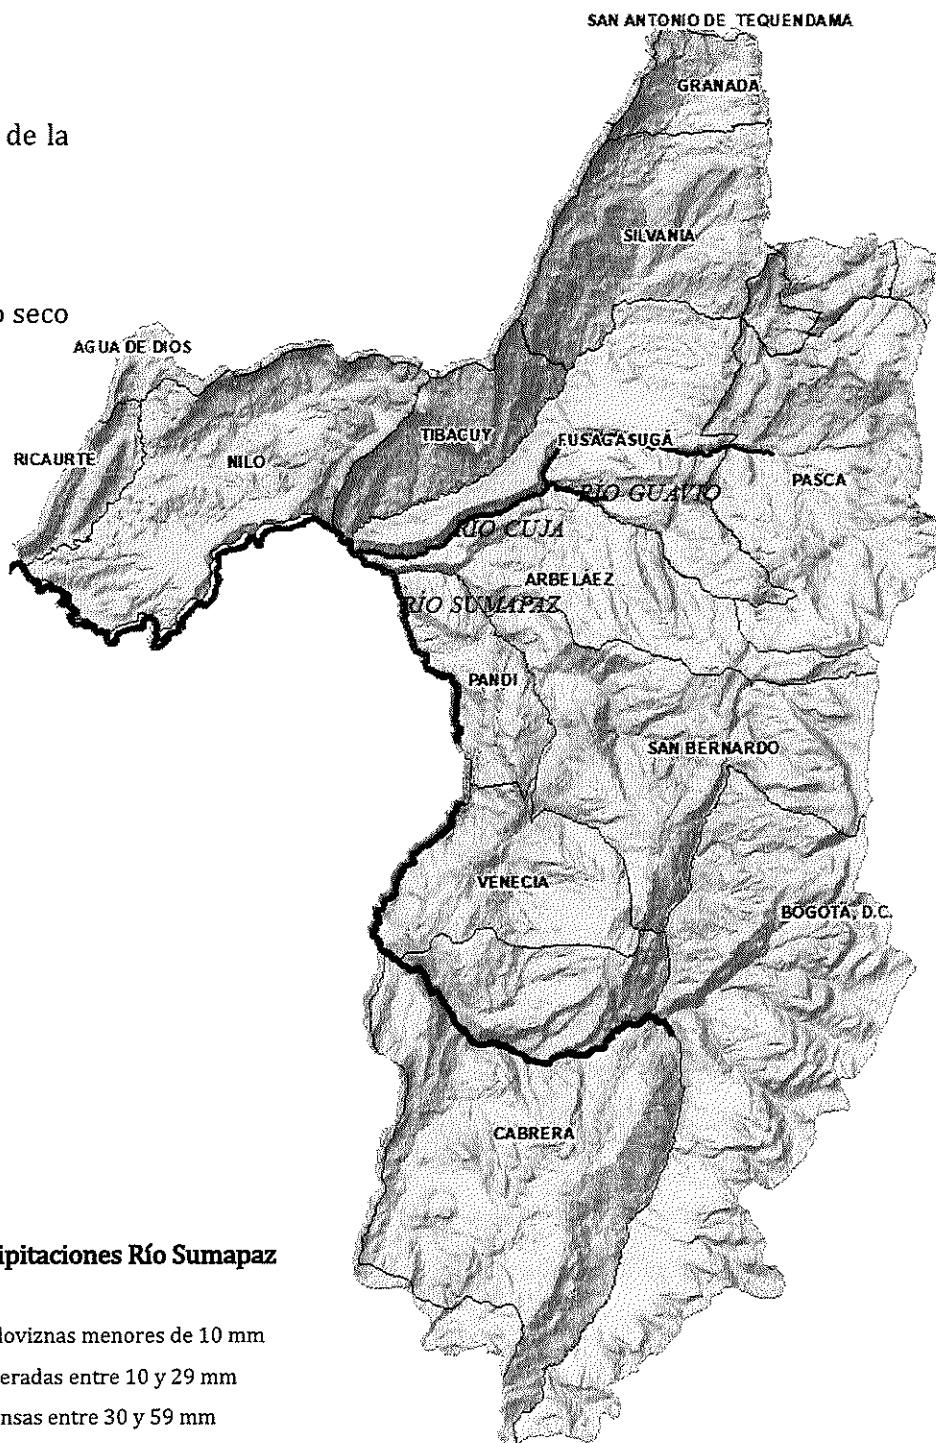

RÍO SUMAPAZ	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	Valor (milímetros)
Pasca	0.0

Precipitaciones Río Sumapaz

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental




Río Balsillas

¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

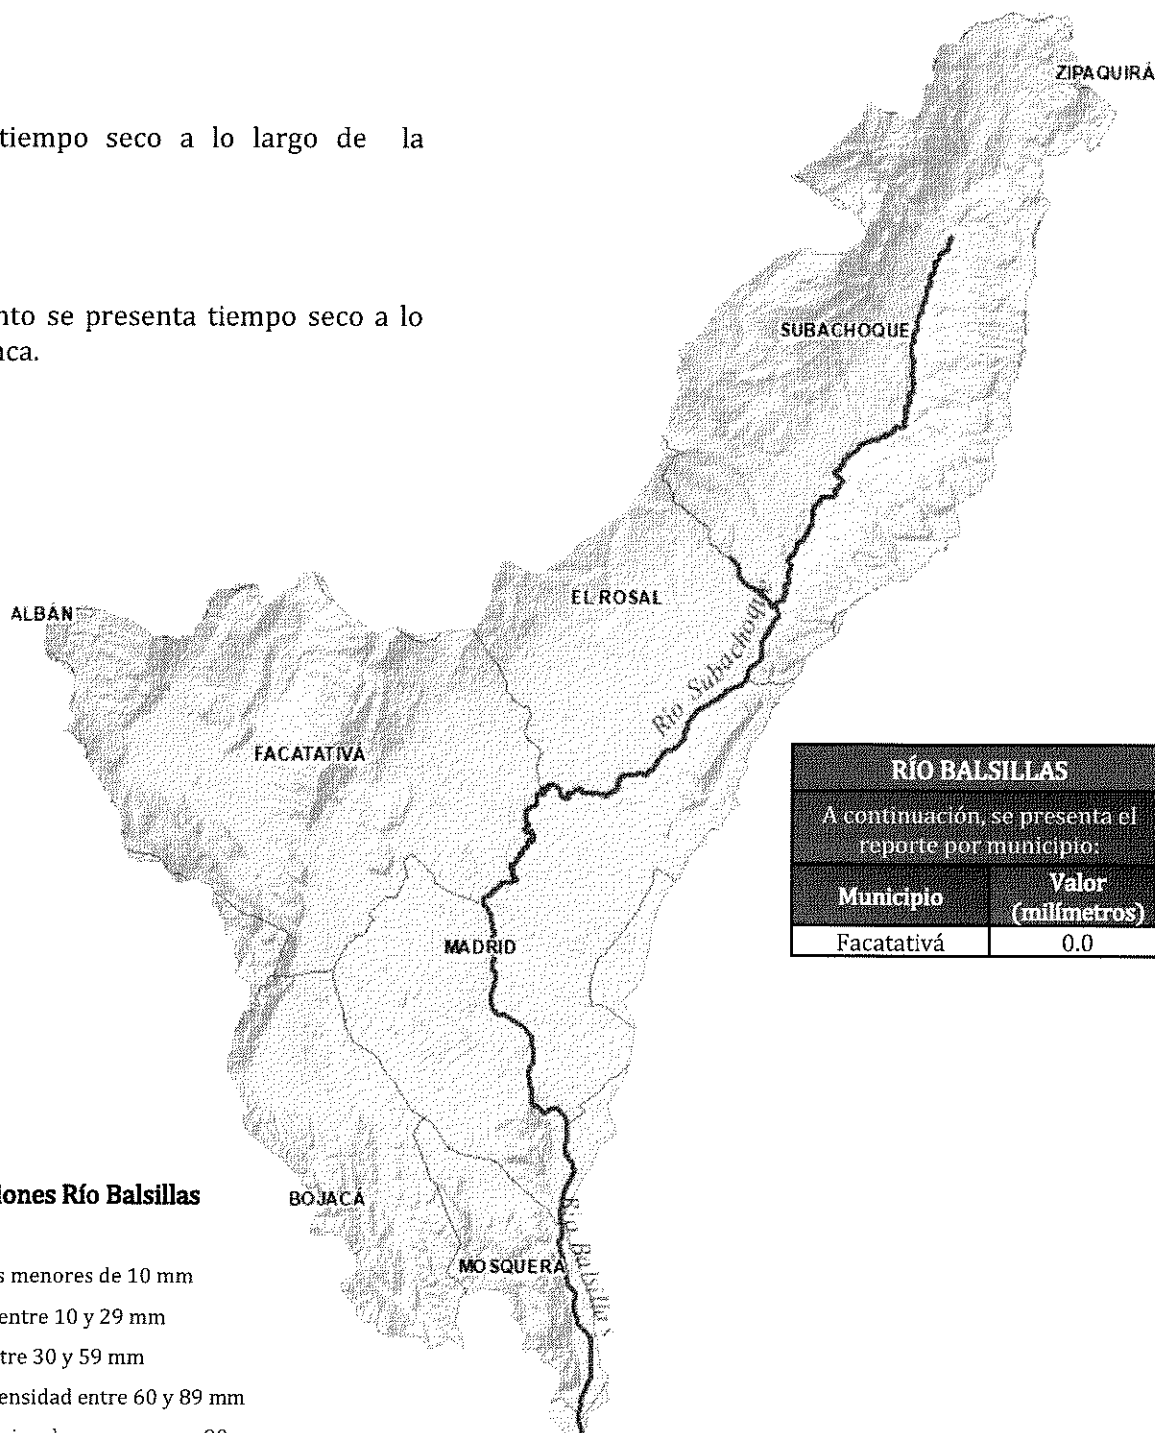

Precipitaciones Río Balsillas

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm


BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental



Temperaturas máximas Jurisdicción CAR últimas 24 horas

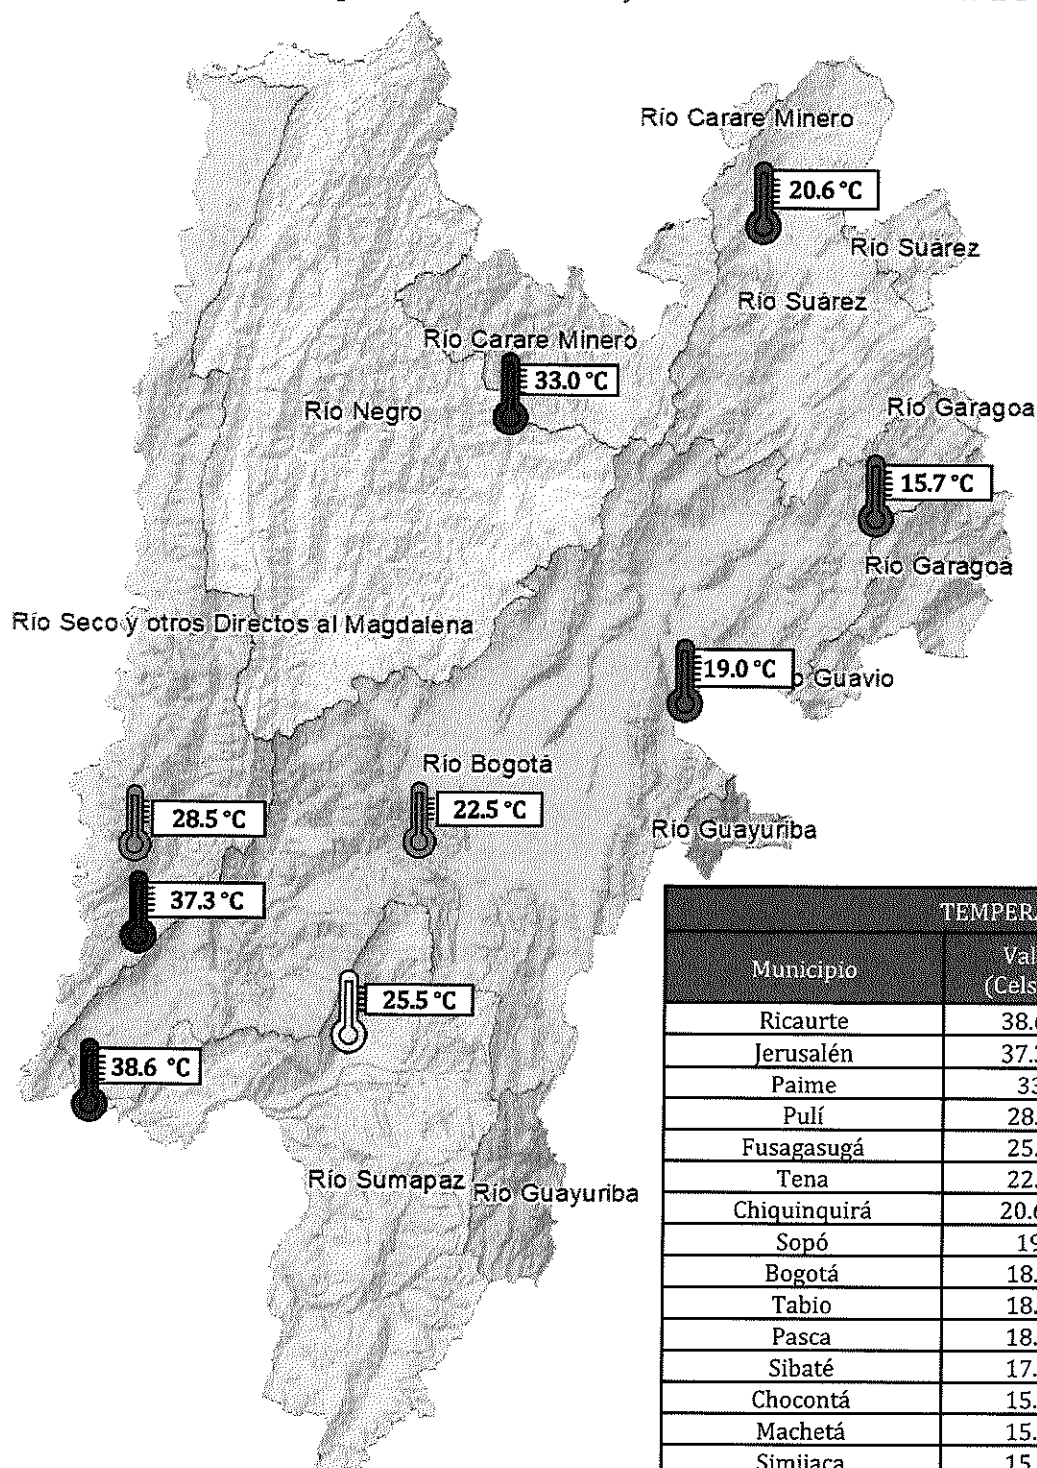

TEMPERATURAS		
Municipio	Valor (Celsius)	Cuenca
Ricaurte	38.63	Baja río Bogotá
Jerusalén	37.38	río Magdalena
Paime	33	Cuenca río Minero
Pulí	28.5	Cuenca Magdalena
Fusagasugá	25.5	Cuenca río Sumapaz
Tena	22.5	Cuenca Baja
Chiquinquirá	20.66	Media río Suárez
Sopó	19	Cuenca Media
Bogotá	18.6	Cuenca Media
Tabio	18.4	Cuenca Media
Pasca	18.3	Cuenca río Sumapaz
Sibaté	17.1	Cuenca Media
Chocontá	15.7	Cuenca Alta
Machetá	15.2	Cuenca Media
Simijaca	15.1	Cuenca Media río Suárez
Villapinzón	14.8	Cuenca Alta
Zipaquirá	14.1	Cuenca Media

Condiciones meteorológicas

Para la evaluación del comportamiento de las lluvias monitoreadas durante las últimas **24 horas** y teniendo en cuenta potenciales afectaciones a la comunidad y sus bienes, con la siguiente referencia de niveles de aviso se hace la respectiva clasificación:

Nivel Verde

No existe ningún riesgo meteorológico ni se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o aislado.

Nivel Amarillo

No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Recomendación: ESTÉ ATENTO. Manténgase informado de la predicción meteorológica del IDEAM más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

Nivel Naranja

Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales).

Recomendación: ESTÉ PREPARADO. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica del IDEAM más actualizada. Las actividades habituales al aire libre pueden verse alteradas.

Nivel Rojo

El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).

Recomendación: tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica del IDEAM más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.

Dato sin referencia de comparación.



BOLETÍN METEOROLÓGICO JURISDICCIÓN CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental
Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y del Clima
✉ hidromonitoreo@car.gov.co

Av. Esperanza No. 60-50, Centro Empresarial Gran Estación,
costado esfera - Pisos 6 y 7
Bogotá D.C. - Teléfono: 580 1111- Ext: 1924

www.car.gov.co



Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca



Car_cundi

