

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
DE CONTRATO O CONVENIO No. 12**

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	ORDEN DE ACEPTACIÓN	☐
Espacio para registro					
Número:	CO1.PCCNTR. 4917031		de	2023	
Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.					
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	5	de	mayo	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	2	de	junio	de	2023
Duración total:	333 días				
Fecha de terminación:	30	de	abril	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER.			
2	2	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER.			
3	3	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de mayo de 2026.			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		1	de	mayo	de 2026

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	N/A
Valor total:		SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE. (\$63.650.000.000), incluido IVA.

Suspensiones	
Adicional No.	Tiempo (días calendario)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI X No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
1/02/2026 al 28/02/2026	\$ 3.559.825	10/03/2026	Se anexa informe Financiero remitido por FINDETER
1/03/2026 al 31/03/2026	\$ 6.379.619	10/04/2026	
1/04/2026 al 30/04/2026	\$ 7.154.029	11/05/2026	
1/05/2026 al 31/05/2026	\$ 5.381.907	9/06/2026	


PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.


SI	NO
Marque con una X	

Soporte certificación de Parafiscales en: Proceso CO1.PCCNTR.4762508/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D1.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B>

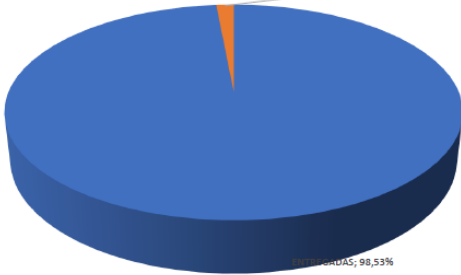ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	98,53%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): <u>El avance físico global del contrato corresponde al 98,53%.</u> 134 sedes se encuentran entregadas. 2 sedes terminadas. (Pendientes de entrega)	
Aulas Móviles Contrato No. 4917031-2023  136 sedes educativas [instalación de aulas y mejoramientos] \$ 63.650 Millones de pesos  Fecha inicio: 02/06/2023 Fecha Fin Actual: 01/05/2026 Terminación Inicial: 30/04/2024 Prórroga 1: 6 meses - 01/11/2024 Prórroga 2: 7 meses - 01/07/2025 Prórroga 3: 10 meses - 01/05/2026 Estado de entrega y ejecución de Sedes ENTREGADAS 134 sedes 98,53% TERMINADAS 2 sedes 1,47%  ■ ENTREGADAS ■ TERMINADAS CCOM-FO-005 V1 / 05_Ago-2024 / Publica <i>Fuente: presentación FINDETER</i>	
Toda la contratación derivada se encuentra concluida. El último grupo en ejecución, correspondiente al Grupo No. 9, finalizó las obras el 27 de febrero de 2026. No obstante, aún se encuentra pendiente la entrega formal de las sedes educativas La Humareda y El Brasil, ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima. Al respecto, FINDETER, en articulación con la Alcaldía Municipal y el rector de la institución educativa, ha adelantado las gestiones necesarias para la formalización del servicio de energía eléctrica en ambas sedes. En ese sentido, FINDETER informó al Ministerio que la institución educativa presentó ante la Entidad Territorial Certificada (ETC) del Tolima la solicitud formal para su inclusión en el paquete corporativo de CELSIA, así como para la realización del traslado del servicio al nuevo punto donde fueron construidas las sedes educativas. Actualmente, tanto la institución educativa como FINDETER se encuentran a la espera de que la Entidad Territorial Certificada adelante las gestiones requeridas ante CELSIA para el traslado del servicio y la inclusión de las sedes en el paquete corporativo, trámite que es de su competencia y responsabilidad. <u>El presente contrato interadministrativo finalizó el 1 de mayo de 2026.</u>	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

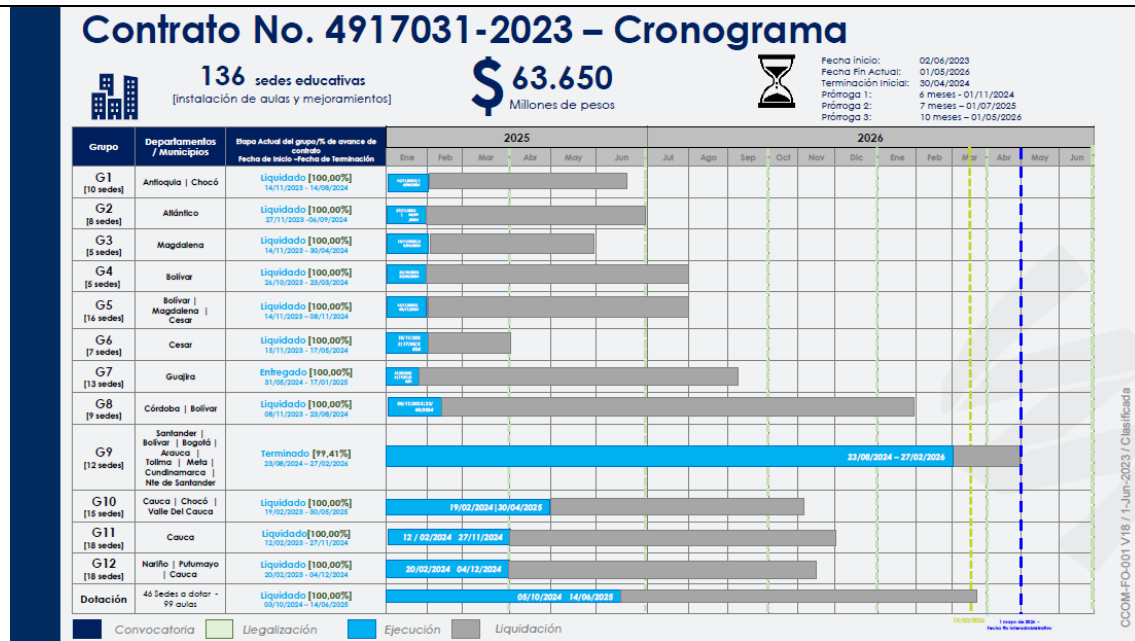

Grupo 09

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

EL BRASIL - ID No. 100

LA HUMAREDA - ID No. 67



Fuente: presentación FINDETER

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	% DE EJECUCIÓN
1	Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C.E.R. PAULINA PUERTA	100%
1	Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	100%
1	Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	100%
1	Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

1	Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	100%
1	Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	100%
1	Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	100%
1	Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	100%
1	Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA	100%
1	Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA	100%
2	Atlántico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	100%
2	Atlántico	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	100%
2	Atlántico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	100%
2	Atlántico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	100%
2	Atlántico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	100%
2	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	SEDE PRINCIPAL	100%
2	Atlántico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	100%
2	Atlántico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	100%
3	Magdalena	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	100%
3	Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	100%
3	Magdalena	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	100%
3	Magdalena	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	100%
3	Magdalena	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	100%
4	Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	100%
4	Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	100%
4	Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	100%
4	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	100%
4	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	100%
5	Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	100%
5	Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	100%
5	Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

5	Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	100%
5	Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	100%
5	Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	100%
5	Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	100%
5	Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	100%
5	Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	100%
5	Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	100%
5	Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	100%
5	Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	100%
5	Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	100%
5	Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	100%
5	Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	100%
5	Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	100%
6	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	100%
6	Cesar	La Paz (Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	100%
6	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	100%
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	100%
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	100%
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	100%
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	100%
7	La Guajira	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	100%
7	La Guajira	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA'ANA1	100%
7	La Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	100%
7	La Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	100%
7	La Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	100%
7	La Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	100%
7	La Guajira	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	100%
7	La Guajira	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	100%
7	La Guajira	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

7	La Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	100%
7	La Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	100%
7	La Guajira	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	100%
7	La Guajira	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	100%
8	Córdoba	Tuchín	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	100%
8	Córdoba	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	100%
8	Córdoba	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	100%
8	Córdoba	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	100%
8	Córdoba	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	100%
8	Córdoba	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	100%
8	Bolívar	María la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO	100%
8	Bolívar	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	100%
8	Bolívar	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	SEDE PRINCIPAL	100%
9	Santander	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	100%
9	Santander	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	100%
9	Bolívar	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	100%
9	Arauca	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	100%
9	Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	100%
9	Meta	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	100%
9	Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	100%
9	Cundinamarca	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	100%
9	Bolívar	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	100%
9	Bolívar	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	100%
9	Norte de Santander	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	100%
9	Arauca	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	100%
10	Cauca	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	100%
10	Cauca	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	100%
10	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	100%
10	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	100%
10	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	100%
10	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

10	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	100%
10	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	100%
10	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	100%
10	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	100%
10	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	100%
10	Cauca	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	100%
10	Cauca	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	100%
10	Cauca	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	100%
10	Cauca	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	100%
11	Cauca	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	100%
11	Cauca	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	100%
11	Cauca	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	100%
11	Cauca	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	100%
11	Cauca	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	100%
11	Cauca	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	100%
11	Cauca	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	100%
11	Cauca	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	100%
11	Cauca	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	100%
11	Cauca	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	100%
11	Cauca	Popayán	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	100%
11	Cauca	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	100%
11	Cauca	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	100%
11	Cauca	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	100%
11	Cauca	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	100%
11	Cauca	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	100%
11	Cauca	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	100%
11	Cauca	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	100%
12	Nariño	Pasto	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	100%
12	Nariño	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	100%
12	Huila	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	100%
12	Cauca	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

12	Nariño	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	100%
12	Putumayo	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	100%
12	Putumayo	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	100%
12	Nariño	BARBACOAS	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	100%
12	Putumayo	Puerto Leguizamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	100%
12	Nariño	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	100%
12	Cauca	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	100%
12	Cauca	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	100%
12	Putumayo	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	100%
12	Nariño	Ipiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	100%
12	Nariño	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	100%
12	Putumayo	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	100%
12	Cauca	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	100%
12	Cauca	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	100%

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADA CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.

GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACIÓN
G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A.	Liquidado el 31 de enero del 2025
G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Liquidado el 22 de julio del 2025
G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025
G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	Liquidado el 30 de enero del 2026
G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023G5	Liquidado el 16 de julio del 2025
G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025
G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM2023	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el 28 de julio del 2025
G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	Liquidado el 15 de enero del 2026
G8	PAF-MENAM-O-055-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 14 de marzo del 2025
G8	PAF-MENAM-I-057-2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO	Liquidado el 30 de enero del 2026
G9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	En Liquidación
G9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	CONSORCIO SAN GABRIEL	En Liquidación
G10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	Liquidado el 23 de octubre del 2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

G10	PAF-MENAM-I-062-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 24 de octubre del 2025
G11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Liquidado el 13 de agosto del 2025
G11	PAF-MENAM-I-063-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 25 de agosto del 2025
G12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	Liquidado el 26 de junio del 2025
G12	PAF-MENAM-I-064-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 23 de julio del 2025
**	PAF-ATMEN5-S-041-2024	DOTAESCOL	Liquidado el 30 de enero del 2026

DETALLE SEDES BENEFICIDAS CON DOTACIÓN ESCOLAR

GRUPO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ACTA DE ENTREGA	AULAS NUEVAS	AULAS NUEVAS BÁSICA PRIMARIA	AULAS NUEVAS BÁSICA SECUNDARIA	AULAS NUEVAS BÁSICA MULTIGRADO	TOTAL AULAS NUEVAS
1	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	Carmen del Darién	Chocó	SI				2	2
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	Apartadó	Antioquia	SI				1	1
2	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	Repelón	Atlántico	SI				1	1
2	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	Soledad	Atlántico	SI				3	3
3	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	El Retén	Magdalen a	SI			9		9
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	Mompós	Bolívar	SI				6	6
4	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	San Sebastián de Buenavista	Magdalen a	SI				4	4
4	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	San Sebastián de Buenavista	Magdalen a	SI				3	3
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	Barranco de Loba	Bolívar	SI		1			1

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
DE CONTRATO O CONVENIO No. 12**

5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	San Martín de Loba	Bolívar	SI		1			1
6	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	La Paz (Robles)	Cesar	SI				1	1
6	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	El Paso	Cesar	SI		1			1
8	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	Planeta Rica	Córdoba	SI		1			1
8	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	Puerto Libertador	Córdoba	SI				1	1
8	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	Ayapel	Córdoba	SI				1	1
8	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	Montelíbano	Córdoba	SI		2			2
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	María la Baja	Bolívar	SI			2		2
10	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	Santander de Quilichao	Cauca	SI			8		8
10	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ	SEDE MARIA INMACULADA	Suarez	Cauca	SI		6			6
11	I.E. HUISITO	SEDE HUISITÓ	El Tambo	Cauca	SI	2	3	1		6
11	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	SEDE CORRAL VIEJO	Bolivar	Cauca	SI				1	1
11	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	SEDE LA FUENTE	Bolivar	Cauca	SI				1	1
11	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	IE AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER - SEDE GARAY	La Vega	Cauca	SI				1	1

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
DE CONTRATO O CONVENIO No. 12**

11	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER	Rosas	Cauca	SI	1				1
5	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	El Banco	Magdalen a	SI	1				1
5	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	SI		1			1
5	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	SI				1	1
7	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMAN A	Manaure	La Guajira	SI		1			1
7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	SI			1		1
7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	SI		1			1
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	SI			1		1
7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	SI		1			1
7	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	SI		1			1
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'AN A	Maicao	La Guajira	SI			2		2
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	SI		4			4
9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	SI				1	1
9	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	SI		5			5
9	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	SI				1	1
9	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	SI				1	1

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	SI				1	1
10	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	SI				1	1
10	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano (Mutis)	Chocó	SI				1	1

N.º	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1.	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	% de avance: 98.53% Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el presente período, garantizó el cumplimiento estricto de esta obligación mediante la ejecución de actividades de seguimiento y control, orientadas a verificar la conformidad de los procesos con los requisitos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales establecidos en el marco contractual. Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
2	Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.	% de avance: 98.53% Descripción del avance: Durante el presente período se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento: 15 de abril de 2026 – Comité de seguimiento virtual. 25 de mayo de 2026 – Comité de seguimiento virtual. Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D3. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
3	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.	% de avance: 98.53% Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el presente período, dio cumplimiento estricto a esta obligación mediante la disposición y administración interna del servicio en la nube de Microsoft, utilizado para el almacenamiento y custodia de la documentación contractual. Es importante señalar que el acceso a esta plataforma tecnológica está restringido exclusivamente a FINDETER, de conformidad con las políticas establecidas por la Vicepresidencia de Riesgos de la Entidad. En este sentido, el ingreso, la

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		administración y la gestión de los archivos únicamente pueden realizarse desde los equipos de cómputo autorizados por FINDETER, garantizando así el adecuado mantenimiento, conservación y custodia de la documentación relacionada con el Contrato Interadministrativo. Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
4	Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante el presente período, y en atención a la solicitud de la supervisión radicada mediante oficio No. 2026-EE-127549 del 10 de abril de 2026, mediante la cual se requirió la remisión de información relacionada con la ejecución del contrato, FINDETER dio respuesta a dicho requerimiento mediante radicado No. 2202652003829 del 23 de abril de 2026, remitiendo la documentación solicitada. Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D4 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B
5	Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.	% de avance: N/A Descripción del avance: Durante el presente periodo, no se recibieron requerimientos por parte de los organismos de control del Estado colombiano ni de otras autoridades competentes. Entrega de producto: si <u> </u> no <u>X</u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
6	Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	% de avance: 99% Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el presente periodo se garantizó la aplicación integral del Manual de Imagen del Ministerio de Educación Nacional en todas las piezas comunicativas asociadas al evento de lanzamiento de la Cumbre Agraria. Asimismo, se aseguró su observancia en el desarrollo de productos, la ejecución de contratos, las actividades de socialización y los procesos de seguimiento vinculados al Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023. De igual forma, se otorgó el reconocimiento correspondiente en la publicación de los estudios previos de las convocatorias para obra e interventoría de los contratos derivados, así como en los demás espacios institucionales requeridos, en cumplimiento de la normativa vigente y los

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		lineamientos establecidos por la entidad. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional. Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
7	Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.	% de avance: N/A Descripción del avance: FINDETER informa que, durante el presente periodo, dio cumplimiento estricto a esta obligación, en atención a las políticas de tratamiento y protección de datos personales adoptadas por la Entidad, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todos sus funcionarios y colaboradores. Estas directrices garantizan la adecuada gestión, confidencialidad, integridad y seguridad de la información, en concordancia con la normativa vigente y los lineamientos institucionales aplicables. Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
8	Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	% de avance: 100% Descripción del avance: A la fecha del presente informe, FINDETER informa que, ha dado cumplimiento estricto a la presente obligación Se anexa certificado del pago de Seguridad Social y parafiscales. Entrega de producto: si <u>X</u> no ___ Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación
1.	Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio secop), el cronograma de ejecución del objeto del contrato interadministrativo.	% de avance: 100% Descripción del avance: FINDETER presentó el cronograma correspondiente en junio de 2023 y posteriormente realizó una actualización en agosto del mismo año, tal como se evidencia en el Informe Periódico de Supervisión No. 1. Desde su presentación, se ha efectuado un seguimiento permanente al cumplimiento de dicho cronograma en cada uno de los comités realizados en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo. Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
2	Crear una vez suscrito y legalizado el contrato	% de avance: 100%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación
	interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este contrato interadministrativo dentro del patrimonio autónomo constituido para tal fin por FINDETER.	Descripción del avance: FINDETER informa que, una vez constituido el Patrimonio Autónomo correspondiente al presente Contrato Interadministrativo, se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Dicha cuenta fue habilitada para la administración y manejo de los recursos asociados al Contrato Interadministrativo, en cumplimiento de las disposiciones contractuales y financieras aplicables. Los respectivos soportes fueron aportados en el informe periódico de supervisión No. 1. Entrega de producto: si ☐ no ☒ Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
3	Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.	% de avance: 99% Descripción del avance: FINDETER dio cumplimiento a la presente obligación mediante la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil No. 3.1-113801 con Fiduciaria Popular S.A., cuyo objeto consiste en constituir un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) en virtud del Contrato Interadministrativo Electrónico No. CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, a título de fiducia mercantil denominado Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal. Este patrimonio autónomo tiene como finalidad la administración, inversión y ejecución de los recursos, así como la realización de los pagos y la celebración de los contratos derivados del fideicomiso, garantizando una gestión eficiente, transparente y acorde con las disposiciones contractuales, legales y financieras aplicables al Contrato Interadministrativo. FINDETER remite mensualmente el informe financiero donde se evidencia lo descrito previamente. Entrega de producto: si ☒ no ☐ Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D5 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true.%E2%80%8B
4	Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.	% de avance: 99% Descripción del avance: En cumplimiento de este compromiso, FINDETER llevó a cabo la estructuración de la contratación mediante doce (12) grupos de ejecución, sobre los cuales realiza el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico correspondiente. Como resultado de las gestiones adelantadas, el contrato registra a la fecha un avance global del 99,53 % en la ejecución de las actividades programadas. A continuación, se detalla el estado de ejecución de las obras de infraestructura correspondientes a las 136 sedes educativas

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación																																												
		priorizadas en el marco de los compromisos adquiridos con la Unidad de Gestión del Riesgo en el marco de la atención por ola invernal: 134 obras terminadas y entregadas a las respectivas comunidades educativas. 2 obras terminadas en etapa de entrega para posterior liquidación de la contratación derivada. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proceso/Grupo</th><th colspan="2">Estado del Grupo</th></tr> <tr> <th>Obra</th><th>Interventoría</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Grupo 1</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 2</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 3</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 4</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 5</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 6</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 7</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 8</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 9</td><td>Terminado</td><td>Terminado</td></tr> <tr><td>Grupo 10</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 11</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Grupo 12</td><td>Liquidado</td><td>Liquidado</td></tr> <tr><td>Dotación</td><td>Liquidado</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> Ver detalle de avance de ejecución de las sedes en el “ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe. Entrega de producto: si___ no__<u>X</u>__ Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A	Proceso/Grupo	Estado del Grupo		Obra	Interventoría	Grupo 1	Liquidado	Liquidado	Grupo 2	Liquidado	Liquidado	Grupo 3	Liquidado	Liquidado	Grupo 4	Liquidado	Liquidado	Grupo 5	Liquidado	Liquidado	Grupo 6	Liquidado	Liquidado	Grupo 7	Liquidado	Liquidado	Grupo 8	Liquidado	Liquidado	Grupo 9	Terminado	Terminado	Grupo 10	Liquidado	Liquidado	Grupo 11	Liquidado	Liquidado	Grupo 12	Liquidado	Liquidado	Dotación	Liquidado	N/A
Proceso/Grupo	Estado del Grupo																																													
	Obra	Interventoría																																												
Grupo 1	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 2	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 3	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 4	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 5	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 6	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 7	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 8	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 9	Terminado	Terminado																																												
Grupo 10	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 11	Liquidado	Liquidado																																												
Grupo 12	Liquidado	Liquidado																																												
Dotación	Liquidado	N/A																																												
5	Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución del presente convenio, FINDETER avanzó en la evaluación de la viabilidad técnica, jurídica, financiera y administrativa de ciento treinta y seis (136) sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Como resultado de las revisiones adelantadas en el marco del plan de acción definido conjuntamente entre el MEN y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), se logró establecer la viabilidad de las intervenciones y las condiciones requeridas para su financiación. Los soportes que acreditan el cumplimiento de la presente obligación fueron aportados y anexados en los informes parciales de supervisión presentados previamente. Entrega de producto: si___ no__<u>X</u>__ Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A																																												
6	Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD.	% de avance: 99% Descripción del avance: FINDETER ha cumplido esta obligación, remitiendo mensualmente los informes financieros y de gestión técnica correspondientes. Para el presente periodo se registra la remisión de los siguientes informes:																																												

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación																																							
		Informe N° 35: Periodo comprendido entre el 02 de abril de 2026 al 01 de mayo de 2026. Con respecto al informe final, FINDETER informa que este será remitido una vez se encuentre liquidada el 100% de la contratación derivada. Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B																																							
7	Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.	% de avance: 100% Descripción del avance: Findeter elaboró la totalidad de los estudios previos y los términos de referencia correspondientes a los 136 proyectos priorizados a la fecha, necesarios para la contratación de las obras y sus respectivas interventorías, agrupados en doce (12) procesos de contratación. Estos documentos fueron estructurados de conformidad con los requisitos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de Findeter, incluyendo la definición de las garantías exigidas para cada proceso. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTRUCTURACIÓN</th><th>CONVOCATORIA</th><th>GRUPO</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> Los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la presente obligación fueron remitidos en informes de supervisión previos. Entrega de producto: si <u> </u> no <u>X</u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A	ESTRUCTURACIÓN	CONVOCATORIA	GRUPO	100%	100%	1	100%	100%	2	100%	100%	3	100%	100%	4	100%	100%	5	100%	100%	6	100%	100%	7	100%	100%	8	100%	100%	9	100%	100%	10	100%	100%	11	100%	100%	12
ESTRUCTURACIÓN	CONVOCATORIA	GRUPO																																							
100%	100%	1																																							
100%	100%	2																																							
100%	100%	3																																							
100%	100%	4																																							
100%	100%	5																																							
100%	100%	6																																							
100%	100%	7																																							
100%	100%	8																																							
100%	100%	9																																							
100%	100%	10																																							
100%	100%	11																																							
100%	100%	12																																							
8	El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio	% de avance: 99% Descripción del avance: De acuerdo con el reporte del informe de ejecución financiera de Findeter, con corte al 28 febrero de 2026, se reintegraron los siguientes rendimientos financieros: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo de</th><th>Valor</th><th>Fecha de</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Periodo de	Valor	Fecha de																																				
Periodo de	Valor	Fecha de																																							

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación			
	Autónomo constituido por Findeter.		generación de rendimientos	rendimiento	consignación de rendimientos
			Febrero	\$ 3.559.825	10/03/2026
			Marzo	\$ 6.379.619	10/04/2026
			Abril	\$ 7.154.029	11/05/2026
			Mayo	\$ 5.381.907	9/06/2026
9	En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, Findeter debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.	Entrega de producto: si <u> X </u> no <u> </u>			
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D6 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B			
		% de avance: 100%			
		Descripción del avance: Findeter, en cumplimiento de lo establecido en su Manual Operativo, adelantó los procesos de contratación que garantizaron la ejecución eficiente de los procesos de selección y promovieron la pluralidad de oferentes. De igual manera, durante la etapa de estructuración se identificó la necesidad de optimizar los tiempos de respuesta y ejecución, para lo cual se contempló la implementación de sistemas constructivos industrializados que permitieron una mayor eficiencia en el desarrollo de los proyectos. El detalle de avance de ejecución de las sedes en el “ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe.			
		Entrega de producto: si <u> </u> no <u> X </u>			
10	Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.	Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A			
		% de avance: 100%			
		Descripción del avance: Durante el desarrollo del presente contrato, FINDETER ha adelantado la evaluación de las propuestas correspondientes a doce (12) grupos de contratación, tanto para la ejecución de las obras como para las respectivas interventorías. Prueba de lo anterior es el estado de avance de ejecución de las obras el cual puede ser verificado en el apartado de “ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe.			
		Entrega de producto: si <u> </u> no <u> X </u>			
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A			
11	Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.	% de avance: 100%			
		Descripción del avance: FINDETER realiza la supervisión de los contratos de obra mediante las interventorías contratadas para este propósito. De igual manera, ha designado profesionales especializados para ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a dichos contratos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y alcances establecidos para cada proyecto.			
		GRUPO	INTERVENTORÍA	CÓDIGO CONVOCATORIA	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación		
		Grupo 1 – Antioquia, Chocó	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S	PAF-MENAM-I-052-2023
		Grupo 2 - Atlántico	RM INGENIEROS S.A.S.	PAF-MENAM-I-053-2023
		Grupo 3 – Magdalena	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023
		Grupo 4 – Bolívar, Magdalena	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023
		Grupo 5 - Bolívar, Magdalena	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023
		Grupo 6 - Cesar	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023
		Grupo 7 – La Guajira	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023
		Grupo 8 – Córdoba, Bolívar	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023
		Grupo 9 – Santander, Nte de Santander, Arauca, Meta.	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024
		Grupo 10 – Cauca, Chocó, Valle del Cauca.	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023
		Grupo 11 – Cauca	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	AF-MENAM-I-063-2023
		Grupo 12 – Nariño	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023
		FINDETER continúa ejerciendo la supervisión de los contratos que actualmente se encuentran en etapa de liquidación, teniendo en cuenta que aún está pendiente la entrega a satisfacción de las sedes educativas Brasil y La Humareda, ubicadas en el municipio de Santa Isabel. Lo anterior obedece a que dichas actividades corresponden al cumplimiento de obligaciones propias del contrato de obra, las cuales, a la fecha, no han sido culminadas en su totalidad. Así las cosas, y pese a haberse cumplido el plazo contractual del Contrato Interadministrativo y finalizado las actividades correspondientes al contrato de obra derivado, FINDETER, en articulación con la institución educativa y la entidad territorial, ha gestionado ante la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, CELSIA, la inclusión de las sedes educativas en el paquete corporativo de la Secretaría de Educación, con el fin de garantizar la adecuada prestación y continuidad del servicio.		
Entrega de producto: si <u> X </u> no <u> </u>				
Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D7 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B				
12	Conformar un Comité Fiduciario y un Comité	% de avance: 100%		

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación																																																												
	Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.	Descripción del avance: Tal como se ha informado en los informes de supervisión previos, esta obligación se cumplió mediante la aprobación del Manual operativo Patrimonio Autónomo Findeter MEN aulas móviles por ola invernal - Contrato de fiducia mercantil 3-1-113801de 2023, efectuada en el Comité Fiduciario No. 1 celebrado el veintisiete (27) de junio de 2023. En dicho manual se establecieron los lineamientos para la conformación de los comités Técnico y Fiduciario, así como sus funciones, competencias y mecanismos de actuación, con el fin de garantizar la adecuada gobernanza y seguimiento de los recursos y proyectos a cargo del patrimonio autónomo. Entrega de producto: si__ no <u>X</u> Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A																																																												
13	Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.	% de avance: 99% Descripción del avance: Conforme a la finalización de las actividades en cada uno de los contratos derivados, FINDETER ha adelantado los respectivos procesos de liquidación tal y como se describe a continuación: <table><tr><th>GRUPO</th><th>CONVOCATORIA</th><th>CONTRATISTA</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>G1</td><td>PAF-MENAM-I-052-2023</td><td>INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S</td><td>Liquidado el 25 de febrero del 2025</td></tr><tr><td>G1</td><td>PAF-MENAM-O-049-2023</td><td>OBRAS CAPITAL S.A</td><td>Liquidado el 31 de enero del 2025</td></tr><tr><td>G2</td><td>PAF-MENAM-I-053-2023</td><td>RM INGENIEROS S.A.S</td><td>Liquidado el 22 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G2</td><td>PAF-MENAM-O-050-2023</td><td>CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023</td><td>Liquidado el 17 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G3</td><td>PAF-MENAM-I-054-2023</td><td>CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3</td><td>Liquidado el 20 de diciembre del 2024</td></tr><tr><td>G3</td><td>PAF-MENAM-O-051-2023</td><td>CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA</td><td>Liquidado el 01 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>G4</td><td>PAF-MENAM-O-052-2023</td><td>JASA LTDA</td><td>Liquidado el 30 de septiembre del 2024</td></tr><tr><td>G4</td><td>PAF-MENAM-I-055-2023</td><td>CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4</td><td>Liquidado el 26 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>G5</td><td>PAF-MENAM-O-053-2023</td><td>CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5</td><td>Liquidado el 16 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G5</td><td>PAF-MENAM-I-056-2023</td><td>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5</td><td>Liquidado el 22 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G6</td><td>PAF-MENAM-O-056-2023</td><td>DAR ARQUITECTURA S.A.S</td><td>Liquidado el 20 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>G6</td><td>PAF-MENAM-I-058-2023</td><td>CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023</td><td>Liquidado el 27 de noviembre del 2024</td></tr><tr><td>G7</td><td>PAF-ATMEN5-O-036-2024</td><td>CONSORCIO GUAJIRA 7</td><td>Liquidado el 28 de julio del 2025</td></tr><tr><td>G7</td><td>PAF-MENAM-I-059-2023</td><td>GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN</td><td>En Liquidación</td></tr></table>	GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACION	G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025	G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A	Liquidado el 31 de enero del 2025	G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Liquidado el 22 de julio del 2025	G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025	G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el 20 de diciembre del 2024	G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el 01 de noviembre del 2024	G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Liquidado el 30 de septiembre del 2024	G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	Liquidado el 26 de noviembre de 2025	G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Liquidado el 16 de julio del 2025	G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025	G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 20 de noviembre del 2024	G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el 27 de noviembre del 2024	G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el 28 de julio del 2025	G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	En Liquidación
GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACION																																																											
G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025																																																											
G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A	Liquidado el 31 de enero del 2025																																																											
G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Liquidado el 22 de julio del 2025																																																											
G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidado el 17 de julio del 2025																																																											
G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el 20 de diciembre del 2024																																																											
G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el 01 de noviembre del 2024																																																											
G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Liquidado el 30 de septiembre del 2024																																																											
G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	Liquidado el 26 de noviembre de 2025																																																											
G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Liquidado el 16 de julio del 2025																																																											
G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidado el 22 de julio del 2025																																																											
G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 20 de noviembre del 2024																																																											
G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el 27 de noviembre del 2024																																																											
G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Liquidado el 28 de julio del 2025																																																											
G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	En Liquidación																																																											

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos Específicos del Contratista	Estado de avance de la obligación			
		G8	PAF-MENAM-O-055-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Liquidado el 14 de marzo del 2025
		G8	PAF-MENAM-I-057-2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZRICARDO	Liquidado el 11 de febrero de 2026
		G9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	En Liquidación
		G9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	CONSORCIO SAN GABRIEL	En Liquidación
		G10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	Liquidado el 23 de octubre del 2025
		G10	PAF-MENAM-I-062-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 24 de octubre del 2025
		G11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Liquidado el 13 de agosto del 2025
		G11	PAF-MENAM-I-063-2023 –	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 25 de agosto del 2025
		G12	PAF-MENAM-O-076-2023 –	CONSORCIO FIN GRUPO 12	Liquidado el 26 de junio del 2025
		G12	PAF-MENAM-I-064-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Liquidado el 23 de julio del 2025
		**	PAF-ATMEN5-S-041-2024	DOTAESCOL	Liquidado el 11 de febrero de 2026
		Actualmente, y como consecuencia de la falta de entrega a satisfacción de las sedes educativas Brasil y La Humareda, se encuentran pendientes los procesos de liquidación de los contratos de obra e interventoría correspondientes al Grupo No. 9. En atención a esta situación, la Supervisión remitió a FINDETER el oficio con radicado No. 2026-EE-151548 del 29 de abril de 2026, mediante el cual solicitó información actualizada sobre las dificultades que han impedido la culminación del proceso, así como la definición de una ruta de trabajo que permita lograr la entrega a satisfacción de las sedes educativas y, posteriormente, la liquidación de los contratos derivados.			
Entrega de producto: si <u> X </u> no <u> </u>					
Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: Proceso CO1.PCCNTR.4917031/ Información de la Selección/ Documentos de ejecución del contrato/ 89_IDS_12_4917031_23_D8 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.%E2%80%8B					

N.º	Obligaciones/compromisos del Ministerio de Educación	Estado de avance de la obligación	
1	Realizar la gestión necesaria con el FNGRD para que dicha entidad transfiera al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER a nombre del MEN, los recursos para la ejecución de los proyectos objeto del presente Contrato.	% de avance: 100%	
		Descripción del avance: Tal como se ha informado en reportes de supervisión anteriores, y de acuerdo con lo señalado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se impartió instrucción a FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) – Subcuenta Colombia Vital, para efectuar el giro de los recursos correspondientes. En cumplimiento de dicha instrucción, el desembolso fue realizado el 4 de agosto de 2023 a la cuenta de ahorros No. 500-804-65045-0. Por su parte, FINDETER, entidad encargada de ejecutar el Plan	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos del Ministerio de Educación	Estado de avance de la obligación
		de Acción contratado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), confirmó que la Fiduciaria Popular S.A. recibió los recursos el 8 de agosto de 2023. Los soportes de cumplimiento de la presente obligación fueron suministrados en informes de supervisión previos.
		Entrega de producto: si___ no_ <u>X</u>__
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
2	Designar la supervisión del presente contrato interadministrativo.	% de avance: 100% Descripción del cumplimiento: De conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del Contrato Interadministrativo, a la fecha de presentación del presente informe, la supervisión del contrato es ejercida por la ingeniera Diana Milena Maldonado Torres, Profesional Especializada de la Oficina de Infraestructura Educativa. Esta designación fue formalizada mediante el comunicado No. 2024-EE-269101 del 19 de septiembre de 2024, aportada en el Informe de Supervisión No. 5, y continúa vigente a la fecha.
		Entrega de producto: si___ no_ <u>X</u>__
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
3	Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los Comités Fiduciarios, cuando se requiera, previa convocatoria por parte de la FIDUCIARIA que determine FINDETER.	% de avance: 100% Descripción del cumplimiento: Durante la ejecución del presente contrato, y conforme se indicó en los informes de supervisión previos, el Ministerio participó en los comités técnicos y fiduciarios cada vez que fue convocado. Sin embargo, durante el período objeto del presente informe, y debido a la finalización del Contrato Interadministrativo el 1 de mayo de 2026, FINDETER no realizó convocatorias a comités en el marco de las competencias y obligaciones establecidas contractualmente.
		Entrega de producto: si___ no_ <u>X</u>__
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
4	Entregar a FINDETER la priorización de los establecimientos educativos a atender bajo este contrato.	% de avance: 100% Descripción del cumplimiento: Los proyectos enmarcados en la línea de Atención Ola invernal se establecieron en el estudio previo del presente contrato, los cuales se encuentran descritos en el apartado de “ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO” del presente informe.
		Entrega de producto: si___ no_ <u>X</u>__
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
5	Elaborar y suscribir el acta de liquidación del presente Contrato.	% de avance: 0% Descripción del cumplimiento: <u>El contrato finalizó contractualmente el 1 de mayo de 2026.</u> En consecuencia, la Supervisión iniciará las gestiones necesarias para su liquidación una vez FINDETER informe que la totalidad de los contratos derivados se encuentra debidamente liquidada.
		Entrega de producto: si___ no_ <u>X</u>__

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 12

N.º	Obligaciones/compromisos del Ministerio de Educación	Estado de avance de la obligación
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
6	Informar en un plazo no superior a quince (15) días hábiles contados desde la terminación del plazo del presente Contrato, la cuenta bancaria para el reintegro de los recursos desembolsados por el FNGRD, que no fueron ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros.	% de avance: 0%
		Descripción del cumplimiento: Los recursos fueron transferidos en su totalidad por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) mediante la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil No. 3.1-113801 con Fiduciaria Popular S.A., cuyo objeto fue la constitución de un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos aportados por dicha entidad. En este contexto, corresponde a FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), suministrar la información requerida para hacer efectivo el reintegro de los recursos disponibles una vez se surta la liquidación del contrato.
		Entrega de producto: si__ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A
7	Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes para solicitar la exoneración de asumir los costos que se generen por concepto del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se generen por la expedición de nuevas disposiciones legales.	% de avance: 100%
		Descripción del cumplimiento: Tal como se ha informado en los anteriores informes de supervisión, el Ministerio de Educación Nacional comunicó que, como resultado de las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cuenta de ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular, destinada al manejo exclusivo de los recursos de este contrato y de los respectivos reportes contables, fue declarada exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) a partir del 23 de junio de 2023.
		Entrega de producto: si__ no__X__
		Ruta de acceso en SECOP II al soporte de cumplimiento: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado).


N.º	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Entrega a satisfacción de las Sedes educativas La Humareda y Brasil pertenecientes al Grupo No.9.	A la fecha del presente informe, aún se encuentra pendiente la entrega a satisfacción de las sedes educativas Brasil y La Humareda. En este sentido, la Supervisión manifiesta su preocupación, considerando que dichas situaciones debieron haber sido identificadas y gestionadas durante la Etapa I del proyecto.	Se requiere que FINDETER adelante una visita de seguimiento con la participación de representantes de la comunidad educativa, los contratistas de obra, la interventoría y la Entidad Territorial, con el propósito de validar de manera conjunta las acciones requeridas para subsanar las observaciones existentes y avanzar en la entrega a satisfacción de las obras.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
DE CONTRATO O CONVENIO No. 12**

OBSERVACIONES	
1	El 1 de mayo de 2026 finalizó el plazo contractual del Contrato Interadministrativo 4917031 de 2023. Por lo que la supervisión iniciará los trámites respectivos para adelantar su liquidación
2	FINDETER deberá mantener informado al Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre las acciones que adelante de manera conjunta con los actores involucrados, orientadas a superar las observaciones existentes y a garantizar la entrega a satisfacción de las sedes educativas Brasil y La Humareda.
3	La supervisión continuará el seguimiento a las gestiones que adelante FINDETER y que garanticen la entrega a satisfacción de las sedes educativas Brasil y La Humareda, pertenecientes al Grupo No. 9, del municipio de Santa Isabel.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 1 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 29 días del mes de junio de 2026.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



SUPERVISOR

Nombre: Diana Milena Maldonado Torres

Cargo: Profesional Especializado Grado 22

Fecha: 29 de junio de 2026.



Nombre: Juan Sebastián Prada Sánchez

Cargo: Apoyo a la supervisión.

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor
