


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 1 de 4	

No	8	INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN					
Subdirección Técnica Operativa					

FECHA			Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.										
DD	MM	AAAA											
25	11	2025	Secretario: Catalina Camacho										
			Lugar: Virtual										
Hora de Inicio:		3:00	a.m.		p.m.	X	Hora de Cierre:		4:00	a.m.		p.m.	X
Tema de reunión:			Comité Técnico Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.										
Grupo que se reúne:			Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP/Jardín Botánico de Bogotá - JBB										
Asistentes													
Nombre			Cargo				Firma						
Yon Alexsander Plazas Gómez			Profesional Universitario UAESP										
Liseth Paola Piñeros Urrego			Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO										
Ramiro Adolfo Garzón			Profesional Restauración Ecológica JBB - STO										
Luisa Morales			Profesional Restauración Ecológica JBB - STO										
Catalina Camacho Fandino			Coordinadora Convenios JBB - STO										
Orden del día (Describe brevemente los temas a tratar)													
1. Seguimiento al Cerramiento.													
2. Seguimiento actividades de plantación y mantenimiento.													
3. Varios.													
Desarrollo de la reunión													
1. Seguimiento al cerramiento.													
Los designados de la UAESP informaron que se presentó un inconveniente contractual con el contratista encargado del cerramiento, quien había solicitado inicialmente una prórroga y luego una													

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 <p>BOGOTÁ</p> <p>JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ</p>
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 2 de 4	

suspensión del contrato. Sin embargo, tras un comité extraordinario celebrado el día anterior con el área jurídica, se resolvieron los pagos pendientes y se descartó la suspensión del contrato, garantizando su continuidad.

La UAESP confirmó que faltan únicamente entre 100 a 120 metros lineales para culminar el cerramiento, y que las actividades operativas finalizarán el jueves, con recepción del contrato el viernes. Se explicó que el retraso se debió a cambios en la dirección y áreas jurídicas de la entidad, lo que afectó el trámite del anticipo al contratista.

El equipo del JBB presentó observaciones técnicas sobre la ejecución:

- Presencia de residuos de cemento, empaques y basura dejados por el contratista.
- Un mojón ubicado a 30 cm de un árbol plantado, afectando el área.
- Discontinuidades de 20 metros en algunos tramos del cerramiento, especialmente en el sector del cordón ripario.

En respuesta, la UAESP indicó que el guardabosques Félix está realizando actividades de limpieza y cerramiento de parches. Además, se confirmó que el contrato contempla tres broches de acceso, los cuales serán instalados al finalizar el tendido del alambre.

Los designados del JBB reiteraron que la culminación del cerramiento es crítica para la continuidad de la plantación en diciembre y el cumplimiento de metas institucionales. Asimismo, insistieron en la urgencia de evitar nuevos ingresos de ganado, advirtiendo que el pasto crecerá nuevamente en pocas semanas, lo que aumenta el riesgo de afectaciones.

2. Seguimiento actividades de plantación y mantenimiento.

El equipo técnico del JBB reportó el desarrollo de actividades de mantenimiento y plateo, señalando que algunas zonas presentan un crecimiento de pasto superior a 1.20 m, lo cual ha exigido mayores jornadas de manejo. Se informó que el porcentaje de supervivencia es superior al 98 %, y que se han plantado aproximadamente 16.000 individuos, con proyección de finalizar el mes con 4.200 árboles adicionales, superando los 18.000 programados.

Actualmente existen 1.185 árboles en acopio, y solo faltan menos de 2.000 para completar la meta total. Se espera culminar las actividades de plantación antes del 15 de diciembre, fecha límite para la operación del personal contratado.

Se informó formalmente que el 14 de noviembre se suscribió la prórroga No. 1 del Convenio, extendiendo su vigencia hasta marzo de 2026, lo cual permitirá ejecutar adecuadamente las actividades de mantenimiento asociadas.


3. Varios.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 3 de 4	

- La UAESP informó la actualización de la delegación para el seguimiento del Convenio, indicando que la nueva subdirectora de Disposición Final a la Dra. Helga Johanna Camacho Corzo, por lo tanto fue designada como supervisora, en el marco de los ajustes internos derivados de cambios en la dirección y en el equipo jurídico de la entidad. No obstante, se reiteró la continuidad del acompañamiento técnico y administrativo al Convenio Interadministrativo No. 008 de 2025, por el profesional Yon Alexander Plazas Gómez, garantizando la articulación institucional con el Jardín Botánico para el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- La UAESP recomendó la remisión del informe bimestral septiembre–octubre, recordando que en la revisión anterior hubo retrasos derivados de cambios temporales en los revisores. El JBB se comprometió a enviarlo la semana siguiente.
- Por otro lado, se informó sobre inquietudes de un grupo comunitario respecto al uso de especies no nativas y a la percepción de abandono de árboles en el predio. Para atender esta situación, la UAESP solicitó al JBB acompañar una jornada de socialización técnica, programada para el 26 de noviembre a las 6:00 p.m., en la cual se explicarán los criterios y técnicas de restauración ecológica.
- La UAESP confirmó la realización de la jornada de plantación institucional (PIGA) el 2 de diciembre, con participación estimada de 30 a 35 personas. El JBB apartó entre 100 y 120 individuos para la actividad. Se acordó que la UAESP expondrá la contextualización general del proyecto, mientras que el JBB brindará orientación técnica sobre la plantación.
- La UAESP informó que el documento tuvo retrabajos debido a cambios directivos, pero se comprometió a remitirlo antes del viernes.
- Liquidación Convenio Marco 009 de 2020. El JBB reiteró la necesidad de recibir la versión preliminar del acta de liquidación del Convenio Marco 009, antes de que sea firmada por la dirección de la UAESP, para poder realizar la revisión correspondiente.

Evidencias de la reunión:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 4 de 4	

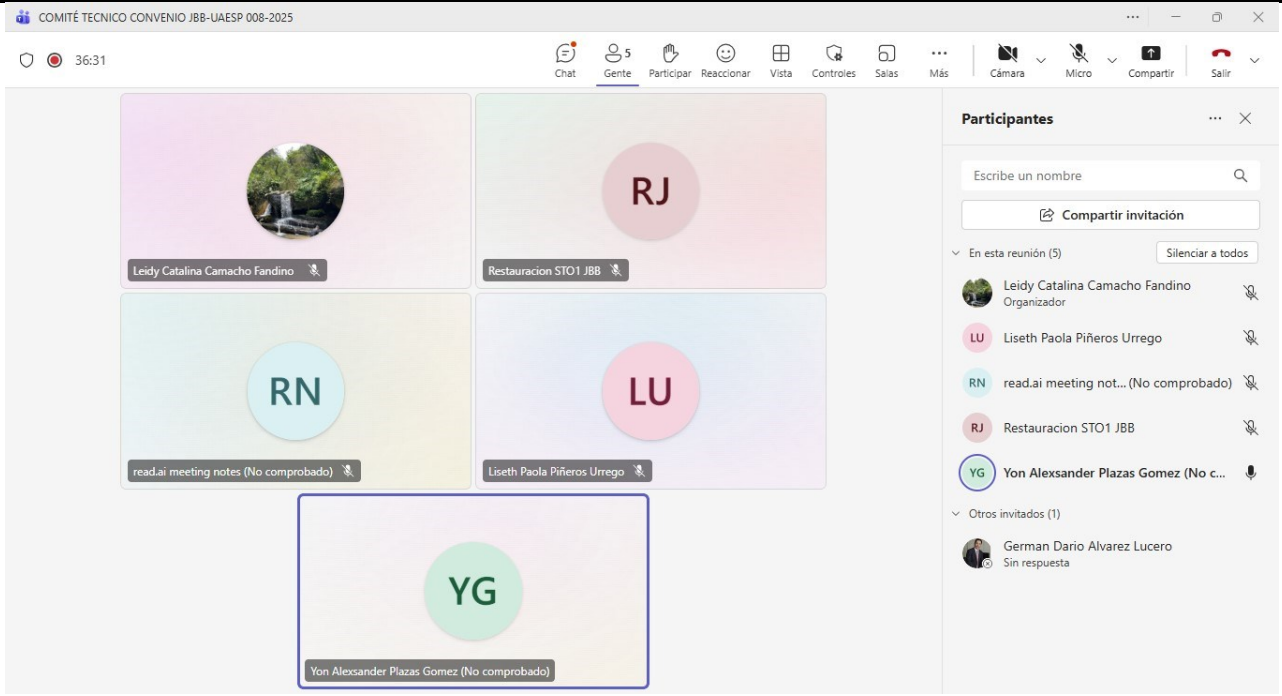

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Culminar el cerramiento del predio	UAESP	28/11/2025
2. Finalizar plantación de los individuos restantes (aprox. 2.000)	JBB	15/12/2025
3. Enviar informe bimestral No. 2	JBB	12/12/2025
4. Realizar la socialización comunitaria sobre restauración ecológica	JBB-UAESP	26/11/2025
5. Realizar jornada del plantación PIGA.	JBB-UAESP	2/12/2025
6. Remitir acta preliminar de liquidación del Convenio Marco 009-2020.	UAESP	28/11/2025

ELABORÓ: CATALINA CAMACHO FANDIÑO
