

 Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
		Versión: 4
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Fecha: 16/07/2025

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OM-2025	
IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): 901972420-9	
No. DE CONTRATO: CPS - 2218 de 2025	Mayor cuantía ☒ Menor Cuantía ☐ Mínima cuantía ☐
OBJETO DEL CONTRATO:	RTVC REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA QUE CONFORMA LA RED DE TRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN ANALÓGICA, TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) Y ESTACIONES DE RADIO AM/FM.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	05 de agosto de 2025
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	Modificación No.1 (11/11/2025) – adición \$2.708.436.834; Modificación No.2 (31/12/2025) – adición \$12.641.872.050 y prórroga al 31/03/2026; Modificación No.3 (31/03/2026) – adición \$5.476.329.530 y prórroga al 30/04/2026; Modificación No. 4 (30/04/2026) – adición \$32.661.971.848 y prórroga al 31/12/2026.
PLAZO INICIAL:	Plazo Inicial: Hasta el 31/12/2025 o hasta agotar recursos Nuevo plazo (Mod. 2): hasta el 31/03/2026 Nuevo plazo (Mod. 3): hasta el 30/04/2026 Nuevo plazo (Mod. 4): hasta el 31/12/2026 o hasta agotar recursos.
PRORROGAS:	Prórroga 1 (Mod. 2): tres (3) meses, del 01/01/2026 al 31/03/2026. Prórroga 2 (Mod. 3): un (1) mes, del 01/04/2026 al 30/04/2026. Prórroga 3 (Mod. 4): ocho (8) meses, del 01/05/2026 al 31/12/2026.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RESOL 005/2026 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC) - VALOR A PAGAR - (\$ 7.200.717.442)
PERIODO CERTIFICADO:	JULIO de 2026
NUMERO DE PAGO:	PAGO # 12

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	Factura Electrónica de Venta FV-23 del 6 de AGOSTO de 2026 por servicios prestados durante el mes de JULIO de 2026.
---	---

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	GASTOS DE VIAJE _____
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO _____	COMISIÓN _____
ANTICIPO: _____	PAGO ANTICIPADO: _____

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Durante el periodo de JULIO de 2026 se evidencia la entrega de la documentación requerida al contratista que permite soportar la ejecución a la fecha. A continuación, se relaciona la documentación entregada a INRAVISION:

- Anexo 1. Informe de Gestión – julio 2026
- Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica julio 2026
- Anexo 3. Entregables Resolución 040 - julio 2026
- Anexo 4. Cronograma Visitas julio
- Anexo 5. Servicios Recuperados Estaciones julio
- Anexo 6. Control PQRS julio 2026
- Anexo 7. Soportes actividades Energía julio

 Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
		Versión: 4
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Fecha: 16/07/2025

- Anexo 8. Resumen de actividades julio energía
- Anexo 9. Cronograma julio CAN
- Anexo 10. Soportes actividades CAN julio 2026
- Anexo 11. Soporte de actividades civiles julio
- Anexo 12. Informe Gestión Ambiental julio 2026
- Anexo 13. Soportes de gestión Ambiental - julio 2026
- Anexo 14. Soportes de gestión SST - julio 2026
- Anexo 15. Informe de monitoreo julio
- Anexo 16. Consolidado de custodios y evidencia de visitas - julio 2026
- Anexo 17. Informe de actividades de Bolsa Integral de Repuestos julio 2026
- Anexo 18. Certificación de Combustibles – julio
- Anexo 19. Detalle de Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato julio
- Anexo 20. Certificación custodios julio 2026
- Anexo 21. Certificación operarios estaciones principales julio
- Anexo 22. Resumen de actividades correctivas julio
- Anexo 23. Ejecución presupuestal contrato NO 2218-2025 31 julio 2026
- Anexo 24. Soportes sistema de información
- Anexo 25. Ingreso de activos Julio 2026

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS:

Durante el periodo certificado a la fecha se tiene que el contrato se inició de acuerdo a lo establecido, adelantando lo relacionado a la **CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato es por la suma de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **(\$25.725.653.989)**, IVA incluido, amparados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3823 y 3833, expedidos el 19 de junio de 2025.

Que con fecha 11 de noviembre de 2025 se realizó la **MODIFICACION No. 1** tendiente a adicionar el contrato **RTVC-CPS-2218-2025** por un valor de **DOS MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE \$ 2.708.436.834**, IVA incluido, amparados en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. CDP No. 4824 de 24/10/2025 - (\$1.931.008.634) y CDP No. 4825 de 24/10/2025 - (\$777.428.200), para un **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MC/TE \$28.434.090.823**, IVA incluido. Con el fin de dar cumplimiento con la ejecución de las necesidades de financiar el proyecto de “Fortalecimiento de la Radio Pública en el Territorio Nacional”. En virtud de lo aprobado por el MinTIC, INRAVISION estableció asegurar la **implementación y puesta en funcionamiento de la Estación de Radio Leticia, la cual requiere la ampliación del alcance y recursos del contrato RTVC-CPS-2218-2025.**

Que con fecha 31 de diciembre de 2025 se realizó la **MODIFICACION No. 2. Tendiente a adicionar el contrato RTVC-CPS-2218-2025** por un valor de **DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$12.641.872.050)** con cargo al CDP de Vigencias Futuras No. 781 del 22-12-2025), para un **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE: CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$41.075.962.873).** Igualmente se establece prorrogar el plazo de ejecución del contrato **RTVC-CPS-2218-2025**, por el término de TRES (03) MESES más, esto es, del **01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026.**

Que con fecha 31 de marzo de 2025 se realizó la **MODIFICACION No. 3. Tendiente a adicionar el contrato RTVC-CPS-2218-2025** por un valor de **CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (\$5.476.329.530 M/CTE)**, IVA incluido, con el propósito de asegurar la ejecución integral de las actividades técnicas, operativas y de soporte necesarias durante el periodo adicional para un **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE . (\$46.552.292.403)** IVA incluido. Igualmente se establece prorrogar en el plazo de ejecución del contrato **RTVC-CPS-2218-2025**, por el término de UN (01) MES más, esto es, del **01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.**

Que con fecha 30 de abril de 2026 se realizó la **MODIFICACION No. 4.** Tendiente a adicionar el contrato **RTVC-CPS-2218-2025** por un valor de **TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$32.661.971.848)** IVA incluido, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio público esencial de radiodifusión a cargo de INRAVISION y el cumplimiento de los indicadores de la Resolución FUTIC 040 de 2026, para un **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE: SETENTA Y NUEVE MIL**

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$79.214.264.251) IVA incluido. Igualmente se establece prorrogar el plazo de ejecución del contrato RTVC-CPS-2218-2025, por el término de OCHO (08) MESES más, esto es, del **01 de mayo de 2026 al 31 de diciembre de 2026.**

Se suscribió el Acta de Inicio de la ejecución contractual y aprobados también por INRAVISION.

ITEM	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO
1	Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportunamente a su liquidación, cuando sea necesario.	Cumple
2	Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y salvaguardar los intereses institucionales de RTVC.	Cumple
3	Atender y cumplir con los lineamientos, directrices, observaciones y requerimientos emanadas por el supervisor y/o interventor del contrato, o a quien este delegue, e informar a este en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados durante la ejecución del contrato.	Cumple
4	Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada. Esto incluye la reserva de obras o contenidos inéditos, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o uso indebido que por sí o por un tercero cause a la administración o a terceros.	Cumple
5	Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución de este hasta su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.	Cumple
6	Cumplir de manera estricta todas y cada una de las medidas y/o protocolos que se adopten en el marco de los programas de promoción y prevención del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por -RTVC S.A.S.	Cumple
7	Entregar al supervisor y/o interventor del contrato al inicio del contrato y cada que sea requerido por el supervisor y/o interventor del contrato, copia del documento que acredite el cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en su empresa.	Cumple
8	Asistir a las reuniones que se programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato.	Cumple
9	Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus actividades, respetando las instrucciones internas de seguridad y convivencia de la Entidad, y manteniendo el buen trato con los demás Contratista es, servidores y funcionarios de -RTVC S.A.S. - bajo los principios de buena conducta ética y Página 4 de 14 moral, a fin de cumplir con el objeto contractual establecido en el presente negocio jurídico.	Cumple
10	Informar por escrito al supervisor y/o interventor del contrato las novedades relativas a cesión, suspensión o terminación anticipada del contrato, con mínimo ocho (8) días de antelación a la fecha de suscripción del acta que contenga la novedad.	Cumple
11	Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, teniendo como referente los principios de calidad en los tiempos de ejecución establecidos.	Cumple
12	Cumplir con los lineamientos y especificaciones técnicas del Servicio y conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral de la presente contratación.	Cumple
13	Conocer y aplicar las políticas y protocolos de protección implementadas a través de la Circular No. 007 del 22 de marzo de 2023, o aquella que la modifique, sustituya o adicione, las cuales corresponden al protocolo para el manejo del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en RTVC S.A.S.	Cumple
14	Custodiar y velar por la seguridad de las instalaciones y el personal requerido para el cumplimiento del contrato, cuando sea necesario y bajo su propio riesgo sin que esto represente un costo adicional para la Entidad. RTVC no se hará responsable por pérdida total o parcial de los equipos, esta responsabilidad recaerá únicamente en cabeza del CONTRATISTA, a quien podrá serle descontado el valor del daño a cargo de la contraprestación que habrá de recibir.	Cumple
15	Cumplir con los lineamientos contemplados en el Manual de Contratación de -RTVC-, referente al Conflicto de Interés.	Cumple
16	Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.	Cumple

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en EJECUCIÓN, con un porcentaje de avance financiero acumulado del **75 %** (tras Pago No. 12).

NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de julio de 2026**, la ejecución del Contrato **INRAVISIÓN-CPS-2218-2025** se desarrolló de manera continua; no obstante, se presentaron novedades que incidieron en la operación de la red de transmisión y que fueron reportadas por el contratista y verificadas por la interventoría.

1. Se ejecutó el **98,74% del plan de mantenimiento preventivo**, realizando visitas a **157 de las 159 estaciones programadas**. Las dos estaciones no intervenidas (Lengupá y López de Micay) obedecieron a restricciones de acceso.
2. Se realizaron **trece (13) mantenimientos correctivos** en estaciones estratégicas, logrando restablecer servicios de Televisión Digital Terrestre (TDT), Radio Nacional y sistemas de recepción satelital.
3. La **Mesa de Ayuda** atendió **52 PQRS**, alcanzando un nivel de resolución del **98,07%**, fortaleciendo el seguimiento y la trazabilidad de las incidencias reportadas.

- 4. En el componente eléctrico se ejecutaron **78 intervenciones** (3 preventivas y 75 correctivas), obteniendo una mejora del indicador de infraestructura eléctrica de **85,53% a 86,71%**; sin embargo, la red continúa clasificada como **"operativa con restricciones"** debido a la obsolescencia tecnológica y a equipos pendientes de modernización.
- 5. Se mantuvo una **disponibilidad del 100% en la estación CAN**, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento en los sistemas de energía, refrigeración y emisión, garantizando la continuidad de los servicios estratégicos.
- 6. Se cumplió la meta establecida en la **Resolución 040 de 2026 (FUTIC)** para disponibilidad del servicio TDT, alcanzando un **92,13%**, superior al umbral exigido del 91%. Asimismo, el plan de estabilización eléctrica registró un avance del **33,79%**.
- 7. En materia ambiental se logró el **100% de cumplimiento** de las metas previstas para el periodo, efectuando la disposición final de **1.499,2 kg de residuos peligrosos (RESPEL)** con la correspondiente trazabilidad documental.
- 8. Persistieron afectaciones estructurales que continúan impactando los indicadores de disponibilidad, principalmente asociadas a:
 - estaciones siniestradas;
 - obsolescencia de equipos de transmisión;
 - ausencia de energía comercial en algunas estaciones;
 - fallas recurrentes en transmisores, UPS, plantas eléctricas y sistemas de climatización;
 - daños ocasionados por descargas atmosféricas;
 - restricciones de acceso a estaciones;
 - eventos de hurto y vandalismo sobre infraestructura y equipos.
- 9. Se evidenció recuperación operacional en varias estaciones TDT, destacándose la recuperación total de **Nazareth, Puerto Libertador, Moniquirá, El Doncello e Istmina**, así como recuperaciones parciales en **Aguazul, Santiago Pérez, Chinchiná y La Calera**.
- 10. Los **estudios de radio** mantuvieron una disponibilidad del **100%**, sin interrupciones del servicio, apoyándose en enlaces IP como mecanismo de respaldo cuando fue necesario.

Por su parte, la interventoría verificó el cumplimiento general de las obligaciones contractuales durante el período evaluado, sin evidenciar novedades relacionadas con cesión, suspensión o terminación anticipada del contrato. No 2218 de 2024, no obstante se formuló observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de algunos aspectos técnicos y administrativos, así como a la conciliación de diferencias entre actividades programadas y ejecutadas en el marco del seguimiento contractual.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo ARTÍCULO 2.2.4.2.2.13., del decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes, conforme a las siguientes consideraciones:

Número de Planilla:	Certificado de revisor fiscal
Periodo cotizado:	JULIO de 2026

2.5 GARANTIAS: (Si el contrato no tiene garantías deje el numeral, registre N/A y elimine los cuadros. Para el caso en que el contrato tiene garantías debe especificar el tipo de garantía y las diferentes características En caso de realizarse modificaciones, se deben relacionar igualmente los respectivos anexos expedidos para las pólizas)

Póliza No. 33-45-101138565
33-40-101086566

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

			Vigencia	
Amparo	Porcentaje amparado	Valor	Fecha inicial	Fecha final
CUMPLIMIENTO - BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100%	\$16.042.852.850,40	1/08/2025	31/12/2026
CUMPLIMIENTO	30%	\$24.064.279.275,60	1/08/2025	1/05/2027
PAGO DE SALARIOS	5%	\$4.010.713.212,60	1/08/2025	31/12/2029

 Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES		Código: P-F-43
			Versión: 4
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN		Fecha: 16/07/2025

CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$16.042.852.850,40	1/08/2025	1/05/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	\$ 3.501.810.000	1/08/2025	31/12/2026

2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS: (En este orden y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Supervisión, en lo que respecta a las funciones de la supervisión, se debe estipular la totalidad de actividades realizadas en el marco de cada uno de los siguientes aspectos).

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Durante el periodo certificado a la fecha se tiene que el contrato se inició de acuerdo con lo establecido.

Con fundamento en la revisión del Informe Mensual No. 12 correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de JULIO de 2026, presentado por el CONSORCIO OM-2025, así como en el Informe Mensual de Interventoría del Contrato RTVC-CPS-2719-2025, la Supervisión verificó el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período, evidenciando lo siguiente:

Aspectos administrativos: El contratista presentó el informe mensual con sus respectivos soportes técnicos, operativos y administrativos, permitiendo evidenciar la ejecución de las actividades previstas en el contrato. Durante el período evaluado se realizaron los comités y reuniones de seguimiento programados, se mantuvo la gestión documental requerida para la ejecución contractual y se dio continuidad a la actualización de la información operativa en la plataforma SIGMA. La interventoría verificó el cumplimiento general de las obligaciones administrativas del contratista, formulando recomendaciones orientadas al fortalecimiento de algunos procesos documentales y de seguimiento contractual.

La interventoría verificó la presentación oportuna del informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el **1 y el 31 de julio de 2026**, evidenciando la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas por el contratista durante el periodo reportado. El informe contiene la descripción de las actividades ejecutadas, el seguimiento a los indicadores de gestión, la atención de requerimientos mediante la Mesa de Ayuda, el estado de ejecución de los diferentes componentes del contrato y los soportes documentales que permiten realizar el seguimiento a la gestión administrativa, técnica, ambiental y operativa del contrato.

La interventoría constató igualmente que durante el periodo el contratista mantuvo la trazabilidad de la información mediante la plataforma SIGMA y la gestión documental asociada a la operación del contrato, reportando la atención de **52 PQRS**, con un nivel de resolución del **98,07%**, así como el seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas en cada uno de los componentes contractuales.


Asimismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones de reporte relacionadas con la **Resolución 040 de 2026 (FUTIC)**, evidenciándose el seguimiento a las metas de disponibilidad del servicio, estabilización eléctrica y gestión ambiental, incluyendo la entrega de los soportes correspondientes a la disposición de residuos peligrosos (RESPEL), garantizando la trazabilidad documental requerida por la Entidad.

2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS

Las actividades ejecutadas por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato y las obligaciones específicas a su cargo fueron realizadas dentro de los parámetros requeridos durante el periodo certificado.

Se verificó la ejecución de actividades de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de la red nacional de radio y televisión, incluyendo mantenimientos preventivos y correctivos, actualización de inventarios, operación del Centro CAN, seguimiento a indicadores de disponibilidad y atención de incidentes reportados en la red. Durante el período persistieron afectaciones asociadas a estaciones siniestradas, ausencia de suministro eléctrico, restricciones de acceso, obsolescencia tecnológica y deterioro de infraestructura física, condiciones que continúan incidiendo en los indicadores de disponibilidad de algunas estaciones secundarias. La interventoría constató la ejecución de las actividades contratadas y efectuó seguimiento permanente al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), emitiendo las recomendaciones técnicas correspondientes.

Con base en la documentación presentada y en la verificación realizada desde la Interventoría, se concluye que durante el mes de **julio de 2026** se efectuó el seguimiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista, evidenciándose la ejecución de las labores programadas de administración, operación y mantenimiento de la red, el acompañamiento a la atención de incidencias y el control sobre el cumplimiento de las obligaciones técnicas. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, se considera procedente el trámite de pago correspondiente al período evaluado, sin perjuicio de las observaciones y acciones de mejora relacionadas con la recuperación de la disponibilidad de estaciones afectadas por condiciones estructurales y eventos ajenos a la ejecución del contrato.



8.


SEGURIDAD – CUSTODIOS – 249

No.	ESTACION	CÓDIGO	TIPO	OPERADORES) PERMANENTES (vientes)	ESTADO ACTUAL 2025	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	VALOR (ANTES DE IVA)	VALOR (CON IVA)
51	PUERTONARIÑO	SEC-AMAZ-Puer-PUERTO-051	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
52	ABRIAGUI	SEC-ANTI-Abri-ABRIAG-052	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
53	ALEJANDRIA	SEC-ANTI-Alej-ALEJAN-053	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
54	AMALFI	SEC-ANTI-Amal-AMALFI-054	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
55	ANDES	SEC-ANTI-Ande-ANDES-055	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
56	ANGOSTURA	SEC-ANTI-Ang-ANGOST-056	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
57	ARBOLETES	SEC-ANTI-Arbo-ARBOLE-057	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
58	BELMIRA	SEC-ANTI-Belm-BELMIR-058	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
59	CALDAS	SEC-ANTI-Cald-CALDAS-059	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
60	CANAÑSGORDAS	SEC-ANTI-CaÑa-CANAÑSG-060	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
61	CAROLINA	SEC-ANTI-Caro-CAROL-061	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
62	CAUCASÍA	SEC-ANTI-Cauc-CAUCAS-062	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
63	CISNEROS	SEC-ANTI-Cisn-CISNER-063	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
64	CIUDADBOULVAR	SEC-ANTI-Ciud-CIUDAD-064	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
65	CONCEPCION	SEC-ANTI-Conc-CONCEP-065	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
66	DABEIBA	SEC-ANTI-Dabe-DABEIB-066	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
67	ENTRERRIOS	SEC-ANTI-Entr-ENTRER-067	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
68	FRONTINO	SEC-ANTI-Fron-FRONTI-068	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
69	GOMEZPLATA	SEC-ANTI-Gome-GOMEZP-069	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
70	GRANADA	SEC-ANTI-Gran-GRANAD-070	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
71	GUADALUPE	SEC-ANTI-Guad-GUADAL-071	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
72	HELICONIA	SEC-ANTI-Heli-HELICO-072	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
73	ITUANGO	SEC-ANTI-Itua-ITUANG-073	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
74	JARDIN	SEC-ANTI-Jard-JARDIN-074	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
75	JERICO	SEC-ANTI-Jeri-JERICO-075	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
76	LACEJA	SEC-ANTI-LaCe-LACEJA-076	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
77	LIBORINA	SEC-ANTI-Libo-LIBORI-077	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
78	MUTATA	SEC-ANTI-Muta-MUTATA-078	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
80	PUERTO RIERRO	SEC-ANTI-Puer-PUERTO-080	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
81	RIONEGRO	SEC-ANTI-Rion-RIONEG-081	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
82	SABANALARGA	SEC-ANTI-Saba-SABANA-082	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
83	SALGAR	SEC-ANTI-Salg-SALGAR-083	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
84	SANANDREDEQUERQUIA	SEC-ANTI-Salg-SANAND-084	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
85	SANCARLOS	SEC-ANTI-SanC-SANCAR-085	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
86	SANJOSEDELAMONTAÑA	SEC-ANTI-SanJ-SANJOS-086	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
87	SANJUANEDEURABA	SEC-ANTI-SanJ-SANJUA-087	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
88	SONSON	SEC-ANTI-Sons-SONSON-088	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
89	TAMÉSIS	SEC-ANTI-Tame-TAMÉSIS-089	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
90	TARAZA	SEC-ANTI-Tara-TARAZA-090	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
91	TOLEDO	SEC-ANTI-Tole-TOLEDO-091	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
92	URRAO	SEC-ANTI-Urra-URRAO-092	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
93	YARUMAL	SEC-ANTI-Yaru-YARUMA-093	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
94	ARAUCA	SEC-ARAU-Arau-ARAUCA-094	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
95	ARAUQUITA	SEC-ARAU-Arau-ARAUQU-095	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
96	FORTUL	SEC-ARAU-Fort-FORTUL-096	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
97	SARAVENA	SEC-ARAU-Sara-SARAVE-097	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
98	LOS NOGALES	SEC-ATLA-Barr-LOSNOG-098	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
99	SAN JACINTO	SEC-BOLI-Sanj-SANJAC-099	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
100	ARCABUO	SEC-BOYA-Arc-ARCBU-100	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
101	BELÉN	SEC-BOYA-Belén-BELÉN-101	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
102	BELÉNICITO	SEC-BOYA-Belén-BELÉN-102	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
103	BOAVITA	SEC-BOYA-Boav-BOAVIT-103	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
104	CHITA-JERICÓ	SEC-BOYA-Chit-CHITA-104	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
105	CUCAITA	SEC-BOYA-Cuca-CUCAIT-105	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
106	ELOCUCU	SEC-BOYA-Eico-ELOCUC-106	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
107	ELESPIÑO	SEC-BOYA-Eico-ELESPI-107	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
108	VALLDETENZAI	SEC-BOYA-Guat-VALLD-108	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
109	VALLDETENZAI	SEC-BOYA-Laca-VALLD-109	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
110	LENGUPA	SEC-BOYA-Leng-LENGUP-110	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
111	MIRAFLORES	SEC-BOYA-Mira-MIRAF-111	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
112	MONQUIRA	SEC-BOYA-Moni-MONQUI-112	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
114	OTANCHE	SEC-BOYA-otan-OTANCH-114	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
115	PACHAVITA	SEC-BOYA-Pach-PACHAV-115	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
116	PAUNA	SEC-BOYA-Paun-PAUNA-116	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
117	PAZDERIO	SEC-BOYA-Pazd-PAZDER-117	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
118	RAQUIRA	SEC-BOYA-Raqu-RAQUIR-118	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
119	SAMACA	SEC-BOYA-Sama-SAMACA-119	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
120	SANLUISDEGACENO	SEC-BOYA-SanL-SANLUI-120	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
121	SANTAMARIA	SEC-BOYA-Sant-SANTAM-121	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
122	SATIVANORTE	SEC-BOYA-Sati-SATIVA-122	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
123	UMBITA	SEC-BOYA-Umbi-UMBITA-123	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
124	VILLADELEYVA	SEC-BOYA-Vill-VILLAD-124	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
125	MADROÑO	SEC-CALD-Bela-MADROÑ-125	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
126	CHINCHINA	SEC-CALD-Chin-CHINCH-126	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
127	CERVANTES	SEC-CALD-Mani-CERVAN-127	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
128	ARAUCA	SEC-CALD-Pale-ARAUCA-128	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
129	SALAMINA	SEC-CALD-Sala-SALAMI-129	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
130	SANVICENTE	SEC-CAQU-SanV-SANVIC-130	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
131	ELDONCELLO	SEC-CAQU-Eido-ELDON-131	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
132	YOPAL	SEC-CASA-Yopa-YOPAL-132	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
133	CHAMEZA 01	SEC-CASA-Cham-CHAM1-133	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
134	CHAMEZA 02	SEC-CASA-Cham-CHAM2-134	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
135	NUNCHÍA	SEC-CASA-Nunc-NUNCHI-135	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
136	AGUAZUL	SEC-CASA-Agua-AGUAZ-136	ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
137	BOUVAR	SEC-CAUC-Boli-BOUVA-137	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
138	ELTAMBO	SEC-CAUC-Elt-ELTAMB-138	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
139	INZA	SEC-CAUC-Inza-INZA-139	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
140	LAVEGA	SEC-CAUC-Lave-LAVEGA-140	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
141	PAEZ	SEC-CAUC-Paez-PAEZ-141	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
142	ROSAS	SEC-CAUC-Rosa-ROSAS-142	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
143	SANSEBASTIAN	SEC-CAUC-SanS-SANSEB-143	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
144	SILVIA	SEC-CAUC-Silv-SILVIA-144	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
145	ATANQUEZ	SEC-CESA-Atan-ATANQU-145	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
146	MARIANGOLA	SEC-CESA-Mari-MARIAN-146	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
147	PAILTAS	SEC-CESA-Pail-PAILT-147	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
148	BADILLO	SEC-CESA-Vall-BADILL-148	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
149	ACANDÍ	SEC-CHOC-Acan-ACANDÍ-149	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
150	BAHIAOLANO	SEC-CHOC-Bahi-BAHIAS-150	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
151	CARMENDEATRATO	SEC-CHOC-Carm-CARMEN-151	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
152	ISTMINA	SEC-CHOC-Istm-ISTMIN-152	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
153	JURADO	SEC-CHOC-Jura-JURADO-153	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
154	PUERTOSCONDIDO	SEC-CORD-Puer-PUERTO-154	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
155	PUERTO LIBERTADOR	SEC-CORD-Lib-UBER-155	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
157	CRUZ VERDE	SEC-CUND-Bogo-CRUZVE-157	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
158	CHOACHI	SEC-CUND-Choa-CHOACH-158	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	NO OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
159	CHOCONTA	SEC-CUND-Choc-CHOCON-159	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
160	CUCUNUBA	SEC-CUND-Cucu-CUCUNU-160	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
161	GACHETA	SEC-CUND-Gach-GACHET-161	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
162	GAMA(CERROALEGRIA)	SEC-CUND-Gama-GAMA-162	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
163	GACHETA	SEC-CUND-Guac-GUACHE-163	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
164	GUADUAS	SEC-CUND-Guad-GUADUA-164	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
165	GUAYABETAL	SEC-CUND-Guay-GUAYAB-165	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800
166	JUN(JUN(CERROALEMANIA))	SEC-CUND-Juni-JUNIN-166	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$ 420.000	\$ 499.800

242	LOSSANTOS	SEC-SANT-Mesa-LOSSAN-242	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
243	OIBA	SEC-SANT-Oiba-OIBA-243	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
244	SANANDRES	SEC-SANT-Sana-SANAND-244	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
245	SILOS	SEC-SANT-Silo-SILOS-245	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
246	SURATA	SEC-SANT-Sura-SURATA-246	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
247	BABEGA	SEC-SANT-Tole-BABEGA-247	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
248	TONA	SEC-SANT-Tona-TONA-248	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
250	GUARANDA	SEC-SUCR-Guar-GUARAN-250	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
251	SAN MARCOS	SEC-SUCR-Sanm-SANMAR-251	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
252	SANTIAGOPEREZ	SEC-TOLI-Atac-SANTIA-252	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
253	CAJAMARCA	SEC-TOLI-Caja-CAJAMA-253	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
254	VILLARICA	SEC-TOLI-Cund-VILLAR-254	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
255	LAHERRERA	SEC-TOLI-LaHe-LAHERR-255	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
256	RIOBLANCO	SEC-TOLI-RioB-RIOBLA-256	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
257	RIOPRADO	SEC-TOLI-RioP-RIOPRA-257	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
258	SANANTONIO	SEC-TOLI-Sana-SANANT-258	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
259	VEGALARGA	SEC-TOLI-Vega-VEGALA-259	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
260	ARGELIA	SEC-VALL-Arge-ARGELI-260	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
261	BUENAVENTURA	SEC-VALL-Buen-BUENAV-261	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
262	CRISTOREY	SEC-VALL-Cali-CRISTO-262	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
263	DAGUA	SEC-VALL-Dagu-DAGUA-263	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
264	ELDOVIO	SEC-VALL-EIdo-ELDOVI-264	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
265	FLORIDA	SEC-VALL-Flor-FLORID-265	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
266	TENERIFE	SEC-VALL-Tene-TENERI-266	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
267	TRESCRUCES	SEC-VALL-Tres-TRESCR-267	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
268	LAMARINA	SEC-VALL-Tulu-LAMARI-268	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SINIESTRADA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
269	VERSALLES	SEC-VALL-Vers-VERSAL-269	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	SIN ENERGÍA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
270	MITU	SEC-VAUP-Mitu-MITU-270	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
271	CASUARITO	SEC-VICH-Casu-CASUAR-271	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
272	PUERTOCARREÑO	SEC-VICH-Puer-PUERTO-272	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	NO	OPERATIVA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
305	CHOCONTA 02	SEC-CUND-Choc-CHOCO2-305	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
306	EL CAIRO	SEC-VALL-Elca-ELCAIR-306	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
307	SASAIMA	SEC-CUND-Sasa-SASAIM-307	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
308	QUIBDO	SEC-CHOC-Quib-QUIBDO-308	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
309	LAUNIÓN	SEC-NARI-Laun-LAUNIO-309	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
310	MONSERRATE	SEC-CALD-Agua-MONSER-310	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
311	SUPIA	SEC-CALD-Supi-SUPIA-311	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
316	CODAZZI	SEC-CESA-Coda-CODAZZ-316	ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
318	SOTAVENTO-TUCHÍN	SEC-CORD-Sana-SOTAVE-318	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
319	SAN AGUSTÍN 02	SEC-HUIL-Sana-SANAGU-319	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
320	EL AGUILA	SEC-VALL-Elag-ELAGUI-320	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
322	NAZARETH	SEC-GUAI-Naza-NAZARE-322	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
323	TAME	SEC-ARAU-Tame-TAME-323	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
324	LURUACO	SEC-ATLA-Luru-LURUAC-324	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
325	MORELIA	SEC-CAQU-More-MORELI-325	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
326	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	SEC-CAQU-Sanj-SANJOS-326	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
327	LÓPEZ DE MICAY	SEC-CAUC-Lope-LOPEZD-327	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
328	BADILLO 02	SEC-CESA-Valle-BADILL-328	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
329	CURUMANÍ	SEC-CESA-Curu-CURUMA-329	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
330	EL COPEY	SEC-CESA-EIco-ELCOPE-330	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
331	ALTO BAUDÓ	SEC-CHOC-Alto-ALTOBA-331	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
332	JUNIN 02	SEC-CUND-Juni-JUNIN-332	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
333	SAN JUAN DE RIOSECO	SEC-CUND-Sanj-SANJUA-333	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
334	VILLAPINZON 02	SEC-CUND-Villa-VILLAP-334	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
335	GIGANTE	SEC-HUIL-Giga-GIGANT-335	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
336	BARBACOAS	SEC-NARI-Barb-BARBAC-336	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
337	SANTA ROSA DE CABAL	SEC-RISA-Sant-SANTAR-337	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
338	HONDA	SEC-TOLI-Hond-HONDA-338	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
339	RIOBLANCO 02	SEC-TOLI-RioB-RIOBLA-339	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
340	ROVIRA	SEC-TOLI-Rovi-ROVIRA-340	ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800
341	LAFLORIDA		ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	NO	NO RECIBIDA	CUSTODIO	\$	420.000	\$	499.800

SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO 30 ESTACIONES

No.	ESTACION	CÓDIGO	TIPO	OPERADOR(ES) PERMANENTES (vivientes)	ESTADO ACTUAL 2025	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	VALOR (ANTES DE IVA)	VALOR (CON IVA)
273	ESTUDIO ITUANGO	EST-ANTI-Itua-ITUAN-273	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
274	ESTUDIO MEDELLIN	EST-ANTI-Mede-MEDELL-274	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
275	ESTUDIO ARAUQUITA	EST-ARAU-Arau-ARAUQU-275	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
276	ESTUDIO BARRANQUILLA	EST-ATLA-Barr-BARRAN-276	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
277	ESTUDIO SAN JACINTO	EST-BOLI-Sanj-SANJAC-277	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
278	ESTUDIO MANIZALES	EST-CALD-Mani-MANIZA-278	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
279	ESTUDIO SANVICENTE	EST-CAQU-SanV-SANVIC-279	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
280	ESTUDIO ELTAMBO	EST-CAUC-ElTa-ELTAMB-280	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
281	ESTUDIO VALLEDUPAR	EST-CESA-Vall-VALLE-281	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
282	ESTUDIO BOJAYA	EST-CHOC-Boja-BOJAYA-282	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
283	ESTUDIO QUIBDO	EST-CHOC-Quib-QUIBD-283	ESTUDIO RADIO	NO	SIN ENERGÍA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
284	ESTUDIO FONSECA	EST-GUAI-Fons-FONSEC-284	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
285	ESTUDIO SANJOSEDELGUAVIARE	EST-GUAV-Sanj-SANJOS-285	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
286	ESTUDIO ALGECIRAS	EST-HUIL-Alge-ALGECI-286	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
287	ESTUDIO FUNDACIÓN	EST-MAGD-Fund-FUNDAC-287	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
288	ESTUDIO MESETAS	EST-META-Mese-MESETA-288	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
289	ESTUDIO VILLAVICENCIO	EST-META-Vill-VILLAO-289	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
290	ESTUDIO PASTO	EST-NARI-Past-PASTO-290	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
291	ESTUDIO TUMACO	EST-NARI-Tuma-TUMACO-291	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
292	ESTUDIO CONVENCIÓN	EST-NORT-Conv-CONVEN-292	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
293	ESTUDIO PUERTOLEGUIZAMO	EST-PUTU-Puer-PUERTO-293	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
294	ESTUDIO SAN ANDRES	EST-SANA-Sana-SANAN-294	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
295	ESTUDIO BUCARAMANGA	EST-SANT-Buca-BUCARA-295	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
296	ESTUDIO CHAPARRAL	EST-TOLI-Chap-CHAPA-296	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
297	ESTUDIO CALI	EST-VALL-Cali-CALI-297	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
298	ESTUDIO FLORIDA	EST-VALL-Flor-FLORID-298	ESTUDIO RADIO	NO	OPERATIVA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
312	ESTUDIO CODAZZI	EST-CESA-Coda-CODAZZ-312	ESTUDIO RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
313	ESTUDIO TIERRALTA	EST-CORD-Tier-TIERRA-313	ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
314	ESTUDIO BUENAVENTURA	EST-VALL-Buen-BUENAV-314	ESTUDIO RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
315	ESTUDIO RIOSUCIO	EST-CHOC-Rios-RIOSUC-315	ESTUDIO RADIO	NO	NO RECIBIDA	MONITOREO	\$ 6.835.000	\$ 8.133.650
							\$ 205.050.000	\$ 244.009.500

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión: 4 Fecha: 16/07/2025

REPORTE SUMINISTRO DE ACPM

Nº	Short Code	Estación	Tipo de Estación	Fecha de ejecución	Mes ejecución	Ticker	QT	Actividad	Observación y /o detalle	Valor antes de IVA	IVA	Valor con IVA
1	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	1/7/2026	JULIO	3224	1896	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
2	33	BAÑADEROS (*****)	PRI-LAGU-Hato-BAÑADE-033	3/7/2026	JULIO	2918	1731	COMBUSTIBLE	100 \$	\$ 2.383.866	\$ 452.934	\$ 2.836.800
3	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	4/7/2026	JULIO	3225	1897	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
4	288	ESTUDIO MESETAS	EST-META-Mese-MESETA-288	4/7/2026	JULIO	3050	1799	COMBUSTIBLE	10 \$	\$ 481.244	\$ 91.436	\$ 572.680
5	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	6/7/2026	JULIO	3226	1898	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
6	44	LEBRÍJA	PRI-SANT-Lebr-LEBRÍJ-044	7/7/2026	JULIO	3052	1801	COMBUSTIBLE	1000 \$	\$ 19.156.303	\$ 3.639.697	\$ 22.796.000
7	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	8/7/2026	JULIO	3227	1899	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
8	33	BAÑADEROS (*****)	PRI-LAGU-Hato-BAÑADE-033	8/07/2026	JULIO	3064	1802	COMBUSTIBLE	100 \$	\$ 2.383.866	\$ 452.934	\$ 2.836.800
9	282	ESTUDIO BOIAYIA	EST-CHOC-Boja-BOIAYIA-282	8/07/2026	JULIO	3051	1800	COMBUSTIBLE	350 \$	\$ 8.428.235	\$ 1.601.365	\$ 10.029.600
10	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	11/7/2026	JULIO	3228	1900	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
11	33	BAÑADEROS (*****)	PRI-LAGU-Hato-BAÑADE-033	13/07/2026	JULIO	3065	1803	COMBUSTIBLE	100 \$	\$ 2.383.866	\$ 452.934	\$ 2.836.800
12	41	PLANADAS	PRI-QUIN-Cala-PLANAD-041	13/07/2026	JULIO	3256	1881	COMBUSTIBLE	450 \$	\$ 8.549.622	\$ 1.624.428	\$ 10.174.050
13	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	14/7/2026	JULIO	3229	1901	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
14	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	16/7/2026	JULIO	3230	1902	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
15	38	CERRO TASAÍERO	PRI-NORT-Curc-CERROT-038	17/7/2026	JULIO	3259	1884	COMBUSTIBLE	500 \$	\$ 9.838.067	\$ 1.869.233	\$ 11.707.300
16	27	EL CABLE (*****)	PRI-CUND-Bogo-ELCABL-027	17/7/2026	JULIO	3257	1882	COMBUSTIBLE	200 \$	\$ 4.467.563	\$ 848.837	\$ 5.316.400
17	33	BAÑADEROS (*****)	PRI-LAGU-Hato-BARADE-033	18/7/2026	JULIO	3232	1910	COMBUSTIBLE	100 \$	\$ 2.383.866	\$ 452.934	\$ 2.836.800
18	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	19/7/2026	JULIO	3272	1904	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
19	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	21/7/2026	JULIO	3273	1905	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
20	282	ESTUDIO BOIAYIA	EST-CHOC-Boja-BOIAYIA-282	21/7/2026	JULIO	3258	1883	COMBUSTIBLE	350 \$	\$ 8.428.235	\$ 1.601.365	\$ 10.029.600
21	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	23/7/2026	JULIO	3274	1906	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
22	33	BAÑADEROS (*****)	PRI-LAGU-Hato-BAÑADE-033	24/07/2026	JULIO	3279	1911	COMBUSTIBLE	100 \$	\$ 2.383.866	\$ 452.934	\$ 2.836.800
23	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	25/7/2026	JULIO	3275	1907	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
24	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	27/7/2026	JULIO	3276	1908	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
25	33	BAÑADEROS (*****)	PRI-LAGU-Hato-BARADE-033	29/7/2026	JULIO	3280	1912	COMBUSTIBLE	100 \$	\$ 2.383.866	\$ 452.934	\$ 2.836.800
26	34	CERROKENNEDY	PRI-MAGD-Sant-CERROK-034	29/7/2026	JULIO	3243	1969	COMBUSTIBLE	1000 \$	\$ 20.447.059	\$ 3.884.941	\$ 24.332.000
27	321	AMBALEMA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	30/7/2026	JULIO	3277	1909	COMBUSTIBLE	30 \$	\$ 902.118	\$ 171.402	\$ 1.073.520
28	26	BOQUERON	PRI-CUND-Chip-BOQUER-026	31/07/2026	JULIO	3351	1972	COMBUSTIBLE	500 \$	\$ 12.518.067	\$ 2.378.433	\$ 14.896.500
									\$	\$ 118.345.118		\$ 140.830.690

REPORTE ACTIVIDADES DE PODA Y ROCERIA

Nº	Short Code	Estación	Tipo de Estación	Fecha de ejecución	Mes ejecución	Ticket	OT	Actividad	Observación y /o detalle	Valor antes de IVA	IVA	Valor con IVA
89	331	ALTO BAUDÓ	SEC-CHOC-Alto-ALTOBA-331	24/07/2026	JULIO	3338	1952	ROCERIA		\$ 1.214.290	\$ 230.715	\$ 1.445.005
90	95	ARAUQUITA	SEC-ARAU-Arau-ARAUQU-095	24/07/2026	JULIO	3284	1949	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
91	321	AMBALEA	SEC-TOLI-Amba-AMBALE-321	21/07/2026	JULIO	2904	1765	ROCERIA		\$ 1.142.860	\$ 217.143	\$ 1.360.003
92	202	ELTABLONDEGÓMEZ	SEC-NARI-Etta-ELTABL-202	8/07/2026	JULIO	3285	1950	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
93	221	TOLEDO	SEC-NORT-Tole-TOLEDO-221	24/07/2026	JULIO	3286	1951	ROCERIA		\$ 642.860	\$ 122.143	\$ 765.003
94	217	ELCARMEN	SEC-NORT-Eica-ELCARM-217	24/07/2026	JULIO	3287	1955	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
95	309	LAUNIÓN	SEC-NARI-Laun-LAUNIO-309	21/07/2026	JULIO	3288	1956	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
96	183	PUERTONIRIDA	SEC-GUAI-Inir-PUERTO-183	2/07/2026	JULIO	3289	1957	ROCERIA		\$ 4.285.720	\$ 814.287	\$ 5.100.007
97	97	SARAVENA	SEC-ARAU-Sara-SARAVE-097	3/07/2026	JULIO	3290	1959	ROCERIA		\$ 2.142.860	\$ 407.143	\$ 2.550.003
98	252	SANTIAGOPÉREZ	SEC-TOLI-Atac-SANTIA-252	26/07/2026	JULIO	2903	1764	ROCERIA		\$ 1.714.290	\$ 325.715	\$ 2.040.005
99	317	RIOSECIO	SEC-CHOC-Rios-RIOSEC-317	25/07/2026	JULIO	2908	1766	ROCERIA		\$ 1.714.290	\$ 325.715	\$ 2.040.005
100	167	LACALERA	SEC-CUND-LaCa-LACALE-167	27/07/2026	JULIO	3291	1960	ROCERIA		\$ 1.142.860	\$ 217.143	\$ 1.360.003
101	76	LACEJA	SEC-ANTI-LaCe-LACEJA-076	23/07/2026	JULIO	3292	1961	ROCERIA		\$ 1.285.720	\$ 244.287	\$ 1.530.007
102	251	SAN MARCOS	SEC-SUCR-Sams-SANMAR-251	21/07/2026	JULIO	3293	1962	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
103	154	PUERTOSCONDIDO	SEC-CORD-Puer-PUERTO-154	24/07/2026	JULIO	3294	2001	ROCERIA		\$ 1.142.860	\$ 217.143	\$ 1.360.003
104	64	CIUDADOLIVAR	SEC-ANTI-Ciud-CIUDA-064	22/07/2026	JULIO	3295	1963	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
105	250	GUARANDA	SEC-SUCR-Guar-GUARAN-250	3/07/2026	JULIO	3296	1964	ROCERIA		\$ 857.150	\$ 162.859	\$ 1.020.009
106	148	BADILLO	SEC-CESA-VaB-BADILL-148	28/07/2026	JULIO	3297	1965	ROCERIA		\$ 1.000.000	\$ 190.000	\$ 1.190.000
107	287	ESTUDIO FUNDACIÓN	EST-MAGD-Fund-FUNDAC-287	18/07/2026	JULIO	3298	1966	ROCERIA		\$ 1.000.000	\$ 190.000	\$ 1.190.000
108	201	ELROSARIO	SEC-NARI-Eiro-ELROSA-201	27/07/2026	JULIO	3299	1967	ROCERIA		\$ 714.290	\$ 135.715	\$ 850.005
109	7	JAMUNDÍ	A M-VALL-Jam-JAMUND-007	31/07/2026	JULIO	3208	1886	ROCERIA		\$ 7.066.387	\$ 1.342.613	\$ 8.409.000
110	49	AZALEA	PRI-VALL-Buga-AZALEA-049	16/06/2026	JULIO	3336	1968	ROCERIA		\$ 571.430	\$ 108.572	\$ 680.002
										\$ 32.780.767	\$ 39.009.111	\$ 39.009.111

Nº	Short Code	Estación	Tipo de Estación	Fecha de ejecución	Mes ejecución	Ticket	OT	Actividad	Observación y /o detalle	Valor antes de IVA	IVA	Valor con IVA
111	24	MONTERIA	PRI-CÓRD-Mont-MONTER-024	30/07/2026	JULIO	1718	1892	PODA		\$ 3.574.143	\$ 679.087	\$ 4.253.230
112	76	LACEJA	SEC-ANTI-LaCe-LACEJA-076	5/07/2026	JULIO	1817	1871	PODA		\$ 3.785.715	\$ 719.286	\$ 4.505.001
113	144	SILVIA	SEC-CAUC-Silv-SILVIA-144	16/07/2026	JULIO	1894	1980	PODA		\$ 1.714.300	\$ 325.717	\$ 2.040.017
114	31	GABINETE	PRI-HUIL-Guad-GABINE-031	25/07/2026	JULIO	3213	1915	PODA		\$ 5.686.153	\$ 1.080.369	\$ 6.766.522
										\$ 14.760.311		\$ 17.564.770

REPORTE ACTIVIDADES DE FUMIGACIONES

Nº	Short Code	Estación	Tipo de Estación	Fecha de ejecución	Mes ejecución	Ticket	OT	Actividad	Observación y /o detalle	Valor antes de IVA	IVA	Valor con IVA
115	2	SABAGRANDE	A-M-ATLA-Saba-SABANA-002	3/06/2026	JULIO	2363	1385	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
116	165	GUAYABATE	SEC-CUND-Guay-GUAYAB-165	30/06/2026	JULIO	1052	1325	FUMIGACIONES		\$ 1.610.724	\$ 306.038	\$ 1.916.762
117	33	BANADEROS (*****)	PRI-LAGU-HAB-BANADER-033	3/07/2026	JULIO	2369	1390	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
118	281	ESTUDIO VALDEUPAR	EST-CESA-Vall-VALLE-281	11/07/2026	JULIO	2536	1449	FUMIGACIONES		\$ 672.008	\$ 127.682	\$ 799.690
119	164	GUADUAS	SEC-CUND-Guad-GUADUA-164	11/07/2026	JULIO	1275	1327	FUMIGACIONES		\$ 1.610.724	\$ 306.038	\$ 1.916.762
120	41	PLANADAS	PRI-QUIN-Cala-PLANAD-041	15/07/2026	JULIO	2351	1371	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
121	14	CHISGORDO	PRI-ANTI-Care-CHISGOR-014	18/07/2026	JULIO	2362	1384	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
122	324	LIQUIAJO	SEC-ATLA-Licu-LIQUIAJ-324	18/07/2026	JULIO	1829	1918	FUMIGACIONES		\$ 481.313	\$ 91.810	\$ 573.123
123	13	BELLO	PRI-ANTI-BAR-BELLO-013	21/07/2026	JULIO	2352	1372	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
124	1	MARINILLA	A-M-ANTI-Mar-MARIN-001	21/07/2026	JULIO	2353	1374	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
125	47	LAPITA	PRI-SUCK-Carr-LAPITA-047	22/07/2026	JULIO	2359	1379	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
126	27	EL CABLE (*****)	PRI-CUND-Bugo-ELCABL-027	22/07/2026	JULIO	3099	1834	FUMIGACIONES		\$ 4.705.882	\$ 894.118	\$ 5.600.000
127	44	LEBRUA	PRI-SANT-Labr-LEBRUA-044	25/07/2026	JULIO	2354	1375	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
128	28	TIBITO	PRI-CUND-Tib-TIBITO-028	26/07/2026	JULIO	2367	1389	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
129	4	LAENEA	A-M-CALD-Mani-LAENEA-004	27/07/2026	JULIO	2365	1387	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
130	18	LAPOPA	PRI-BOL-Cart-LAPOPA-018	29/07/2026	JULIO	2358	1378	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
131	7	JAMUNDI	A-M-VALL-Jamu-JAMUND-007	29/07/2026	JULIO	2366	1388	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
132	32	CERRONEIVA	PRI-HUIL-Nely-CERRON-032	31/07/2026	JULIO	2356	1376	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
133	40	MIRADOR	PRI-PUTI-Moco-MIRADO-040	31/07/2026	JULIO	2357	1377	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
134	29	MANJUI	PRI-CUND-Ziga-MANJUI-029	31/07/2026	JULIO	2364	1386	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
135	49	AZALEA	PRI-VALL-Buga-AZALEA-049	31/07/2026	JULIO	2371	1391	FUMIGACIONES		\$ 4.285.714	\$ 814.286	\$ 5.100.000
										\$ 77.654.101	\$	\$ 92.408.380

condiciones e idoneidad mínima establecidas en el contrato.

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI * ____ NO X

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA (En caso de aplicar para informe de interventoría; de lo contrario, omitir esta sección.)

No. de Informe	Fecha	Folios
Informe Mensual de Interventoría JULIO de 2026	JULIO DE 2026	88 folios

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI * ____ NO ____
(*En caso de SI Diligenciar formato M-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)

1. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 25.725.653.989
ADICIONES No 1:	\$ 2.708.436.834
ADICIONES No 2:	\$ 12.641.872.050
ADICIONES No 3:	\$ 5.476.329.530
ADICIONES No 4:	\$ 32.661.971.848
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 79.214.264.251
REDUCCIONES:	N/A.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 52.292.599.659
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 19.720.947.150
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	\$ 5.145.130.797,00
AMORTIZACIÓN # 1 (20%) mes de Agosto 2025:	\$ 345.158.614,20
AMORTIZACIÓN # 2 (20%) mes de Sept 2025:	\$ 1.173.570.875,40
AMORTIZACIÓN # 3 (20%) mes de Oct 2025:	\$ 1.154.141.230,40
AMORTIZACIÓN # 4 (20%) mes de Nov 2025:	\$ 1.128.217.401,80
AMORTIZACIÓN # 5 (20%) mes de Dic - 2025:	\$ 1.344.042.675,20
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	\$ 7.200.717.442

Certifico que el valor autorizado para pago de JULIO de 2026 está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: <u> X </u> NO APLICA: ____
---	--------------------------------

OBSERVACIONES ADICIONALES:	El contrato se ha desarrollado durante el periodo certificado con avances técnicos relevantes y con persistencia de brechas en los Acuerdos de Niveles de Servicio explicadas mayoritariamente por condicionantes estructurales preexistentes. El contratista cumplió, con las precisiones y salvedades del presente informe, las obligaciones generales del contrato y radicó la Factura Electrónica de Venta No. FV-23 del 6 de AGOSTO de 2026, validada por la interventoría. REFERENCIA AL INFORME DE INTERVENTORÍA RADICADO: El Informe Mensual de Interventoría correspondiente al periodo de JULIO de 2026 fue radicado por el CONSORCIO INTEGRAL RTVC 2025 y verificado por la supervisión. La interventoría dictamina ejecución estable y alineada con los pliegos, con desempeño satisfactorio.
----------------------------	---

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de Interventor supervisor del contrato RTVC-CPS-2218-2025, en cumplimiento del deber funcional previsto en los artículos 82 a 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Supervisión e Interventoría de INRAVISION, CERTIFICO que se ha realizado la verificación del informe de actividades No. 12 presentado por el contratista CONSORCIO OM-2025 (NIT 901.972.420-9) y de la **Factura Electrónica de Venta No. FV-23 del 6 de AGOSTO de 2026**, evidenciando que el mismo ha cumplido — con las precisiones técnicas y bajo las salvedades expresas del presente informe— con las obligaciones contractuales para el valor a pagar con esta cuenta.

 RTVC Sistema de Medios Públicos	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
		Versión: 4
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Fecha: 16/07/2025

La presente se firma a los 6 días del mes agosto de 2026.



FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE Angélica Patricia Bula Tache
CARGO: REPRESENTANTE LEGAR - CONSORCIO INTEGRAL RTVC 2025
INTERVENTORIA DEL CONTRATO 2218 DE 2025

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.
Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la probación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Cliente	INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33				
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C ó NIT	900,002,583-6		Fecha 06/08/2026 12:32:41 PM Vence 05/09/2026 Pago Credito a 30 Días
País	COLOMBIA	Zona			
Teléfono	2200700	Celular			
Vendedor		Email	facturacion@rtvc.gov.co		

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTUDIO DE RADIO	6,858,196.00	18.00	0.00	19.00	0.00	123,447,528.00
2	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACION PRIMARIA	13,616,021.00	27.00	0.00	19.00	0.00	367,632,567.00
3	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES SECUNDARIAS	4,782,312.75	106.00	0.00	19.00	0.00	506,925,151.50
4	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIONES AM	14,567,312.00	6.00	0.00	19.00	0.00	87,403,872.00
5	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTUDIO DE RADIO	6,858,196.00	5.00	0.00	19.00	0.00	34,290,980.00
6	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES PRIMARIAS	13,616,021.00	68.00	0.00	19.00	0.00	925,889,428.00
7	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES SECUNDARIAS	4,782,312.75	30.00	0.00	19.00	0.00	143,469,382.50
8	001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES AM	14,567,312.00	6.00	0.00	19.00	0.00	87,403,872.00
9	001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ESTACION CAN	Y 311,064,922.00	1.00	0.00	19.00	0.00	311,064,922.00

Despacho a INRAVISION - SISTEMA DE Dirección AV EL DORADO 45 26 33 Teléfono 2200700 Ciudad BOGOTA Departamento D.C.	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	0.00
					-Descuento	0.00
					-Otros Dscots	0.00
					BASE GRAVABLE	0.00
Observaciones:					+IVA	0.00
					+ImpoConsumo	0.00
					-ReteFuente	0.00
					-ICA Retenido	0.00
SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L					-IVA Retenido	0.00
					TOTAL NETO	\$ 0.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses - contratacion@itecoconsultores.com	
---	--

CUFE: a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac		Aceptada y Recibido
---	---	---------------------

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Cliente	INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA		
Teléfono	2200700		
Vendedor		Fecha	06/08/2026 12:32:41 PM
		Vence	05/09/2026
		Pago	Credito a 30 Días

10 001	OPERADORES VIVIENTES EN ESTACIONES PRINCIPALES	8,707,955.00	94.00	0.00	19.00	0.00	818,547,770.00
11 001	SERVICIO DE MONITOREO	7,183,585.00	30.00	0.00	19.00	0.00	215,507,550.00
12 001	SERVICIO DE CUSTODIO	441,420.00	248.00	0.00	19.00	0.00	109,472,160.00
13 001	HERRAMIENTA DE GESTION Y SISTEMA DE INFORMACION MANTENIMIENTO SIGMA	70,000,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	70,000,000.00
14 001	SERVICIO MESA DE AYUDA	24,698,500.00	6.00	0.00	19.00	0.00	148,191,000.00
15 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS , ACPM PARA PLANTAS EXITENTES	118,345,118.00	1.00	0.00	19.00	0.00	118,345,118.00
16 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, ADECUACIONES LOCATIVAS	370,127,987.00	1.00	0.00	19.00	0.00	370,127,987.00
17 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, REPUESTOS Y ACCIONES CORRECTIVAS ATENDIDAS POR LA BOLSA INTEGRAL	242,866,520.00	1.00	0.00	19.00	0.00	242,866,520.00

Despacho a	INRAVISION - SISTEMA DE	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	0.00
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33					-Descuento	0.00
Teléfono	2200700					-Otros Dctos	0.00
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE	0.00
Departamento	D.C.					+IVA	0.00
Observaciones:						+ImpoConsumo	0.00
						-ReteFuente	0.00
						-ICA Retenido	0.00
						-IVA Retenido	0.00
SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L						TOTAL NETO	\$ 0.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses - contratacion@itecoconsultores.com	
---	--

CUFE: a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac		Aceptada y Recibido
--	---	---------------------

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Página 3 de 7

Cliente	INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C ó NIT	900,002,583-6
País	COLOMBIA	Zona	
Teléfono	2200700	Celular	
Vendedor		Email	facturacion@rtvc.gov.co

18 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima XBoost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8E0288 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	2,998,800.00	1.00	0.00	19.00	0.00	2,998,800.00
19 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima XBoost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8E0289 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	2,998,800.00	1.00	0.00	19.00	0.00	2,998,800.00
20 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima XBoost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8C1554 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	2,998,800.00	1.00	0.00	19.00	0.00	2,998,800.00

Despacho a	INRAVISION - SISTEMA DE	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	0.00
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33					-Descuento	0.00
Teléfono	2200700					-Otros Dctos	0.00
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE	0.00
Departamento	D.C.					+IVA	0.00
Observaciones:						+ImpoConsumo	0.00
						-ReteFuente	0.00
						-ICA Retenido	0.00
						-IVA Retenido	0.00
SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L						TOTAL NETO	\$ 0.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses
- contratacion@itecoconsultores.com

CUFE:
a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac



Aceptada y Recibido

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Página 4 de 7

Cliente INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad BOGOTA, D.C.	C.C ó NIT 900,002,583-6	Fecha 06/08/2026 12:32:41 PM
País COLOMBIA	Zona	Vence 05/09/2026
Teléfono 2200700	Celular	Pago Credito a 30 Días
Vendedor	Email facturacion@rtvc.gov.co	

21 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima XBoost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8C1552 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	2,998,800.00	1.00	0.00	19.00	0.00	2,998,800.00
22 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, Generador o Estación Energía Silenciosa DELTA 2 MAX (Potencia máxima XBoost 3400W) Capacidad 2000W o 2000Wh Estaciones de energía DELTA Marca ECOFLOW serie: R351ZABAPH141783 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	7,344,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	7,344,000.00
23 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, Panel Solar Portál PS-400W de 400w Paneles solares portáles Potencia 400W ISC 11A VOC 48V IMP8A VMP 41V Eficiencia 22,60% Tipo de celdas Silicio Marca ECOFLOW serie: OS13Z11ALJ3G0537 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	3,671,880.00	1.00	0.00	19.00	0.00	3,671,880.00

Despacho a INRAVISION - SISTEMA DE	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	0.00
Dirección AV EL DORADO 45 26 33					-Descuento	0.00
Teléfono 2200700					-Otros Dscots	0.00
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE	0.00
Departamento D.C.					+IVA	0.00
Observaciones:					+ImpoConsumo	0.00
					-ReteFuente	0.00
					-ICA Retenido	0.00
					-IVA Retenido	0.00
SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L					TOTAL NETO	\$ 0.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses
- contratacion@itecoconsultores.com

CUFE:
a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac



Aceptada y Recibido

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Página 5 de 7

Cliente	INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C ó NIT	900,002,583-6
País	COLOMBIA	Zona	
Teléfono	2200700	Celular	
Vendedor		Email	facturacion@rtvc.gov.co

24 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, HOLLYLAND Full-Duplex Wireless DECT Intercom System with 8 Headsets (1.9 GHz) Marca HOLLYLAND serie: 45524323SLC Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	17,000,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	17,000,000.00
25 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, HOLLYLAND Full-Duplex Wireless DECT Intercom System with 8 Headsets (1.9 GHz) Marca HOLLYLAND serie: 45524322QAZ Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	17,000,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	17,000,000.00
26 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, HOLLYLAND Full-Duplex Wireless DECT Intercom System with 8 Headsets (1.9 GHz) Marca HOLLYLAND serie: 45524322466 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	17,000,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	17,000,000.00
27 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: N22618-00000153 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	4,530,105.00	1.00	0.00	19.00	0.00	4,530,105.00

Despacho a	INRAVISION - SISTEMA DE	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	0.00
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33					-Descuento	0.00
Teléfono	2200700					-Otros Dscots	0.00
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE	0.00
Departamento	D.C.					+IVA	0.00
Observaciones:						+ImpoConsumo	0.00
						-ReteFuente	0.00
						-ICA Retenido	0.00
						-IVA Retenido	0.00
SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L						TOTAL NETO	\$ 0.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses
- contratacion@itecoconsultores.com

CUFE:
a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac



Aceptada y Recibido

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Página 6 de 7

Cliente	INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA		
Teléfono	2200700		
Vendedor		Fecha	06/08/2026 12:32:41 PM
		Vence	05/09/2026
		Pago	Credito a 30 Días

28 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: N22618-00000224 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	4,530,105.00	1.00	0.00	19.00	0.00	4,530,105.00
29 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: 2412-N22618-00422 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	4,530,105.00	1.00	0.00	19.00	0.00	4,530,105.00
30 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: 2412-N22618-00245 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	4,530,105.00	1.00	0.00	19.00	0.00	4,530,105.00
31 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, ADECUACIONES LOCATIVAS. Ticket 2376 OT 1782 Adecuaciones locativas ID 343 - Estudio de radio Centro Histórico / Costo directo	1,144,177,394.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,144,177,394.00
32 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, ADECUACIONES LOCATIVAS, Ticket 2376 OT 1782 Adecuaciones locativas ID 343 - Estudio de radio Centro Histórico / Administración 20%	228,835,478.00	1.00	0.00	0.00	0.00	228,835,478.00

Despacho a	INRAVISION - SISTEMA DE	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	0.00
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33					-Descuento	0.00
Teléfono	2200700					-Otros Dscots	0.00
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE	0.00
Departamento	D.C.					+IVA	0.00
Observaciones:						+ImpoConsumo	0.00
						-ReteFuente	0.00
						-ICA Retenido	0.00
						-IVA Retenido	0.00
SON: CERO PESOS CON 00/100 M/L						TOTAL NETO	\$ 0.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses
- contratacion@itecoconsultores.com

CUFE:
a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac



Aceptada y Recibido

CONSORCIO OM-2025 - PRINCIPAL
NIT: 901,972,420-9 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 6190 Tarifa Renta 2.20%
CR 14 94 44 OF 201 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 3005137055
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 6190 8.66 x mil

Cliente	INRAVISION - SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS DEL ESTADO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FV-23	
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33		
Ciudad	BOGOTA, D.C.		
País	COLOMBIA		
Teléfono	2200700		
Vendedor		Fecha 06/08/2026 12:32:41 PM Vence 05/09/2026 Pago Credito a 30 Días	
	C.C ó NIT 900,002,583-6		
	Zona		
	Celular		
	Email facturacion@rtvc.gov.co		

33 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, ADECUACIONES LOCATIVAS, Ticket 2376 OT 1782 Adecuaciones locativas ID 343 - Estudio de radio Centro Histórico / Imprevistos 7%	80,092,417.57	1.00	0.00	0.00	0.00	80,092,417.57
34 001	BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, ADECUACIONES LOCATIVAS, Ticket 2376 OT 1782 Adecuaciones locativas ID 343 - Estudio de radio Centro Histórico / Utilidad 5%	57,208,870.50	1.00	0.00	19.00	0.00	57,208,870.50

Despacho a	INRAVISION - SISTEMA DE	Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO	SUBTOTAL	6,283,031,468.07
Dirección	AV EL DORADO 45 26 33	1,453,105,289.57	0.00	0.00	0.00	-Descuento	0.00
Teléfono	2200700	4,829,926,178.50	19.00	0.00	917,685,973.92	-Otros Dscots	0.00
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE	6,283,031,468.07
Departamento	D.C.					+IVA	917,685,973.93
Observaciones:						+ImpoConsumo	0.00
						-ReteFuente	0.00
						-ICA Retenido	0.00
						-IVA Retenido	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/L						TOTAL NETO	\$ 7,200,717,442.00
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA Autorización Numeración de Facturación N° 18764097243827 de 20/08/2025 desde FV 1 hasta FV 100 con vigencia de 24 meses - contratacion@itecoconsultores.com							
CUFE: a9d36c3df1883ec3cdac35752dc27d2988f0becbc57da18c556b961c5e31874e904b43d837ef5d0e6cbf0f7bc2881cac							Aceptada y Recibido

←

→

↺

abaco3.software-colombia.com/reception-document/Dirección%20Tecnologías%20Covergentes

🔍

🔒

☆

📄

📄

📄

En pausa

⋮

📦

Código Integridad -...

INTRANET

CASOS MESA

Ábaco 3.0

Ábaco 3.0

Correo: Milena Sar...

DTC - 1. ESTRATEGI...

2.6.9 OM CTO 2218...

RUTA VISITA TECNI...

»

Señal Memoria

Gestión Cultural

RTVC PLAY

Subgerencia de Televisión

Canal Señal Colombia

Canal Institucional

Canal Institucional - Producción Televisión

Coordinación Gestión de...

☰

Documentos Dirección Tecnologías Covergentes 🔍

☰

Fecha de recepción	Número de documento	Tipo de documento	Nombre de remitente	NIT	Total de la factura	Estado	Recibido o satisfacción
agosto 6, 2026	FV/23	Factura	consorcio om-2025	901972420	7200717442.00 COP	ACEPTADO	👍

Bogota, 02 de Julio de 2026

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado **CONSORCIO OM-2025**, identificado con **NIT 901972420**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado Cuenta
CUENTA AHORROS	040-000114-22	2025/08/11	A ACTIVA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 040 Central
Asesor de Crédito N.º 153
Cedula N.º 153


*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607) 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaida Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.



CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo, **WILLIAM HUMBERTO RODRIGUEZ OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía No 79.727.981 expedida en Bogotá, en mi condición de Contador Público del CONSORCIO OM 2025, identificado con Nit. 901.972.420-9, certifico el pago y el cumplimiento de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicione, complementen o modifiquen, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Dada en Bogotá, a los (13) días del mes de julio del 2026.

Atentamente,

WILLIAM RODRIGUEZ OSORIO
CONTADOR PUBLICO
C.C. N° 79.727.981 de Bogotá
T.P. N° 145135-T

GISELLE ANDREA CARDENAS VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 53.072262

CÉDULA DE
CIUDADANÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos

RODRIGUEZ OSORIO

NUIP 79.727.981

Nombres

WILLIAM HUMBERTO

Nacionalidad

COL

Estatura

1.74

Sexo

M

Fecha de nacimiento

12 MAR 1979

G.S.

O+

Lugar de nacimiento

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición

12 NOV 1997, BOGOTA D.C.

Firma

William

Fecha de expiración

25 ENE 2034




.CO

038239481



Hernán Penagos Giraldo
REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL038239481215001<<<<<<<<<<
7903122M3401251COL79727981<<<3
RODRIGUEZ<OSORIO<<WILLIAM<HUMB

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

145135-T

**WILLIAM HUMBERTO
RODRIGUEZ OSORIO**
C.C. 79727981



RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

155683

FIRMA DEL TITULAR

69369

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B H 0 9 E 9 7 4 4 9 8 6 6 9 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILLIAM HUMBERTO RODRIGUEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79727981 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145135-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 1 de 103

Informe de seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de estaciones de la red de radio y televisión nacional de INRAVISIÓN

Período: Del 1 de julio 2026 al 31 de julio 2026



Contrato: RTVC-CPS-2218-2025

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 2 de 103

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Alcance de informe	4
1.2. Objetivo	4
2. RESUMEN EJECUTIVO	4
3. INDICADORES	6
3.1. Indicadores de medición de disponibilidad	6
3.2. Mejora de infraestructura eléctrica	21
3.3. Cumplimiento de estrategias resolución 040 de 2026 (FUTIC)	22
4. DESARROLLO DE COMPONENTES	24
4.1. Componente técnico (Transmisión)	24
4.1.1. Visitas de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión	25
4.1.2. Mantenimientos correctivos del componente técnico (Transmisión)	26
4.1.3. Mesa de ayuda	27
4.2. Componente eléctrico	28
4.2.1. Mantenimientos preventivos y correctivos	29
4.3. CAN	34
4.3.1. Actividades Ejecutadas	34
4.4. Componente civil.	40
4.5. Componente ambiental	60
4.6. Componente SST	73
4.6.1. Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal mínimo requerido en el contrato	74
4.6.3. Condiciones de seguridad	75
4.6.4. Inspecciones de seguridad	75
4.6.5. Recarga, cambio o suministro de extintores y/o botiquines	76
4.6.6. Capacitación	78
4.6.7. Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral	78
4.6.8. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)	79
4.6.9. Inversiones Bolsa Ornato SST – julio 2026	80
4.6.10. SG SST	81
4.6.11. Entrega de menaje y elementos de aseo en estaciones primarias	81
4.6.13. Entrega de dotación y EPPS	82
4.6.14. Plan de Evacuación Médica MEDEVAC Nacional	82
4.7. Componente seguridad y vigilancia	83

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 3 de 103

4.8. Componente Herramienta de gestión y sistema de información (SIGMA)	83
4.9. Bolsa de productos y servicios	94
4.9.1. Bolsa integral de repuesto, equipos nuevos y alquiler	94
4.9.2. Bolsa suministro de acpm y transporte	97
4.9.3. Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato	97
5. CONCLUSIONES	98
5.1. Evaluación global de los componentes	98
5.2. Puntos críticos identificados	99
5.3. Grado de cumplimiento de requisitos	100
ANEXOS	102

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 4 de 103

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Alcance de informe

El presente informe mensual de seguimiento No. 12 corresponde al periodo comprendido entre el 01 y 31 de julio de 2026 y tiene como finalidad evidenciar las actividades ejecutadas por el CONSORCIO OM 2025, orientadas a mostrar la distribución de recursos, la estrategia implementada para la atención, seguimiento y control de solicitudes e incidentes, así como las rutinas de mantenimiento realizadas en las estaciones de INRAVISIÓN. Estas acciones comprenden la gestión integral de diferentes sistemas, los cuales deben administrarse de manera óptima para garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de radio y televisión pública a nivel nacional.

1.2. Objetivo

Informar y presentar las principales actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2026, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el marco del contrato vigente, dejar trazabilidad documental para efecto de supervisión e interventoría, y suministrar a la entidad la información técnica y financiera para la toma de decisiones operativas y administrativas.

2. RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo del mes de julio de 2026, el CONSORCIO OM 2025 dio continuidad a las labores de administración, operación y mantenimiento de la red nacional de radiodifusión sonora y televisión de INRAVISIÓN. La gestión se enfocó primordialmente en robustecer la confiabilidad de la infraestructura, restituir servicios de carácter crítico y asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato vigente, así como de las estrategias definidas en la Resolución 040 de 2026.

Dentro del componente técnico, se ejecutó el plan preventivo en 157 de las 159 estaciones programadas, lo que representa un cumplimiento operativo del 98,74%. La desviación del 1,26% se debió estrictamente a limitaciones de acceso en las estaciones de Lengupá y López de Micay. Asimismo, se adelantaron trece (13) intervenciones correctivas en puntos estratégicos, logrando restablecer señales de Televisión Digital Terrestre (TDT), Radio Nacional y sistemas de recepción satelital.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 5 de 103

Por su parte, la Mesa de Ayuda centralizó la trazabilidad documental y el monitoreo operativo, atendiendo 52 PQRSD con un nivel de resolución del 98,07%.

En el frente eléctrico, se realizaron setenta y ocho (78) intervenciones en la Red de Radiodifusión de INRAVISIÓN (tres (3) intervenciones preventivas y setenta y cinco (75) intervenciones correctivas). Estas labores se orientaron a la estabilización de grupos electrógenos, sistemas UPS, transferencias, climatización y subestaciones, entre otros elementos de respaldo. Consecuentemente, el indicador de infraestructura eléctrica ascendió del 85,53% al 86,71%, reflejando una mejora de 1,18 puntos porcentuales. No obstante, la red se mantiene bajo la clasificación de "operativa con restricciones" debido a la persistencia de obsolescencia tecnológica y sistemas pendientes de modernización.

La estación CAN reportó una disponibilidad del 100%, sustentada en la ejecución de 80 actividades de mantenimiento y operación en las áreas de energía, refrigeración, emisión y gestión de señales, salvaguardando la continuidad de los servicios estratégicos de la entidad.

Respecto a las metas de la Resolución 040 de 2026, el servicio TDT alcanzó una disponibilidad del 92,13%, superando el umbral establecido del 91%. De igual modo, el plan de estabilización eléctrica registró un avance del 33,79%, mientras que la gestión ambiental logró un cumplimiento del 100% mediante la disposición final de 1.499,2 kg de residuos peligrosos (RESPEL), garantizando la debida trazabilidad y el rigor normativo.

A pesar de los logros alcanzados, los indicadores globales de disponibilidad siguen condicionados por factores estructurales preexistentes, tales como estaciones siniestradas, equipos con marcada obsolescencia, falta de suministro de energía comercial y fallas recurrentes en transmisores y sistemas de climatización. A esto se suman eventos de vandalismo, hurtos y dificultades de acceso a zonas remotas, afectando principalmente a las estaciones secundarias analógicas y TDT, lo cual limita el cumplimiento pleno de los indicadores contractuales a pesar de los esfuerzos correctivos desplegados.

En conclusión, la gestión de julio refleja una operación estable con un alto índice de ejecución en mantenimientos y una mejora gradual en la fiabilidad de la infraestructura eléctrica. Se consolida así una tendencia positiva hacia la estabilización de la red nacional, cumpliendo con los objetivos técnicos, ambientales y administrativos trazados para el desarrollo del contrato.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 6 de 103

3. INDICADORES

3.1. Indicadores de medición de disponibilidad

El control y seguimiento de los indicadores de disponibilidad en las estaciones principales (Primarias y AM) se realiza con el apoyo de los operadores residentes en cada estación, quienes cumplen turnos de 7 x 24 durante periodos de 15 días, dada la relevancia y cobertura de estas estaciones dentro de la red de INRAVISIÓN. Al finalizar cada periodo, se efectúa el relevo correspondiente, garantizando la continuidad del monitoreo permanente de las indisponibilidades que presenten estas estaciones.

El reporte de los indicadores se elabora diariamente a través de la bitácora de las estaciones primarias y de las visitas de campo, y se consolida mensualmente en la plataforma SIGMA. **Anexo 1. Informe de Gestión – julio 2026.**


TIPO DE ESTACIÓN	TOTAL	A visitar Jul-26	Visitadas Jul-26
ESTACIÓN AM	6	6	6
ESTACIÓN AM + ANALÓGICA	1	0	0
CAN	1	1	1
ESTACIÓN MICROONDAS	3	0	0
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	31	22	22
ESTACIÓN PRIMARIA TDT	4	4	4
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + TDT	4	4	4
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	12	8	8
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	135	50	49
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	25	15	15

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 7 de 103

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	13	2	2
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	9	7	7
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	45	16	15
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	3	1	1
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	11	5	5
ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	2	0	0
ESTUDIO RADIO	27	17	17
ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	3	1	1
CABECERA REGIONAL TDT	6	0	0
TOTAL	341	159	157

Durante el mes de julio de 2026 se visitaron 157 de las 159 estaciones programadas por el equipo de transmisión para este período, más la estación CAN para un total de 157 estaciones, equivalente a un cumplimiento operativo del 98,74% sobre el subconjunto de estaciones visitadas de manera efectiva en el periodo. El total de estaciones de la red es de 341. Esta variación frente a periodos anteriores refleja la operación efectiva durante el mes una vez se descuentan las estaciones siniestradas, sin energía, en proceso de recuperación o sin condiciones técnicas para su intervención.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 8 de 103

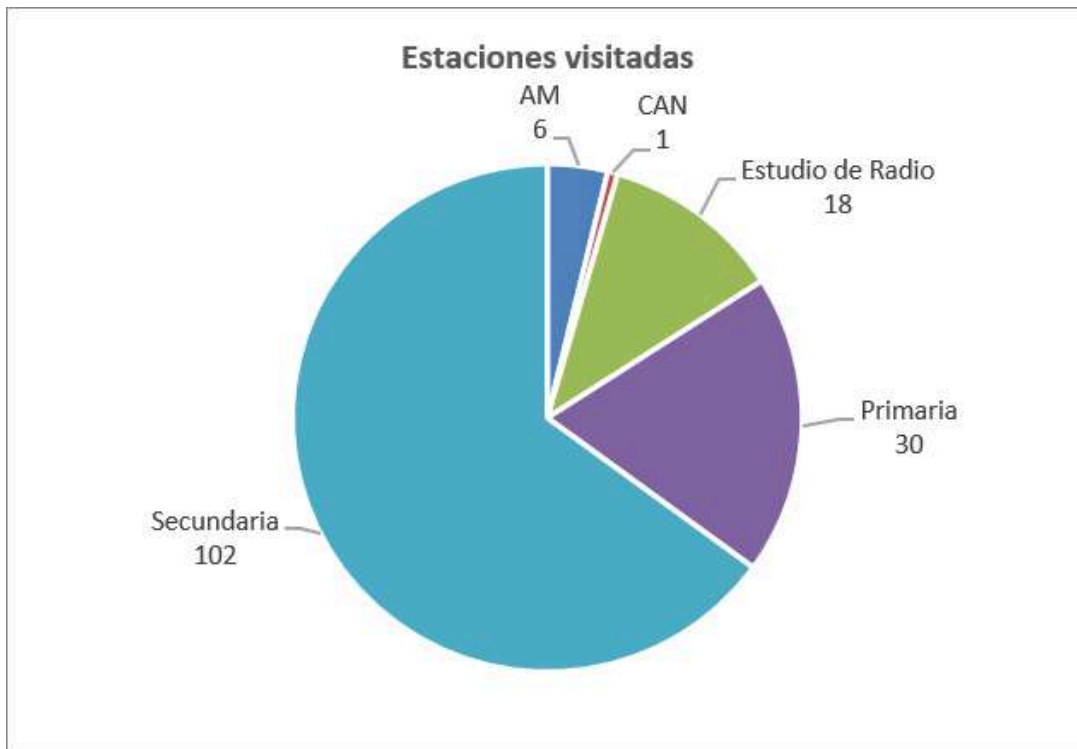

El comportamiento de los indicadores de servicio durante el periodo evaluado se evidencia por debajo de los indicadores contractuales, lo que se resalta la importancia de priorizar intervenciones correctivas y estrategias de mantenimientos para asegurar la continuidad y calidad del servicio.

Fórmula de cálculo de indicadores medición de disponibilidad

$$\text{Indicador de Disponibilidad} = \frac{(\text{Tiempo total de servicio} - \text{Tiempo total de indisponibilidad})}{\text{Cantidad de días evaluados}}$$

TIPO DE ESTACIÓN	REAL (%)	CONTRACTUAL (%)	UMBRAL > (%)
ESTACIÓN AM	99,95%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN AM + ANALÓGICA	100,00%	100,00%	99,80%
CAN	100,00%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN MICROONDAS	100,00%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	76,16%	100,00%	99,80%

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 9 de 103

ESTACIÓN PRIMARIA TDT	96,40%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA + TDT	90,17%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO	70,29%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA	58,51%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT	66,52%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT	56,17%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + TDT (CON G.E)	56,73%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT	79,04%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA + RADIO + TDT (CON G.E)	77,50%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA TDT (CON G.E)	74,04%	100,00%	99,80%
ESTACIÓN SECUNDARIA REPETIDORA TDT	27,08%	100,00%	99,80%
ESTUDIO RADIO	100,00%	100,00%	99,80%
ESTUDIO DE RADIO + ESTACIÓN DE RADIO	100,00%	100,00%	99,80%
CABECERA REGIONAL TDT	100,00%	100,00%	99,80%
TOTAL PONDERADO (Anexo 1)	88,94%	100,0%	—

COBERTURA	REAL	POBLACIÓN COLOMBIANA 2025	% COBERTURA POBLACIÓN COLOMBIA
-----------	------	---------------------------	--------------------------------

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 10 de 103

COBERTURA RED TELEVISIÓN TDT	45.769.272	50.528.858	90,58%	52.469.495	87,23%
	CONTRACTUAL				
	50.528.858	50.528.858	100,00%	52.469.495	96,30%

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL TDT	REAL	CONTRACTUAL
SERVICIOS TDT	84,05%	100,00%

DISPONIBILIDAD	jul-26
Disponibilidad mensual para el servicio de las estaciones con TDT, para estaciones con una cobertura superior a 100.000 habitantes.	91%

Indicadores cualitativos de disponibilidad por tipo de estaciones

Estaciones de Radio AM – Disponibilidad: 99,95%

La disponibilidad del servicio de Radio Nacional en las estaciones de Radio AM durante julio de 2026 se situó en 99,95%, registrando una mejora de 12,2 puntos porcentuales frente al 87,75% reportado en junio de 2026.

Este comportamiento evidencia una recuperación significativa del servicio, principalmente por la normalización de la estación Sabanagrande, que durante el mes anterior concentró la mayor parte de la indisponibilidad debido a la caída de la torre AM y a las actividades necesarias para la instalación y ajuste del sistema radiante provisional.

Durante julio, la mayoría de las estaciones mantuvieron una operación estable. Las únicas afectaciones que generaron indisponibilidad se presentaron en Sabanagrande y El Rosal, acumulando en conjunto 121 minutos fuera de servicio. Las estaciones Marinilla, La Rumba, La Enea y Jamundí mantuvieron una disponibilidad del 100%.

Estación 01 - Marinilla:

Durante julio de 2026 no se presentaron afectaciones en la disponibilidad del servicio de Radio Nacional.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 11 de 103

Los días 4 y 11 de julio se realizaron actividades de calentamiento de la planta eléctrica para verificar su funcionamiento, encontrándose operativa y sin generar indisponibilidad.

Asimismo, los días 6 y 28 de julio se presentaron cortes de energía comercial; sin embargo, la estación continuó operando mediante la planta eléctrica. También se realizaron suspensiones programadas del suministro de energía para efectuar actividades de mantenimiento dentro de la estación, manteniéndose el servicio mediante el sistema de respaldo.

Como resultado, la estación cerró julio con una disponibilidad del 100%.

Estación 02 - Sabanagrande:

Durante julio de 2026 se presentó una afectación puntual del servicio de Radio Nacional el día 6 de julio, durante la ejecución de ajustes en la caja de sintonía y en la potencia del transmisor Nautel.

Estas actividades, registradas mediante el ticket 2971, generaron indisponibilidad entre las 11:45 y las 13:12, para un total de 87 minutos.

A diferencia del mes anterior, cuando la estación presentó una indisponibilidad prolongada por la caída de la torre AM, durante julio el servicio permaneció estable después de los ajustes técnicos realizados. La estación cerró el mes con una disponibilidad de 99,81%.

Estación 03 - La Rumba:

Durante julio de 2026 no se presentaron indisponibilidades en la prestación del servicio.

El 1 de julio se registró el ingreso de elementos para la operación y permanencia del personal en la estación. Posteriormente, el 6 de julio, el Consorcio OM realizó una visita de mantenimiento, sin que estas actividades generarán afectaciones sobre la continuidad del servicio.

La estación cerró el mes con una disponibilidad del 100%.

Estación 04 - La Enea:

Durante julio de 2026 se presentaron cortes de energía comercial; no obstante, la estación continuó operando mediante la planta eléctrica, por lo que no se generaron indisponibilidades en el servicio de Radio Nacional.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 12 de 103

Los eventos fueron reportados a VATIA mediante el radicado 889143. Adicionalmente, el 18 de julio se realizó el calentamiento de la planta eléctrica para verificar su funcionamiento, encontrándose operativa. La estación cerró el mes con una disponibilidad del 100%.

Estación 05 - El Rosal:

Durante julio de 2026 se presentó una afectación puntual del servicio de Radio Nacional el día 6 de julio, asociada a un corte de energía comercial.

La planta eléctrica no encendió, dejando los equipos sin respaldo de energía y generando indisponibilidad entre las 12:56 y las 13:30, para un total de 34 minutos. La novedad fue reportada a VATIA mediante el radicado 845622.

Durante el mes también se realizaron inspecciones relacionadas con las condiciones estructurales de la estación, visitas de mantenimiento, fumigación y mediciones de la cubierta de la edificación y del salón de equipos.

El 23 de julio, durante una visita de mantenimiento del Consorcio OM, se configuraron los parámetros del procesador de audio, dejando el equipo operando correctamente. Estas actividades adicionales no generaron indisponibilidad.

La estación cerró julio con una disponibilidad de 99,92%.

Estación 07 - Jamundí:

Durante julio de 2026 no se presentaron afectaciones en la disponibilidad del servicio de Radio Nacional.

El 10 de julio se realizó mantenimiento preventivo y el 13 de julio se efectuó el calentamiento de la planta eléctrica, verificando su correcto funcionamiento.

Los días 17 y 19 de julio se presentaron fallas en la red de energía comercial, reportadas mediante las PQR 8902617 y 890405. En ambos casos, la estación continuó operando con la planta eléctrica, sin generar interrupciones en el servicio.

La estación cerró el mes con una disponibilidad del 100%.

En general, durante julio se presentó una recuperación importante en la disponibilidad de las estaciones de Radio AM. Las afectaciones fueron puntuales y de corta duración, concentrándose únicamente en Sabanagrande y El Rosal.

La operación adecuada de las plantas eléctricas permitió mantener la continuidad del servicio durante la mayoría de los cortes de energía comercial. No obstante, se recomienda continuar priorizando la revisión y mantenimiento del sistema de respaldo eléctrico de El Rosal, debido a la recurrencia de fallas de encendido de la planta durante eventos de pérdida de energía comercial.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 13 de 103

Estaciones AM + Analógicas – Disponibilidad: 0%

La estación de Uribia permanece siniestrada, ya que fue tomada por comunidades indígenas antes del inicio del proyecto, y a la fecha no se ha recibido directriz sobre su manejo o atención.

Estaciones Microondas – Disponibilidad: 0%

En cuanto a las estaciones de microondas (El Piojo, Lastinas y Gavilanes), se encuentran siniestradas, lo que impacta significativamente el indicador ponderado de disponibilidad, considerando que estas representan el 10% del total de la disponibilidad de acuerdo a la resolución 6 y actualmente no es posible restablecer su operación.

CAN – Disponibilidad: 100%

Gracias a la ejecución de actividades programadas de mantenimientos preventivos, instalación de nuevos equipos de refrigeración y actividades complementarias, la infraestructura se conserva en óptimas condiciones de funcionamiento y totalmente operativa.

Estaciones Primarias TDT – Disponibilidad: 87,58%

Durante julio de 2026, la disponibilidad de las estaciones primarias TDT se ubicó en 87,58%, presentando una disminución de 2,48 puntos porcentuales frente al 90,06% registrado en junio.

El comportamiento del indicador estuvo determinado principalmente por la permanencia de afecciones prolongadas en los servicios analógicos C1, Canal Institucional y Señal Colombia, así como por nuevas indisponibilidades en los servicios TDT RTVC, TDT REG1 y TDT REG2. En varios casos, los transmisores permanecieron fuera de servicio o con potencia de salida en 0 W durante la totalidad del mes.

Las principales novedades estuvieron relacionadas con daños en transmisores, amplificadores de potencia, módulos PA, excitadores, tarjetas lógicas y de control, fuentes de alimentación y sistemas de refrigeración. También se mantuvieron transmisores sin módulos de potencia debido a que sus componentes se encontraban retirados para reparación especializada.

Estas condiciones generaron afectaciones continuas en estaciones como Leticia,

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 14 de 103

Chigorodó, Padre Amaya, La Popa, Saboyá, Munchique, Montería, Calatrava, Tibitoc, Cerro Kennedy, El Tigre, Galeras, Jurisdicciones, Planadas, Lebrija, San Gil, Martinica y Azalea, entre otras.

Durante el mes también se presentaron afectaciones en los servicios TDT por pérdida de potencia, amplificadores alarmados y transmisores que se apagaron como medida de protección. Entre las novedades más relevantes se encontraron fallas prolongadas en TDT REG1 y TDT REG2, transmisores sin etapas finales de amplificación y equipos pendientes de revisión o reparación por parte de los fabricantes.

Adicionalmente, se registraron eventos asociados a descargas atmosféricas, tormentas eléctricas y daños en elementos de la cadena de recepción satelital. Estas condiciones ocasionan fallas en LNB, pérdida de señal, desenganche de receptores y afectaciones simultáneas en los servicios TDT, Radio Nacional y televisión analógica.

Otro factor relevante correspondió a las fallas en los sistemas eléctricos y de respaldo. Durante cortes y microcortes de energía comercial se evidenciaron UPS que no sostuvieron la carga debido al deterioro de sus baterías, plantas eléctricas que presentaron fallas de encendido o que no soportaron la carga total de la estación, y afectaciones durante las transferencias entre energía comercial y generación de respaldo.

En varias estaciones, aunque la planta eléctrica entró en funcionamiento, fue necesario apagar algunos transmisores para evitar sobrecargas. En otros casos, los equipos se reiniciaron una vez normalizado el suministro de energía. Estas novedades generaron indisponibilidades puntuales o recurrentes en los servicios TDT y analógicos.

También se presentaron alarmas por alta temperatura, fallas en los sistemas de extracción de aire y climatización, y transmisores apagados como medida de protección. Estas condiciones afectaron principalmente equipos de alta potencia y estaciones donde los sistemas de aire acondicionado no garantizaron las condiciones necesarias para una operación estable.

Durante julio se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, calentamiento y verificación de plantas eléctricas, reinicio y configuración de transmisores, revisión de sistemas de recepción, cambio de LNB, recuperación de potencia, revisión de UPS y transferencias eléctricas, así como retiro de equipos y

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 15 de 103

componentes para reparación.

Sin embargo, varias de las intervenciones permitieron únicamente recuperaciones parciales, debido a que persisten daños que requieren repuestos, reparación especializada, sustitución de módulos de potencia, intervención de los fabricantes o mejoramiento de los sistemas eléctricos y de climatización.

En términos generales, la disminución del indicador durante julio estuvo asociada a la continuidad de fallas heredadas de meses anteriores y a la aparición de nuevos eventos en los servicios TDT. Aunque varias estaciones mantuvieron disponibilidades cercanas o iguales al 100%, las indisponibilidades prolongadas en transmisores y sistemas críticos impidieron una recuperación del resultado general.

Estaciones Analógicas Secundarias – Disponibilidad: 64,4%

Durante julio de 2026, la disponibilidad de las estaciones analógicas secundarias se ubicó en 64,4%, presentando una disminución de 2,91 puntos porcentuales frente al 67,31% registrado en junio.

El comportamiento del indicador continuó afectado principalmente por estaciones que permanecieron fuera de servicio o con operación parcial durante todo el mes. Las novedades más frecuentes estuvieron relacionadas con la ausencia de transmisores en sitio, equipos retirados para reparación, transmisores no devueltos de contratos anteriores, receptores satelitales fuera de servicio y daños en amplificadores, fuentes, moduladores, etapas de potencia y sistemas de recepción.

Se mantuvieron afectaciones prolongadas en los servicios analógicos C1, Canal Institucional y Señal Colombia. En varias estaciones, uno o más de estos servicios permanecieron fuera de operación durante la totalidad del periodo, mientras que otras estaciones conservaron únicamente un transmisor activo, generando disponibilidades parciales.

También persistieron novedades asociadas a la obsolescencia de los equipos. En algunos casos, los transmisores fueron clasificados como irreparables debido a múltiples fallas en sus módulos, la falta de repuestos y la dificultad para brindar soporte técnico a equipos de marcas discontinuadas. Esta situación limitó la recuperación de varios servicios y mantuvo indisponibilidades heredadas de meses anteriores.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 16 de 103

Otro de los principales factores de afectación fue la falta de energía comercial. Durante julio se registraron estaciones sin suministro eléctrico por suspensión del servicio, falta de pago, ausencia de medidores, daños en acometidas, caída de árboles sobre el cableado y fallas en las líneas de alimentación. Estas condiciones ocasionaron la salida total de las estaciones o impidieron la operación de los transmisores y receptores.

Adicionalmente, continuaron presentándose afectaciones relacionadas con hurto y vandalismo. En algunas estaciones se evidenció la pérdida o daño de cableado coaxial, sistemas radiantes, equipos e infraestructura eléctrica. También se identificaron condiciones deficientes de seguridad que dificultan la instalación de nuevos elementos y representan un riesgo para la recuperación definitiva de los servicios.

Durante el periodo se registraron fallas en receptores satelitales y cadenas de recepción, entre ellas ausencia de señal, receptores que no superaron las pruebas de arranque, problemas de voltaje, decodificadores fuera de servicio y daños ocasionados por árboles o condiciones ambientales. Estas novedades afectan la entrega de señal a los transmisores, aun cuando algunos equipos de transmisión se encontraban disponibles.

También se presentaron transmisores con potencia de salida en 0 W, alarmas por alta temperatura, fallas en módulos PA, daños en etapas de amplificación y equipos operando con potencia reducida. En varios casos, los transmisores permanecieron apagados como medida de protección o fueron enviados a laboratorio para diagnóstico y reparación.

Durante julio se adelantaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, revisión de transmisores, recuperación de receptores satelitales, ajustes de potencia, reinicio de equipos, verificación de sistemas eléctricos y retiro de componentes para reparación. Algunas de estas acciones permitieron recuperar parcialmente los servicios; sin embargo, no fueron suficientes para compensar la cantidad de estaciones con fallas prolongadas.

Se priorizan los esfuerzos en las estaciones con impacto sobre el indicador, principalmente:

96 - Fortul
103 - Boavita
106 - El Cocuy

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 17 de 103

108 - Valle de Tenza II
 110 - Lengupá
 111 - Miraflores
 114 - Otanche
 116 - Pauna
 118 - Ráquira
 120 - San Luis de Gaceno
 141 - Páez
 159 - Chocontá
 171 - Pacho
 182 - Villapinzón
 193 - San Andrés de Tello
 202 - El Tablón de Gómez
 214 - Tangua

En términos generales, el indicador de julio se mantuvo en niveles similares a los del mes anterior, aunque presentó una leve disminución. Las principales causas continúan siendo la ausencia de equipos de transmisión, fallas prolongadas en los servicios analógicos, falta de energía comercial, obsolescencia tecnológica, vandalismo y estaciones pendientes de intervenciones especializadas.

Aunque varias estaciones mantuvieron una operación estable y se lograron recuperaciones puntuales, el resultado general continúa condicionado por indisponibilidades acumuladas de periodos anteriores y por novedades estructurales que requieren reposición de equipos, reparación de acometidas eléctricas, adquisición de repuestos y mejoramiento de las condiciones de seguridad e infraestructura.

Estaciones Secundarias TDT – Disponibilidad: 62,44%

Durante julio de 2026, la disponibilidad de las estaciones secundarias TDT se ubicó en 62,44%, presentando una mejora de 2,03 puntos porcentuales frente al 60,41% registrado en junio.

Aunque el indicador mantuvo una tendencia positiva, la recuperación fue moderada debido a la permanencia de estaciones fuera de servicio o con operación parcial durante todo el mes. Las principales afectaciones estuvieron relacionadas con ausencia de energía comercial, acometidas eléctricas sin legalizar o fuera de servicio, hurto de elementos, vandalismo, restricciones de acceso a los predios y equipos apagados como medida de protección.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 18 de 103

También se mantuvieron fallas prolongadas en transmisores TDT, amplificadores de potencia, excitadores, fuentes de alimentación y etapas finales de amplificación. En varios casos, los sistemas no detectaron los transmisores, los excitadores no iniciaron correctamente o los equipos presentaron disparos recurrentes de sus protecciones, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado y de los fabricantes.

Las novedades en las cadenas de recepción continuaron afectando la prestación del servicio. Se presentaron receptores IRD averiados o con reinicios constantes, daños en LNB y latiguillos, problemas de voltaje, pérdida de señal satelital y estaciones repetidoras que no recibieron señal desde su estación principal. Estas condiciones mantuvieron transmisores operativos, pero sin contenido para radiodifundir.

Otro factor relevante correspondió a las fallas en los sistemas de climatización y refrigeración. En algunas estaciones, los transmisores permanecieron en 0 W o apagados por alarmas de alta temperatura, debido a que los sistemas de aire acondicionado se encontraban fuera de servicio. También se presentaron equipos desenergizados por humedad dentro de los shelters y riesgo de cortocircuito.

Las afectaciones por falta de energía continuaron concentrando una parte importante de la indisponibilidad. Varias estaciones permanecieron sin suministro eléctrico durante la totalidad del mes, mientras que otras operaron únicamente durante periodos limitados o dependen del funcionamiento de plantas eléctricas. Asimismo, se mantuvieron casos con UPS hurtadas, acometidas eléctricas vandalizadas o pendientes de legalización.

Durante julio también se registraron afectaciones puntuales por fallas en sistemas SFN, pérdida de comunicación entre unidades periféricas y transmisores, alarmas por relación de onda estacionaria y fallas en las tramas de video. En algunos casos, los servicios fueron recuperados mediante reiniciar, reconfiguración de equipos, actualización de parámetros o soporte técnico remoto.

Se priorizan los esfuerzos en las siguientes estaciones, por su mayor impacto sobre el indicador:

57 - Arboletes
98 - Los Nogales

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 19 de 103

136 - Aguazul
 131 - El Doncello
 263 - Dagua
 305 - Chocontá 02
 306 - El Cairo
 309 - La Unión
 320 - El Águila
 322 - Nazareth
 335 - Gigante
 341 - La Florida
 230 - La Hormiga
 79 - Necoclí
 222 - Maracaibo
 318 - Sotavento-Tuchín

Dentro del periodo se adelantaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de LNB y elementos de recepción, lavado de bombas y recuperación de sistemas de refrigeración, revisión de amplificadores, restablecimiento de transmisores, reinicio de alarmas y configuración de unidades de control. Estas acciones permitieron recuperar algunos servicios o reducir los tiempos de afectación.

No obstante, varias estaciones continuaron presentando novedades heredadas de meses anteriores que requieren intervenciones de mayor alcance, como reposición de transmisores y fuentes, reparación de etapas de potencia, recuperación de sistemas radiantes, instalación de UPS, normalización de acometidas eléctricas y asistencia especializada de los fabricantes.

En términos generales, el resultado de julio evidencia una estabilidad relativa y una leve mejora frente al mes anterior. Sin embargo, el indicador continúa condicionado por indisponibilidades prolongadas relacionadas con falta de energía, fallas estructurales en transmisores y amplificadores, problemas en las cadenas de recepción, deficiencias en climatización y eventos de hurto o vandalismo. Aunque se lograron recuperaciones puntuales, estas no fueron suficientes para generar un incremento significativo en la disponibilidad general

Durante julio se evidenció la recuperación completa de las estaciones Nazareth, Puerto Libertador, Monquirá, El Doncello e Istmina, las cuales alcanzaron una

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 20 de 103

disponibilidad del 100% después de presentar afectaciones durante junio. Asimismo, se registraron recuperaciones parciales en Aguazul, Santiago Pérez, Chinchiná y La Calera; sin embargo, en estas estaciones persisten novedades en algunos servicios TDT, asociadas principalmente a fallas en transmisores, etapas de potencia, amplificadores finales y sistemas de refrigeración.

Frente a junio, durante julio de 2026 no se identificaron nuevas estaciones secundarias TDT sin suministro de energía comercial. Continúan con novedades heredadas las estaciones Los Nogales, Dagua, Chocontá 02, Sotavento-Tuchín y La Florida, asociadas a falta de energía, acometidas pendientes de legalización, restricciones de acceso y hurto de la UPS. Como novedad del periodo se presentó Puerto Escondido, cuyos equipos fueron desenergizados preventivamente debido a la alta temperatura registrada en el shelter y a fallas en los sistemas de aire acondicionado; por tanto, esta afectación no corresponde a ausencia de energía comercial. Asimismo, Istmina, La Unión, Ambalema y Nazareth dejaron de figurar en julio bajo esta condición, evidenciando una recuperación o cambio en la novedad reportada frente al mes anterior.

Estudios de Radio – Disponibilidad: 100%

Durante julio, el indicador de disponibilidad de los estudios de radio se ubicó en 100%, evidenciando continuidad en la disponibilidad del servicio.

Durante el mes se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, inspección y verificación del funcionamiento de equipos en estudios como Medellín, Manizales, Cali y Florida, sin que estas intervenciones generen afectaciones en la prestación del servicio. Los demás estudios conservaron una operación estable y no presentaron novedades que comprometieron su disponibilidad.

Como novedad técnica, en el estudio de Algeciras el radioenlace se encontraba fuera de servicio; sin embargo, la transmisión se mantuvo mediante conectividad IP, evitando interrupciones. De igual manera, se verificó el transmisor de enlace del estudio Chaparral, encontrándose operativo y disponible como sistema de respaldo, aunque actualmente la señal principal se transporta por IP directamente desde Bogotá debido a su mayor estabilidad y calidad.

En términos generales, el comportamiento de los estudios de radio durante julio fue satisfactorio. Las actividades de mantenimiento y las alternativas de transmisión

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 21 de 103

mediante enlaces IP permitieron conservar la operación continua, sin afectaciones sobre el indicador general de disponibilidad.

Cabeceras Regionales – Disponibilidad: 100%

Estas estaciones no fueron visitadas durante el periodo evaluado y mantienen el estado reportado en el Anexo Técnico V4 entregado por la entidad.

3.2. Mejora de infraestructura eléctrica

El indicador de desempeño presentó una mejora durante el periodo reportado, pasando de 85,53% en junio a 86,71% en julio, lo que representa un incremento de 1.18 puntos porcentuales. Aunque el resultado evidencia una recuperación frente al mes anterior, el sistema se mantiene en condición de “operativo con restricciones”, debido a la persistencia de novedades en plantas eléctricas, UPS, bancos de baterías y puntos con limitaciones en el suministro eléctrico.

La mejora se explica principalmente por el aumento de estaciones clasificadas como confiables y la reducción de estaciones en condición crítica. En julio, sobre las 341 estaciones evaluadas, el estado fue el siguiente:

- **Confiables:** 206 estaciones (60,41%)
- **Operativas con restricciones:** 59 estaciones (17,30%)
- **Críticas:** 35 estaciones (10,26%)
- **N/A:** 41 estaciones (12,02%)

Estas estaciones corresponden a aquellas que se encuentran siniestradas, sugeridas para dar de bajas y/o vandalizadas.

No obstante, continúan presentándose novedades relevantes asociadas a plantas eléctricas fuera de servicio o con fallas, UPS en bypass o sin respaldo efectivo, bancos de baterías pendientes de cambio, fallas en sistemas de transferencia, y estaciones sin energía comercial o con acometidas pendientes de normalización. Estas condiciones limitan la confiabilidad total de la infraestructura y mantienen puntos críticos que requieren intervención correctiva.

En general, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo permitieron mejorar el indicador, pero aún se requiere avanzar en la normalización eléctrica y reposición de componentes para consolidar una infraestructura plenamente confiable.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 22 de 103

Esta información se encuentra en el **Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica julio 2026.**

3.3. Cumplimiento de estrategias resolución 040 de 2026 (FUTIC)

Se realiza entrega de cumplimiento en el mes de julio de las estrategias comprendidas dentro de la resolución 040, orientadas a garantizar la sostenibilidad técnica, operativa y ambiental de la infraestructura de TDT.

En términos de disponibilidad del servicio, se alcanzaron niveles del 92,13% en la disponibilidad del servicio TDT, cumpliendo la meta del 91%. Se destaca el cumplimiento total en el CAN (100%), así como un desempeño satisfactorio en estaciones primarias (≈95,15%), lo que evidencia efectividad en las acciones de mantenimiento y estabilización. Las estaciones secundarias presenta una avance de 2,81% (≈81,02%), consecuente con la tendencia de mejora asociada a la recuperación progresiva de estaciones y a la ejecución de intervenciones técnicas correctivas.

Respecto a la estrategia de estabilización eléctrica, se evidencia avance en la implementación de acciones estructurales en estaciones priorizadas, alcanzando un 33,79% de ejecución general, con actividades clave como reposición de componentes, estudios técnicos y puesta en operación de equipos de generación. Estas acciones contribuyen directamente al cumplimiento de las metas de confiabilidad y continuidad del servicio exigidas por la Resolución 040.

No.	Estación	Elemento eléctrico a intervenir	Plan de trabajo a ejecutar por elemento (alcance en actividades)	% AVANCE	Trimestre
33	BAÑADEROS	Planta Electrica Cummins	Suministro de precalentadores para planta eléctrica, cambio de batería de arranque, cambio de cargador de batería	7,00%	Enero - Marzo
33	BAÑADEROS	Estudio de sistema puesta a tierra	Verificar que el sistema de puesta a tierra del ESTACIÓN BAÑADEROS cumpla con los valores estipulados en el reglamento de instalaciones eléctricas	7,00%	Enero - Marzo
33	BAÑADEROS	Sistema puesta a Tierra	Reposición de sistema puesta a tierra	21,00%	Julio - Septiembre
33	BAÑADEROS	Protección en TVSS y DPS	Instalación de TVSS Tipo A y DPS	7,00%	Julio - Septiembre
33	BAÑADEROS	Adecuaciones de MT (media tensión)	Mantenimiento de transformador, limpieza, tratamiento anticorrosivo y cambio de aceite	7,00%	Abril - Junio

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 23 de 103

		transformador			
38	CERRO TASAJERO	UPS DELTA 75KVA	Cambio de banco de baterías para UPS DELTA 75KVA	2,20%	Enero - Marzo
34	CERRO KENNEDY	Estudio de sistema puesta a tierra	Verificar que el sistema de puesta a tierra del ESTACIÓN CERRO KENNEDY cumpla con los valores estipulados en el reglamento de instalaciones eléctricas	11,00%	Enero - Marzo
34	CERRO KENNEDY	Transferencia automática	Cambio de ATS de transferencia y programación	11,00%	Enero - Marzo
34	CERRO KENNEDY	Planta FG WILSON	Escanner de planta para confirmar diagnóstico y actividades correctivas	5,50%	Enero - Marzo
27	EL CABLE	Planta Electrica Perkins	Tarjeta de control y sensor aceite planta	17,00%	Enero - Marzo
35	ELTIGRE	Estudio de sistema puesta a tierra	Verificar que el sistema de puesta a tierra del ESTACIÓN EL TIGRE cumpla con los valores estipulados en el reglamento de instalaciones eléctricas	11,00%	Abril - Junio
35	ELTIGRE	Reparación de planta cummins de 630 kVA	Reparación de planta y cambio de Batería Auto Mac Silver 8D1600MC (2) Cargador De Baterías 12v 24v Ip20 20 - 200 Ah Uyustools (1) Enfriador planta Perkins Transformador 380/220 VAC 1 KVA (1)	27,00%	Enero - Marzo
47	LAPITA	UPS SALICRU de 20 kVA - 48 Baterías 12V 35A	Cambio de banco de baterías para UPS SALICRU de 20 kVA - 48 Baterías 12V 35A	2,20%	Enero - Marzo
47	LAPITA	Planta Cumins 40 KVA	Revisión, diagnóstico y reparación de la planta eléctrica	45,00%	Abril - Junio
48	MARTINICA	UPS PEI 20 kVA	Cambio de banco de baterías UPS PEI U320 de 20kVA	2,20%	Enero - Marzo
22	MUNCHIQUE	Planta Electrica FG Wilson	Cambio de tarjeta de control, sensores y modernización de electrónica de planta perkins	21,00%	Abril - Junio
46	SANGIL	Planta Perkins de 58 kVA	Cambio de precalentador, baterías y cargador.	100,00%	Abril - Junio
Avance general con respecto a estrategia general (Sumatoria de avance ponderado / 9 estaciones)				33,79%	

Respecto a las metas de la estrategia ambiental de la resolución 040 (RESPEL), se consolidó un cumplimiento del 100% de los objetivos trazados para el ciclo de julio. Este resultado se fundamenta en la entrega de documentación de las dieciocho (18) estaciones programadas, asegurando la debida trazabilidad documental y el rigor normativo mediante la formalización de los soportes técnicos asociados a la disposición de residuos. Esta gestión permitió la disposición adecuada de 1499,2 kg de residuos peligrosos, garantizando la trazabilidad documental completa y un impacto ambiental positivo al reducir riesgos sanitarios en las estaciones intervenidas.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 24 de 103

SHORT CODE	ESTACIÓN PRIMARIA	GESTOR	FECHA CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RESPEL (Kg)
41	PLANADAS	PROSSAM	10/3/2026	23,54
42	MONTEZUMA	PROSSAM	10/2/2026	69,72
40	MIRADOR	ECORPIN	13/2/2026	73
45	MÁLAGA	SANDESOL	2/3/2026	12,8
12	LETICIA (****)	ORIGEN SAS	22/2/2026	46,6
44	LEBRIJA	SANDESOL	2/3/2026	53,9
47	LAPITA	BIO-RESIDUOS	27/1/2026	194,9
19	LA RUSIA	OILPC 520	29/1/2026	42
37	JURISDICCIONES	SANDESOL	2/3/2026	96,5
36	GALERAS (**)	VEOLIA	16/1/2026	190,4
31	GABINETE	ECORPIN	12/2/2026	57
21	ELRUIZ	PROSSAM	10/2/2026	36,84
32	CERRO NEIVA	ECORPIN	13/2/2026	72
34	CERRO KENNEDY	INTERASEO	18/2/2026	64
25	CALATRAVA	LITO	30/12/2025	310
TOTAL DE RESIDUOS ENTREGADOS A DISPOSICIÓN				1499.2

En conjunto, los resultados reflejan un alto nivel de cumplimiento de las metas establecidas en la Resolución 040, con avances concretos en disponibilidad del servicio, fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y gestión ambiental. Si bien persisten brechas en algunos indicadores (principalmente en estaciones secundarias), la tendencia general es positiva, con acciones en curso que permiten proyectar el cumplimiento pleno de los objetivos en los siguientes periodos.

Detalle de las actividades desarrolladas durante el primer semestre del año se encuentran en el **Anexo 3. Entregables Resolución 040 - julio 2026.**

4. DESARROLLO DE COMPONENTES

4.1. Componente técnico (Transmisión)

El Componente Técnico contempla la planeación, organización y ejecución de las actividades orientadas a garantizar la operación, confiabilidad y sostenibilidad de la red de estaciones de INRAVISIÓN a nivel nacional enfatizando en la intervención de los equipos de transmisión.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 25 de 103

Durante el mes de julio se completó la visita a 157 estaciones (5 de ellas correspondientes a estaciones pendientes del mes de julio) con el personal de mantenimiento asignado a los cuatro Centros Operativos en los que se ha dividido la red de INRAVISIÓN. En total, se realiza ruta de mantenimiento con diez (10) ingenieros de mantenimiento y cuatro (4) Jefes de Zona, responsables de la atención de las 335 estaciones que conforman la red (no se cuentan las cabeceras regionales).

4.1.1. Visitas de mantenimiento preventivo de equipos de transmisión


La ejecución de estas visitas se alineó con la planificación técnica aprobada por INRAVISIÓN y la interventoría para un universo de 159 estaciones (154 del ciclo de julio y 5 remanentes de julio). Al cierre del periodo, se consolidó la atención de 157 estaciones, de las cuales 153 corresponden al plan preventivo del mes de julio y 4 a la ejecución de estaciones pendientes del ciclo anterior. Este balance arroja un cumplimiento operativo del 98,74%, registrando una desviación del 1,26% asociada a la imposibilidad de acceso a dos estaciones: la Estación 110 - Lengupá, por afectaciones en la vía de ingreso, y la Estación 327 - López de Micay, debido a restricciones en la disponibilidad de transporte aéreo y riesgos de orden público que inhabilitan la ruta fluvial. Lo anterior deja un saldo de dos unidades pendientes por intervenir respecto al cronograma establecido.

Las estaciones visitadas en el mes de julio están alineadas al cronograma en **Anexo 4. Cronograma Visitas Julio**. Es importante resaltar que en cada visita se ejecutaron las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo, conforme a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato.

Durante este mes de julio se recuperaron varios servicios en diferentes estaciones, los cuales se detallan en el archivo denominado **Anexo 5. Servicios Recuperados Estaciones julio 2026**.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 26 de 103

ESTACIONES VISITADAS VS ESTACIONES ESTIMADAS

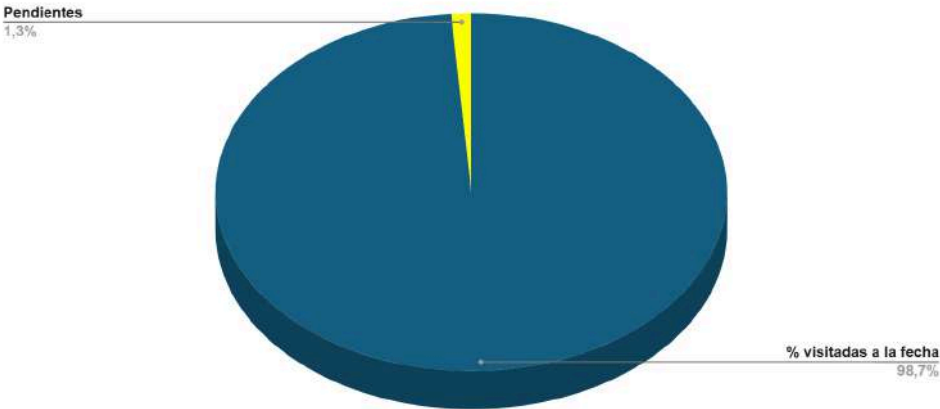

4.1.2. Mantenimientos correctivos del componente técnico (Transmisión)

Como parte de la gestión del componente técnico, se llevaron a cabo trece (13) mantenimientos correctivos sobre la infraestructura de transmisión y recepción en el mes de referencia. Estas actividades fueron ejecutadas sobre estaciones primarias TDT, en la que se restablecieron los servicios de TDT INRAVISIÓN y regionales.

Las visitas preventivas sobre elementos, equipos y ajustes que inciden directamente en la disponibilidad del sistema de radiodifusión. La intervención permitió restituir la operación, corregir fallas identificadas en campo y estabilizar condiciones técnicas en los sitios intervenidos, reafirmando la capacidad de respuesta operacional y la efectividad del esquema táctico para la recuperación del servicio.

Las estaciones intervenidas son las siguientes:

Short Code	Estación	Fecha	Ticket	OT	Observaciones
50	VERSALLES	4/7/2026	2965	1753	Falla en TxS TDT - Falla sistema refrigeración
97	SARAVENA	10/7/2026	3005	1778	Falla en Radio Nacional
94	ARAUCA	14/7/2026	3086	1820	Falla en señales TDT

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 27 de 103

60	CAÑAS GORDAS	15/7/2026	3362	1981	Falla en Recepción Satelital
76	LA CEJA	18/7/2026	3375	1987	Falla en señal TDT
130	SAN VICENTE	19/7/2026	3146	1986	Falla en Radio Nacional - SSRR
235	EL NUDO	23/7/2026	3201	1861	Falla en acometida eléctrica y transferencia
16	ITAGÜÍ	24/7/2026	3265	1889	Falla señal TDT TELEANTIOQUIA
16	ITAGÜÍ	27/7/2026	3266	1893	Falla señal TDT INRAVISIÓN
252	SANTIAGO PEREZ	28/7/2026	3374	1985	Falla en la Radio Nacional
319	SAN AGUSTIN - 02	29/7/2026	3363	1982	Falla señales TDT
132	YOPAL	30/7/2026	3349	1971	Falla señales TDT
17	PADRE AMAYA	31/7/2026	3352	1973	Falla señal TDT INRAVISIÓN

Adicionalmente se realizan visitas de acompañamiento a 4 estaciones por solicitud de la ANE.

Short code	ESTACIÓN	Fecha de ejecución	Observación y /o detalle
045	MÁLAGA	02/07/2026	Acompañamiento visitas ANE
039	CERRO ORIENTE	7/07/2026	Acompañamiento visitas ANE
015	CERRO AZUL	17/07/2026	Acompañamiento visitas ANE
014	CHIGORODÓ	24/07/2026	Acompañamiento visitas ANE


4.1.3. Mesa de ayuda

Las actividades atendidas por la mesa de ayuda durante el mes de julio se listan a continuación:

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 28 de 103

- Revisión y consolidación de las bitácoras diarias en los formatos correspondientes remitidas por los 90 Operadores divididos en dos turnos que atienden las treinta y nueve (39) Estaciones Primarias más las seis (6) estaciones AM actualmente operativas.
- Revisión y consolidación de los Reportes de Mantenimiento correspondientes a las visitas programadas y ejecutadas por los Ingenieros de campo durante el mes.
- Entrega y consolidación de toda la información requerida para el informe mensual de indicadores que se entrega a INRAVISIÓN.
- Atención y respuesta de 52 PQRSD en la medida en que han sido entregados por parte de RTVC, dando un saldo del 98.07 % de los casos gestionados y 1.93 % en gestión.
- Recibir, organizar y clasificar documentos de acuerdo con los requerimientos particulares por parte de INRAVISIÓN, tales como las bitácoras diarias y los reportes de mantenimientos preventivos, los cuales son cargados al Sistema de Información
- Verificar que la documentación diligenciada cumpla con los requisitos contractuales.

En la ejecución de estas actividades de atención de PQRSD, en la gráfica a continuación se pueden apreciar los indicadores correspondientes al mes de julio, el detalle de estos indicadores se encuentran en el sistema de información SIGMA (**Módulo de PQRSD**) y en el **Anexo 6. Control PQRSD Julio 2026**.

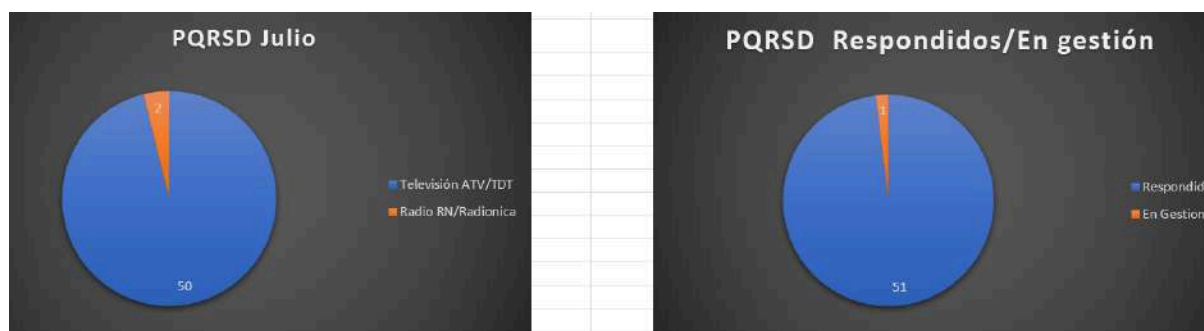

4.2. Componente eléctrico

El Componente Eléctrico tiene dos frentes en desarrollo simultáneo; uno es el mantenimiento preventivo que se caracteriza por la planeación, organización de rutas y ejecución de las rutinas propias del mantenimiento preventivo para los

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 29 de 103

grupos electrógenos, UPS y equipos de aire acondicionado. El segundo frente obedece a la atención de mantenimientos correctivos los cuales se planean y ejecutan en aras de restablecer el servicio de cualquiera de los equipos del componente eléctrico, esto es de plantas eléctricas, UPS, tableros eléctricos, transferencias, equipos de aire acondicionado, subestaciones y/o transformadores y la estructura de media tensión que alimenta la estación.

Estas actividades están orientadas a mejorar la confiabilidad, garantizar la operación y sostenibilidad de la red de transmisores e infraestructura de INRAVISIÓN a nivel nacional.

4.2.1. Mantenimientos preventivos y correctivos

Dando continuidad al plan de estrategia para la atención integral de la infraestructura eléctrica de la red de INRAVISIÓN, se complementa con el plan de trabajo en el que se plantea el cambio de banco de baterías y atención de novedades por medio de los correctivos, principalmente en las estaciones de TDT.

En paralelo se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica en aires acondicionados, UPS y plantas eléctricas en cuanto cumplen alguno de los dos parámetros establecidos en el cambio de fungibles (Funcionamiento durante 250 horas o seis meses después del último mantenimiento preventivo).

Durante julio de 2026 se ejecutaron **setenta y ocho (78) intervenciones** en la Red de Radiodifusión de INRAVISIÓN (tres (3) intervenciones preventivas y setenta y cinco (75) intervenciones correctivas).

INTERVENCIONES PREVENTIVAS

Durante el mes de julio de 2026 se ejecutaron tres (3) intervenciones especializadas de mantenimiento preventivo. A continuación se presenta el detalle de cada una de las actividades mantenimiento preventivo:

No.	Ticket	OT	Tipo actividad	Short code	Estación	Descripción
-----	--------	----	----------------	------------	----------	-------------

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 30 de 103

1	2501	1505	Preventivo	4	LA ENEA	Visita diagnóstica de SPT
2	3138	1848	Preventivo	26	BOQUERÓN	Revisión diagnóstica de las PE's y tableros de transferencia
3	3237	1874	Preventivo	154	PUERTO ESCONDIDO	Diagnóstico especializado de sistema de aire acondicionado.

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

A continuación se presenta el consolidado de las intervenciones correctivas ejecutadas por el Componente de Energía de la Red de Radiodifusión de INRAVISIÓN durante el mes de julio de 2026. En total se realizaron setenta y cinco (75) intervenciones correctivas, con una cobertura geográfica que abarca regiones estratégicas de la red nacional de radiodifusión pública. Estas actividades estuvieron orientadas a restablecer condiciones operativas, corregir fallas detectadas en la infraestructura eléctrica y energética, y garantizar la continuidad de los servicios de radiodifusión en los diferentes sitios intervenidos.

Las acciones ejecutadas incluyen mantenimiento y reparación de plantas eléctricas, sistemas de transferencia automática, sistemas de respaldo energético, bancos de baterías, sistemas de puesta a tierra, sistemas de protección contra sobretensiones (DPS), tableros eléctricos, sistemas de iluminación, equipos de aire acondicionado y componentes electromecánicos asociados a la operación de las estaciones. Asimismo, se realizaron actividades de suministro e instalación de repuestos, cambio de componentes críticos, atención de emergencias operativas y recuperación de infraestructura afectada por eventos externos, contribuyendo a mantener la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas que soportan la prestación del servicio.

No.	Ticket	OT	Short code	ESTACIÓN	Observación y /o detalle
1	2493	1853	20	SABOYA	suministro y cambio de correa a planta perkins
2	2974	1774	230	LA HORMIGA	instalación de fusibles en media tensión

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA			Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026			Versión: No. 01
				Emisión: 06/09/2025
				Página 31 de 103

3	3101	1832	174	QUININI	revisión y desmontaje de aspa de motor aem para traslado a bogotá y mandar a fabricar
4	2223	1421	36	GALERAS	revisión diagnóstica de la planta eléctrica perkins de 350 kva, suministro y cambio de precalentador, desmonte de cárter y medición de cigüeñal
5	3093	1828	44	LEBRIJA	mantenimiento de planta eléctrica
6	804	1031	33	BAÑADEROS	mtto correctivo para equipotencializar todo el spt, dejando medidas bajo recomendación de los estándares por la normativa
7	2412	1555	33	BAÑADEROS	suministro e instalación de dps
8	3108	1847	33	BAÑADEROS	suministro e instalacion de motobomba
9	3095	1829	33	BAÑADEROS	mantenimiento de planta eléctrica
10	3096	1830	282	ESTUDIO BOJAYÁ	mantenimiento de planta eléctrica
11	2419	1419	44	LEBRIJA	atención de emergencia, en transformador de potencia
12	2602	1533	186	ALGECIRAS	mantenimiento de aires acondicionados
13	2041	1414	321	AMBALEMA	mantenimiento de planta eléctrica
14	3112	1846	152	ISTMINA	atención de emergencia
15	2183	2010	13	BELLO	reapriete y limpieza de conexiones en la celda de media tensión
16	2184	2011	20	SABOYA	corrección de puntos calientes por termografía y reapriete de conexiones en el tablero de distribución
17	2185	2012	23	ALGUACIL	corrección del sistema de puesta a tierra de la subestación de media tensión
18	2186	2013	24	MONTERÍA	reapriete general y ajuste de las protecciones del tablero de transferencia
19	2187	2014	26	BOQUERÓN	limpieza y ajuste del seccionador y los aisladores de media tensión
20	2188	2015	28	TIBITOC	reorganización, marcación y reapriete de conexiones del tablero de distribución
21	2189	2016	31	GABINETE	corrección de conexiones flojas y ajuste de las protecciones del tablero general
22	2191	2017	32	CERRO NEIVA	corrección de puntos calientes por termografía y reapriete de bornes en la celda de media tensión
23	2194	2018	35	ELTIGRE	reapriete de conexiones y verificación de la protección del transformador de media tensión
24	3100	1831	23	ALGUACIL	normalizacion atencion emergencia
25	2195	2019	36	GALERAS (**)	reapriete y limpieza de conexiones del tablero de servicios auxiliares
26	2196	2020	37	JURISDICCION ES	corrección de conexiones y ajuste del tablero del sistema de transferencia automática (ats)
27	2197	2021	39	CERRO ORIENTE	corrección de la puesta a tierra de la subestación de media tensión

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 32 de 103

28	2199	2022	41	PLANADAS	reapriete de conexiones en el seccionador tripolar de media tensión
29	2200	2023	42	MONTEZUMA	reorganización del cableado y corrección de la canalización del tablero de distribución
30	3381	1991	15	CERRO AZUL	reparación de los componentes de la planta en laboratorio especializado: bomba de inyección bosch, inyectores, bomba de transferencia, bomba de agua, radiador e intercooler, quedando corregido el daño
31	3380	1992	15	CERRO AZUL	Se hace servicio especializado en laboratorio (mantenimiento correctivo y preventivo, transporte de componentes a laboratorio y sitio): desarme, calibración y sincronización del motor, montaje, cambio de aceite y filtros, limpieza y pruebas funcionales.
32	2872	1687	8	CAN	suministro filtro de aceite
33	2201	2024	45	MÁLAGA	reapriete general de conexiones del tablero de distribución principal
34	2202	2025	50	VERSALLES	corrección de puntos calientes y ajuste de los barrajes del tablero principal
35	2203	2026	15	CERRO AZUL	limpieza de la celda de media tensión y verificación de distancias de seguridad
36	2978	2027	27	EL CABLE	reapriete de bornes en el lado de media tensión del transformador
37	2979	2028	40	MIRADOR	corrección del sistema de puesta a tierra del anillo de media tensión
38	2980	2029	16	ITAGÜÍ	reapriete general y corrección de la marcación del tablero de distribución
39	2981	2030	12	LETICIA	reapriete de barrajes y bornes, limpieza y termografía del tablero de rectificación/dc y verificación de breakers
40	2982	2031	14	CHIGORODÓ	reapriete y limpieza de conexiones en barrajes (fase-neutro-tierra), termografía de terminales y verificación de puesta a tierra del tablero de distribución
41	2983	2032	17	PADRE AMAYA	reapriete y limpieza de conexiones en la acometida aérea de mt (bornes del transformador y cortacircuitos), verificación de aisladores/crucetas y corrección de la puesta a tierra
42	2984	2033	19	LA RUSIA	reapriete y limpieza de conexiones del tablero de transferencia (barrajes y terminales), termografía y verificación de puesta a tierra
43	2985	2034	21	ELRUIZ	reapriete de barrajes y bornes, limpieza, termografía y medición de parámetros en el tablero de transferencia y el general de distribución (380 v)

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 33 de 103

44	2986	2035	22	MUNCHIQUE	limpieza de aisladores y bujes, reapriete de conexiones del lado de mt del transformador, termografía de la acometida y verificación de la puesta a tierra
45	3190	1859	24	MONTERÍA	suministro e instalacion de iluminacion perimetral y caseta
46	2988	2036	25	CALATRAVA	reapriete de conexiones y barrajes, limpieza, termografía y medición de corriente por fases (r-s-t-n) en los tableros de distribución
47	2989	2037	29	MANJUI	reapriete de bornes y barrajes, limpieza de portafusibles/seccionadores, termografía y medición de tensión por fases
48	2990	2038	30	BUENAVISTA	reapriete de bornes del totalizador y barrajes, limpieza y termografía, con medición de corrientes por fase y verificación de puesta a tierra
49	2992	2039	33	BAÑADEROS	reapriete y limpieza de conexiones en totalizador, mini-breakers y barrajes del tablero de distribución y del banco de condensadores, con termografía y medición
50	2994	2040	34	CERRO KENNEDY	reapriete y limpieza de conexiones de la acometida/poste de mt (aisladores y seccionadores) y verificación de tensiones
51	2995	2041	38	CERRO TASAJERO	limpieza, reapriete de bornes y termografía del tablero de transferencia (ats) contiguo a la planta, con verificación de conexiones y puesta a tierra
52	3092	1827	289	ESTUDIO VILLAVICENCIO	mantenimiento de aires acondicionados
53	2996	2042	44	LEBRIJA	reapriete y limpieza de conexiones del tablero de distribución/transferencia, termografía y medición de corrientes por fase con verificación del analizador de redes
54	2997	2043	46	SANGIL	reapriete y torque de conexiones en barrajes y bornes de breakers, limpieza, termografía y medición de tensión/corriente en el tablero de distribución
55	2998	2044	47	LAPITA	reapriete de bornes del breaker totalizador y barraje, limpieza, termografía y medición de tensión/corriente en el tablero de distribución
56	820 821	1641	31	GABINETE	correctivo a planta perkins y planta cummins
57	2999	2045	48	MARTINICA	reapriete de conexiones en breakers/contactores y barrajes, limpieza, ajuste y termografía de los tableros de control/distribución, con verificación de marcación
58	3001	2046	49	AZALEA	reapriete de bornes del interruptor trifásico y barrajes, limpieza, termografía y medición de tensión en el tablero general

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA			Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026			Versión: No. 01
				Emisión: 06/09/2025
				Página 34 de 103

59	3102	1833	295	ESTUDIO BUCARAMANGA	cotización para mantenimiento de aires acondicionados e instalación de luminarias led.
60	3104	1913	38	CERRO TASAJERO	mantenimiento de planta eléctrica y aire acondicionado
61	1814	1877	132	YOPAL	mantenimiento en media tensión, suministro e instalación de pararrayos y cortacircuitos
62	3236	1873	4	LA ENEA	suministro e instalación de batería de 1500 12v para planta eléctrica
63	2935	1737	1	MARINILLA	adecuación y mantenimiento eléctrico
64	2968	1872	33	BAÑADEROS	mantenimiento de planta eléctrica y suministro de dos correas b-47.
65	3103	1834	186	ALGECIRAS	suministro e instalación de banco de baterías
66	3107	1845	50	VERSALLES	suministro e instalación de precalentador para planta eléctrica
67	3244	1879	38	CERRO TASAJERO	correctivos adicionales cummins
68	3105	1844	23	ALGUACIL	suministro fusible hh 40a zigua 24kv
69	3245	1880	38	CERRO TASAJERO	mantenimiento correctivo de planta cummins
70	1488	1128	157	CRUZ VERDE	cambio de baterías ups eaton 75 kva
71	1872	1422	157	CRUZ VERDE	mantenimiento preventivo de la planta eléctrica, con el suministro y cambio de filtración y aceite
72	2413	1423	157	CRUZ VERDE	suministro de tv ,rosetas, bombillos y tomacorrientes.
73	3240	1876	191	PITALITO	mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la estación
74	3243	1878	28	TIBITOC	spt, revisión de transferencia, plantas, suministro e instalación de contactor
75	3384	1990	2	SABANAGRANDE	normalización de punto de conexión de la estación

Las actividades correctivas se encuentran relacionadas en el **Anexo 8. Resumen de actividades Julio energía** y los soportes de las actividades del mes de Julio en el **Anexo 7. Soportes actividades Energía Julio**.

4.3. CAN

4.3.1. Actividades Ejecutadas

Durante Julio de 2026, se llevaron a cabo 80 actividades para la estación CAN, con la siguiente distribución:

Tipo de mantenimiento:

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 35 de 103

Mantenimientos Preventivos	40
Mantenimientos Correctivos	29
Operación	11

Áreas en mantenimiento:

Energía	31
Aires Acondicionados	21
Producción y Post	4
Emisión	3
Gestión Señales	9
Radio	8
civil	3
Gestión Administrativa	1


Las actividades se encuentran relacionadas al cronograma aprobado de julio 2026 referenciado en el **Anexo 9. Cronograma julio CAN**. A continuación se relacionan algunas de las actividades más relevantes dentro del periodo. El detalle de las actividades se puede evidenciar en el **Anexo 10. Soportes actividades CAN Julio 2026**.

A continuación se relacionan algunas actividades ejecutadas durante el periodo:

SUMINISTRO HERRAMIENTA E INSUMOS GESTIÓN SEÑALES

Se realiza el suministro de herramientas e insumos para el área de gestión de señales como: Herramienta de mano, Hidrolavadora. Insumos para mantenimientos, Elementos de seguridad, entre otros. De igual forma está pendiente el suministro de un cable y conectores de video

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 36 de 103

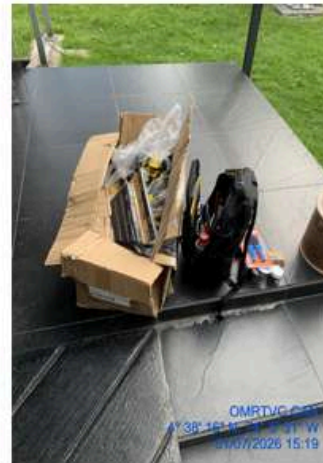

SUMINISTRO LNBs e INTERCOMs



Se realiza la entrega de los siguientes elementos al Ingeniero Yamal Salinas. los cuales son destinados para el área de gestión de señales y TV: 12 LNBs marca NORSAT PLL Banda C REF. 3220RF -3200F-BFP-1 3200F-BPF-4. 3 INTERCOMUNICADORES marca HOLLYLAND Full Duplex 1.9 GHz REF. SOLIDCOM C1



LIMPIEZA VENTANAS FACHADA SEÑAL MEMORIA

Se realiza acompañamiento a personal contratista el fin de semana en la limpieza tanto interna como externa de las ventanas del área de señal memoria, las cuales están conformadas por 45 vidrios de 1,20 x1,70 mts. debido a la suciedad presentada por el excremento de las palomas. La actividad fue realizada con elementos y herramienta especializada, teniendo en cuenta que las ventanas están cubiertas con una película de seguridad publicitaria. La actividad se llevó a cabo sin ninguna novedad. Pendiente informe final por parte del contratista.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 37 de 103

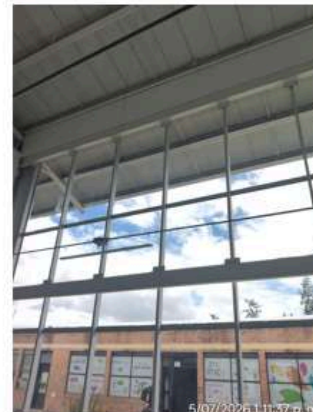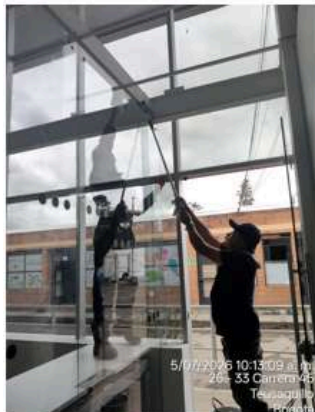

ADECUACIÓN ELÉCTRICA OFICINA JURÍDICA

Se realizó la instalación de dos (2) tomacorrientes eléctricos en el área Jurídica, correspondientes a un (1) tomacorriente de red normal y un (1) tomacorriente de red regulada. La intervención incluyó la conexión de ambos puntos a los circuitos eléctricos existentes, garantizando la correcta identificación y separación de las redes normal y regulada, conforme a la distribución eléctrica del área.

Finalizada la instalación, se efectuó la medición de parámetros eléctricos y las pruebas de funcionamiento correspondientes, verificando presencia de tensión, correcta polaridad, continuidad de conductores y adecuada operación de los tomacorrientes. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, confirmando el correcto funcionamiento de los puntos instalados.



MANTENIMIENTO Y SOPORTE N° 3 SISTEMA CALREC RADIO

Se realizó el acompañamiento técnico y apoyo al personal de VCR durante el proceso de cambio de la tarjeta **MAIN I/O #2** del sistema **Calrec** instalado en el **Master Central**, como parte de la ventana de mantenimiento programada el pasado 11 de julio.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 38 de 103

Durante la ejecución de la actividad se brindó soporte al personal encargado, verificando el correcto desarrollo del procedimiento y validando la operación del sistema posterior al cambio del componente. No se presentaron novedades ni fallas durante la intervención, manteniéndose la operación normal del sistema de emisión de Radio Nacional.

De igual forma se efectuó mantenimiento preventivo y correctivo sobre los módulos Fader del entorno Calrec 2, ubicados en las cabinas de periodistas 4 y 5, efectuando labores de limpieza y verificación de funcionamiento. Posterior a la intervención, los módulos quedaron operativos y funcionando correctamente dentro de la operación habitual del sistema.



CAMBIO FILTRO REFRIGERANTE PLANTA VERDE

Se realizó el reemplazo del filtro de líquido refrigerante ref. AW2127SP de la planta eléctrica principal (verde) marca Cummins, de igual forma se realiza recarga de líquido refrigerante con aproximadamente 1 galón que se tenía de backup en la estación. La actividad se llevó a cabo sin ninguna novedad.





ALARMA EN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EMISIÓN

El presente mes se presentó una alarma en el sistema de automatización, la cual hace referencia a una falla de comunicación y sincronización del servidor principal generando una pérdida temporal de la base de datos del sistema, así como una falla de comunicación, la


	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 39 de 103

base de datos se recupera de manera autónoma después de unos minutos. Se contacta al representante de la marca y se le solicita entregar una propuesta de soporte con proyección 31 de diciembre, la cotización es enviada y se encuentra en evaluación por parte de la dirección del proyecto.

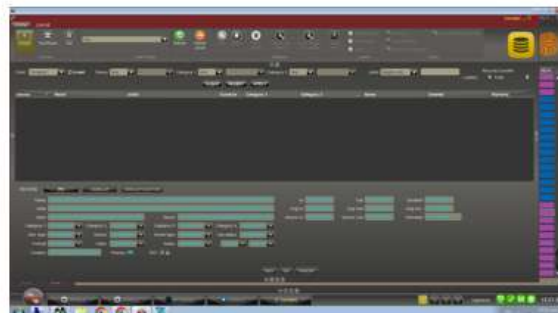

CORRECTIVO MANEJADORA 1 AA 10 TR SEÑAL MEMORIA

Se realiza acompañamiento a personal contratista para el reemplazo del Damper y poleas correspondientes a la manejadora de aire #1 del área de señal memoria, los cuales se evidenció fallo en su operación.

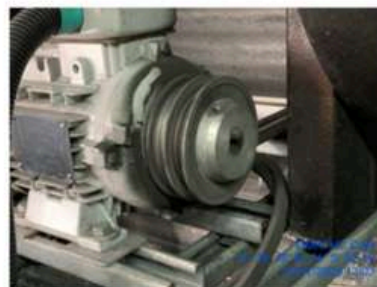


ORGANIZACIÓN CABLEADO MC3

Se inician labores de organización del cableado en el Master Central #3. De acuerdo al requerimiento por parte de la visita del ministerio de trabajo. Se realizó la organización del cableado que actualmente no se encuentra en uso y que permanece dispuesto sobre la parrilla tipo Cablofil.


Como resultado de la intervención, queda pendiente la organización del cableado correspondiente a los puestos de trabajo. Se recomienda que esta actividad sea ejecutada por el personal de soporte de producción, con el apoyo del OM, teniendo en cuenta la criticidad de las señales que llegan a dichos equipos, así como el procesamiento asociado a

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 40 de 103

las mismas. Esta recomendación tiene como finalidad minimizar el riesgo de afectación a la operación y garantizar la correcta identificación, manipulación y reconexión de los circuitos involucrados.

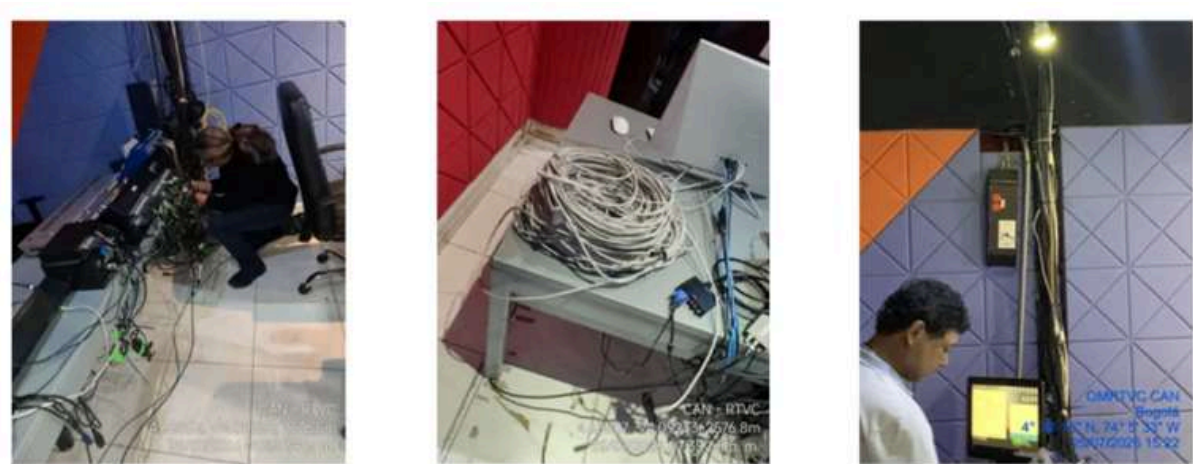

Estado Ejecución Tickets

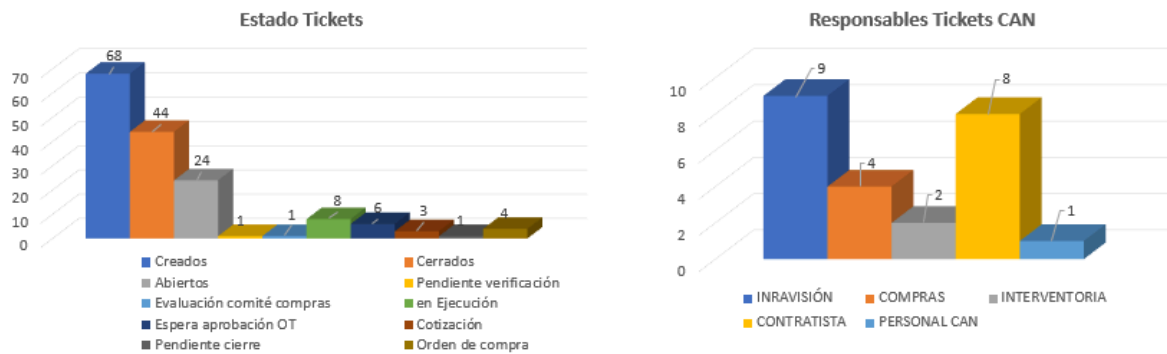


4.4. Componente civil.

Durante el mes de julio del 2026 el componente civil atendió los requerimientos urgentes y de mayor afectación a la infraestructura de las estaciones, salvaguardando la operación como tal y la estabilidad de los equipos y personal; Cabe anotar que hay actividades que por su alcance y presupuesto necesariamente requieren afectación de la bolsa y por ende requiere de la autorización previa tanto

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 41 de 103


de la interventoría como de la entidad. Abrimos el mes con trece (13) obras en ejecución correspondientes a novedades reportadas en las estaciones y a intervenciones presentadas al principio del año y sobre las cuales tanto la interventoría como la entidad priorizaron su aprobación con base al cumplimiento a satisfacción de los soportes presentados; A continuación de se relacionan las obras iniciadas y sobre las cuales se realiza el seguimiento durante el mes.

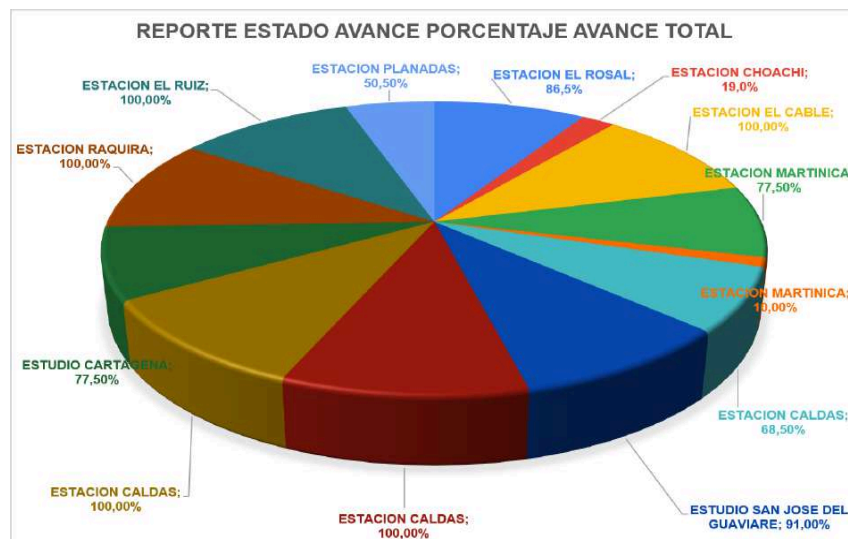

SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENCION COMPONENTE CIVIL						
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DEL 2026						
CODIGO ESTACION	NOMBRE DE LA ESTACION	REPORTE ESTADO AVANCE				OBSERVACIONES
		APROBACION DE RECURSOS 5%	CONTRATACION 5%	EJECUCION OBRA 90%	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	
26	ESTACION BOQUERON	100%	100%	100%	100,0%	Reparación y reforzamiento puerta cuarto de maquinas, portón planta y portón ppal. cerramiento.
79	ESTACION NECOCLI	100%	100%	15%	23,50%	Reparación integral deterioro y daño localizado en el piso del shelter (cuarto de equipos).
33	ESTACION BAÑADEROS	100%	100%	100%	100,0%	Construcción baño vivienda inexistente.
5	ESTACION EL ROSAL	100%	100%	0%	10,0%	Concepto especialista estructural sobre daño losa.
158	ESTACION CHOACHI	100%	100%	0%	10,0%	Reparación integral cubierta y torre riendada por caída de árbol.
27	ESTACION EL CABLE	100%	100%	15%	23,50%	Reposición integral de cubierta inclinada.
38	ESTACION CERRO TAJAJERO	100%	100%	100%	100,00%	Mantenimiento correctivo impermeabilización de tanque almacenamiento agua potable.
38	ESTACION CERRO TAJAJERO	100%	100%	100%	100,00%	Reposición integral de 8 ventanas metálicas por aluminio.
286	ESTUDIO ALGESIRAS	100%	100%	100%	100,00%	Suministro e instalación puerta cuarto de equipos. - Suministro e instalación timbre luminoso. - Suministro e instalación visor ojo de pescado.
49	ESTACION AZALEA	100%	100%	100%	100,00%	Mantenimiento integral de puertas incluye cerrajería. Corrección integral de filtraciones por cubierta, incluye la reposición integral de las tejas deterioradas. Mito tanque ACPM y pintura dique.
48	ESTACION MARTINICA	100%	100%	10%	19,00%	Reparación integral de filtraciones por cubierta
59	ESTACION CALDAS	100%	100%	10%	19,00%	Reparación integral de filtraciones por cubierta
23	ESTACION ALGUACIL	100%	100%	100%	100,00%	Reparación integral de cubierta por evento climático.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 42 de 103

En el transcurso del mes se terminaron algunas de las obras iniciadas, se continuaron otras y se iniciaron nuevas, para cerrar el mes con trece (13) obras activas relacionadas a continuación, en donde cinco (05) de ellas se terminaron y ocho (08) que dieron inicio.

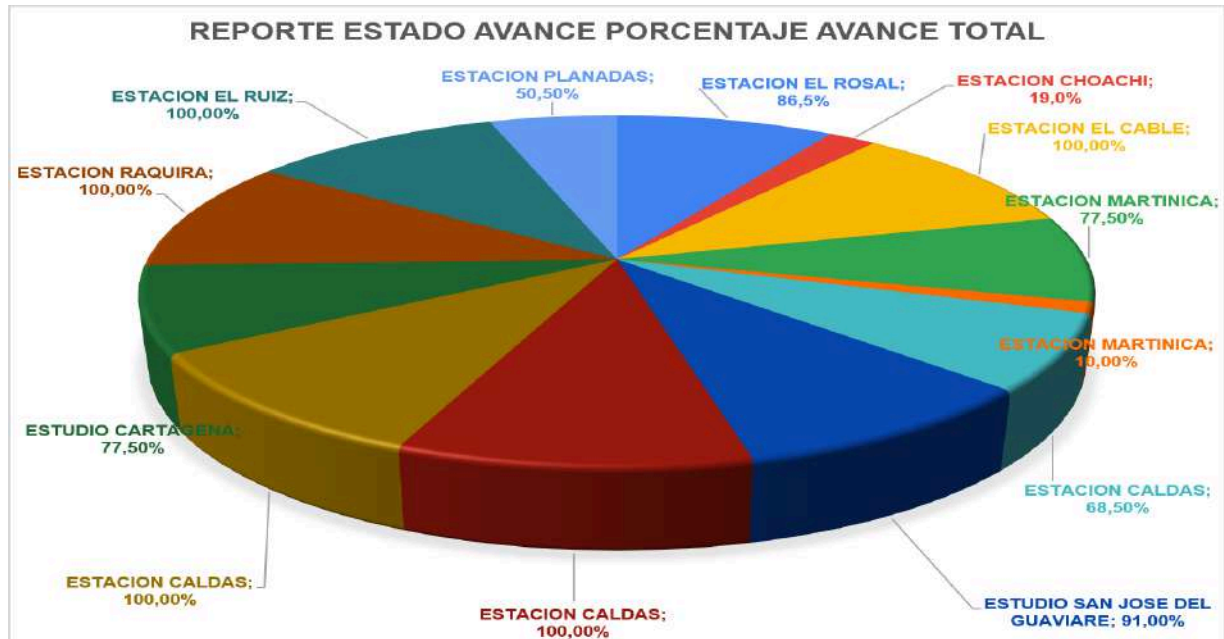

SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERVENCION COMPONENTE CIVIL						
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DEL 2026						
CODIGO ESTACION	NOMBRE DE LA ESTACION	REPORTE ESTADO AVANCE				OBSERVACIONES
		APROBACION DE RECURSOS 5%	CONTRATACION 5%	EJECUCION OBRA 90%	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	
26	ESTACION BOQUERON	100%	100%	100%	100,0%	Reparación y reforzamiento puerta cuarto de maquinas, portón planta y portón ppal. cerramiento.
79	ESTACION NECOCLI	100%	100%	15%	23,50%	Reparación integral deterioro y daño localizado en el piso del shelter (cuarto de equipos).
33	ESTACION BAÑADEROS	100%	100%	100%	100,0%	Construcción baño vivienda inexistente.
5	ESTACION EL ROSAL	100%	100%	0%	10,0%	Concepto especialista estructural sobre daño losa.
158	ESTACION CHOACHI	100%	100%	0%	10,0%	Reparación integral cubierta y torre riendada por caída de árbol.
27	ESTACION EL CABLE	100%	100%	15%	23,50%	Reposición integral de cubierta inclinada.
38	ESTACION CERRO TASAJERO	100%	100%	100%	100,00%	Mantenimiento correctivo impermeabilización de tanque almacenamiento agua potable.
36	ESTACION CERRO TASAJERO	100%	100%	100%	100,00%	Reposición integral de 8 ventanas metálicas por aluminio.
286	ESTUDIO ALGESIRAS	100%	100%	100%	100,00%	Suministro e instalación puerta cuarto de equipos. - Suministro e instalación timbre luminoso. - Suministro e instalación visor ojo de pescado.
49	ESTACION AZALEA	100%	100%	100%	100,00%	Mantenimiento integral de puertas incluye cerrajería. Corrección integral de filtraciones por cubierta, incluye la reposición integral de las tejas deterioradas. Mto tanque ACPM y pintura dique.
48	ESTACION MARTINICA	100%	100%	10%	19,00%	Reparación integral de filtraciones por cubierta
59	ESTACION CALDAS	100%	100%	10%	19,00%	Reparación integral de filtraciones por cubierta
23	ESTACION ALGUACIL	100%	100%	100%	100,00%	Reparación integral de cubierta por evento climático.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 43 de 103

- ESTACIÓN EL CABLE - REPOSICIÓN INTEGRAL DE CUBIERTA INCLINADA 100% TERMINADA.



- ESTACIÓN MARTINICA - CORRECCIÓN FILTRACIONES POR CUBIERTA Y MUROS AFECTADOS 77,5% EJECUCIÓN.



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 44 de 103



- ESTACIÓN CALDAS - CUBIERTAS, MUROS Y EXTERIORES 68.5% EJECUCIÓN.




	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 45 de 103



- ESTACIÓN RÁQUIRA - SEGURIDAD PERIMETRAL 100% TERMINADA.



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 46 de 103

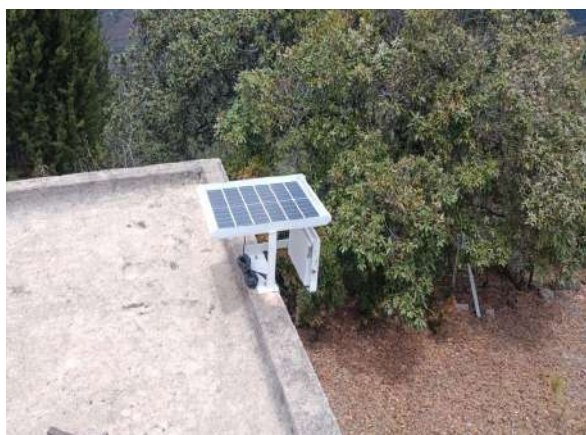

- ESTACIÓN EL RUIZ - MASTIL TORRE 100% TERMINADA.



 CONSORCIO OM-2025	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 47 de 103



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 48 de 103



- ESTACIÓN AMBALEMA - CUARTO RESPEL.



- ESTACIÓN AZALEA - ALUMBRADO EXTERIOR.



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 50 de 103

- ESTACIÓN LA ENEA - FILTRO FRANCÉS.



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 51 de 103

- ESTACIÓN ITAGÜÍ - FILTRACIONES LATERALES.



Finalmente el mes de julio cierra con la terminación de la mayoría de las intervenciones programadas e iniciando otras nuevas, al inicio del mes, el alcance de algunas situaciones superó el concepto de obra menor, por lo que su intervención y presupuesto de inversión se encuentra en proceso de aprobación.

Paralelamente y coordinada la entrega de soportes presupuestales a la interventoría de las intervenciones pre-aprobadas, el componente avanzó en la elaboración de los informes técnicos solicitados para cada presupuesto entregado, en el proceso se inició la coordinación de mesas de trabajo y la entrega de los APU de las actividades más representativos y de mayor peso dentro de cada presupuesto, la información se está entregando en la medida en que se va completando el proceso sobre cada presupuesto durante todo el mes en la plataforma sigma hasta abordar tanto los requerimientos de cada estación como los 12 proyectos pre aprobados a realizar, cabe anotar que de estos doce (12) proyectos pre aprobados, seis (06) cierran el mes aprobados y con el siguiente porcentaje de ejecución:

- Estudio especializado sobre la estación EL ROSAL - 86.5%.
- Reposición integral de la cubierta de la estación EL CABLE - 100%.
- Reparación y estabilización de la torre riendada y cubierta de la edificación de la estación CHOACHÍ, afectadas por la caída de un individuo arbóreo - 19%.
- Reparación filtraciones por cubierta estación CHAMEZA 1 - 100%.
- Reparación filtraciones por cubierta estación CHAMEZA 2 - 100%.
- Reparación filtraciones por cubierta estación NUNCHIA - 100%.

En el transcurso del mes de julio de 2026, se dio continuidad a las actividades de monitoreo sistemático y control de tiquetes y requerimientos operativos, bajo una

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 52 de 103

dinámica de gestión rotativa orientada a optimizar la eficiencia operativa del componente. Los esfuerzos se centraron en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta para la reducción de servicios pendientes y la depuración integral de los casos atendidos y terminados. Con el fin de garantizar la trazabilidad institucional, se presenta un análisis comparativo entre el cierre del periodo inmediatamente anterior y el estado actual al finalizar el presente mes, como se detalla a continuación:

JUNIO 30 DEL 2026


40	34,19%	Finalizados
13	11,11%	En ejecución - intervención técnica
45	38,46%	Validación presupuestal
15	12,82%	Cierre - legalización administrativa
4	3,42%	Pendiente - inicio de gestión
117	100,00%	

JULIO 31 DEL 2026

53	31,36%	Finalizados
10	5,92%	En ejecución - intervención técnica
55	32,54%	Validación presupuestal
48	28,40%	Cierre - legalización administrativa
3	1,78%	Pendiente - inicio de gestión
169	100,00%	

Bajo esta dinámica, el periodo finaliza con un total de ciento sesenta y nueve (169) requerimientos activos, de los cuales cincuenta y cinco (55) se encuentran en fase de validación presupuestal, tres (03) aguardan inicio de gestión, diez (10) están en proceso de intervención técnica y cuarenta y ocho (48) se hallan en etapa de legalización administrativa. Así mismo, se reportan cincuenta y tres (53) actividades finalizadas satisfactoriamente, lo que refleja una gestión operativa ágil y una capacidad de respuesta optimizada para el tratamiento de hallazgos en plazos reducidos, favoreciendo la estabilidad y sostenibilidad de la red nacional.


	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 53 de 103

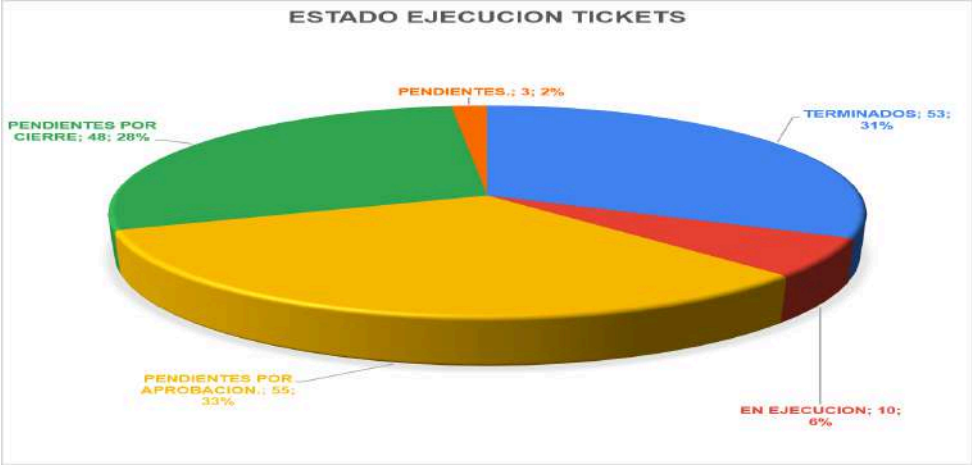

Los reportes que se encuentran pendientes por oficialización y cierre suman ciento tres (103) unidades, las cuales están tabuladas según su pendiente y su correspondencia presupuestal con el fin de facilitar y agilizar el proceso pertinente.

RESUMEN	VALOR AFECTACION BOLSA		
TKT PTE CIERRE ENTIDAD	23	22,3%	8.191.187
TKT PTE CIERRE INTERVENTORIA + ENTIDAD	7	6,8%	46.333.165
TKT EN EJECUCION PTE APROBACION ENTIDAD	1	1,0%	74.183.393
TKT EN EJECUCION PTE APROBACION INTERVENTORIA +ENTIDAD	1	1,0%	-
TKT EN EJECUCION APROBADOS POR INTERVENTORIA+ENTIDAD	6	5,8%	213.020.506
TKT APROBADO POR INTERVENTORIA - PTE APROBACION ENTIDAD	24	23,3%	262.054.616
TKT PTE APROBACION INTERVENTORIA	23	22,3%	1.394.015.472
TKT TERMINADOS PTE SOLICITUD DE CIERRE	18	17,5%	47.466.081
TOTAL	103	100%	


	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 54 de 103

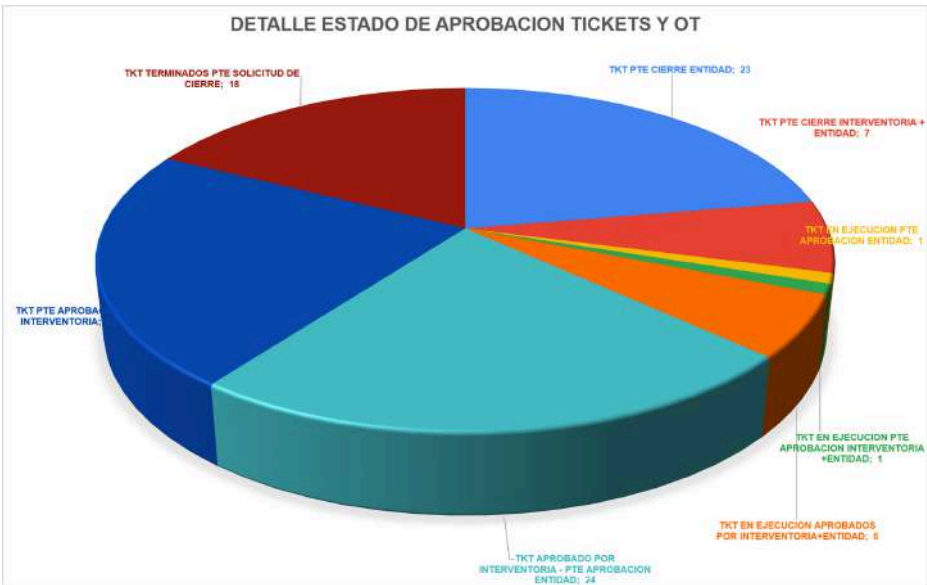

Durante el periodo de julio, la gestión del componente civil prioriza la ejecución de intervenciones correctivas orientadas a salvaguardar la estabilidad de la operación nacional, lo cual derivó en la suspensión temporal de las actividades paralelas de diagnóstico y levantamiento de inventarios en estudios. Como resultado de esta dinámica operativa, el mes cierra con un cumplimiento del 89,41%, quedando pendientes de visita cinco (5) estudios y seis (6) más en fase de consolidación de informes y evaluación de criticidad. Este remanente, equivalente al 10,59% de ejecución, será abordado de manera prioritaria para completar la trazabilidad técnica y documental de la infraestructura física del proyecto.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE OBRA CIVIL ESTACIONES ESTUDIO								FECHA DE CORTE		JULIO.30.2026	
EJECUCION PROGRAMADA					EJECUCION REAL						
FECHA TERMINACION CONTRATO	DURACION EN DIAS	CANTIDAD ESTACIONES ESTUDIO	TIEMPO EJECUCION EN DIAS	CANTIDAD ESTACIONES ESTUDIO PROGRAMADAS	CANTIDAD ESTACIONES ESTUDIO VISITADAS	CANTIDAD ESTACIONES ESTUDIO INVENTARIADAS	% PROGRAMADO DE EJECUCION ESTACIONES ESTUDIO	% VISITAS ESTACIONES ESTUDIO	% INVENTARIO ESTACIONES ESTUDIO	% EJECUCION VS PROGRAMACION	
Marzo.31.2026	237	30	176	22.28	25	24	74.26%	83.33%	80.33%	89.41%	

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 55 de 103

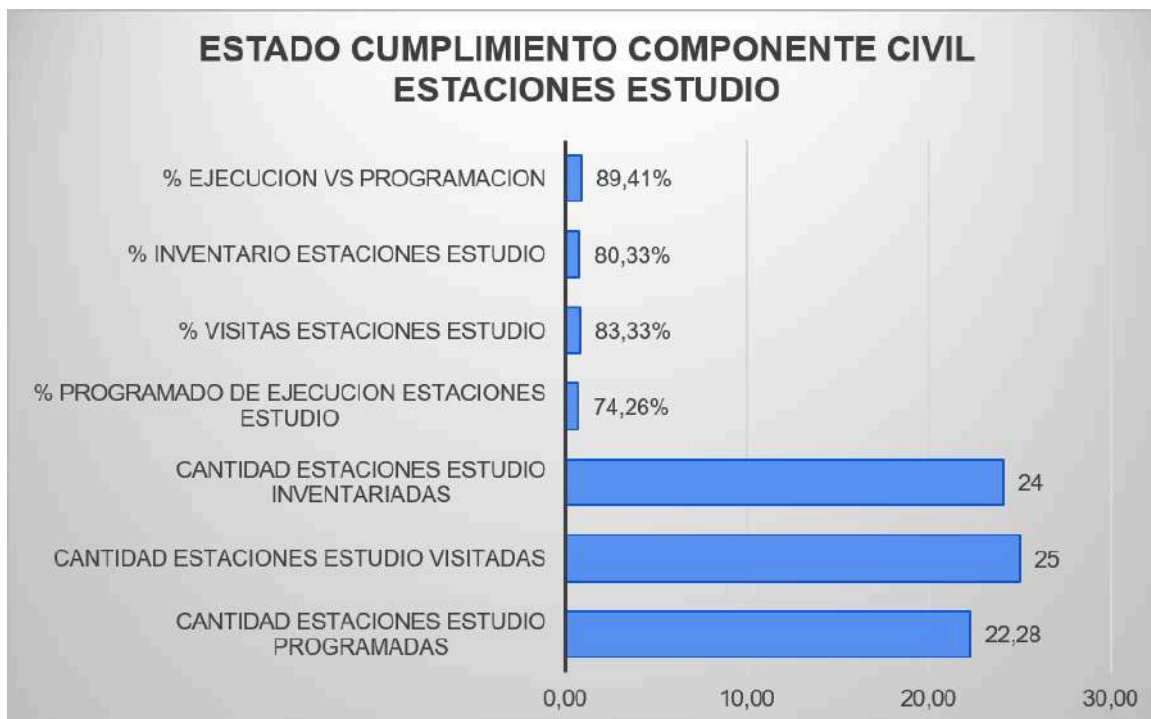

El avance puntual sobre cada COP evidencia que los estudios pendientes por visitar, levantar, evaluar y diagnosticar corresponden al COP 4, el componente civil retoma esta actividad para llevar a buen término lo propuesto y consolidar la información a la brevedad.



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 56 de 103

CRITICIDAD		3	2	1									
No.	ESTUDIOS DE RADIO	ACTIVIDADES											
		Muros internos	Fachada	Cielo raso	Cubierta	Ventanería	Puertas	Piso	Inst. eléctricas	Inst. sanitarias	SHELTER	Cerramiento	Cuarto de bombas
	ESTUDIO												
287	FUNDACIÓN	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2
282	BOJAYA	2	2	3	3	2	2	2	1	1	3	2	1
284	FONSECA	2	1	1	1	2	3	3	3	3	1	1	1
277	SAN JACINTO	1	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	3
281	VALLEDUPAR	2	1	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1
312	CODAZZI	1	1	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1
285	SAN JOSE DEL GUAVIARE	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
298	FLORIDA	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
313	TIERRA ALTA	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1
288	MESETAS	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
292	CONVENCION	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1
274	MEDELLIN	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
297	CALI	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
295	BUCARAMANGA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
278	MANIZALES	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
276	BARRANQUILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
289	VILLAVICENCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
273	ITUANGO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
283	QUIBDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
314	BUENAVENTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
315	RIOSUCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
286	ALGECIRAS	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
275	ARAUQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	EL TAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	PASTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	SAN VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	TUMACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	PUERTO LEGUIZAMO	3	2	2	1	1	3	1	1	3	0	1	1
296	CHAPARRAL	3	2	3	3	3	3	3	1	1	0	1	1
TOTALES		35	28	34	31	30	41	41	29	33	25	26	28
		38.9%	31.1%	37.6%	34.4%	33.3%	45.6%	45.6%	32.2%	36.7%	27.8%	28.9%	31.1%

Soportes de actividades finalizadas se encuentran en el **Anexo 11. Soporte de actividades civiles Julio** y relacionadas en el **Anexo 22. Resumen de actividades correctivas Julio**.

PROYECTOS ESPECIALES. - ESTUDIO CARTAGENA TORRE DEL RELOJ.

Para el cierre del mes, en la ejecución de la obra y su avance se destacan la terminación de actividades de acabados, incluyendo la evacuación permanente de escombros y residuos de obra, se terminaron los trabajos de nivelación de pisos, las obras en cumplimiento de la querrela policiva RAD.2084, emitida por la Inspección de Policía Comuna 1B de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la cual ordenó la reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia del Apartamento 101, producto de filtraciones detectadas en el inmueble intervenido.

Se realizó la evacuación y disposición final de los escombros generados, los residuos de construcción y demolición (RCD) fueron clasificados, recolectados y trasladados a sitios autorizados para su disposición final, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, garantizando condiciones de orden y limpieza en el frente de obra.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 57 de 103




Se mantuvo la progresión en las labores destinadas a la optimización de la infraestructura física y técnica del sitio, logrando hitos en obras civiles, reforzamiento estructural y sistemas eléctricos indispensables para la puesta en marcha de los nuevos ambientes. Se adelantó el retiro del cielo raso previo, manteniendo de forma selectiva la zona acústica donde los elementos de madera formarán parte de la estética final. Estas intervenciones facilitaron un peritaje pormenorizado de la estructura, determinando la urgencia de sustituir un elemento de soporte en el área técnica y cinco (05) vigas en la planta inferior afectadas por filtraciones relacionadas con el trámite de la querella policiva RAD.2084, estas últimas no serán suministradas por el CONSORCIO OM 2025, obedeciendo el direccionamiento de la entidad soportado en que la afectación y su responsabilidad no obedece a la adecuación que se está ejecutando, es un vicio preexistente que no asumirá la entidad en su calidad de arrendatario.

En el transcurso del mes de julio se continuaron las adecuaciones de ingeniería eléctrica, consistentes en la remoción de los ductos de PVC obsoletos y el montaje de canalizaciones bajo estándar EMT. Se avanzó significativamente en el tendido de cableado para los sectores de televisión, control master, el cuarto de equipos, la cabina de locución radial y en la totalidad del estudio incluyendo la reinstalación de los aires acondicionados.




La materialización de las modificaciones validadas se ha integrado en el desarrollo de los planos AS BUILT, documento en elaboración que plasma el estado actual de la intervención. Esta cartografía técnica evidencia la distribución definitiva de flujos, cada ambiente responde a criterios de productividad y funcionalidad dentro del esquema operativo del proyecto.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 58 de 103

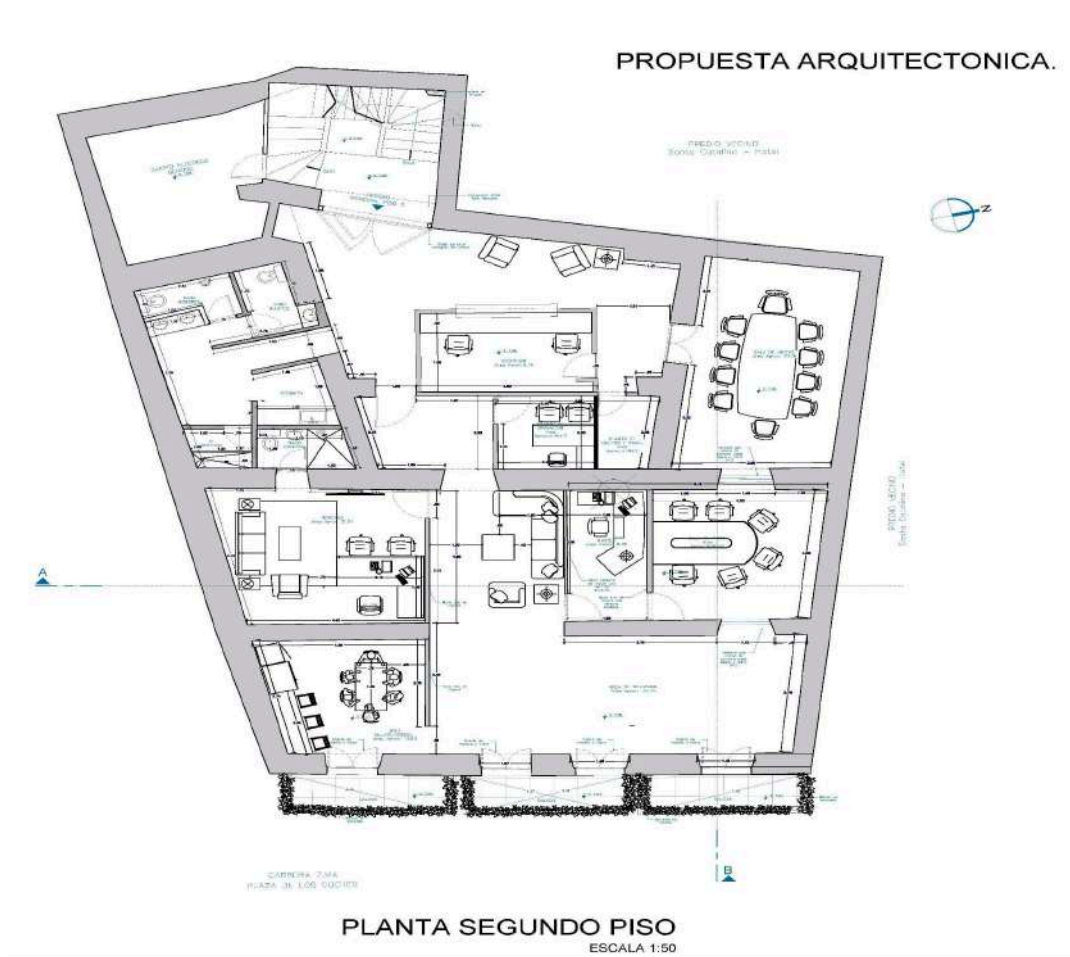


Con el cierre del mes se culminaron las actividades de instalación de pisos, resanes, acabado muros existentes, muros de construcción liviana, cielos, enchapes y aires acondicionados entre otros. Esto para un **75,89%** de avance general de obra.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 59 de 103

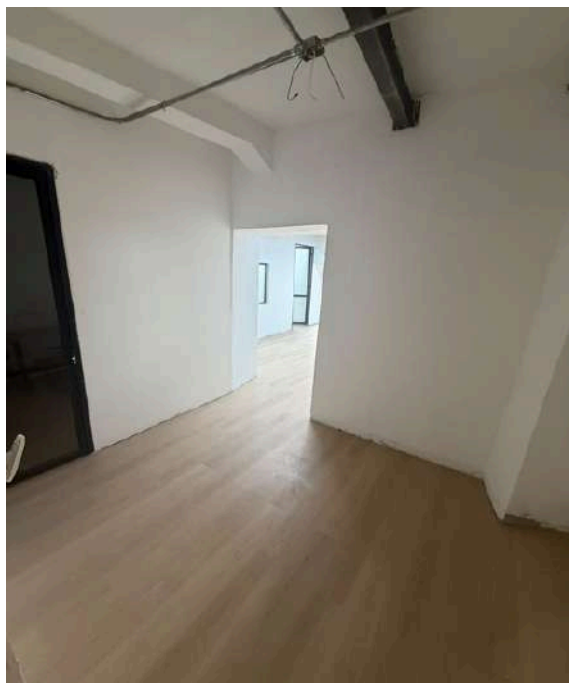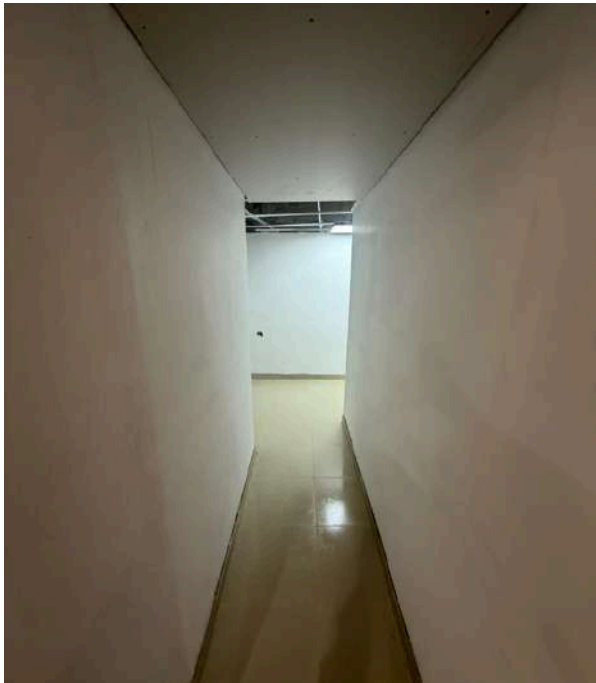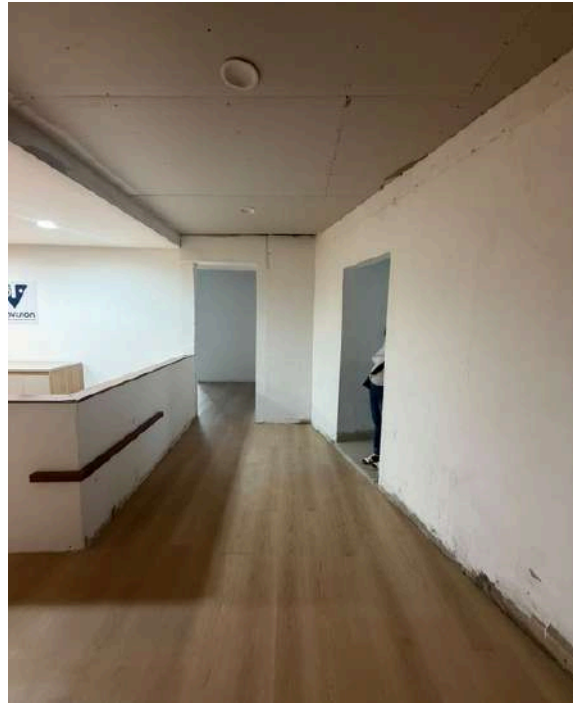

 CONSORCIO OM-2025	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 60 de 103

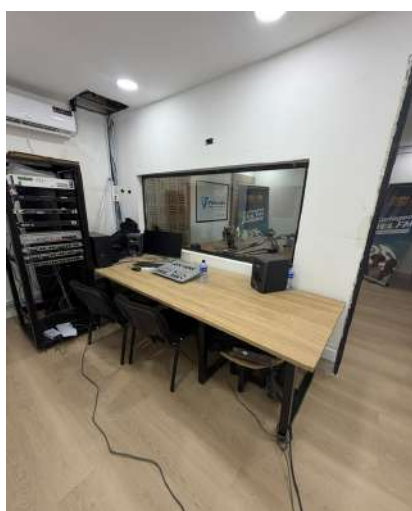

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 61 de 103

Las actividades ejecutadas durante el mes de julio se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos establecidos, manteniendo el respectivo control mediante registros fotográficos, bitácoras de obra y seguimiento permanente de los avances constructivos.

Plan de acción para reparaciones necesarias

Para implementar un plan de acción en el componente civil se requiere de la asignación de recursos suficientes para realizar las reparaciones necesarias, mientras eso sucede se continúa con el proceso de especificación, presupuesto y programación sobre el diagnóstico de cada estación visitada y de los hallazgos que cambian la prioridad de atención, todo con el fin de obtener la autorización correspondiente por parte de la entidad y del comité de compras e iniciar la ejecución de su corrección; En el proceso, también se implementó mitigar actividades particulares que definitivamente no dan espera, así se encuentren incluidas en los presupuestos pre aprobados o en los informes diagnóstico, con especial atención en las estaciones secundarias y los estudios.

4.5. Componente ambiental

El Informe de Gestión Ambiental del Consorcio OM-2025, correspondiente al mes de julio 2026 y presentado como **Anexo 12. Informe Gestión Ambiental julio 2026**, consolida los avances, resultados y mejoras alcanzadas en la implementación de las estrategias de manejo ambiental a nivel nacional, evidenciando un cierre de mes con una gestión estructurada, planificada y en cumplimiento de los compromisos contractuales.

Estrategia de Gestión de Residuos Peligrosos: Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) mantiene el avance reportado en el periodo anterior, registrando la **recolección y disposición final de residuos en 14 estaciones**, actividades que fueron ejecutadas y reportadas oportunamente en el informe correspondiente al mes de julio, con un total reportado de **747,31 kg** entregados a gestores autorizados. Estas intervenciones cuentan con la respectiva trazabilidad documental, soportada mediante manifiestos de transporte, registros fotográficos y demás evidencias técnicas exigidas por la normatividad ambiental vigente.

Durante el periodo no se programaron nuevas jornadas de recolección, dado que la estrategia se encuentra alineada con la planificación de los mantenimientos y la

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 62 de 103

generación de residuos en las estaciones, optimizando la logística operativa y la eficiencia en la gestión ambiental.

Como parte de las actividades de fortalecimiento de la estrategia, se avanzó en el proceso de **solicitud y evaluación de cotizaciones con proveedores especializados** para la dotación y adecuación de puntos de almacenamiento temporal de RESPEL en las estaciones priorizadas.

Adicionalmente, se realizó la **priorización técnica de estaciones** donde se proyecta la construcción o adecuación de puntos de acopio temporal para **Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)**, actividad que será desarrollada de manera articulada con el componente civil. Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura ambiental de las estaciones, garantizar condiciones adecuadas para el almacenamiento temporal de residuos y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Al cierre del periodo se mantienen **seis (6) estaciones programadas** para las próximas jornadas de recolección de RESPEL: Galeras, Lebrija, Sabanagrande, La Ceja, Cruz Verde y Toluviejo. Su ejecución se desarrollará conforme a la programación de mantenimiento de las estaciones y a la disponibilidad operativa, garantizando la continuidad de la estrategia durante el segundo semestre de la vigencia 2026.

Ilustración 1. Total, de Kg RESPEL recolectados a corte 31 de julio 2026.



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 63 de 103

Fuente: Consorcio OM-2025, julio 2026.

Al cierre de julio de 2026, la estrategia de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) mantiene un desarrollo acorde con la planificación establecida, conservando la trazabilidad de las recolecciones ejecutadas y fortaleciendo las acciones de planeación para la siguiente fase de implementación. Durante el periodo se avanzó en la estructuración de los procesos de dotación y adecuación de puntos de almacenamiento temporal, así como en la priorización de estaciones para la construcción de áreas de acopio de RAEE en articulación con el componente civil. Estas acciones permitirán fortalecer la infraestructura ambiental de la red, optimizar la gestión de residuos y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Estrategia de Mantenimiento de pozos sépticos: Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de mantenimiento de pozos sépticos se concentró en el fortalecimiento de las condiciones técnicas, logísticas y administrativas necesarias para garantizar la ejecución de las intervenciones priorizadas durante el segundo semestre de la vigencia. Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a eliminar restricciones operativas, avanzar en los procesos de contratación y asegurar la continuidad del plan de mantenimiento de la infraestructura sanitaria de las estaciones.

Uno de los avances más relevantes del periodo fue la **habilitación del acceso a la Estación 031 – Gabinete**, donde el 25 de julio de 2026 culminaron las labores de remoción del deslizamiento que afectaba la vía de ingreso. Esta intervención restableció las condiciones de accesibilidad a la estación, facilitando la programación y ejecución de futuras actividades de mantenimiento, así como el ingreso seguro del personal, equipos y materiales requeridos.

En el componente contractual, actualmente se encuentra en proceso de aprobación por parte del Comité de Compras la cotización para la ejecución del mantenimiento manual de los pozos sépticos de las estaciones 030 – Buenavista y 031 – Gabinete, intervenciones priorizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y minimizar riesgos operacionales.

De igual manera, avanza el proceso de aprobación ante el Comité de Compras para el reemplazo integral del sistema séptico de la Estación 049 – Azalea. El alcance del proyecto contempla el transporte, el suministro e instalación de un nuevo sistema séptico, el desmonte de la infraestructura existente, la reposición de las tuberías de

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 64 de 103

descarga que presentan deterioro y fallas funcionales, así como la puesta en operación del nuevo sistema, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento y cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales.

Respecto a la Estación 004 – La Enea, continúa la gestión documental con el proveedor seleccionado, encontrándose pendiente la entrega de la documentación requerida para presentar el proceso ante el Comité de Compras. Debido a las características constructivas del sistema séptico existente, el mantenimiento debe ejecutarse mediante succión periódica de lodos, con una frecuencia aproximada de seis meses, al no contar con condiciones que permitan la realización de un mantenimiento manual convencional.

Como parte del fortalecimiento de la estrategia en áreas ambientalmente sensibles, y con las visitas realizadas en el mes de julio, ya se cuenta con los proveedores seleccionados para la ejecución del mantenimiento de los pozos sépticos de las estaciones 036 – Galeras y 042 – Montezuma, ubicadas dentro de áreas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). No obstante, el inicio de estas actividades está condicionado a la expedición de la resolución de autorización por parte de la autoridad ambiental, requisito indispensable para el ingreso y ejecución de los trabajos.

En cumplimiento de este proceso, se elaboró y remitió el informe técnico de intervención, en el cual se describen la metodología de mantenimiento, las medidas de manejo ambiental y el procedimiento para la disposición final de los lodos extraídos. Dicho documento fue radicado ante Parques Nacionales Naturales por la entidad competente y actualmente se encuentra en proceso de evaluación para la emisión del acto administrativo correspondiente.

Las actividades desarrolladas durante el periodo evidencian un avance significativo en la eliminación de restricciones operativas, la consolidación de los procesos contractuales y la articulación con las autoridades ambientales, condiciones que permitirán incrementar el ritmo de ejecución de los mantenimientos programados durante el segundo semestre de la vigencia.

Al cierre de julio de 2026, la estrategia de mantenimiento de pozos sépticos registra avances importantes en la consolidación de las condiciones técnicas, logísticas, contractuales y regulatorias requeridas para la ejecución de las intervenciones priorizadas. La habilitación del acceso a la Estación Gabinete, el avance de los procesos de aprobación ante el Comité de Compras para las estaciones Buenavista,

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 65 de 103

Gabinete, Azalea y La Enea, así como la gestión adelantada con Parques Nacionales Naturales para las estaciones Galeras y Montezuma, evidencian una adecuada articulación entre los componentes operativo, administrativo y ambiental. Estas acciones fortalecen la gestión preventiva de la infraestructura sanitaria, reducen riesgos operacionales y ambientales, y generan las condiciones necesarias para incrementar la ejecución del plan de mantenimiento durante los próximos meses, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos.

Estrategia de Fumigación: La estrategia de fumigación y control de plagas continuó ejecutándose conforme a la planificación establecida para la vigencia 2026, con el propósito de mitigar los riesgos asociados a la presencia de fauna ponzoñosa, vectores, roedores y maleza en las estaciones de transmisión, fortaleciendo las condiciones de seguridad para el personal y garantizando la continuidad operativa de la infraestructura.

Durante el periodo se dio continuidad a la primera fase de la estrategia de control de animales ponzoñosos, ampliando la cobertura a 20 estaciones priorizadas, en las cuales se realizaron dos aplicaciones especializadas por estación, de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos y el análisis de riesgo desarrollado por el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La ejecución de esta fase culminó satisfactoriamente durante el fin de semana del **2 de agosto de 2026**, cumpliendo el cronograma establecido y sin registrarse novedades operativas durante el desarrollo de las actividades.

Como parte del seguimiento posterior, se mantiene el monitoreo de las estaciones intervenidas, sin que hasta la fecha se hayan reportado eventos relacionados con la presencia de animales ponzoñosos o vectores, evidenciando la efectividad de las medidas implementadas.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 66 de 103



4.4 ESTRATEGIA DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Estado de ejecución – Corte al 31 de julio de 2026

La estrategia de fumigación y control de plagas se ejecutó conforme a la planificación establecida para la vigencia 2026, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la presencia de fauna ponzoñosa, vectores, roedores y maleza en las estaciones de transmisión, fortaleciendo la seguridad del personal y garantizando la continuidad operativa de la infraestructura.



AVANCE DE LA ESTRATEGIA



Fecha de finalización de la Fase I:
02/08/2026

PRINCIPALES RESULTADOS



COBERTURA – ESTACIONES INTERVENIDAS (20)

- 1 Planadas
- 2 Bello
- 3 Marinilla
- 4 Lebrija
- 5 Cerro Neiva
- 6 Mirador
- 7 La Popa

- 8 La Pita
- 9 El Rosal
- 10 Gabinete
- 11 Chigorodó
- 12 Sabanagrande
- 13 Manjui
- 14 La Enea

- 15 Jamundí
- 16 Tibitoc
- 17 Bañaderos
- 18 La Azalea
- 19 El Cable
- 20 Buenavista



Cobertura total de 20 estaciones priorizadas en diferentes departamentos del país.

ESTADO DEL PROCESO



CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de fumigación y control de plagas presenta un avance satisfactorio, consolidando la ejecución de la primera fase del programa de control de animales ponzoñosos en la totalidad de las estaciones priorizadas. Las actividades fueron desarrolladas conforme a la programación establecida, sin incidentes operativos y con resultados positivos durante el seguimiento posterior, al no evidenciarse reportes de presencia de fauna ponzoñosa en las estaciones intervenidas. Estos resultados ratifican la efectividad de las medidas implementadas y fortalecen la gestión preventiva del riesgo biológico, contribuyendo a la protección del personal, la continuidad operativa de las estaciones y el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y gestión ambiental.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 67 de 103

Paralelamente, continúa la ejecución de las actividades programadas para el **control de vectores y roedores**, así como las **fumigaciones para control de maleza**, de acuerdo con la programación definida para la vigencia, garantizando la trazabilidad documental mediante órdenes de trabajo, registros fotográficos e informes técnicos. Estas intervenciones buscan reducir riesgos sanitarios, prevenir afectaciones a la salud del personal y minimizar posibles daños sobre la infraestructura y los equipos instalados.

De manera complementaria, las **fumigaciones para el control de maleza** continuaron ejecutándose como parte de las actividades preventivas de mantenimiento ambiental, contribuyendo a disminuir la presencia de hábitats favorables para fauna nociva, mejorar las condiciones de accesibilidad a las estaciones y reducir el riesgo de afectaciones sobre la infraestructura por crecimiento excesivo de vegetación.

Las tres líneas de intervención son objeto de seguimiento permanente mediante inspecciones posteriores, permitiendo verificar la efectividad de los tratamientos aplicados y establecer oportunamente la necesidad de nuevas intervenciones de acuerdo con la evolución de las condiciones ambientales en cada estación y estudio.

Principales resultados del periodo

- Se culminó la primera fase del programa de control de animales ponzoñosos, alcanzando una cobertura de 20 estaciones priorizadas.
- Se ejecutaron 40 aplicaciones especializadas, correspondientes a dos tratamientos por estación.
- No se registraron incidentes durante la ejecución de las actividades ni reportes posteriores de presencia de fauna ponzoñosa en las estaciones intervenidas.
- Se dio continuidad a las actividades de control de vectores y roedores, conforme a la programación establecida para la vigencia.
- Continuó la ejecución de las fumigaciones para control de maleza, fortaleciendo las condiciones de seguridad, accesibilidad y mantenimiento ambiental en las estaciones.
- Se mantiene la trazabilidad técnica y documental de todas las intervenciones mediante órdenes de trabajo, registros fotográficos e informes de ejecución.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 68 de 103

Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de fumigación y control de plagas presenta un avance favorable, consolidando la ejecución de la primera fase del programa de control de animales ponzoñosos y dando continuidad a las actividades de control de vectores, roedores y maleza programadas para la vigencia. Los resultados obtenidos evidencian la efectividad de las intervenciones implementadas, reflejada en la ausencia de novedades operativas y en la no ocurrencia de reportes asociados a fauna ponzoñosa en las estaciones intervenidas. La continuidad de las acciones de monitoreo y seguimiento permitirá mantener condiciones adecuadas de bioseguridad, reducir riesgos para el personal y preservar la infraestructura operativa bajo criterios de prevención, eficiencia y cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos.

Rocería – Estaciones Primarias

La estrategia de rocería en estaciones primarias continuó desarrollándose conforme a la programación establecida para la vigencia 2026, priorizando las estaciones que presentan mayor crecimiento de cobertura vegetal, restricciones de accesibilidad y necesidades operativas que requieren mantener condiciones adecuadas para la operación, el mantenimiento y la seguridad del personal.

Durante el mes de julio de 2026 se ejecutaron actividades de rocería en las estaciones 007 – Jamundí y 049 – Azalea, incrementando el avance de la estrategia a 7 de las 23 estaciones programadas, equivalente a un 30,43 % de ejecución, mientras que 16 estaciones (69,57 %) permanecen pendientes de intervención conforme al cronograma establecido.

En la **Estación 007 – Jamundí**, se realizó la rocería de las áreas exteriores como actividad prioritaria para mejorar las condiciones de acceso y visibilidad requeridas durante el proceso de validación técnica adelantado por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), en atención a las observaciones relacionadas con la ubicación de los puntos de medición, el acceso a los cuadrantes y la visibilidad hacia el sistema irradiante, aspectos necesarios para la continuidad del trámite técnico.

De igual manera, en la **Estación 049 – Azalea** se ejecutó la rocería de las áreas interiores de la estación, mejorando las condiciones de orden, limpieza y accesibilidad para el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 69 de 103

Las intervenciones continúan desarrollándose de acuerdo con la priorización técnica definida para la estrategia, considerando el estado de la vegetación, la criticidad de cada estación y los requerimientos operativos que se presentan durante la vigencia.

Con las actividades ejecutadas durante julio, el avance acumulado de la estrategia pasó del **21,74% registrado al cierre de junio al 30,43%**, evidenciando la continuidad de la programación y el incremento gradual de la cobertura en las estaciones priorizadas. Las actividades continúan ejecutándose bajo criterios de priorización técnica y de acuerdo con las necesidades operativas identificadas en cada instalación.

Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de rocería en estaciones primarias presenta un avance progresivo, consolidando la intervención de siete estaciones priorizadas y fortaleciendo la articulación entre la gestión ambiental y los requerimientos operativos del proyecto. Las actividades ejecutadas durante el periodo permitieron mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y mantenimiento de la infraestructura, destacándose la intervención realizada en la Estación Jamundí como apoyo al cumplimiento de los requerimientos técnicos formulados por la ANE dentro del proceso de validación de mediciones. La continuidad de la programación permitirá incrementar la cobertura de la estrategia y mantener condiciones adecuadas para la operación y el mantenimiento de las estaciones.

Estrategia de embellecimiento en Estaciones Secundarias

La estrategia de embellecimiento en estaciones secundarias continuó ejecutándose durante el mes de julio de 2026, con el propósito de preservar las condiciones físicas, funcionales y estéticas de la infraestructura, fortaleciendo la seguridad operacional, la accesibilidad y la conservación de los activos administrados por el Consorcio OM.

Las actividades fueron desarrolladas mediante un esquema de mantenimiento integral, que incluyó intervenciones de rocería, fumigación, pintura, lavado de antenas TVRO y reparaciones menores, de acuerdo con las necesidades identificadas durante las inspecciones técnicas realizadas en cada estación.


Durante el periodo se intervinieron 20 estaciones secundarias, ejecutándose actividades de rocería y fumigación en la totalidad de ellas, mientras que las labores de pintura, lavado de antenas TVRO y arreglos menores fueron desarrolladas

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 70 de 103

únicamente en aquellas estaciones que, conforme a la evaluación técnica realizada en campo, requieran este tipo de intervención.

La ejecución de estas actividades permitió mejorar las condiciones de conservación de la infraestructura, facilitar las labores de operación y mantenimiento y fortalecer la imagen institucional de las estaciones intervenidas, manteniendo la trazabilidad de cada intervención mediante registros fotográficos, informes técnicos y soportes documentales.

Ejecución de Actividades de Embellecimiento- corte 31 de julio 2026

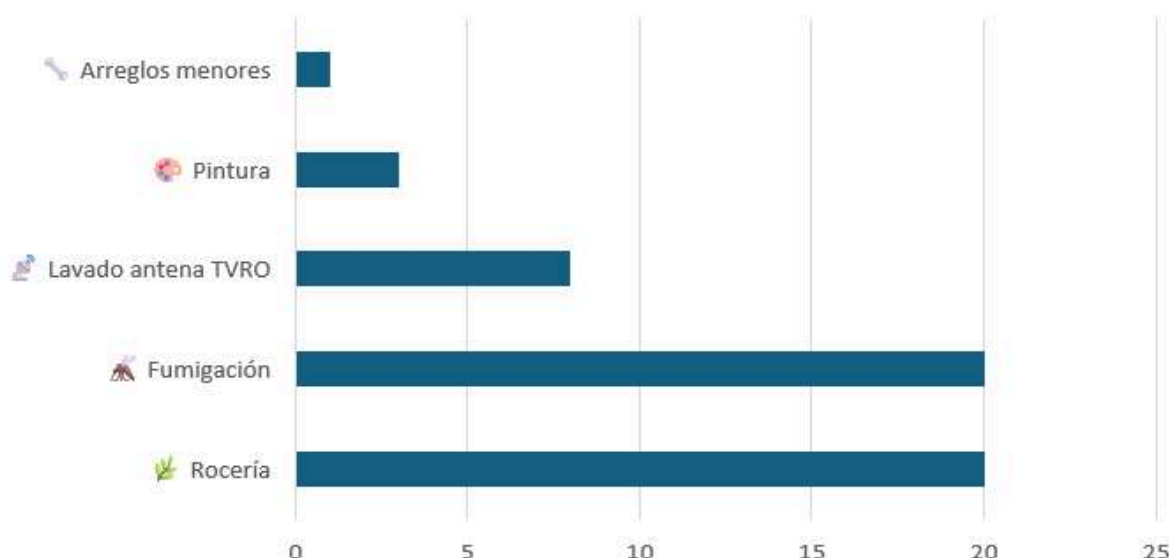

Fuente: Consorcio OM 2025, julio 2026.

La estrategia de embellecimiento fue ejecutada bajo un enfoque de mantenimiento preventivo e integral, orientado a conservar las condiciones ambientales, funcionales y locativas de las estaciones secundarias mediante intervenciones específicas definidas a partir de las inspecciones técnicas realizadas en cada instalación.

Las actividades de **rocería y fumigación** constituyeron el componente principal de la estrategia, ejecutándose en la totalidad de las veinte estaciones intervenidas, permitiendo controlar el crecimiento de la vegetación, reducir la presencia de

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 71 de 103

vectores y mejorar las condiciones de seguridad para el ingreso del personal operativo.

De forma complementaria, se ejecutaron actividades de **lavado de antenas TVRO** en aquellas estaciones donde se identificó acumulación de suciedad o material particulado que pudiera afectar las condiciones de operación y conservación de los equipos. Asimismo, se realizaron labores de **pintura** sobre elementos que presentaban deterioro superficial por exposición a las condiciones ambientales, contribuyendo a la protección de la infraestructura y al mejoramiento de la imagen institucional.

Finalmente, se ejecutó un **arreglo menor** correspondiente a las necesidades específicas identificadas durante las inspecciones en campo, garantizando la atención oportuna de observaciones que podrían afectar el adecuado funcionamiento de la estación.

La ejecución diferencial de estas actividades permitió optimizar los recursos disponibles, interviniendo únicamente los elementos que requerían mantenimiento y garantizando una gestión eficiente de los recursos destinados a la estrategia.

Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de embellecimiento en estaciones secundarias presenta un avance satisfactorio, consolidando intervenciones integrales orientadas a preservar las condiciones ambientales, operativas y locativas de la infraestructura. Las actividades ejecutadas permitieron mejorar la seguridad para el personal, optimizar las condiciones de conservación de los activos y fortalecer la imagen institucional de las estaciones intervenidas. La ejecución diferenciada de las actividades, basada en las necesidades identificadas durante las inspecciones técnicas, evidencia una adecuada priorización de los recursos y una gestión orientada a maximizar el impacto de las intervenciones sobre la infraestructura.

Estrategia de poda y tala:

La estrategia de poda y tala de individuos arbóreos continuó desarrollándose durante el mes de julio de 2026 bajo un enfoque de gestión preventiva del riesgo, orientado a eliminar condiciones que pudieran afectar la seguridad del personal, la integridad de la infraestructura y la continuidad de la operación de las estaciones, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la articulación con las autoridades competentes.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 72 de 103

Con corte al 31 de julio de 2026, la estrategia registra un total de 27 solicitudes de tala, de las cuales 18 han sido ejecutadas, mientras que 9 continúan en proceso de gestión administrativa y obtención de permisos, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes. Asimismo, de las tres compensaciones forestales requeridas, dos ya fueron ejecutadas y una permanece en trámite, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos ambientales otorgados.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron intervenciones en las estaciones 024 – Montería, 076 – La Ceja y 144 – Silvia, atendiendo condiciones particulares de riesgo y criterios técnicos que justificaron su intervención.

En la Estación 024 – Montería, se realizó exclusivamente la tala de individuos arbóreos frutales, los cuales no requieren autorización ambiental para su aprovechamiento. Sin embargo, continúa la gestión ante la autoridad ambiental y las entidades competentes para obtener la autorización correspondiente para la intervención de los demás individuos identificados dentro del diagnóstico forestal.


En la Estación 144 – Silvia, la intervención fue autorizada por la autoridad municipal de Gestión del Riesgo, al evidenciarse que los individuos arbóreos interfieren con la propagación de la señal y comprometían la continuidad de la operación de la estación, razón por la cual fue autorizada su tala inmediata como medida preventiva.

En la Estación 076 – La Ceja, se ejecutó la tala de un individuo arbóreo identificado como muerto en pie, cuya condición representaba un riesgo para la infraestructura y para el personal que realiza actividades de operación y mantenimiento.

Las demás intervenciones continúan avanzando conforme a los tiempos establecidos por las autoridades ambientales y a la obtención de los permisos requeridos para su ejecución.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 73 de 103

Estado de Ejecución de la Estrategia de Poda y Tala – Julio 2026

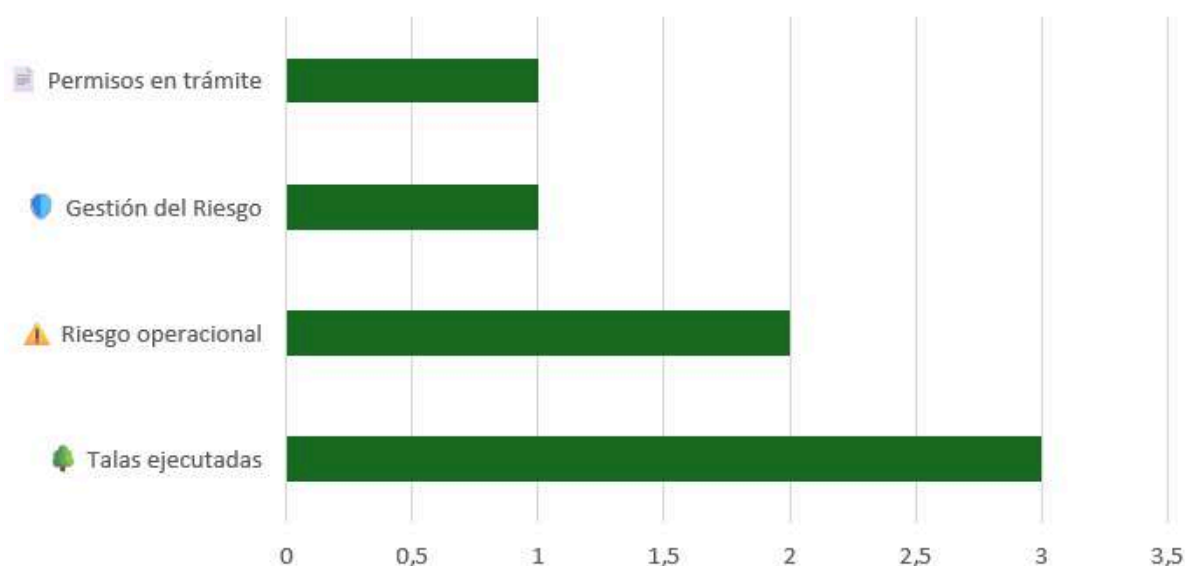

Fuente: Consorcio OM 2025, julio 2026.

Al cierre del mes de julio de 2026, la estrategia de poda y tala presenta un avance sostenido, consolidando la ejecución de intervenciones priorizadas bajo criterios de seguridad operacional, gestión del riesgo y cumplimiento de la normatividad ambiental. Las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron eliminar condiciones que comprometían la infraestructura y la continuidad del servicio, al tiempo que se mantuvo la gestión administrativa para la obtención de los permisos requeridos en las intervenciones pendientes. De igual manera, se dio continuidad al cumplimiento de las obligaciones de compensación forestal, fortaleciendo la gestión ambiental del proyecto y asegurando la trazabilidad técnica y documental de cada actuación.

Estrategia de Aseo:

Para la estrategia de aseo en los 31 estudios, se cumplió la programación de limpieza y mantenimiento preventivo en las estaciones, garantizando condiciones óptimas de operación. Como novedad, durante la semana del 13 al 19 de julio en el estudio Medellín no se prestó el servicio, dado que la estación permaneció fuera de operación.

Recomendaciones estratégicas

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 74 de 103

- **Fortalecer la planeación preventiva** de actividades ambientales (poda, tala, rocería, fumigación, RESPEL y mantenimiento sanitario) para reducir reprocesos y atender necesidades oportunamente.
- **Mantener seguimiento continuo a trámites y permisos ambientales**, priorizando aquellos que dependen de autoridades externas para evitar retrasos en la ejecución.
- **Priorizar intervenciones críticas** asociadas a riesgos operativos, seguridad de las estaciones y cumplimiento normativo.
- **Mejorar la trazabilidad documental** mediante el cierre oportuno de tickets, consolidación de evidencias y seguimiento con interventoría.
- **Implementar un esquema de mantenimiento preventivo** que permita anticipar necesidades en infraestructura ambiental y reducir mantenimientos correctivos.
- **Continuar fortaleciendo la coordinación con entidades territoriales y ambientales** para agilizar autorizaciones y ejecución de actividades pendientes.
- **Consolidar indicadores de seguimiento** que permitan visualizar avances, pendientes y próximos pasos de cada estrategia.

Como soporte de la gestión reportada, se adjuntan las evidencias documentales y registros de ejecución correspondientes al periodo evaluado en el **Anexo 13. Soportes de Gestión Ambiental – Julio 2026.**

4.6. Componente SST

El presente informe consolida la ejecución de las actividades del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del Consorcio OM-2025 durante el mes de julio de 2026, en el marco del contrato RTVC-CPS-2218-2025 para la operación y mantenimiento de la infraestructura de radio y televisión a nivel nacional.

Resumen ejecutivo

0 Accidentes de trabajo (jul-2026)	341 Estaciones con balance de extintores	96 + 24 Afiliados con SS al día (directo + riesgo V)	3 Capacitaciones / jornadas de bienestar
--	--	--	--

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 75 de 103

La gestión del componente de SST y sus comprobantes se encuentran depositados en el repositorio: 3.8. Componente SST/ANEXOS INFORMES MENSUALES/ 11.ANEXO INFORME JULIO 2026. **Anexo 14. Gestión del componente SST.**

4.6.1. Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal mínimo requerido en el contrato

Se llevó a cabo y se verificó el pago oportuno de aportes a seguridad social integral (pensión, salud, ARL, CCF y parafiscales) correspondientes al período de cotización julio de 2026, tanto para el personal directo del Consorcio como para el personal contratista clasificado en riesgo V.

Tabla 1. Pago a la seguridad social – julio 2026

Grupo de personal	Afiliados reportados	Valor total liquidado / aportado
Personal directo (operadores) — planilla PILA	96	\$95.778.200
Personal contratista — riesgo V (Pago ARL SURA) y planillas con pago mes vencido de julio 2026.	24	\$4.778.400

Datos generales de la liquidación: NIT 901.972.420-9, razón social CONSORCIO OM 2025, período de pago julio de 2026, planilla pagada el 06/07/2026 a través de Bancolombia.

El aporte a riesgos laborales para el personal contratista riesgo V, se realizó en su totalidad a través de ARL SURA (código de administradora 14-11), sin días de mora reportados.

En la carpeta del **Anexo No.14.1 Pago Seguridad Social julio 2026** se incluye:

- Carpeta con planillas de pago seguridad social personal contratista julio 2026, en cumplimiento del Decreto 1273 de 2018 (pago mes vencido).
- Planilla de pago ARL personal contratista riesgo V julio 2026.
- Planilla de pago de seguridad social operadores (personal directo) pago julio 2026.

4.6.2. Registros de idoneidad y competencia del personal mínimo requerido en el contrato

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 76 de 103

Se mantiene actualizado el control de registros de idoneidad (formación, educación y experiencia) del personal mínimo requerido exigido contractualmente.

Tabla 2. Control registros de idoneidad y competencia del personal – julio 2026

Categoría de personal	Personal con registro de idoneidad verificado	Verificación SS
Personal profesional (coordinadores, ingenieros, responsables de área)	29	Al día
Operadores de estación	90	Al día
Total personal mínimo requerido con idoneidad verificada	119	—

La verificación de idoneidad incluye, para cada colaborador, el soporte de educación/formación, experiencia y enlace de consulta documental (Google Drive), sin observaciones pendientes reportadas para el corte de julio de 2026.

En la carpeta del **Anexo No.14.2 Registros de idoneidad del personal mínimo requerido por cargo** se presentan los registros correspondientes.

4.6.3. Condiciones de seguridad

Durante el mes de julio de 2026 no se presentaron eventos relacionados con condiciones de seguridad.

4.6.4. Inspecciones de seguridad

Se ejecutó el muestreo de inspección de dotación y EPP correspondiente a julio de 2026, sobre una muestra de 33 colaboradores (31 operarios y 2 técnicos de antenas), con el siguiente resultado:

33 Colaboradores inspeccionados	100% Dotación / EPP completos	0% Requieren reposición	100% Estado general bueno
---	---	-----------------------------------	-------------------------------------

El 100% de la muestra presentó dotación básica completa (casco de seguridad, chaqueta, pantalón en jean, camisa tipo polo, botas de caucho, botas de seguridad

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 77 de 103

dieléctricas, gafas de seguridad, guantes) y ningún colaborador requirió reposición inmediata.

Para el grupo de técnicos de antenas (trabajo en alturas) se verificó adicionalmente la entrega de EPP especializado: casco dieléctrico blanco, eslinga de posicionamiento sencilla, eslinga en Y con regatones y mosquetones dieléctricos, freno arrestador de caídas para guaya, polea sencilla en aluminio, monogafa Everest, botas dieléctricas y cuerda ponchada de 200 m, con entrega confirmada para los 2 técnicos inspeccionados.

En la carpeta del **Anexo No.14.3 Inspecciones de seguridad julio 2026**, se presenta el registro Muestreo_Inspeccion_EPP_Dotacion_Julio_2026.

4.6.5. Recarga, cambio o suministro de extintores y/o botiquines

Durante el mes de julio de 2026 se llevó a cabo la recarga, mantenimiento y reemplazo de extintores así:

Tabla 3. Gestión de Extintores y Botiquines – julio 2026

Estación	Tipo	Cantidad
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Botiquín tipo A (1) y recarga extintores Co2 (6)	7
ESTACIÓN NUNCHIA	Botiquín tipo A	7
ESTACIÓN LA RUSIA	Botiquín tipo A y un extintor Co2 X 5 libras	2
ESTACIÓN RÍO BLANCO	Compra de 3 extintores	3
LA ARGENTINA TERUEL SANTA MARÍA	1 extintor multipropósito de 10 LB, 2 Recargas extintor multiproposito 10 LB, 3 botiquines	6
ESTACIÓN EL COPEY	1 extintor multipropósito	1

Con corte al 30 de julio de 2026, el balance de extintores de la red de 341 estaciones RTVC presenta el siguiente estado:

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 78 de 103

256 Estaciones operativas (75%)	141 Con extintores vigentes (41%)	107 Con extintores vencidos (31%)	85 No operativas (25%)
---	---	---	----------------------------------

Tabla 4. Balance de Extintores – julio 2026

Tipo de estación	Total	Operativas	Vigentes	Vencidos
Primarias	39	39	34	5
Estudios	30	30	30	0
Secundarias	255	174	72	102*
Otras (CAN, AM, cabecera, micro)	17	13	5	8
TOTAL	341	256	141	115

* En estaciones secundarias, el dato incluye estaciones operativas sin extintores o con extintores vencidos; el grupo "Otras" incluye 8 estaciones sin registro disponible a la fecha de corte.

Tabla 5. Plan de acción – julio 2026

#	Acción	Alcance / plazo	Prioridad
1	Recargar / reponer extintores vencidos (primarias, estudios y secundarias)	115 estaciones · 30 días	Alta
2	Priorizar estaciones secundarias operativas sin extintores vigentes	102 estaciones · 15 días	Crítica
3	Actualizar base de datos de dotación de botiquines y camillas	256 estaciones · 60 días	Media
4	Validar base de datos contra facturas de compra/recarga	141 estaciones · 60 días	Media
5	Control de vencimientos y recarga preventiva	Alertas ≤ 60 días · 45 días	Alta

Meta establecida: cero estaciones con extintores vencidos en un horizonte de 90 días.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 79 de 103

En la carpeta del **Anexo No.14.4. Registros extintores y botiquines julio 2026**, se incluye el archivo BALANCE EXTINTORES CORTE 31-07-2026 RESUMEN1.

4.6.6. Capacitación

Durante julio de 2026 se ejecutaron tres (3) jornadas de capacitación y bienestar en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el respectivo registro de asistencia:

Tabla 6. Capacitación – julio 2026

Fecha	Actividad / tema	Modalidad	Asistentes
<u>03/07/2026</u>	PVE y acciones para la prevención de los efectos por riesgo biológico — prácticas seguras – Sesión 1	<u>Virtual</u>	<u>25</u>
<u>23/07/2026</u>	Divulgación programa de pausas saludables (definición, indicaciones, recomendaciones, App Longevo) — sesión 1	<u>Virtual</u>	<u>42</u>
<u>23/07/2026</u>	Manejo y prevención de mordeduras de perros y gatos / continuidad jornada de bienestar — sesión 2	<u>Virtual</u>	<u>21</u>

Las capacitaciones fueron dictadas a través de ARL SURA (asesoras Karen Solanyi Sarmiento Acuña y Tatiana Moreno Sarmiento), dirigidas principalmente a operadores de estación de radio y televisión del Consorcio OM-2025, con registro de cédula, cargo y firma de los participantes. En total se documentaron 67 registros de asistencia en las tres jornadas del mes.

En la carpeta del **Anexo No.14.5. Registro asistencia Capacitaciones Julio 2026**, se incluyen los registros de: Pausas activas y Prevención de mordedura de perros y gatos, con sus respectivas listas de asistencia.

4.6.7. Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026 no se registraron accidentes de trabajo ni enfermedad laboral, tanto para el personal propio del Consorcio OM-2025 como para el personal contratista vinculado al proyecto.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 80 de 103

Tabla 7. Estadísticas de accidentalidad julio 2026

Indicador	Ma r	Ab r	Ma y	Ju n	Jul	Meta	Estado
N.º accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	CUMPLE
N.º días perdidos AT	0	0	0	0	0	0	CUMPLE
N.º enfermedades laborales	0	0	0	0	0	0	CUMPLE
Índice de frecuencia (IF)	0	0	0	0	0	≤ 5	CUMPLE
Índice de severidad (IS)	0	0	0	0	0	≤ 20	CUMPLE
Índice de lesión incapacitante (ILI)	0	0	0	0	0	≤ 0.1	CUMPLE
Ausentismo por enfermedad común	0	0	0	0	0	30 días	CUMPLE

Las certificaciones fueron expedidas por Valentina Piragauta Páez, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio OM-2025 (Licencia No. 25-0780), y por la Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente de Seguros de Vida Suramericana S.A. — ARL SURA, respectivamente, con base en la verificación de los registros oficiales del SG-SST, reportes internos, inspecciones realizadas y seguimiento permanente a las actividades desarrolladas en el período.

En la carpeta del **Anexo No.14.6 Constancias de accidentalidad ARL SURA julio 2026** se presentan los siguientes archivos: Constancia Accidentalidad ARL SURA Julio 2026 y Constancia Accidentalidad Contratistas CONSORCIO OM julio 2026.

4.6.8. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

El Consorcio OM-2025 mantiene disponible y actualizada una matriz de once (11) formatos estandarizados de Análisis de Trabajo Seguro (código base GI-FO), diligenciables en campo previo a la ejecución de actividades de alto riesgo, con identificación de peligros, consecuencias, controles, EPP requeridos y evaluación cuantitativa del riesgo así:

Tabla 8. LISTADO DE ATS implementados

Nº	Actividad	Permiso de trabajo asociado
----	-----------	-----------------------------

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 81 de 103

01	Trabajo en alturas	Trabajo en altura
02	Riesgo eléctrico	Energías peligrosas (LOTO)
03	Desbroces, tala y poda	Otro: cercanía a redes eléctricas (si aplica)
04	Cambio de filtro y aceite de planta	Ninguno especial (verificar otro si aplica)
05	Limpieza de equipo eléctrico	Energías peligrosas (LOTO)
06	Ejecución de obra civil	Otro: excavación (si aplica)
07	Espacios confinados	Espacio confinado
08	Lavado de tanques	Espacio confinado (si aplica ingreso)
09	Rocería	Ninguno especial
10	Fumigación, control de plagas, roedores y vectores	Otro: manejo de sustancias químicas
11	Trabajo en caliente	Trabajo en caliente

Cada formato incluye la identificación de la estación, personal ejecutor, riesgos directos asociados, pasos de la tarea con sus respectivos controles, listado de EPP requeridos y matriz de evaluación de riesgo (probabilidad × consecuencia), además del acta de legalización firmada por el técnico/trabajador de zona, el supervisor o ingeniero de zona y el responsable del SG-SST.

En la carpeta del **Anexo No.14.7 ATS generados julio 2026**, se anexa el documento: ATS por actividad.xlsx.

4.6.9. Inversiones Bolsa Ornato SST – julio 2026

Se ejecutó el suministro recarga y compra de extintores y botiquines a necesidad de las estaciones y estudios con cargo a la Bolsa de Adecuaciones Operativas, Embellecimiento y Ornato en estaciones del proyecto.

En la carpeta **ANEXO No.14.8 Bolsa SST Julio 2026**, se presenta el archivo “Detalle de Bolsa Repuesto / Adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato julio 2026”.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 82 de 103

4.6.10. SG SST

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución 0312 de 2019, y a la circular 026 de 2026, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el plazo máximo de reporte al ministerio de trabajo (que corresponde al 31-07-2026), el Consorcio OM-2025, presenta en la carpeta **Anexo No.14.9 SG SST CONSORCIO OM-2025 a Julio de 2026**, presenta los documentos: Resultados de estándares mínimos Ministerio de Trabajo 2026 y Evaluación estándares mínimos ARL SURA a 31-07-2026.

4.6.11. Entrega de menaje y elementos de aseo en estaciones primarias

En ejecución conjunta con el contratista GESTORES (NIT 901.242.927-9), se adelantó entre el 23 de julio y el 16 de julio de 2026 la entrega de menaje y elementos de aseo en 42 estaciones primarias de la red RTVC, con el objeto de garantizar el abastecimiento, distribución y verificación de dichos elementos para mantener condiciones adecuadas de limpieza, orden y funcionamiento de las instalaciones donde opera personal residente.

Estaciones cubiertas: Alguacil, Bañaderos, Bello, Boquerón, Buenavista, Calatrava, Cerro Azul, Cerro Kennedy, Cerro Neiva, Cerro Oriente, Chigorodó, El Cable, El Rosal, El Ruiz, El Tigre, Gabinete, Galeras, Itagüí, Jamundí, Jurisdicciones, La Azalea, La Enea, La Pita, La Popa, La Rumba, La Rusia, Lebrija, Leticia, Málaga, Manjui, Marinilla, Martinica, Mirador, Montería, Montezuma, Munchique, Padre Amaya, Planadas, Sabanagrande, Saboyá, San Gil, Simón Bolívar, Tasajero, Tibitóc y Versalles.

La actividad incluyó coordinación logística de distribución, entrega física de insumos con confirmación de recepción por el personal encargado, verificación del estado general de las instalaciones y registro fotográfico geolocalizado y con fecha de cada entrega, garantizando trazabilidad documental completa.

4.6.12. Entrega de sillas ergonómicas a Estudios

Se adelantó la entrega y/o reposición de sillas ergonómicas en 23 estudios de la red nacional.

Se reportó sin novedad en la mayoría de los estudios; en Mesetas y Pasto se realizó reposición de tornillería del espaldar, y en Manizales 4 sillas fueron entregadas adicionalmente a INRAVISIÓN.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 83 de 103

En la carpeta **Anexo No.14.10 Entrega sillas ergonómicas 2026**, se presenta el archivo de Actas de entrega por estación.

4.6.13. Entrega de dotación y EPPS

En julio se llevó a cabo la entrega de dotación y EPPS al personal viviente de las estaciones el cual se presenta en detalle (con registro fotográfico) en la carpeta **Anexo No.14.11 Entrega de dotación y EPPS** que incluye los registros de: Acta de entrega y registro fotográfico y Control_Inspeccion_EPP_Dotacion.

4.6.14. Plan de Evacuación Médica MEDEVAC Nacional

Se formalizó la Versión 01 del Plan MEDEVAC Nacional (código OM-2025-SST-PL-MED-001, emisión 01/07/2026), estructurado a partir del directorio nacional de IPS suministrado por el Consorcio OM-2025 y ARL SURA, con el objeto de establecer los lineamientos, responsabilidades y mecanismos de coordinación para la atención, estabilización, evacuación y traslado de personal ante emergencias médicas en cualquier frente de trabajo a nivel nacional.

Alcance	Personal propio, contratistas, subcontratistas y visitantes vinculados a las actividades del Consorcio OM-2025, en zonas urbanas y rurales
Directorio de IPS anexo	514 registros de IPS consolidados en 108 hojas/municipios o zonas de referencia
Clasificación operativa	4 niveles de evacuación: I – Atención inmediata, II – Atención prioritaria, III – Atención no urgente, IV – Consulta especializada
Procedimiento	9 pasos: proteger, alertar, evaluar, atender, ubicar, coordinar, trasladar, notificar, cerrar
Pendientes de completar	Matriz de contactos críticos (capítulo 16) y anexos 3 y 4 (rutas de evacuación por frente y cadena de llamadas), a validar por cada ubicación

El plan establece requisitos específicos para frentes remotos (identificación de IPS de referencia y alternativa, coordenadas del frente, punto de encuentro, cobertura de comunicaciones y rutas de evacuación) y contempla su revisión mínima anual, o ante cambios en frentes de trabajo, IPS de referencia, teléfonos o condiciones de operación.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 84 de 103

En la carpeta **Anexo No.14.12 MEDEVAC** se incluyen los siguientes documentos: BASE DE DATOS COMUNICACIÓN MEDEVAC NACIONAL; MEDEVAC NACIONAL CONSORCIO OM 2025 Y ANEXOS 2 Y 3 MEDEVAC CONSORCIO OM 2025.

4.7. Componente seguridad y vigilancia

Durante el mes de julio de 2026 se prestó de manera continua el servicio de monitoreo remoto 24x7 a las estaciones de radio de INRAVISIÓN, mediante la estrategia de seguridad que integra vigilancia física en sedes críticas con un sistema centralizado de video-revisión y supervisión remota. El monitoreo comprendió la verificación permanente de cámaras, sistemas de alarma, sensores, sirenas, conectividad y condiciones generales de la infraestructura, con el propósito de identificar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar la continuidad operativa de las estaciones.

Como resultado de las actividades ejecutadas, se evidenció que la gran mayoría de las estaciones monitoreadas mantuvieron condiciones normales de operación, con transmisión estable de las cámaras, sistemas de alarma operativos, conectividad disponible y ausencia de ingresos no autorizados o eventos que comprometen la seguridad de la infraestructura. Las novedades registradas corresponden principalmente a actividades de mantenimiento y adecuación ejecutadas por personal autorizado, sin representar riesgos para la operación del servicio.

En términos generales, el monitoreo permitió mantener un seguimiento permanente sobre el estado operativo de las estaciones, validar la correcta disponibilidad de los sistemas electrónicos de seguridad y generar los registros técnicos necesarios para la supervisión del contrato, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la continuidad operativa de la red de radio de INRAVISIÓN.

El detalle de las actividades realizadas, así como los registros fotográficos y evidencias de seguimiento, se encuentran disponibles en el **Anexo 15. Informe de monitoreo julio**, correspondiente al Informe de Monitoreo del mes de julio de 2026.

Con respecto a la tenencia y custodia de las llaves de las estaciones secundarias a nivel nacional se entrega base de datos actualizada, relacionada en el **Anexo 16. Consolidado de custodios y evidencia de visitas julio**.

4.8. Componente Herramienta de gestión y sistema de información (SIGMA)

Durante el mes de julio de 2026, la aplicación estuvo operando 7/24, sin que se presentará inoperabilidad, fallas o ventanas de tiempo.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 85 de 103

Por otra parte, se desarrollaron mejoras en la plataforma tecnológica especialmente en el módulo de Gestión de Procesos de Compra y Cotización en lo referente a la ampliación del tamaño de los archivos para poder cargarlos al módulo, otras actividades se enfocaron en el soporte a los usuarios, mantenimiento realizado sobre la plataforma tecnológica SIGMA como parte de la mejora continua y de acuerdo con las necesidades de la operación, solicitudes efectuadas por INRAVISIÓN, Interventoría y el Consorcio OM 2025 cumpliendo así con las obligaciones contractuales.

MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGMA	
CONCEPTO	DETALLE
Módulos	a. Visitas
	b. Administrador de usuarios
	c. Técnico
	d. Control del Proyecto
	e. PQRSD
	f. Estaciones
	g. Informes Estados Estaciones
	h. Informes Fallas/Eventos Estaciones
	i. Reportes Avance Proyecto
	j. Inventario
	k. Servicios WEB
	l. Importar Información
	m. Compras o Adquisiciones
	n. ANS y Control

Los módulos del sistema de información se encuentran en producción en la plataforma tecnológica establecida por el Consorcio OM 2025 y operando de acuerdo a las necesidades de INRAVISIÓN y con las funcionalidades establecidas en las obligaciones contractuales, a continuación se relacionan los módulos.

Imagen para ingresar a la plataforma tecnológica SIGMA.

Se actualizó el logo y el nombre de la entidad de acuerdo con el manual de marca, como se observa la siguiente imagen:



	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 86 de 103

Las opciones de las diferentes funcionalidades se encuentran denominadas de acuerdo con los numerales de las obligaciones contractuales, como se evidencia en las siguientes imágenes:

FUNCIONALIDADES SIGMA

a. Visitas Gestión solicitud acceso cerros Consorcio Planeador de visitas Registrar visita Visor de visitas Solicitud Ingreso Cerros Interventoría Gestión solicitud acceso cerros Interventoría Importador de planeación Configuraciones [a.1] ▾	d. Control de Proyecto Tableros Kanban e. PQRS Gestión PQRS Gestión PQRS RTVC Vista Visor PQRS e.1. Gestión de TICKETS (Casos) Mis tickets generados Reportar un ticket Panel de gestión general Definición de ANS Gestionar tickets básico Visor de tickets - INTERNOS Visor de tickets - EXTERNOS Configuraciones [e.1] ▾	f. Estaciones Sinistros Reporte de mantenimientos Estaciones de transmisión Generar Orden Trabajo Ordenes de Trabajo Entidad Ordenes de Trabajo Técnico Ordenes de Trabajo Eléctrico Ordenes de Trabajo Interventoría Ordenes de Trabajo Obra Civil Ordenes de Trabajo Ambiental Ordenes de Trabajo Maestro Ordenes de Trabajo Consorcio Definición de servicios Configuraciones [f.1] ▾ Bitácoras ▾ Gastos, contratos y servicios Gestión RP y CDP
--	--	---

i. Reportes de proyecto Tablero de activos Control de versionamiento j. Inventarios y Activos Configuraciones [j.2] ▾ Mantenimiento por Activo Importador de Mantenimientos Preventivos Maestro Activos Activos por responsable Reporte general de activos Ficha general de activos Confirmación existencia interna Confirmación existencia externa	k. Servicios web Cargar motor de servicios Gestión de llaves API L. Importador de Información Importador de planeación m. Compras o Adquisiciones Gestión de procesos Procesos por estado ▾ n. ANS y Control Definición ANS	z. Gestión Documental Gestión Documental Visor Documentos Configuraciones [z.3] ▾ Operación Solicitud Ingreso a Cerros Operación
---	--	---

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 87 de 103

Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con WAF (Web Application Firewall), se acordó que en el mes de octubre de 2026 se procediera a la migración y entrega del Sistema de información SIGMA a INRAVISIÓN, junto con sus programas fuentes y bases de datos:

CONCEPTO	DETALLE	ESTADO
Programas Fuentes	Entrega Final	Pendiente
Licencias de uso	Entrega Final	Pendiente
Transferencia de la aplicación y bases de datos	Entrega Final	Pendiente

A. Desarrollo y Optimización de la Plataforma Tecnológica (SIGMA)


En el siguiente cuadro se puede observar las 68 actividades de optimización a la plataforma Tecnológica SIGMA para la versión 26.7 realizadas como mejora, mantenimiento de la aplicación, así:

ELEMENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
CONFIGURACION	2	3%
INFORME	9	13%
EVENTO	10	15%
FORMULARIO	47	69%
TOTAL	68	100%

Ver detalle anexo *MANTENIMIENTOS PLATAFORMA TECNOLÓGICA JULIO 2026*

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de participación de las modificaciones o mejoras por cada una de las funcionalidades de la plataforma tecnológica SIGMA.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 88 de 103

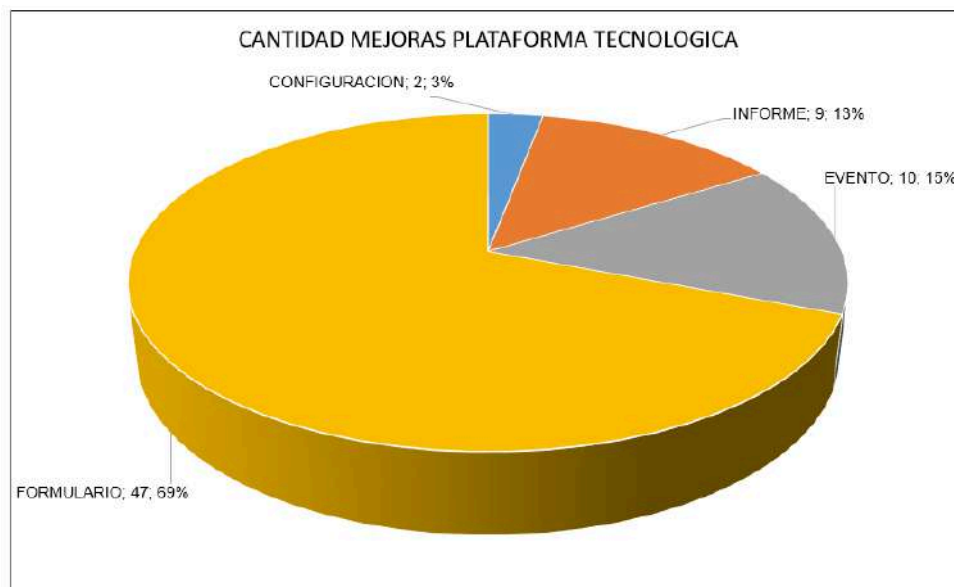

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de participación de las modificaciones o mejoras por cada una de las funcionalidades de la plataforma tecnológica SIGMA.

FUNCIONALIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE
Eliminar Factura	22	32%
Orden de Trabajo	13	19%
Generar TICKET	12	18%
N/A	12	18%
Servicios y contratos - Movimiento	7	10%
Ordenes de Trabajo Consorcio	1	1%
Ordenes de Trabajo Entidad	1	1%
TOTAL	68	100%

De la anterior cuadro se puede indicar que:

Mayor Volumen de Actividad: El formulario "*Eliminar Factura*" destaca como el más activo con 22 registros, con un 32% de participación de las modificaciones o mejoras.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 89 de 103

Le sigue “*Orden Trabajo*” con 13 registros, con un 19% de participación de las modificaciones o mejoras.

Módulo de Inventarios:

En el desarrollo de nuestras actividades como Consorcio OM 2025, y específicamente en el seguimiento a los inventarios de la parte técnica en las estaciones tanto primaria como secundarias, estaciones de radio nos permitimos informar que se efectuó verificación física de los elementos que se encontraban en cada una de las estaciones incluido el CAN, indicando su estado y verificando si correspondía a equipos “*NUEVOS*” que no se encontraban inventariados.

Donde la metodología presentada por el Consorcio OM 2025 está diseñada de la siguiente manera, lo primero es la verificación física de los activos que se encuentran con placa de inventario o no, ya sea que esta se encuentre con placa prediseñada, deteriorada o escrita manualmente con un sharpie.

Después se efectúa una comparación de la información entre lo encontrado físicamente y el listado de activos suministrado por RTVC / INRAVISIÓN (Sistema de Medios Públicos)

Para luego efectuar una conciliación de los elementos encontrados frente al reporte suministrado por RTVC, RTVC / INRAVISIÓN (Sistema de Medios Públicos) para posteriormente presentar el estado de los inventarios recabados en las estaciones establecidas contractualmente.

Como parte, de la metodología se procedió a crear un equipo multidisciplinario para corroborar la primera validación de los bienes de cada una de las estaciones, con el ánimo de garantizar que los activos de los elementos técnicos utilizados en la estación sean efectivamente los evidenciados físicamente.

Así mismo se estableció una metodología con un nemotécnico para identificar aquellos activos que por algún motivo no tienen placa el cual consta de tres partes así:

NTP: No Tiene Placa

001; Código de la estación

001; un consecutivo para los números de activos que no tienen placa así:

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 90 de 103

ESTACION	CODIGO PARA PLACA
SABANAGRANDE	NTP-002-001
LAPOPA	NTP-001-001
LAPITA	NTP-047-001
SAN MARCOS	NTP-251-001

Una vez aplicada la metodología de levantamiento de información de los inventarios nos permitimos presentar un informe que con consolidado del inventario de los activos asociados a las estaciones de la red de radiodifusión sonora y de televisión pública operada por RTVC / INRAVISIÓN (Sistema de Medios Públicos). El documento desagrega por cada estación, identificando la composición de los activos, su ubicación, estado físico y administrativo, los servicios que presta, su cobertura estimada, el espacio para la evidencia fotográfica y de manera específica, la situación de las estaciones siniestradas.

Es importante indica que este inventario está sujeto a una conciliación con la entidad con el ánimo de cotejar aquellas diferencias que se pudieran presentar, dada la dinámica de la entidad, y de acuerdo a la depuración que se vaya efectuando, así como ajustes por movimientos o traslados y otros eventos que se puedan presentar.


Por lo anterior, se efectuó el cargue de datos de inventario levantado de las estaciones, así como las imágenes del número de la placa de los activos que fue registrado en este módulo, al corte del 31 de Julio de 2026 se tiene los siguientes datos:

INVENTARIOS			
INFORMACION EN SIGMA			
ESTACIONES	TOTAL IMÁGENES CON PLACA	TOTAL PLACAS SIN IMAGEN	TOTAL REGISTROS
307	15,655	215	15,870

* Incluidos los Inventarios de 3 estaciones siniestradas y la Bodega del Consorcio OM 2025

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 91 de 103

En la siguiente gráfica se puede evidenciar el comportamiento de la información semana a semana de los inventarios en el sistema de información SIGMA, así:

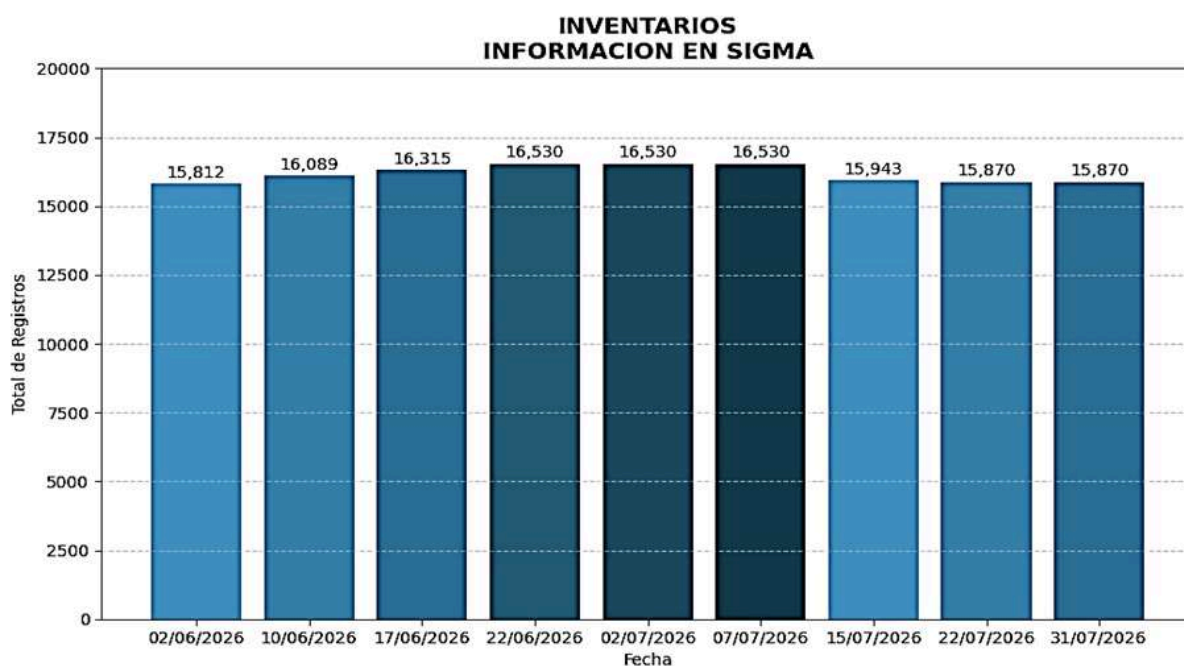

En el siguiente cuadro se muestra como esta la distribución de los inventarios por tipo de estación, así:

TIPO ESTACION	CANTIDAD
Estación Primaria Analógica + Radio + TDT	3,556
Estación Secundaria Analógica	2,790
Estudio Radio	2,736
Estación Secundaria TDT	1,317
Estación Secundaria Analógica + TDT	1,061
Estación Secundaria Analógica + Radio + TDT	755
CAN	733
Estación AM	665
Estación Secundaria TDT (Con G.E)	469
Estación Secundaria Analógica + TDT (Con G.E)	445
Estación Secundaria Analógica + Radio	334
Estación Primaria Analógica + TDT	329
Estación de Radio + Estudio de Radio	279
Estación Secundaria Analógica + Radio + TDT (Con G	187
Estación Primaria TDT	161
ALMACEM OM2025	30
Estación Secundaria Repetidora TDT	23
Total general	15,870

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 92 de 103

Del análisis de la información almacenada en la base de datos del sistema de información SIGMA se puede identificar lo siguiente:

Del total de inventarios registrados a la fecha se evidencia su distribución de acuerdo al tipo de estación así:




En la anterior imagen se puede observar que de los 15.870 activos están distribuidos así: 4.711 que corresponden al 30% de elementos en las 45 estaciones primarias y 10.396 activos corresponden al 65%, el nodo CAN cuenta con 733 elementos para un 5%; en las 307 incluidas 3 estaciones estaciones siniestradas y el almacén del Consorcio OM 2025 con un porcentaje del 1%, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los valores donde se evidencia que la mayor concentración de activos se encuentra en las estaciones secundarias, así:

TIPO ESTACION	
PRIMARIAS	4,711
SECUNDARIAS	10,396
NODO CAN	733
ALMACEN OM	30
TOTAL GENERAL	15,870

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 93 de 103

En la siguiente gráfica se registra las estaciones que tiene más de 100 activos donde se puede establecer que la mayor cantidad de elementos del inventario se encuentran en la estación del CAN, le sigue Marinilla, continuando con Martinica y las demás como se observa a continuación:

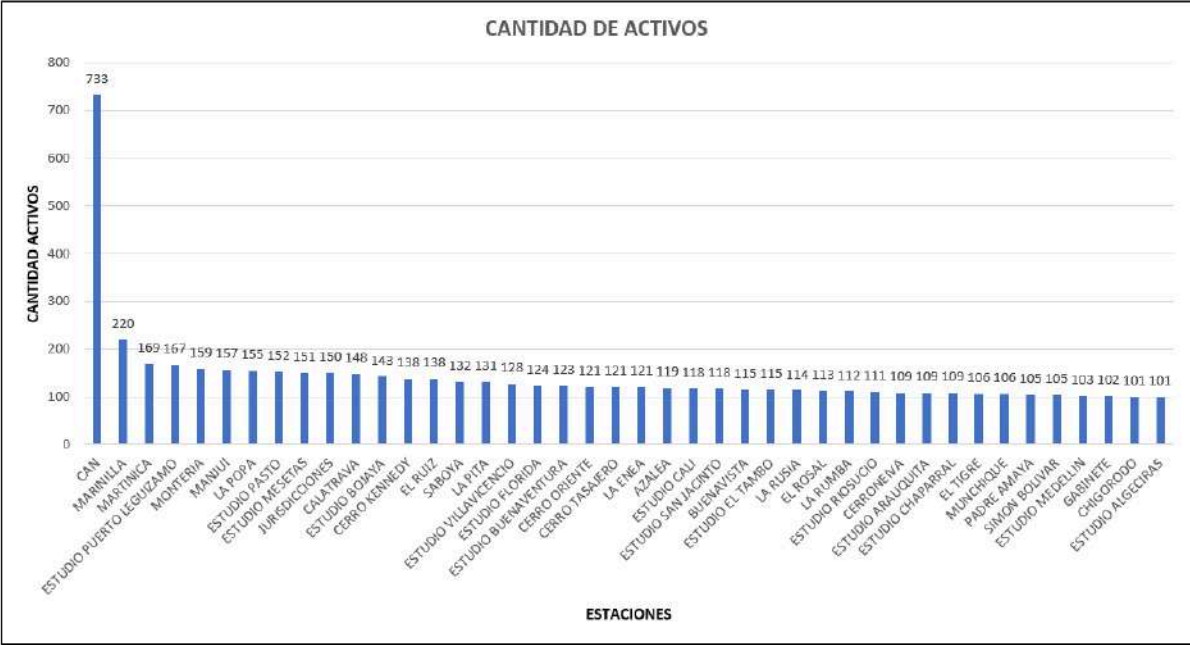

Se mantiene la estrategia para la depuración y generación de identificación de activos por medio del nemotécnico aprobado por la entidad.

El Consorcio OM 2025, presenta un informe con corte al 21 de julio de 2026 con el estado de cada una de las estaciones, cuyo propósito es servir como soporte técnico para la gestión, el control y el saneamiento de los activos de la Entidad, facilitando la trazabilidad documental frente a los entes de control, la planeación del mantenimiento y la toma de decisiones sobre reposición, baja o modernización de la infraestructura.

Este informe del estado de los activos se envía como un anexo denominado *Informe Inventario Estaciones RTVC* y su respectiva tabla con la información fuente tomada de SIGMA con corte al 21 de julio de 2026, denominado *Activos inventario Estaciones 21072026*

Traslado de elementos (ACTIVOS) de inventarios entre estaciones

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 94 de 103

Para el mes de julio de 2026, no se evidencio traslado de bienes o elementos entre estaciones.

- **Módulo de Bitácoras:**

- Se cargaron en el sistema de información SIGMA, para el mes de Julio de 2026 un total de 1.421 Bitácoras, es importante anotar que la estación del Nazareth (Guajira) comenzó a cargar bitácoras a partir del 6 de julio de 2026.
- Se efectuaron cargue de bitácoras desde las 45 estaciones primarias más la estación de Nazareth, como se observa en la siguiente imagen:

BITACORAS	
FECHA CORTE	CANTIDAD
31 DE JULIO DE 2026	1,421

*** 1 A 30 DE JULIO 2026**

- **Módulo de Tiquetes (Casos):**

- Se encuentra en producción los tickets o casos internos y externos, se está utilizando por las personas de INRAVISIÓN, Interventoría, la mesa de ayuda, los coordinadores de procesos e ingenieros del Consorcio OM 2025.

Se efectuaron ajustes de acuerdo con la áreas correspondiente como son: Eléctrico, Civil, Ambiental o Técnica.

- Se confirmó que la asignación automática de responsables al elegir una tipología de caso es posible mediante la gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

Para el periodo objeto de evaluación se tiene los tickets gestionados así:

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 95 de 103

ESTADO	CANTIDAD
EnEspera aprobación OT INTERVENTORIA	160
Cerrado	130
Asignado	119
EnEspera aprobación OT ENTIDAD	53
EnEspera aprobación cierre INTERVENTORIA	8
En cotización	2
Cancelado	1
EnEspera aprobación cierre ENTIDAD	1
Total general	474

B. Creación de Usuarios

Se dio cumplimiento a las solicitudes de creación de usuarios para el acceso a la plataforma, para el corte a julio de 2026, se cuenta con 233 usuarios, distribuidos así:

OPERADOR	CANTIDAD
Consorcio OM-2025	160
RTVC	56
INTERVENTORIA	15
Contraloría General de la República	2
Total general	233

4.9. Bolsa de productos y servicios

4.9.1. Bolsa integral de repuesto, equipos nuevos y alquiler

Para el mes de julio se realiza la ejecución y finalización de nueve (9) actividades aprobadas por medio de los siguientes Tickets:

Ticket	OT	ID	Estación	Descripción	Valor Total
1493	1134	30	BUENAVISTA	Reparacion TX EGATEL - ATV SC	10.605.875
804	1031	33	BAÑADEROS	Mtto correctivo para equipotencializar todo el SPT, dejando medidas bajo recomendación de los estándares por la normativa	46.594.783
1488	1128	157	CRUZ VERDE	Cambio de baterías UPS Eaton 75 kVA	68.790.568

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 96 de 103

2419	1419	44	LEBRIJA	ATENCIÓN DE EMERGENCIA, EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA	54.446.320
820 821	1641	31	GABINETE	Correctivo a planta Perkins y planta Cummins	16.218.712
2935	1737	1	MARINILLA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	32.895.706
3125	1857	343	CENTRO HISTÓRICO	Suministro de elementos consumibles Suministro y transporte de elementos necesario de la estación Estudio Centro Histórico	10.181.152
2425	1557	8	CAN	Suministro de elementos consumibles 5 Kit Internet Satelital Starlink Estandar V4 Servicio de conectividad para itinerante Ilimitado hasta 30 MB/s de manera mensual (7 meses x 5 equipos) 4 Panel Solar Portátil PS-220W de 220w Paneles solares portátiles Potencia 220W ISC lado delantero 12.4A, Lado trasero 11.8 A VOC 21.5V IMP Lado delantero	43.212.708
427	858	8	CAN	Suministro de filtros consumible 2 filtros C-Band PLL LNB Norsat	6.065.335
Total					289.011.159

Adicionalmente se realizó el suministro de equipos requeridos por gestión de señales como Ecoflow e intercoms Holly Land y filtros NORSAT para el CAN, se tramita ingreso de activos por medio de formato de ingreso de equipos al inventario.

Ticket	OT	ID	Estación	Descripción	Valor Total
2425	1557	8	CAN	Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima X Boost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8E0288 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	3.568.572
2425	1557	8	CAN	Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima X Boost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8E0289 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	3.568.572
2425	1557	8	CAN	Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima X Boost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de	3.568.572

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 97 de 103

				energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8C1554 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	
2425	1557	8	CAN	Generador o Estación Energía Silenciosa RIVER 2 PRO (Potencia máxima X Boost 1600W) Capacidad de 800W o 800Wh Estaciones de energía RIVER Marca ECOFLOW serie: R621ZA16XH8C1552 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	3.568.572
2425	1557	8	CAN	Generador o Estación Energía Silenciosa DELTA 2 MÁX (Potencia máxima X Boost 3400W) Capacidad 2000W o 2000Wh Estaciones de energía DELTA Marca ECOFLOW serie: R351 ZABAPH141783 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	8.739.360
2425	1557	8	CAN	Panel Solar Portátil PS-400W de 400w Paneles solares portátiles Potencia 400W ISC 11A VOC 48V IMP8A VMP 41V Eficiencia 22,60% Tipo de celdas Silicio Marca ECOFLOW serie: OS13Z11ALJ3G0537 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	4.369.537
2425	1557	8	CAN	HOLLYLAND Full-Duplex Wireless DECT Intercom System with 8 Headsets (1.9 GHz) Marca HOLLYLAND serie: 45524323SLC Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	20.230.000
2425	1557	8	CAN	HOLLYLAND Full-Duplex Wireless DECT Intercom System with 8 Headsets (1.9 GHz) Marca HOLLYLAND serie: 45524322QAZ Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	20.230.000
2425	1557	8	CAN	HOLLYLAND Full-Duplex Wireless DECT Intercom System with 8 Headsets (1.9 GHz) Marca HOLLYLAND serie: 45524322466 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 2425 / OT 1557	20.230.000
427	858	8	CAN	C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: N22618-00000153 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	5.390.825
427	858	8	CAN	C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: N22618-00000224 Estación	5.390.825

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026		Versión: No. 01
			Emisión: 06/09/2025
			Página 98 de 103

				RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	
427	858	8	CAN	C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: 2412-N22618-00422 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	5.390.825
427	858	8	CAN	C-Band PLL LNB Norsat Marca NORSAT serie: 2412-N22618-00245 Estación RTVC-CPS-2218-2025 - 8 CAN TICKET 427 / OT 858	5.390.825
Total					109.636.485

Detalle de las actividades realizadas se encuentra en el **Anexo 17. Informe de actividades de Bolsa Integral de Repuestos julio** y detalle de acuerdo a **Anexo 19. Detalle de Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato julio**.

4.9.2. Bolsa suministro de acpm y transporte

En el marco de las actividades desarrolladas, únicamente se realizó uso de la bolsa de ACPM y transporte, de acuerdo con la certificación contenida en el **Anexo 18. Certificación de Combustibles – julio**, por un valor total de \$140.830.690, correspondiente al suministro de combustible para la operación de las plantas eléctricas y el transporte a locaciones remotas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Este consumo se efectuó en cumplimiento de las obligaciones contractuales y bajo los lineamientos técnicos establecidos por INRAVISIÓN y el Consorcio OM 2025.

Cabe recalcar que fue necesario el cargue constante de combustible en la estación Primaria de Bañaderos y en la estación secundaria de TDT Ambalema ya que estas se encuentran operando 100% con planta eléctrica.

Detalle de acuerdo a **Anexo 19. Detalle de Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato julio**.

4.9.3. Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato

Durante el mes de julio, se realizaron intervenciones en el componente ambiental que afectan la bolsa de adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato.

En cuanto a las actividades de ornato y embellecimiento:

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 99 de 103

- Se realiza ejecución de 7 intervenciones de adecuaciones locativas que afectan bolsa, desarrolladas por el componente civil.
- Se realizaron aseos en 31 estudios de radio con periodicidad semanal.
- Ejecución de 22 estaciones secundarias en las que se intervino rocería, embellecimiento, limpieza de TVRO y arreglo menores como reparación de ventanería, chapas y rejas.
- Se finaliza y se relaciona en las actividades de ornato del mes de julio la ejecución de talas y podas en las estaciones de 24 Montería, 76 La Ceja y 144 Silvia, adicionalmente se realizó el despeje de la vía con maquinaria amarilla para el acceso de la estación Gabinete.
- Se efectuó la ejecución de jornadas de control de vectores y fauna ponzoñosa en 21 locaciones, atendiendo a los requerimientos técnicos y condiciones particulares identificadas en cada punto de la red.
- Se consolidó la gestión de residuos peligrosos mediante la disposición final de 747,31 kg de RESPEL en 14 estaciones; de forma complementaria, se tramitó el cobro por el manejo de desechos en la estación El Nudo, Nuevo Colón y los estudios de Valledupar y Codazzi, actividades derivadas de la fase operativa ejecutada durante el primer bimestre del año con un peso de 66,5 Kg para un total general de 813,81 Kg.
- Recarga de extintores y reposición de elementos SST en 8 estaciones secundarias.

Detalle de acuerdo a **Anexo 19. Detalle de Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato julio.**

5. CONCLUSIONES

5.1. Evaluación global de los componentes

La evaluación integral de la gestión desarrollada durante julio de 2026 evidencia un desempeño satisfactorio en el cumplimiento de las actividades programadas y una adecuada articulación entre los diferentes componentes técnicos, eléctricos, civiles, ambientales, administrativos y de seguridad industrial.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 100 de 103

El componente técnico mantuvo un alto nivel de ejecución del programa de mantenimiento preventivo y fortaleció la atención de eventos correctivos que permitieron recuperar servicios estratégicos en diferentes regiones del país. Paralelamente, el componente eléctrico presentó una mejora en el estado general de la infraestructura, resultado de las intervenciones ejecutadas sobre sistemas de respaldo energético, plantas eléctricas, UPS y sistemas de climatización.

El componente CAN conservó condiciones óptimas de operación, garantizando la continuidad de los servicios críticos mediante la ejecución permanente de actividades de mantenimiento y operación. Los componentes ambiental, SST y seguridad y vigilancia mantuvieron el cumplimiento de los requisitos contractuales, destacándose el cumplimiento total de la gestión RESPEL, las actividades de capacitación, inspecciones de seguridad y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La plataforma SIGMA continuó consolidándose como herramienta de soporte para la gestión operativa, fortaleciendo la trazabilidad de las actividades desarrolladas, el control documental y el seguimiento de indicadores.

En términos generales, la ejecución del contrato presenta una evolución favorable, evidenciando mejoras progresivas en la confiabilidad de la infraestructura y en la recuperación de servicios, aunque persisten factores externos y condiciones pre existentes que limitan el cumplimiento pleno de algunos indicadores de disponibilidad.

5.2. Puntos críticos identificados

Durante el periodo evaluado se identificaron los siguientes aspectos que continúan representando los principales factores de riesgo para la operación de la red:

- Persistencia de estaciones secundarias analógicas y TDT fuera de servicio debido a daños en transmisores, amplificadores de potencia, receptores satelitales, sistemas radiantes y equipos con alto grado de obsolescencia tecnológica.
- Estaciones que continúan sin suministro de energía comercial, con acometidas pendientes de normalización o afectadas por restricciones administrativas y técnicas.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 101 de 103

- Fallas recurrentes en sistemas de respaldo energético, principalmente plantas eléctricas, UPS, bancos de baterías y sistemas de transferencia automática, especialmente en estaciones remotas.
- Deterioro de infraestructura física y de sistemas de climatización que ocasionan condiciones de operación restringida y afectan la confiabilidad de los equipos de transmisión.
- Persistencia de estaciones siniestradas, vandalizadas o con restricciones de acceso derivadas de condiciones de orden público, limitaciones logísticas o imposibilidad de ingreso por vías terrestres y fluviales.
- Necesidad de reposición de equipos cuya vida útil ha sido superada y cuyos fabricantes ya no suministran soporte técnico o repuestos, dificultando la recuperación definitiva de algunos servicios.

Estas condiciones continúan impactando el indicador global de disponibilidad y requieren intervenciones estructurales, inversiones adicionales y decisiones administrativas por parte de la entidad para su solución definitiva.

5.3. Grado de cumplimiento de requisitos

Durante el mes de julio de 2026 el Consorcio OM 2025 dio cumplimiento a las principales obligaciones contractuales establecidas para la administración, operación y mantenimiento de la red nacional de estaciones de INRAVISIÓN.

Se ejecutaron las actividades programadas de mantenimiento preventivo y correctivo conforme al plan operativo aprobado, garantizando la atención permanente de la infraestructura técnica y eléctrica, la operación continua del CAN, la gestión documental mediante la plataforma SIGMA y el seguimiento integral de los indicadores contractuales.

Asimismo, se evidenció el cumplimiento de las actividades asociadas a la Resolución 040 de 2026, destacándose el cumplimiento de la meta de disponibilidad del servicio TDT, la ejecución progresiva de las estrategias de estabilización eléctrica y el cumplimiento del 100 % de las actividades programadas para la gestión ambiental de residuos peligrosos.

No obstante, el cumplimiento de algunos indicadores de disponibilidad continúa condicionado por situaciones preexistentes al inicio del contrato, entre ellas estaciones siniestradas, infraestructura obsoleta, falta de energía comercial, restricciones de acceso y eventos de vandalismo, condiciones que exceden el

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 102 de 103

alcance operativo del Consorcio y requieren intervenciones estructurales o decisiones administrativas por parte de INRAVISIÓN.

En consecuencia, se concluye que el contrato mantiene un nivel satisfactorio de ejecución técnica, administrativa y operativa, evidenciando una mejora progresiva en la confiabilidad de la red y en la recuperación de servicios, manteniendo la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del alcance establecido.

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-DG-01
	INFORME DE SEGUIMIENTO No.12 Julio de 2026	Versión: No. 01
		Emisión: 06/09/2025
		Página 103 de 103

ANEXOS

- Anexo 1. Informe de Gestión – julio 2026
- Anexo 2. Informe de estado de la infraestructura eléctrica julio 2026
- Anexo 3. Entregables Resolución 040 - julio 2026
- Anexo 4. Cronograma Visitas julio
- Anexo 5. Servicios Recuperados Estaciones julio
- Anexo 6. Control PQRS julio 2026
- Anexo 7. Soportes actividades Energía julio
- Anexo 8. Resumen de actividades julio energía
- Anexo 9. Cronograma julio CAN
- Anexo 10. Soportes actividades CAN julio 2026
- Anexo 11. Soporte de actividades civiles julio
- Anexo 12. Informe Gestión Ambiental julio 2026
- Anexo 13. Soportes de gestión Ambiental - julio 2026
- Anexo 14. Soportes de gestión SST - julio 2026
- Anexo 15. Informe de monitoreo julio
- Anexo 16. Consolidado de custodios y evidencia de visitas - julio 2026
- Anexo 17. Informe de actividades de Bolsa Integral de Repuestos julio 2026
- Anexo 18. Certificación de Combustibles – julio
- Anexo 19. Detalle de Bolsa adecuaciones operativas, embellecimiento y ornato julio
- Anexo 20. Certificación custodios julio 2026
- Anexo 21. Certificación operarios estaciones principales julio
- Anexo 22. Resumen de actividades correctivas julio
- Anexo 23. Ejecución presupuestal contrato NO 2218-2025 31 julio 2026
- Anexo 24. Soportes sistema de información
- Anexo 25. Ingreso de activos Julio 2026
