

Medellín, 01 de septiembre 2026

1300 2634

Señor:
Juan Diego Aguirre Londoño
Director de Desarrollo Físico Gobernación de

Radicado: R 2026010591343

Fecha: 02/09/2026 11:28:14.0

Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero Juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y trámite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260029 lote # 5 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.


Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- febrero de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 1 - pág. 1- 12
- Anexo USB Informe No 1
- marzo de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 2 – pág. 13-28
- Anexo USB Informe No 2
- abril de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 3 - pág. 29-44
- abril de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 3 - pág. 45-59
- Anexo memoria USB informes No 3
- mayo de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 4 - pág. 60-76
- mayo de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 4 - pág. 77-91
- Anexo memoria USB informes No 4
- junio de 2026 corredor pueblo Rico San José Andes Informe No 5 - pág. 92-108
- junio de 2026 corredor salgar-la quiebra-concordia No 1- pág. 109- 124
- junio de 2026 corredor Valparaíso Támesis Informe No 5 - pág. 125-139
- Anexo memoria USB informes No 5 y No 1


Recibí
[Firma]
02.09.2026
11:00 am

ARCHIVO SIT
2026 SEP 15 15:32:14

Cordialmente



CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Duberney Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Rentan

Interventoría técnica, administrativa, ambiental,
financiera y legal al contrato de actividades de
mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de
las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del
Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



**INFORME MENSUAL SST
INTERVENTORIA No. 01**

**GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA**

Secretaría de
Infraestructura Física

**CONTRATO DE OBRA
No. 2500111B2824 de 2025**


Mejoramiento y mantenimiento
para la estabilización de las vías en la
Subregión Suroeste (Lote 5)
a cargo del Departamento
Antioquia.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 20260029 2025**

Interventoría técnica,
administrativa, ambiental,
financiera y legal al contrato de
actividades de mejoramiento y
mantenimiento para la
estabilización de las vías en la
Subregión Suroeste (Lote 5) a
cargo del Departamento
Antioquia.

FEBRERO DE 2026

**INTERVENTORÍA: SADING
GROUP S.A.S**

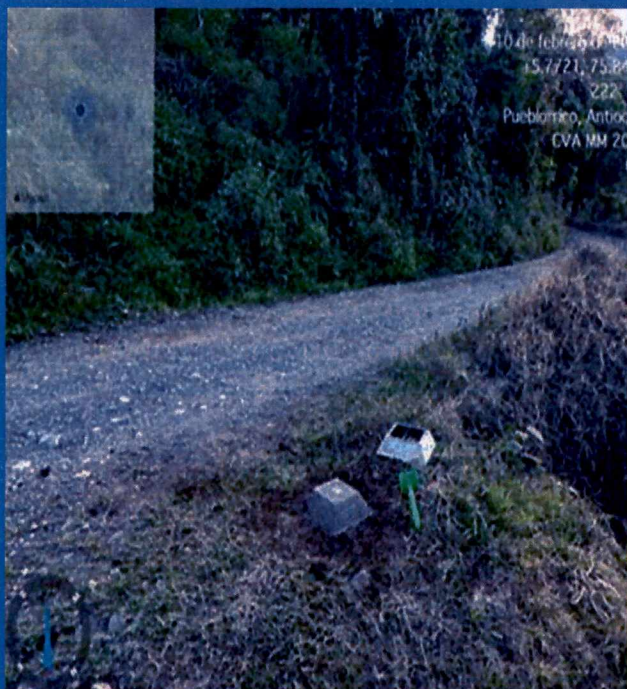



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 01

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25
CONTRATO DE OBRA N°	LC-16787
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA	SADING GROUP S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20260029
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
PERIODO	FEBRERO DE 2026

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría	Dubia Barragán Reyes	Febrero 2026	001
REVISÓ	Director de interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST Rentan			

Recibe SIF José David Jimenez

Supervision SST
protección SST

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	ALCANCE.....	5
2.2.	CORREDORES VIALES ESPECÍFICOS (LOTE 5)	5
2.3.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	5
2.4.	REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SUROESTE	6
3.	OBJETIVOS	7
3.1.	OBJETIVO GENERAL	7
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9
4.1.	LOCALIZACIÓN SUBREGIONES DE SUROESTE ANTIOQUEÑO:.....	9
4.2.	ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:	9
4.3.	SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.....	11
4.4.	Señalización Vial y Elementos en obra.	11
	Esta actividad se debe realizar por parte del del contratista de forma constante y de acuerdo al avance del proyecto.	11
5.	INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	12
5.1.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
5.2.	INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA.....	13
6.	LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO	14
7.	LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA	15
8.	ACCIONES A EJECUTAR CORRESPONDIENTES AL SUBPROGAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.....	16
9.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.....	20
9.1.	ANÁLISIS.....	20
9.2.	EVALUACIÓN.....	20
10.	CONCLUSIONES	21
11.	RECOMENDACIONES.....	22
12.	ANEXOS DOCUMENTALES CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25/INTERVENTORIA SADING GROUP SAS.....	23



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de ejecutar el **mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia**, se suscribió el Contrato de Obra No. 2500111B2824 de 2025 entre la Gobernación de Antioquia y el CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025, cuyo objeto corresponde a la ejecución de las **actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 5 – Suroeste)**.

De igual manera, el 05 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 20260029 entre RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y la empresa SADING GROUP S.A.S., cuyo objeto es **la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal** del contrato de obra para la ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento en la subregión Suroeste (Lote 5), a cargo del Departamento de Antioquia.

El presente informe tiene como propósito describir las actividades ejecutadas y el estado de cada frente de obra, abarcando los componentes técnicos, administrativos y financieros, así como un resumen de las gestiones ambientales y sociales desarrolladas en el marco del proyecto.

Adicionalmente, se presentan las principales dificultades y/o novedades registradas durante el periodo reportado, junto con las acciones implementadas por la Entidad Contratante, el Contratista y la Interventoría.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	---	--

2. ALCANCE

El alcance específico para la subregión del Suroeste (identificada como el Lote 5 en el proceso de contratación) es el siguiente:

2.1. EXTENSIÓN Y OBJETIVOS EN EL SUROESTE

Longitud a intervenir: Se tiene proyectada la intervención de 68,26 km, lo que representa el 7% del total de la red vial a cargo del departamento en esta subregión. Municipios beneficiados: La subregión está conformada por 23 municipios, entre ellos Amagá, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín, Jericó, Salgar, Támesis, Tarso, Urrao y Venecia.

Objetivo técnico: Realizar el mantenimiento de corredores de Bajo Volumen de Tránsito (LVR) utilizando técnicas de estabilización de suelos con cemento o cal, en lugar de la recarga tradicional con materiales granulares.

2.2. CORREDORES VIALES ESPECÍFICOS (LOTE 5)

El proyecto detalla los tramos exactos de intervención en el Suroeste y el tiempo estimado de obra para cada uno:

- Abejorral – Santa Bárbara: Plazo de obra de 4 meses.
- Titiribí – Armenia: Plazo de obra de 8 meses.
- Salgar – La Quebra – Concordia: Plazo de obra de 10 meses.
- Valparaíso – Támesis: Plazo de obra de 12 meses.
- Andes – San José – Pueblorrico: Plazo de obra de 12 meses.

2.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las siguientes obras o actividades:

PRODUCTO LOTES 5:

- Realizar estudio de caracterización del suelo de subrasante, material superficial y diseño de la formula trabajo de la estabilización siguiendo la normativa vigente del INVIAS
- Construcción de Alcantarillas
- Construcción de Cunetas
- Construcción de Bordillos
- Construcción de Filtros para Cunetas
- Construcción de Disipadores
- Construcción Estabilización con Material Granular
- Construcción de una superficie de rodadura en tratamiento superficial doble.



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



- Construcción Señalización vial

2.4. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SUROESTE

Para la ejecución en esta zona, el contratista debe garantizar:

Frentes de trabajo: Como mínimo dos (2) frentes de trabajo realizando actividades de estabilización, más un frente adicional para actividades complementarias.

Personal clave: Un Director de Obra dedicado por 12 meses y dos profesionales del área social (uno por 8 meses y otro por 12 meses). Cada tramo específico deberá contar con su propio Residente de Obra, Residente Ambiental, Residente SST, Topógrafo y Profesional de Calidad.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	---	--

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento mediante la técnica de estabilización de suelos en las vías a cargo del Departamento de Antioquia (específicamente en los tramos asignados al Suroeste), con el fin de garantizar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad de la subregión bajo criterios de sostenibilidad técnica y económica.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Técnicos y Operativos:**

Ejecutar la estabilización de la estructura de la vía utilizando materiales químicos (cemento o cal) según el diseño de mezcla establecido para los tramos del Suroeste.

Aplicar una superficie de rodadura mediante doble riego asfáltico para proteger la base estabilizada y mejorar el confort del tránsito.

Intervenir y mantener las obras de drenaje (cunetas y alcantarillas) para asegurar la evacuación de aguas y prolongar la vida útil de la calzada.

Garantizar la correcta señalización horizontal y vertical de los corredores intervenidos para mejorar la seguridad de los usuarios.

- **Socio-Ambientales y de Seguridad:**

Implementar el Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) exigido por la Gobernación de Antioquia.

Mitigar los impactos ambientales y sociales negativos que puedan surgir durante la ejecución de las obras en los municipios beneficiados.

Garantizar la seguridad física y la salud de los trabajadores y comunidades aledañas mediante el cumplimiento estricto de la normativa de riesgos laborales.

- **Administrativos y de Información:**

Cumplir con los plazos de ejecución establecidos para cada tramo (que oscilan entre 4 y 12 meses según el corredor).



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026




Realizar el inventario y caracterización técnica de las vías intervenidas para alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Secretaría de Infraestructura Física.

Estos objetivos están alineados con el propósito del Lote 5 del contrato, que busca una solución más duradera que el mantenimiento tradicional en una de las regiones con topografía más exigente del departamento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la ejecución de intervenciones de mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo en corredores viales estratégicos del Suroeste de Antioquia. A diferencia del mantenimiento rutinario tradicional, esta iniciativa se centra en la estabilización físico-química de suelos para transformar vías de afirmado (tierra) en corredores con una estructura más resistente y duradera, mejorando la competitividad agrícola y turística de la región.

4.1. LOCALIZACIÓN SUBREGIONES DE SUROESTE ANTIOQUEÑO:

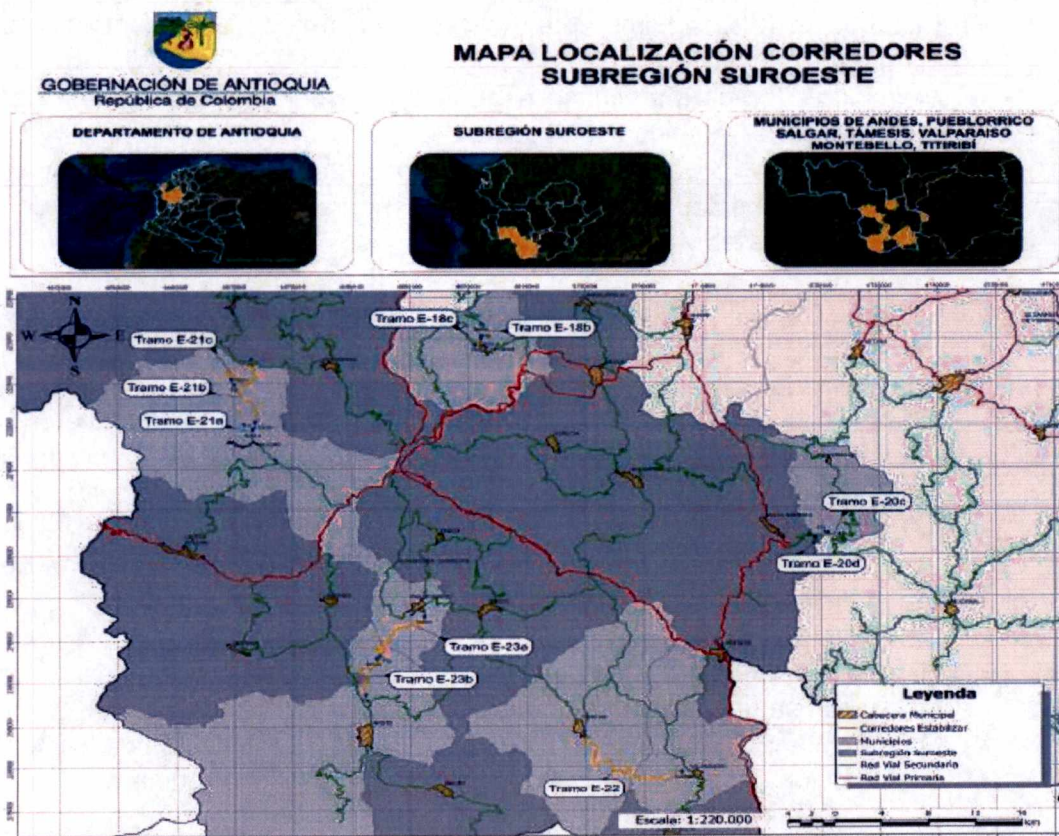

4.2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

1. Actividades Preliminares y de Soporte Localización y Replanteo:

- Definición técnica de los ejes viales y áreas de intervención exacta según los planos.



- Gestión Socio-Ambiental y SST: Implementación de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto incluye la señalización preventiva de obra y la protección del personal y la comunidad.
 - Caracterización de Suelos: Ensayos de laboratorio para determinar si la estabilización se hará con cemento o con cal, dependiendo de la plasticidad y humedad del terreno.
2. Estabilización de la Subrasante o Afirmado es la actividad principal del proyecto. El alcance incluye:
- Escarificación y Homogeneización: Se disgrega el material existente en la vía (suelo o afirmado).
 - Distribución del Conglomerante: Aplicación controlada de cemento o cal sobre el material escarificado.
 - Mezclado: Uso de maquinaria especializada (recicladora o motoniveladora) para integrar el químico con el suelo.
 - Compactación: Nivelación y compactación con rodillo vibratorio hasta alcanzar la densidad máxima permitida, asegurando que la vía no se deforme con el peso de los vehículos.
3. Tratamiento de Superficie (Rodadura) una vez estabilizada la base, se protege con:
- Imprimación: Aplicación de una emulsión asfáltica que penetra en la base estabilizada para sellarla.
 - Doble Riego Asfáltico: Aplicación de dos capas de ligante asfáltico intercaladas con agregados pétreos (gravilla). Su alcance es proporcionar una superficie impermeable, mejorar la tracción y eliminar el polvo.
4. Obras de Drenaje y Manejo de Aguas Dado que el Suroeste es una zona de alta pluviosidad, el alcance incluye:
- Limpieza y Reconstrucción de Cunetas: Asegurar que el agua de lluvia no se empoce ni sature la estructura de la vía.
 - Mantenimiento de Alcantarillas: Limpieza de obras transversales existentes y construcción de cabezales o extensiones si el diseño lo requiere.
5. Señalización y Seguridad Vial
- Demarcación Horizontal: Pintura de líneas centrales y de borde con materiales retro reflectivos.
 - Señalización Vertical: Instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas.
 - Hitos y Defensas: Instalación de elementos de protección en zonas de abismos o curvas peligrosas.
6. Gestión de Información (SIG)

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

- Levantamiento Post-Obra: Recolección de coordenadas y datos técnicos de la vía finalizada para alimentar el Sistema de Información Geográfica de la Gobernación de Antioquia.

4.3. SEÑALIZACIÓN VIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

1. La señalización se define como un componente esencial para garantizar una circulación segura y fluida, reduciendo accidentes en zonas de intervención. Los puntos clave son:

- Implementación Obligatoria: El contratista debe suministrar, transportar e instalar tanto señalización vertical (preventivas, reglamentarias e informativas de 75x75 cm) como demarcación horizontal con pintura acrílica reflectiva y microesferas de vidrio.
- Señalización de Obra: Es responsabilidad absoluta del contratista colocar y mantener vallas informativas, iluminación nocturna y dispositivos de seguridad durante toda la ejecución.
- Control de Tráfico (Pare-Siga): Para actividades iniciales como localización y replanteo, es obligatorio contar con auxiliares de "pare-siga" a ambos lados y delimitar la zona con conos para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía.
- Normativa Aplicable: Se debe cumplir estrictamente con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (actualizado a 2024).

2. Elementos de Protección y Seguridad (SST)

Gestión de Seguridad: El contratista debe seguir la "Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

Responsabilidad Civil y Sanciones: El ejecutor es el único responsable de cualquier multa o sanción derivada de la falta de señalización o dispositivos de seguridad adecuados.

4.4. Señalización Vial y Elementos en obra.

Esta actividad se debe realizar por parte del del contratista de forma constante y de acuerdo al avance del proyecto.



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



5. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2824 de 2025
Objeto	Actividades de mejoramiento y Mantenimiento para la estabilización de las Vías a cargo del de Antioquia (Lote 5 Suroeste)
Contratista	Consortio Vías Antioquia MM 2025, integrado por Wilmar José Moncada Arcila (90%) y Meyan S.A. (10%)
Nit.	902017071-1
Representante Legal	Wilmar Moncada Arcila
Valor del contrato	SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$72.870.090.400) y un A.I.U. del 32,57%.
Anticipo entregado al contratista (15%)	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$ 10.930.513.560) y el porcentaje (en 15%) del valor del Contrato
Fecha de inicio	05 de febrero de 2026
Fecha de terminación	05 de febrero de 2027
Plazo inicial	DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Interventor	SADING GROUP SAS

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

5.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 2. Información del Contrato de Interventoría

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR	
Contrato No.	20260029
Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Contratista	RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Nit.	9011922745
Representante Legal	Juan Carlos Reyes Vanegas
Valor del contrato	Cinco mil seiscientos noventa millones setecientos cincuenta y dos mil trece pesos ml (\$ 5.690.752.013), IVA incluido.
Anticipo entregado al contratista (15%)	N.A.
Fecha de inicio	14 de enero de 2026
Fecha de terminación	14 de febrero de 2027
Plazo inicial	Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Interventor	SADING GROUP SAS



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



6. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

Tabla 3. listado del personal del contratista

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO ANDES						
CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	ALONSO ACOSTA ACEVEDO	AYUDANTE OBRA	15.526.237	CVAMM25	19-02-26	
2	CARLOS ALBERTO ACOSTA	LIDER COMPRAS	1.065.596.504	CVAMM25	02-02-26	
3	CRISTIAN DAVID MONTOYA	AYUDANTE OBRA	1.001-145-117	CVAMM25	19-02-26	
4	FRANKLIN REINA	AYUDANTE OBRA	1.084.576.112	CVAMM25	17-02-26	
5	JAN CARLOS ALVAREZ	AYUDANTE OBRA	1.000.099.471	CVAMM25	17-02-26	
6	JEAN PAUL RETAT	RESIDENTE AMBIENTAL	71773455	CVAMM25	26-02-26	
7	JHON SEBASTIAN GALVIZ	AYUDANTE OBRA	1.007.634.048	CVAMM25	09-02-26	
8	JHON JAIRO CANO	ING RESIDENTE	15.527.325	CVAMM25	06-02-26	28-02-26
9	JORGE IVAN ECHAVERRIA	RESIDENTE SOCIAL	71.667.805	CVAMM25	19-02-26	
10	JUAN JOSE FERNANDEZ	CONDUCTOR	71.648.067	CVAMM25	13-02-26	
11	VICTOR ALVAREZ OSPINA	AYUDANTE OBRA	1.001.395.792	CVAMM25	19-02-26	
12	LUIS FERNANDO OSORNO	DIRECTOR	98494655	CVMM25	28-02-26	
13	WILSON GONZALEZ SANCHES	TOPOGRAFO	70732038	CVMM25	12-02-26	

Listado personal contratista Valparaiso_Tamesis

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	MARICELA USUGA	ING RESIDENTE	42123035	CVAMM25	12-02-26	
2	RICARDO MARTINEZ	CONDUCTOR	71330370	CVAMM25	24-02-26	

Listado personal Inteinsa

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	CARLOS ANDRES RIASCOS	CONDUCTOR	1036604727	INTEINSA	SIN DATOS	
2	CIPRIAN RENTERIA MORENO	AUXILIA LABORATORIO	11794184	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURAS	SIN DATOS	
	JHORLEY RENTERIA CASTRO	AUXILIAR LABORATORIO	1128436875	EX.MAR.	SIN DATOS	

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

7. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 4. Listado del personal técnico de interventoría

Listado personal de Interventoría						
CONTRATO No. 20260029						
No	Nombre	Cargo	Cedula	Empresa	Fecha de ingreso	Fecha de egreso
1	John Fredy Henao Londoño	Director Interventoría	70.419.829	SADING GROUP S.A.S	6/02/2026	
2	Sandra Patricia García González	Residente Técnica	1.033.646.794	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	
3	Henry Pineda Arango	Profesional Social	13.990.560	SADING GROUP SAS.	06/02/2026	
4	Kadir Jalkh Fonseca	Profesional Ambiental	18.928.839	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	
5	Diego Ferney Monsalve Hoyos	Tecnólogo Civil	1.017.132.030	SADING GROUP SAS.	13/02/2026	
6	Nubia Barragán Reyes	Residente SST	65.769.531	SADING GROUP SAS.	20/02/2026	



8. ACCIONES A EJECUTAR CORRESPONDIENTES AL SUBPROGAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, de acuerdo a la guía de manejo socioambiental

El objetivo es garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes interesadas del proyecto, mediante el establecimiento de medidas para prevenir, controlar y/o minimizar los riesgos existentes en las actividades constructivas del proyecto y dar cumplimiento a la legislación colombiana en materia de SST.

b. Subprograma de higiene industria.

El subprograma de Higiene Industrial hace parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y está enfocado en la identificación, evaluación y control de los factores ambientales que pueden generar enfermedades laborales en los trabajadores.

A continuación, se citan los anexos establecidos para la ejecución de los informes mensuales y final. Descripción entrega de Anexos.

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin anexo. **Anexo 1. SGSST obra/interventoría.**
- Soporte documental Matriz de Identificación de peligros y Riesgos. Sin anexo. **Anexo 2. Matriz IPVR obra/interventoría.**
- Soporte documental Plan de Trabajo anual. Sin anexo. **Anexo 3. Cronograma de trabajo anual obra/interventoría.**
- Soporte programa de alturas Res 4272 de 2021. Sin anexo. **Anexo 4. Alturas obra/interventoría**
- Soporte documental espacios confinados 0491 de 2020. Sin anexo. **Anexo 5 espacios confinados Obra/ interventoría**
- Indicadores de estándares mínimos. Sin anexo. **Anexo 6. Estándares mínimos Obra/interventoría**
- Soportes licencias SST. Sin anexo. **Anexo 7. Licencias SST obra/interventoría**
- Soporte documental COPASST 2013 de 1986. Sin anexo. **Anexo 8. Comité COPASST 2013 de 2013 obra/ interventoría**
- Soporte Documental Comité COCOLAB 1010 de 2026. Sin anexo. **Anexo 9. Comité de Convivencia Laboral obra/interventoría.**

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

- Soporte documental Emergencias. Sin anexo. **Anexo 10. Emergencias obra/interventoría.**
- Soporte documental Estándares mínimos RES. 0312. Sin anexo. **Anexo 11. Estándares Mínimos obra/interventoría.**
- Documentos de ingreso, información de total de ingresos del mes de febrero de 2026. **Ver anexo 15 documentos de ingreso obra/ interventoría**

Tabla 5. ingresos de personal febrero de 2026.

FRETE DE OBRA	EMPRESA	# TRABAJADORES
Andes _Pueblo Rico	Consortio Vías Antioquia MM2025	14
Valparaíso _Tamesis	Consortio Vías Antioquia MM2025	2
Valparaíso _Tamesis _Andes _Pueblo Rico	Inteinsa Pavimentos SAS.	3
Andes Pueblorrico	SADING GROUP	6

- **Anexo contratos o certificaciones laborales;** el contratista aportó contratos o certificaciones laborales del personal que ingresó al proyecto, en este sentido se reportan once (11) soportes documentales conforme a los ingresos por el tramo de Andes, dos (2) por el tramo de Valparaíso y un (1) por parte del contratista Inteinsa, No obstante, el contratista no aporta cinco (5) certificaciones de contratación de acuerdo a los ingresos **Ver Anexo 16. Contrato o certificación laboral obra/ interventoría**
- **Inducciones.** De acuerdo a los ingresos des mes de febrero de 2026, se tiene que el contratista de obra no emite inducciones realizadas al personal en este periodo, solo se evidencia un soporte de esta gestión. **Ver anexo 17. inducción y evaluación obra/ interventoría**
- **Suministro o reposición de EPP;** en el periodo del mes de febrero, se realiza suministro de EPP al personal del contratista, el cual se reporta de la siguiente manera:
 Personal de Andes 7 trabajadores
 Personal de Valparaíso 2 trabajadores
 Personal Proveedor 1 persona. De acuerdo a los ingresos contemplados en este periodo, no se presentan reporte de esta gestión de 9 personas restantes. **Ver anexo 18. Entrega de EPP Obra/interventoría.**
- **Suministro de Dotación.** En este periodo el contratista de obra documenta entrega de dotación de 9 trabajadores, de Andes y Valparaíso, reporta entrega de dotación



de un trabajador de Inteinsa, de acuerdo a los ingresos, no se soporta esta gestión de 9 trabajadores. **Ver anexo 19. Dotación Obra/interventoría**

- **Perfil sociodemográfico.** Se lleva a cabo la identificación de las características de la población trabajadora que ingresó en el periodo, en este sentido el contratista reporta por el municipio de Andes 17, personas, por el Municipio de Valparaíso 2 personas. **Ver anexo 20. Perfil sociodemográfico obra / interventoría**
- **Seguridad Social.** Sin anexo. **Ver anexo 21. Seguridad social obra/interventoría**
- **Reporte de nóminas mensual.** El contratista Consorcio Vías Antioquia MM2025, no reporta soportes de pagos de nóminas causados en el periodo del mes de febrero de 2026. Sin anexo. **Ver anexo 22. Nominas febrero /interventoría**
- **Inspecciones del mes de febrero 2026.** sin anexo. **Ver anexo 23. Inspecciones de seguridad obra/interventoría**
- **Anexo de registros fotográficos febrero 2026.** Sin anexo. **Ver anexo 24. Registros fotográficos obra/interventoría**
- **Liquidaciones del febrero de 2026.** Sin anexo. **Ver anexo 25. Liquidaciones obra/interventoría.**
- **Listado de personal:** Se reporta personal por parte del contratista Con un consolidado de trece (13) personas por Andes, dos (2) por Valparaíso y tres (3) contratista Inteinsa. **Ver anexo 26. Listado de personal obra/interventoría**
- **Reportes diarios y semanales.** Sin anexo. **Ver anexo 27. Reportes diarios Obra/interventoría**
- **Reportes diarios semanales:** Sin anexo. **Ver anexo 27. Reportes diarios y semanales obra /interventoría**
- **Presupuesto PMT y SST.** Sin anexo **Ver anexo 28. Presupuesto PMT y SST. obra,** por parte de la interventoría este ítem no aplica.
- **Carta Paz y Salvo Personerías Municipales.** Documento que será entregable al finalizar el proyecto. Sin anexo. **Ver anexo 29. Carta Paz y Salvo Personería**
- **Certificados de Revisor Fiscal y representante Legal.** Sin anexo. **Ver anexo 30. Certificados Revisor fiscal y representante legal Obra/interventoría**
- **Consolidada accidentalidad.** Sin anexo. **Ver anexo 31. accidentalidad obra/interventoría**

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	---

- **Reporte de ausentismo laboral**, Sin anexo. **Ver anexo 32. Ausentismo general Obra/interventoría**
- **Capacitaciones y charlas de seguridad**. Sin anexo. **Ver anexo 33. Capacitaciones y charlas de seguridad obra/interventoría**
- **Análisis y conclusiones**. Este se encuentra dentro del documento informe mensual, que corresponde a cada periodo
- **Comunicaciones**. En este periodo el contratista de obra no remite soporte de este ítem, no obstante, se remiten comunicaciones por parte de la interventoría. **Ver anexo 35. Compunciones obra/interventoría**



Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia.
INFORME MENSUAL SST No. 01
FEBRERO DE 2026



9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1. ANÁLISIS.

Considerando que, durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, el Contratista de obra Consorcio Vías Antioquia MM2025 y la interventoría Sading Group S.A.S. Ejecutaron actividades correspondientes exclusivamente a estudios y diseños en el marco del Contrato de Obra No. 2500111B2824, denominado “Mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento de Antioquia”.

Se precisa que las actividades operativas desarrolladas durante dicho período correspondieron a recorridos de reconocimiento en los tramos Andes y Valparaíso realizados por la interventoría, así como a la verificación documental de ingresos y revisión de la documentación asociada al contrato de obra e interventoría.

9.2. EVALUACIÓN.

De acuerdo con las actividades ejecutadas durante el mes de febrero de 2026, se evidencia que únicamente se adelantaron actividades relacionadas con estudios y diseños. No obstante, el contratista remitió documentación correspondiente al ingreso de personal; sin embargo, dicha información fue presentada de manera incompleta.

La interventoría continuará realizando el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando la implementación de los programas, cumplimiento de la normatividad vigente y ejecución de las actividades establecidas para el desarrollo del contrato.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	---	--

10. CONCLUSIONES

- Durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, las actividades ejecutadas por el Contratista de obra Consorcio Vías Antioquia MM2025 y la interventoría Sading Group S.A.S. estuvieron enfocadas exclusivamente en labores preliminares de estudios y diseños, conforme a las necesidades iniciales del Contrato de Obra No. 2500111B2824.
- Se evidenció que, durante el período evaluado, no se ejecutaron actividades constructivas ni cantidades de obra, toda vez que el proyecto se encontraba en etapa de reconocimiento, verificación y recopilación de información técnica necesaria para la posterior ejecución de las actividades operativas.
- La interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control mediante recorridos de reconocimiento en los tramos Andes y Valparaíso, así como la verificación documental relacionada con el ingreso de personal y los soportes contractuales asociados al contrato de obra e interventoría.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	--	--

11. RECOMENDACIONES

- Se identificó la necesidad de fortalecer la entrega documental por parte del contratista, especialmente en lo relacionado con los documentos de ingreso del personal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, contractuales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se le recomienda al contratista de obra, ejecutar actividades del SGSST, las cuales deben corresponder a lo contemplado en la Guía de Manejo Socioambiental y los lineamientos Generales de Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales contemplan los parámetros de ingreso y egreso de personal, ingreso de maquinaria y vehículos, así como los parámetros para liquidación de personal del proyecto.

	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Suroeste (Lote 5) a cargo del Departamento Antioquia. INFORME MENSUAL SST No. 01 FEBRERO DE 2026	 SADING GROUP S.A.S. INGENIEROS CIVILES
---	---	--

12. ANEXOS DOCUMENTALES CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM25/INTERVENTORIA SADING GROUP SAS.

Dentro del informe mensual del mes de febrero 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden.

- Anexo 1. SGSST
- Anexo 2. Matriz IPVR.
- Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra/interventoría
- Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra. (se indica que no se realizaron actividades de alto riesgo por parte del contratista).
- Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra. Se indica por el contratista que no se realizan actividades de alto riesgo para este periodo
- Anexo 6. Indicadores de Estándares Mínimos.
- Anexo 7. Licencias SST.
- Anexo 8. Comité Copasst 2013/86.
- Anexo 9. Comité Cocola 3461 de 2025
- Anexo 10. Emergencias
- Anexo 11. Estándares Mínimos 0312/19.
- Anexo 12. PESV.
- Anexo 13. Plan de manejo de tránsito (PMT)
- Anexo 14. Protocolo de bioseguridad
- Anexo 15. Documentos de ingreso.
- Anexo 16. Contrato o certificado laboral.
- Anexo 17. Inducción y evaluación.
- Anexo 18. Entrega de EPP.
- Anexo 19. Dotación.
- Anexo 20. Perfil Sociodemográfico.
- Anexo 21. Seguridad Social.
- Anexo 22. Nóminas.
- Anexo 23. Inspecciones de seguridad.
- Anexo 24. Registro Fotográfico.
- Anexo 25. Liquidaciones.
- Anexo 26. Listado de personal.
- Anexo 27. Reportes diarios informes semanales
- Anexo 28. Presupuesto PMA y PMT
- Anexo 29. Carta Paz y Salvo Personerías municipales.
- Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Legal
- Anexo 31. Accidentalidad.
- Anexo 32. Ausentismo general.
- Anexo 33. Capacitaciones.
- Anexo 34. Análisis y conclusiones; se encuentra dentro del documentos informe mensual
- Anexo 35. Comunicaciones.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
