

Medellín, 02 de septiembre 2026

1300 2666

Radicado: R 2026010596736

Fecha: 03/09/2026 10:54:37.0

Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA



Señor:

Juan Diego Aguirre Londoño

Director de Desarrollo Físico Gobernación a

Asunto: Entrega correspondiente al contrato Interadministrativo No 4600018656 de mandato contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Referencia: contrato interadministrativo de mandato sin representación para realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia firme

Respetado Ingeniero Juan Diego,

Mediante la presente remito para su revisión y trámite de los informes del componente SST contrato de interventoría No 20260429 lote # 3 informes del mandato con sus respectivos anexos, como se relacionan a continuación.

Informes SST mensual de interventoría Tomo 1 correspondiente a los periodos de:

- Informe No 1 del 04 febrero de 2026 a el 25 febrero de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 1 –15
- Anexo memoria USB informe No 1
- Informe No 2 del 01 marzo de 2026 a el 31 marzo de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 16 – 31
- Anexo memoria USB informe No 2
- Informe No 3 del 01 abril de 2026 a el 30 abril de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 32– 47
- Anexo memoria USB informe No 3

Recibí

03-09-2026
10:23 am


ARCHIVO SIT
2026 SEP 14 15:14:20

- Informe No 4 del 01 mayo de 2026 a el 31 de mayo de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 48 – 65
- Anexo memoria USB informe No 4
- Informe No 5 del 01 junio de 2026 a el 30 de junio de 2026 San pedro de Urabá Necoclí
- pág. 66 – 82
- Informe No 5 del 01 junio de 2026 a el 30 de junio de 2026 mutata
- pág. 83 – 95
- Anexo memoria USB informe No 5

Cordialmente



CATALINA CASTRILLON TORRES
Subgerente de Ejecución de Proyectos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Dubemey Concha Marin		31/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



GRUPO INTECON S.A.S
Contrato de Interventoría
No 20250429 DE 2025
INFORME SST MENSUAL N° 4



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4

**GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA**

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**CONTRATO DE OBRA N°
2500111B2822**

ANTIOQUIA


INTERVENTORÍA

ANTIOQUIA,

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 4

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO URABÁ 25
CONTRATO DE OBRA N°	2500111B2822 DE 2025
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)
INTERVENTORÍA	GRUPO INTECON S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	20250429 DE 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
PERIODO	1 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026

	CARGO	FIRMA	PERÍODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría		1 al 31 de mayo de 2026	1
REVISÓ	Director de Interventoría			
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF			

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

↓
Jesus David Jimenez
Profesional SST-SIF


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo Intecon S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
--	--	--

Tabla de contenido

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 4	2
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Alcance	5
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño:.....	6
3.2. Actividades por ejecutar y alcance:.....	8
3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección	9
4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	12
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA	13
LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO	14
6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA	17
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST	18
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO URABÁ 25	19
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:	23
a. Seguridad Social	23
b. Presupuestos	24
c. Anexos contratista e interventoría:	24
d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:	25
e. Subprograma de higiene industrial:	26
f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	27
g. Accidentes laborales presentados en el periodo.....	29
h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos	29

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

i. Registro fotográfico:	31
10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	31
11. CONCLUSIONES:	33
12. RECOMENDACIONES.....	33

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato No. 20250429 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” se han definido e implementado acciones específicas orientadas a la promoción de entornos laborales seguros y saludables, en estricta concordancia con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones normativas del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).

Estas acciones tienen como propósito principal proteger la integridad física, mental y social del personal operativo y administrativo vinculado al proyecto, así como de las comunidades que habitan y transitan en los sectores donde se realizan las intervenciones.

1.1. Alcance

La Interventoría, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), tiene como propósito principal supervisar el cumplimiento de la normativa legal vigente y los estándares técnicos aplicables, con el fin de garantizar ambientes laborales seguros y saludables para todos los trabajadores vinculados al proyecto “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)”. Este alcance incluye la verificación de la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de SST del contratista, asegurando su alineación con los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones complementarias.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Proporcionar información precisa, clara y verificable que evidencie el progreso y cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista y la interventoría, en relación con el componente de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

2.2. Objetivos Específicos

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en los diferentes frentes de intervención de obra, estableciendo los controles necesarios para su mitigación, con el fin de garantizar condiciones de trabajo seguras.

Verificar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales, promoviendo la reducción de la accidentalidad y el fortalecimiento de prácticas de trabajo seguro en todos los procesos operativos.

Realizar recorridos de inspección y acompañamiento a las actividades operativas ejecutadas por el contratista en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar condiciones de SST y aplicación de controles.

Elaborar informes de gestión semanal y mensual, orientados a controlar y verificar que las actividades del proyecto se desarrollen en cumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los lineamientos y disposiciones establecidas por la entidad contratante.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto las “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)”.

La intervención de las vías busca mejorar la intercomunicación terrestre de los Municipios beneficiados con la intervención del presente contrato, de aproximadamente 120,65 kilómetros de longitud, distribuidos en los siguientes corredores viales:

- Mutatá – Pavarandó
- San Pedro de Urabá – Necoclí
- San Pedro de Urabá – Arboletes
- San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo

3.1. Localización Subregiones de Oriente Antioqueño:

El proyecto está localizado en Urabá, subregión de Antioquia conformada por once (11) municipios: Apartadó, Turbo, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte.

La longitud que se va a intervenir es de 120,65 Km y representa el 35% del total de kilómetros a cargo del departamento en esta subregión.

Tabla 1. Corredores a intervenir

62

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
--	--	--

CORREDORES	MUNICIPIOS A INTERVENIR DE LA SUBREGIÓN	LONGITUD A INTERVENIR (KM)
Mutatá – Pavarandó	Mutatá	10
San Pedro de Urabá – Necoclí	Necoclí / Turbo	58,65
Arboletes – El Tambito	Arboletes	25,19
San Pedro de Urabá – El Carmelo – El Tambito	Arboletes	4,81
San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo	Turbo	22
TOTAL		120,65

Subregión del Urabá



Ilustración 1. Mapa Subregión del Urabá
Fuente: Gerencia de Corregimientos – Departamento de Antioquia

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	--	--

3.2. Actividades por ejecutar y alcance:

Tabla 2. Actividades a ejecutar tramo 1: San Pedro De Urabá – El Tres – Turbo (22 Km)

TRAMO 1: EL TRES - SAN PEDRO (22 Km)	TRAMO 1: SAN PEDRO DE URABÁ – EL TRES – TURBO (22 KM)	
	PRELIMINARES TRAMO 1	PRELIMINARES TRAMO 1
		Ajuste diseño de pavimentos y aprobación
		Mantenimiento obras de drenaje
	DRENAJES TAMO 1	DRENAJES TAMO 1
		Construcción de filtros
		Construcción de alcantarillas
		Construcción de cunetas
		Construcción de bordillos
		Construcción disipadores
	PREPARACION DE SUELOS TRAMO 1	PREPARACION DE SUELOS TRAMO 1
		Bacheo y transitabilidad
		Estabilización de subrasante con cal
		Estabilización de subbase con cemento
	PAVIMENTO TRAMO 1	PAVIMENTO TRAMO 1
		Tratamiento doble riego
	SEÑALIZACION TRAMO 1	SEÑALIZACION TRAMO 1
		Señalización horizontal
		Señalización vertical

Tabla 3. Actividades a ejecutar tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí (58,7 Km)

TRAMO 3: NECOCLI - SAN PEDRO (58,7 Km)	TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ (58,7 Km)	
	PRELIMINARES TRAMO 3	PRELIMINARES TRAMO 3
		Ajuste diseño de pavimento y aprobación
		Mantenimiento obras de drenaje
	DRENAJES TRAMO 3	DRENAJES TRAMO 3
		Construcción de filtros
		Construcción de alcantarillas
		Construcción de cunetas
		Construcción de bordillos
		Construcción disipadores
	PREPARACION DE SUELO TRAMO 3	PREPARACION DE SUELO TRAMO 3
		Bacheo y transitabilidad

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	--

		Estabilización subrasante con cal
		Estabilización subbase con cemento
	PAVIMENTO TRAMO 3	PAVIMENTO TRAMO 3
		Tratamiento doble riego
	SEÑALIZACION TRAMO 3	SEÑALIZACION TRAMO 3
		Señalización horizontal
		Señalización vertical

Tabla 4. Actividades a ejecutar tramo 4: Mutatá - Pavarandó (10 Km)

TRAMO 4: MUTATA - PAVARANDO (10 Km)	TRAMO 4: MUTATA - PAVARANDO (10 Km)	
	PRELIMINARES TRAMO 4	PRELIMINARES TRAMO 4
		Ajuste diseño de pavimentos y aprobación
		Mantenimiento obras de drenaje
	DRENAJES TRAMO 4	DRENAJES TRAMO 4
		Construcción de filtros
		Construcción de alcantarillas
		Construcción de cunetas
		Construcción de bordillos
		Construcción disipadores
	PREPARACION DE SUELO TRAMO 4	PREPARACION DE SUELO TRAMO 4
		Bacheo y transitabilidad
		Estabilización subrasante con cal
		Estabilización subbase con cemento
	PAVIMENTO TRAMO 4	PAVIMENTO TRAMO 4
		Tratamiento doble riego
	SEÑALIZACION TRAMO 4	SEÑALIZACION TRAMO 4
		Señalización horizontal
		Señalización vertical

3.3. Señalización Vial y Elementos de Protección

Tramo 1: San Pedro De Urabá – El Tres – Turbo:

Durante el período evaluado, el Consorcio Urabá 25 inició la implementación parcial del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para la ejecución del proyecto, en concordancia con el avance de las actividades de toma de densidades y limpieza de obras transversales. En los frentes de trabajo se evidenció la instalación de dispositivos de canalización, tales como conos y balizas.

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
---	--	---

Es importante resaltar que el contratista se encuentra a la espera de la entrega del kit de señalización y demás dispositivos de canalización que serán utilizados en el Tramo 1, cuya disponibilidad está prevista para el mes de junio de 2026.

En relación con las actividades de toma de densidades y limpieza de obras transversales, se observó que actualmente el contratista utiliza señalización móvil, la cual es trasladada de acuerdo con el avance de las actividades. Asimismo, se precisa que, una vez finalizadas las labores diarias, la vía y los sectores intervenidos quedan completamente habilitados para el tránsito vehicular.

Con respecto a la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la dotación, se evidenció que el contratista ha realizado el suministro oportuno al personal administrativo. Sin embargo, el personal operativo aún no cuenta con la dotación conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Marca de Obra Pública de la Gobernación de Antioquia.

Durante las visitas de seguimiento se verificó el uso de los siguientes elementos de protección personal:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (lente oscuro y lente claro).
- Protección respiratoria.
- Protección auditiva tipo inserción.
- Impermeable color amarillo.
- Botas de seguridad con puntera.
- Botas pantaneras de caucho con puntera.
- Chaleco reflectivo.

Tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí:

Durante el período evaluado, el Consorcio Urabá 25 continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para la ejecución del proyecto, en concordancia con el avance de las actividades de limpieza e instalación de obras transversales, toma de densidades y conformación de la vía existente.

En los diferentes frentes de trabajo se evidenció la instalación progresiva de los siguientes elementos:

- Señalización preventiva para zonas de obra: "Trabajos en la vía", "Maquinaria en la vía" y "Auxiliar de tránsito".
- Señales informativas: "Inicio de obra" y "Fin de obra".
- Dispositivos de canalización: maletines, conos, balizas y malla naranja de señalización.

La implementación del PMT se realiza de manera secuencial, iniciando con la instalación de la señalización preventiva para zonas de obra, seguida de la ubicación de auxiliares de tránsito apoyados con dispositivos de canalización. Posteriormente se ejecutan las actividades programadas y, una vez finalizadas, se dispone

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	--

nuevamente la señalización correspondiente hasta concluir con la señalización preventiva que indica la finalización de la zona intervenida. Para tal fin, se emplea señalización vertical fija y señalización móvil tipo tijera.

En las obras transversales ejecutadas, donde se identifica riesgo de caída a distinto nivel para los actores viales dentro del área de influencia del proyecto, se ha implementado la respectiva demarcación mediante el uso de maletines, balizas y malla naranja, garantizando la delimitación y señalización de las áreas intervenidas. No obstante, se ha evidenciado el deterioro de parte de estas medidas debido a factores externos como las fuertes lluvias y el tránsito de vehículos de gran tamaño, por lo que el contratista debe realizar las actividades de mantenimiento y reposición necesarias para garantizar su efectividad.

Por otra parte, se precisa que, al finalizar la jornada laboral, la vía y los sectores intervenidos quedan completamente habilitados para el tránsito. Asimismo, la maquinaria, las volquetas y demás vehículos son trasladados al campamento temporal dispuesto por el contratista, ubicado en la abscisa K0+440.

En cuanto a la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la dotación, se evidenció que el contratista ha realizado el suministro oportuno tanto al personal administrativo como operativo vinculado al proyecto. Entre los elementos entregados se encuentran:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (lente oscuro y lente claro).
- Protección respiratoria.
- Protección auditiva tipo inserción.
- Impermeable color amarillo.
- Botas de seguridad con puntera.
- Botas pantaneras de caucho con puntera.

Respecto a la dotación, se ha efectuado su entrega de manera progresiva, principalmente al personal operativo. Esta cumple con lo establecido en el Manual de Marca de Obra Pública de la Gobernación de Antioquia en lo relacionado con el uso de uniformes para obra.

De igual forma, se verificó que el personal administrativo cuenta con la dotación completa, incluyendo camisetas tipo polo y chaquetas institucionales, las cuales cumplen con los lineamientos establecidos en el citado manual.

Tramo 4: Mutatá - Pavarandó

Durante el período evaluado, el Consorcio Urabá 25 inició con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para la ejecución del proyecto, de acuerdo con el avance de las actividades de limpieza e instalación de obras transversales y toma de densidades.

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

En los frentes de trabajo se evidenció la instalación progresiva de los siguientes elementos:

- Señalización preventiva para zonas de obra: "Trabajos en la vía", "Maquinaria en la vía" y "Auxiliar de tránsito".
- Señales informativas: "Inicio de obra" y "Fin de obra".
- Dispositivos de canalización: maletines, conos y balizas.

En los sitios donde se identifica riesgo de caída a distinto nivel para los actores viales dentro del área de influencia del proyecto, se ha implementado la correspondiente demarcación mediante el uso de maletines, balizas y cinta de peligro, garantizando la delimitación y señalización de las zonas intervenidas.

Con relación a la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la dotación, se evidenció que el contratista ha realizado el suministro oportuno de los EPP al personal operativo. Sin embargo, este aún no cuenta con la dotación conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Marca de Obra Pública de la Gobernación de Antioquia.

Durante las actividades de seguimiento se verificó el uso de los siguientes elementos de protección personal:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad (lente oscuro y lente claro).
- Protección respiratoria.
- Protección auditiva tipo inserción.
- Impermeable color amarillo.
- Botas de seguridad con puntera.
- Botas pantaneras de caucho con puntera.
- Chaleco reflectivo.

4. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TABLA 5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	2500111B2822
Fecha de Suscripción	29/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	CO1.PCCNTR.8708621
Objeto	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

53

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
---	--	---

	DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)
Contratista	CONSORCIO URABÁ 25
Nit.	902.018.335-3
Representante Legal	JULIAN ALONSO BLAIR LLORENS
Valor del contrato	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$144.973.755.369)
Anticipo entregado al contratista (15%)	15%
Fecha de inicio	04/02/2026
Plazo inicial	18 MESES
Fecha de terminación	03/08/2027
Fecha de reinicio	No aplica
Fecha de terminación	03/08/2027
Interventor	GRUPO INTECON S.A.S

4.2. INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA

TABLA 6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
Contrato de Interventoría No.	20250429
Fecha de Suscripción	24/12/2025
Identificación del Proceso en SECOP	IP 020 DE 2025
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Interventoría	GRUPO INTECON S.A.S
Nit.	901.616.027-1
Representante Legal	RUTH ELENA TABARES ZULETA
Valor del contrato	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTIOCHO PESOS (\$9.595.864.128) IVA INCLUIDO

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
---	--	---

Anticipo entregado al contratista (15%)	NO APLICA
Fecha de inicio	19/01/2026
Plazo inicial	19 MESES
Fecha de terminación	19/08/2027
Fecha de reinicio	NO APLICA
Fecha de terminación	19/08/2027
Supervisor	CATALINA CASTRILLÓN TORRES

LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO

TABLA 7. LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO TRAMO 1: SAN PEDRO DE URABÁ – EL TRES – TURBO

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	JULIO CESAR TORO VALENCIA	PROFESIONAL DE CALIDAD	1128265795	CONSORCIO URABÁ 25	06/04/2026	NO APLICA
2	CARLOS ENRIQUE GIL BERRIO	RESIDENTE SST	1045496340	CONSORCIO URABÁ 25	26/03/2026	NO APLICA
3	ANDRES FERNANDO RUEDA FONSECA	RESIDENTE AMBIENTAL	1118545966	CONSORCIO URABÁ 25	22/05/2026	NO APLICA
4	HAROL DAVID YANES SALCEDO	TECNOLOGO DE OBRA	1063298057	CONSORCIO URABÁ 25	19/05/2026	NO APLICA
5	MARTINEZ GIRALDO JORGE DE JESUS	TOPOGRAFO	71943804	CONSORCIO URABÁ 25	26/03/2026	NO APLICA

En la Tabla No. 7 se presenta el personal administrativo vinculado por parte del Contratista, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Interventoría mediante oficio, correspondiente al Tramo 1: San Pedro De Urabá – El Tres – Turbo.

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	--

Con corte a la fecha de presentación del presente informe, el tramo cuenta con un total de 8 trabajadores activos, bajo la dirección del director de obra, quien es el responsable de la supervisión de todos los tramos del proyecto.

TABLA 8. LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ

LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO						
CONTRATO						
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	ALBERTO MUÑOZ RICARDO	ESPECIALISTA PMM	76312109	CONSORCIO URABÁ 25	16/01/2025	NO APLICA
2	HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA	DIRECTOR DE OBRA	8164070	CONSORCIO URABÁ 25	16/01/2025	NO APLICA
3	JAIRO ALFONSO VILLAMIZAR RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	79276530	CONSORCIO URABÁ 25	27/02/2026	NO APLICA
4	ANYI LILIANA ROJAS GARRIDO	RESIDENTE AMBIENTAL	1027964930	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
5	TABITA ESTHER URIETA DELGADO	PROFESIONAL SOCIAL	552333231	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
6	ANA ISABEL SIMANCA CARMONA	PROFESIONAL SOCIAL	39310932	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
7	JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	RESIDENTE SST	91535123	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
8	GUSTAVO ANDRES RUBIANO DIAZ	TECNOLOGO DE OBRA No 1	1069179411	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
9	DANIEL ROBIRO TAPASCO OROZCO	TECNOLOGO DE OBRA No 2	1054541718	CONSORCIO URABÁ 25	25/02/2026	NO APLICA

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGION URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo Intecon S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

10	SINDY YINETH CRISTANCHO SANCHEZ	TOPOGRAFA No 1	1105614480	CONSORCIO URABÁ 25	23/02/2026	NO APLICA
----	---------------------------------	----------------	------------	--------------------	------------	-----------

En la Tabla No. 8 se presenta el personal administrativo vinculado por parte del Contratista, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Interventoría mediante oficio, correspondiente al tramo San Pedro de Urabá – Necoclí.

Con corte a la fecha de presentación del presente informe, el Consorcio Urabá 25 cuenta con un total de 78 trabajadores activos en el tramo San Pedro de Urabá – Necoclí, bajo la dirección del director de obra, quien es el responsable de la supervisión de todos los tramos del proyecto.

TABLA 9. LISTADO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO TRAMO 4: MUTATÁ - PAVARANDÓ

	LISTADO PERSONAL CONTRATISTA AUTORIZADO					
	CONTRATO					
No,	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	LEONARDO ANDREY LOPEZ AVILA	RESIDENTE DE OBRA	1128420059	CONSORCIO URABÁ 25	8/04/2026	NO APLICA
2	JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ	RESIDENTE SST	1040363679	CONSORCIO URABÁ 25	11/05/2026	NO APLICA
3	ORLANDO SEGUNDO CAMPO MORALES	TECNOLOGO DE OBRA	1038100119	CONSORCIO URABÁ 25	25/05/2026	NO APLICA
4	ALZATE GIRALDO ALVARO HERNAN	TOPOGRAFO	7562641	CONSORCIO URABÁ 25	11/05/2026	NO APLICA
5	ROMAN OSPINA JORGE IVAN	TOPOGRAFO	7556632	CONSORCIO URABÁ 25	13/04/2026	NO APLICA

En la Tabla No. 9 se presenta el personal administrativo vinculado por parte del Contratista, el cual ha sido evaluado y aprobado por la Interventoría mediante oficio, correspondiente al tramo Mutatá – Pavarandó.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
---	--	--

Con corte a la fecha de presentación del presente informe, el tramo cuenta con un total de 26 trabajadores activos, bajo la dirección del director de obra, quien es el responsable de la supervisión de todos los tramos del proyecto.

6. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la tabla No 10, se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

TABLA 10. LISTADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA						
CONTRATO						
No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO
1	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	13721542	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA
2	GILBERTO RAUL BALLESTEROS POLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	73131007	GRUPO INTECON S.A.S	24/04/2026	NO APLICA
3	JUAN CARLOS ARIAS GONZÁLEZ	PROFESIONAL DE CALIDAD	79869404	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA
4	DIOFAN ANDRÉS MARÍN ZAPATA	PROFESIONAL AMBIENTAL	4794402	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA
6	CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ	PROFESIONAL SST	1033373831	GRUPO INTECON S.A.S	13/02/2026	NO APLICA

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	--	--

8	ERICA PAOLA LUGO AMAYA	SECRETARIA	65762123	GRUPO INTECON S.A.S	17/02/2026	NO APLICA
9	TEODORO NISPERUZA SANCHEZ	CONDUCTOR	1037593219	GRUPO INTECON S.A.S	26/01/2026	NO APLICA
10	DAVID QUINTERO CRUZ	TOPÓGRAFO	1105616870	GRUPO INTECON S.A.S	3/03/2026	NO APLICA
11	LUIS ANDRES VARGAS JARAMILLO	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES	1026137120	GRUPO INTECON S.A.S	14/03/2026	NO APLICA
12	MARIA LUISA GIL RESTREPO	PROFESIONAL SOCIAL	32358332	GRUPO INTECON S.A.S	25/03/2026	NO APLICA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SG-SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado para la aplicación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, así como el control eficaz de los peligros y riesgos en las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 3 Urabá), es liderado por la empresa consorciada **GISAICO S.A.S.**, a la cual le corresponde el 50% de participación en el **Consortio Urabá 25**.

Con base en la autoevaluación del SG-SST realizada el 02 de diciembre de 2025, conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del SG-SST y mediante el diligenciamiento del formulario establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la empresa **GISAICO S.A.S.**, identificada con NIT 890917464 y afiliada a la administradora de riesgos laborales Colmena Seguros, obtuvo un resultado total del 100%, el cual se interpreta como "Aceptable", evidenciando el cumplimiento de los estándares exigidos.

Es importante señalar que **GISAICO S.A.S.** cuenta con certificaciones en normas internacionales como la ISO 45001:2018 y la NORSOK S-WA 006:2020, ambas certificadas ante el ICONTEC, lo cual respalda la madurez y solidez de su sistema de gestión.

Todas las gestiones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto son gestionadas por:

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	--	---

NOMBRE	NO. IDENTIFICACIÓN	NO. LICENCIA SST	VENCIMIENTO DE LICENCIA	ROL / CARGO
JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	91535123	05982	10/04/2036	RESIDENTE SST TRAMO 3
CARLOS ENRIQUE GIL BERRIO	104596340	S 2019060037386	07/03/2029	RESIDENTE SST TRAMO 1
JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ	1040363679	S 2016060092303	08/11/2026	RESIDENTE SST TRAMO 4
LUISA FERNANDA HERRERA ESCOBAR	1027943022	2023060353858	18/12/2023	AUXILIAR SST TRAMO 3

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR EL CONSORCIO URABÁ 25

Las actividades específicas de cada subprograma serán:

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

- Todos los trabajadores aspirantes a los cargos ofertados por el proyecto serán programados para la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, previo al inicio de su contrato laboral, con el propósito de determinar su aptitud para el cargo al que se postulan. Dichos exámenes se llevarán a cabo conforme al profesiograma establecido por el Consorcio Urabá 25, con el apoyo del prestador UNLAB.
- Con base en los resultados obtenidos en los exámenes médicos ocupacionales realizados por la IPS UNLAB, esta entidad elaborará y socializará con las partes un programa de hábitos de vida saludable. Lo anterior, con el fin de que el personal que presente compromisos en su estado de salud adopte las medidas correctivas necesarias para evitar la generación de complicaciones o el agravamiento de su condición.

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	---

Estas recomendaciones deberán ser atendidas con el apoyo del personal profesional de la EPS a la cual se encuentre afiliado cada colaborador.

- Se entregan a los trabajadores las recomendaciones médicas mediante el formato de compromisos médicos, realizando seguimiento a los compromisos adquiridos por cada trabajador (en caso de presentar alguna enfermedad de base). Este proceso se lleva a cabo con el acompañamiento de la EPS a la cual se encuentra afiliado, con el fin de garantizar la adecuada atención de la condición médica identificada.
- Con el fin de identificar las características de la población trabajadora de la organización, se elaboró el perfil sociodemográfico del proyecto. Este documento constituye una base fundamental para la priorización de acciones orientadas al control de los riesgos laborales; adicionalmente, se actualiza cada vez que se presentan ingresos y/o retiros de trabajadores.
- Se cuenta con cuatro (4) unidades sanitarias (baños portátiles) en el frente de obra. Asimismo, con el fin de mantener adecuadas condiciones de salud e higiene en los frentes de trabajo, se ha previsto la implementación de puntos de lavado de manos, dotados con servilletas, jabón y agua potable, que permitan al personal realizar el lavado de manos antes de consumir sus alimentos.
- Desarrollar actividades de promoción y prevención, orientadas a sensibilizar al personal en general sobre hábitos de vida saludable, pausas activas, higiene, salud y la difusión de información relacionada con comunicados de salud pública a nivel local, departamental y nacional.

b. Subprograma de higiene industrial:

Con la ejecución de este programa se busca garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes interesadas del proyecto, mediante el establecimiento de medidas para prevenir, controlar y/o minimizar los riesgos existentes en las actividades constructivas del proyecto y dar cumplimiento a la legislación colombiana en materia de SST. Para lograrlo se tendrán en cuenta las siguientes acciones:

- Intervenir los riesgos prioritarios identificados en el proyecto y/o en los diferentes frentes de obra, mediante la implementación de medidas de control y el desarrollo de actividades de prevención. Estas incluyen campañas de sensibilización, capacitaciones, inspecciones y visitas técnicas con acompañamiento de la ARL. Asimismo, fortalecer el control de los riesgos inherentes a las actividades ejecutadas, a través de la realización de paradas de seguridad, socialización de procedimientos de trabajo seguro, divulgación de lecciones aprendidas y socialización del Análisis de Riesgo por Tarea (ART).

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	---

- Elaborar, implementar y socializar instructivos, procedimientos y Análisis de Riesgo por Tarea (ART), como herramientas de apoyo para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Las actividades clasificadas como tareas críticas o de alto riesgo, a desarrollar durante el proceso constructivo por parte del Consorcio Urabá 25, tales como trabajos en caliente, operación de equipos, trabajo en alturas, ingreso a espacios confinados y manipulación de sustancias químicas, serán previamente identificadas y controladas. Para ello, se implementan medidas como la elaboración de registros preoperacionales, listas de verificación y la gestión de los respectivos permisos de trabajo. Se establece como requisito obligatorio que, sin el diligenciamiento y aprobación de estos registros, no se autoriza la ejecución de ninguna actividad.
- En articulación con el área Ambiental, se adelanta el inventario de los productos químicos a utilizar en los diferentes frentes de obra. Cada uno de estos cuenta con su respectiva Hoja de Datos de Seguridad (HDS), las cuales se mantienen disponibles en los lugares de almacenamiento y uso. Asimismo, se garantiza que todo el personal que manipula sustancias químicas se encuentre debidamente capacitado y entrenado en su manejo seguro, almacenamiento y respuesta ante emergencias, con el apoyo de proveedores, la ARL y la caja de compensación.
- En los sitios destinados para el manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos, se dispone de kits para atención de derrames, destinados a la respuesta ante vertimientos accidentales. Estos kits se encuentran dotados con los insumos necesarios para el control y mitigación de derrames de sustancias químicas. Asimismo, se implementan medidas de contención, como diques o barreras, que permiten confinar el producto en caso de fuga o derrame parcial de las sustancias almacenadas.
- Las áreas de almacenamiento de los productos químicos se demarcan ubicando en sitio los pictogramas, señalización y recursos correspondientes con el control de derrames de sustancias químicas. De igual manera con apoyo del área ambiental se valida el correcto manejo y disposición de los empaques, embalajes y el producto sobrante, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente por el Decreto 4741 de 2005, o la que la modifique.
- Para la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP), se dispone de un almacén general de obra. Con base en la Matriz de EPP por cargo, elaborada por el área de SST en conjunto con el área de compras, se realizan las entregas considerando el oficio y los peligros a los que se encuentra expuesto cada trabajador. La reposición de los EPP se efectúa de acuerdo con su nivel de desgaste o daño, garantizando su adecuada disponibilidad, uso correcto y conservación por parte del personal.
- Se capacitará a los trabajadores en el manejo, uso y cuidado de los elementos de protección personal. Estas formaciones estarán incluidas en el plan de formación y capacitación SST.

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	---

- Se desarrollará un plan de preparación y respuesta ante emergencias, que garantice la planificación, organización y utilización óptima de los medios técnicos previstos con el fin de reducir al mínimo las consecuencias que se pudieran derivar de una situación de emergencia. Este plan de emergencia estará destinado a preparar las atenciones sobre las amenazas identificadas en la Evaluación de menazas y vulnerabilidades.
- El consorcio Urabá 25 tiene establecido un procedimiento para la notificación e investigación de los incidentes y accidentes laborales ocurridos en los frentes de obra. Este procedimiento incluye comunicación interna del evento, toma de versión de testigos e involucrados, registro de investigación de A.T. Y C.A.T. y registro de lecciones aprendidas. Las investigaciones de estos se realizan acorde a la Resolución 1401 de 2007.
- Se cuenta con señalización preventiva e informativa durante la construcción del proyecto. Esta señalización será ubicada en cada uno de los frentes de trabajo, reforzando los controles y alertas sobre los peligros presentes en las actividades constructivas.
Esta se utiliza con el fin de lograr un desplazamiento seguro en los sitios de obra o en cercanías a ellos por parte del personal del proyecto y además para informar sobre las restricciones y los potenciales riesgos en los frentes de obra.
- El plan de inspecciones de obra contempla la verificación de áreas críticas, definidas con base en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER). Este establece la periodicidad de las inspecciones según el nivel de riesgo, así como los responsables encargados de su ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas correctivas derivadas. Como mínimo, se incluyen inspecciones a equipos y maquinaria, comportamientos seguros, cumplimiento de procedimientos de trabajo y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que abarca maquinaria, equipos, herramientas, vehículos e instalaciones locativas. Este programa define actividades, frecuencias, responsables y registros, con el fin de garantizar condiciones seguras de operación, prevenir fallas y reducir la ocurrencia de incidentes o accidentes asociados al estado de los equipos e infraestructura.
- En relación con el control del tráfico vehicular, se cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el cual contempla los dispositivos, señalización y medidas operativas necesarias para gestionar de manera segura la movilidad en los diferentes tramos de la vía donde se realizan intervenciones totales o parciales. Este plan se implementa conforme a la normatividad vigente, garantizando la seguridad de los trabajadores, usuarios de la vía y demás actores viales.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	--

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO E INTERVENTORIA EN EL PERIODO:

Correos:

A continuación, se presentan a modo de ejemplo dos asuntos de correos electrónicos: uno emitido por la interventoría al contratista, relacionado con los insumos del informe semanal, y otro remitido por el contratista a la interventoría, mediante el cual se solicita la autorización de ingreso de personal.

Interventoría

- Asunto: Insumos informe semanal SST SEMANA 16 - 23 al 29 de mayo de 2026

Contratista

- Asunto: INGRESO PERSONAL _ 26052026

Oficios:

Con relación a la emisión de oficios por parte de la interventoría, durante el mes de mayo se remitió un (1) oficio al contratista, identificado con radicado INTERURABA-RENTAN-2026-174, cuyo asunto corresponde a: "Reiteración de lineamientos y requerimientos SST".

Nota: El oficio mencionado se encuentra adjunto en el Anexo 35. Comunicaciones.

a. Seguridad Social

Interventoría: Planilla 85448902 pagada el 05/06/2026.

Contratista:

Tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí:

planilla 85448927 pagada el 11/05/2026 y planilla 9504354809 pagada el 05/05/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	---	--

Tramo 4: Mutatá – Pavarandó

Planilla 281840369 pagada el 05/05/2026; planilla 85448927 pagada el 11/05/2026;

Nota: Se evidencia en el **Anexo 21.** Seguridad Social de obra e Interventoría.

b. Presupuestos

Con corte a la fecha, se han realizado dos (2) jornadas de seguimiento y conciliación relacionadas con los presupuestos del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del Plan de Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo (PM-SST) para el Tramo 3. En estas actividades han participado los residentes SST de la Interventoría y del Contratista, verificando la ejecución de los recursos mediante los seguimientos efectuados en campo y su contraste con los registros y soportes documentales disponibles por parte del contratista.

Por otra parte, se informa que el contratista se encuentra realizando ajustes a los presupuestos antes mencionados. En este sentido, la Interventoría permanece atenta a la remisión de la versión actualizada, con el fin de efectuar la correspondiente revisión y emitir las observaciones, recomendaciones o conceptos que resulten pertinentes.

c. Anexos contratista e interventoría:

Dentro del informe mensual del mes de mayo de 2026 se encuentran los siguientes anexos con el siguiente orden:

- Anexo 3. Cronograma de Actividades de obra e Interventoría.
- Anexo 4. Alturas 4272/21 de obra.
- Anexo 5. Espacios Confinados 0491/20 de obra.
- Anexo 6. Indicadores de Estándares Mínimos, obra e interventoría.
- Anexo 7. Licencias SST todo el personal del área, obra e interventoría.
- Anexo 8. Comité Copasst 2013/86 obra e interventoría.
- Anexo 9. Comité Cocola 1010/06 obra e Interventoría.
- Anexo 10. Emergencias 1575/12 de obra e interventoría.
- Anexo 12. PESV de obra.
- Anexo 13. PMT de obra.
- Anexo 14. Protocolo de Bioseguridad obra e interventoría*.
- Anexo 15. Documentos de ingreso de obra e interventoría.
- Anexo 16. Contrato o certificado laboral de obra e interventoría.
- Anexo 17. Inducción y evaluación de obra e Interventoría.

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	--	---

- Anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría.
- Anexo 19. Dotación de obra e Interventoría.
- Anexo 20. Perfil Sociodemográfico de obra e Interventoría.
- Anexo 21. Seguridad Social de obra e Interventoría.
- Anexo 22. Nóminas de obra e interventoría.
- Anexo 23. Inspecciones de seguridad de obra e interventoría.
- Anexo 24. Registro Fotográfico de obra e interventoría.
- Anexo 25. Liquidaciones de obra e Interventoría.
- Anexo 26. Listado de personal de obra e interventoría.
- Anexo 27. Reportes diarios de obra e Interventoría.
- Anexo 28. Presupuestos PMT y PMA-SST de obra.
- Anexo 29. Paz y Salvos de Personerías de obra.
- Anexo 30. Certificados Revisor Fiscal y Rep. Leg. de obra e interventoría.
- Anexo 31. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.
- Anexo 32. Ausentismo general de obra e interventoría.
- Anexo 33. Capacitaciones obra e interventoría.
- Anexo 34. Análisis y conclusiones de obra e interventoría.
- Anexo 35. Comunicaciones.

d. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

Previo al ingreso de cada trabajador, el contratista solicita la respectiva autorización mediante la presentación de la siguiente documentación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Hoja de vida actualizada.
- Examen médico ocupacional de ingreso vigente.
- Recomendaciones o restricciones médicas, cuando aplique.
- Certificado vigente de afiliación a la ARL, EPS, AFP y CCF.
- Copia del contrato laboral o documento que acredite la relación contractual.
- Registro de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), junto con su respectiva evaluación.
- Registro de entrega de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP), conforme a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Certificaciones de formación y competencias requeridas según el cargo (operadores de maquinaria y equipos, curso de auxiliar de tránsito, trabajo en alturas, espacios confinados, entre otros aplicables).
- Perfil del cargo.

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Adicionalmente, el contratista presenta el perfil sociodemográfico actualizado.

e. Subprograma de higiene industrial:

A continuación, se describen los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionado con las labores realizadas por el contratista de obra durante el periodo de reporte del presente informe:

- Entrega de elementos de protección personal y dotación

Durante las actividades de seguimiento realizadas por la Interventoría, se verificó que los trabajadores vinculados al proyecto cuentan y hacen uso de los siguientes elementos de protección personal, de acuerdo con los riesgos asociados a las labores desarrolladas:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad con lente oscuro.
- Protección respiratoria.
- Protección auditiva tipo copa y de inserción.
- Guantes de vaqueta.
- Impermeable color amarillo.
- Botas de seguridad con puntera de protección.
- Botas pantaneras de caucho.

Tramo 1: San Pedro De Urabá – El Tres – Turbo

En relación con la dotación, se evidenció que al personal profesional del contratista le fueron suministradas camisetas tipo polo, chaqueta, gorra y carné institucional, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen de Obra de la Gobernación de Antioquia.

Respecto al personal operativo, la entrega de la dotación se ha realizado de manera parcial, encontrándose el contratista a la espera de la recepción de los elementos pendientes para culminar el proceso de suministro.

No obstante, es importante precisar que las actividades en este tramo se encuentran suspendidas y que el personal ha sido reasignado temporalmente al Tramo 3.

Tramo 3: San Pedro De Urabá – Necoclí

Se verificó que el personal profesional cuenta con camisetas tipo polo, chaqueta, gorra y carné institucional, conforme a los lineamientos del Manual de Imagen de Obra de la Gobernación de Antioquia.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	---

De igual manera, se evidenció que el personal operativo dispone de overoles y pantalones tipo jean que cumplen con las especificaciones establecidas en dicho manual.

Tramo 4: Mutatá - Pavarandó

Se constató que el personal profesional cuenta con camisetas tipo polo, chaqueta, gorra y carné institucional, conforme a los lineamientos del Manual de Imagen de Obra de la Gobernación de Antioquia.

Sin embargo, el contratista se encuentra a la espera de la llegada de la dotación destinada al personal operativo. Mientras se completa este proceso, los trabajadores desarrollan sus actividades utilizando chalecos de alta visibilidad de color naranja.

Ver anexo 18. Entrega de EPP de obra e interventoría y **anexo 19.** Dotación de obra e Interventoría.

- Realización de inducciones en SST al personal que ingresa al proyecto.
- Ejecución de inspecciones de seguridad y listas de chequeo preoperacionales de maquinaria, equipos y vehículos.
- Acompañamiento permanente del personal SST a las actividades operativas desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.
- Instalación y mantenimiento de unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.
- Desarrollo de jornadas de orden y aseo en las áreas intervenidas.
- Instalación y mantenimiento de señalización preventiva, informativa y reglamentaria en los frentes de trabajo.
- Presentación y verificación de la documentación requerida para el ingreso de trabajadores, maquinaria, equipos y vehículos al proyecto.
- Instalación de carpas en los frentes de obra para proporcionar áreas de resguardo y descanso a los trabajadores, contribuyendo a la protección frente a condiciones climáticas adversas durante el desarrollo de las actividades.
- Realización de capacitaciones y charlas de sensibilización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

f. Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el período objeto del presente informe, el contratista desarrolló diversas charlas de sensibilización y capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dirigidas al personal vinculado al proyecto, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y promover prácticas seguras durante la ejecución de las actividades. Entre las temáticas abordadas se encuentran:

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
---	---	---

Tabla 11. Relación de charlas diarias y capacitaciones

CAPACITACIONES			
TRAMO 1: SAN PEDRO DE URABÁ – EL TRES – TURBO			
TEMA	N° DE ASISTENTES	FECHA	RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN
Deberes y obligaciones de los trabajadores – Tramo 1	12	25/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Votación y elección de Cocola – Tramo 1 -	12	27/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
TRAMO 3: SAN PEDRO DE URABÁ – NECOCLÍ			
TEMA	N° DE ASISTENTES	FECHA	RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN
Hidratación y suministro de hidratación para el personal	20	09/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Orden y aseo y señalización de áreas	39	11/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Celebración del día de la madre	37	12/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Señalización y delimitación de obra	40	13/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Funciones del auxiliar ambiental	35	14/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Riesgo biológico	49	16/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Socialización de temas de reunión del Copasst	43	16/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Compromiso diligenciamiento del ATS	34	18/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Socialización incumplimiento manejo defensivo en las áreas de influencia operador volqueta Julián Moreno	1	19/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Uso adecuado de baños	46	19/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Uso de EPP – Gafas	40	21/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Uso de EPP – Gafas	3	21/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Importancia de una buena inspección preoperacional	40	20/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Udo de los EPP (barbuquejo y gafas) – Tramo 3	46	23/05/2026	Carlos Enrique Gil Berrio
Rotulación y etiquetado de sustancias químicas – Tramo 3	41	27/05/2026	Luisa Fernanda Herrera
Comportamientos y condiciones seguras – Tramo 3	46	28/05/2026	Luisa Fernanda Herrera
Actores viales peatones, ciclistas, motociclistas y conductores – Tramo 3	40	30/05/2026	Luisa Fernanda Herrera
Protección respiratoria en actividades de doble riego	38	29/05/2026	Juan Andrés Gómez
TRAMO 4: MUTATÁ - PAVARANDÓ			
TEMA	N° DE ASISTENTES	FECHA	RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN
Divulgación y diligenciamiento del ART al personal de topografía	3	19/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo ntecon S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
--	---	--

Identificar área de trabajo – Prohibido uso del celular	14	21/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez
Como identificar actos inseguros – condiciones inseguras	16	22/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez
Dinámica de banco de preguntas SST – Tramo 4 -	16	23/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez
Diligenciamiento y diligenciamiento del ART – Tramo 4	22	25/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez
Prohibiciones en construcción civil (operadores) – Tramo 4	22	26/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez
Socialización de la conformación del Cocola – Tramo 4 -	26	27/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez
Riesgos por bromas en el trabajo – Tramo 4	23	23/05/2026	Jessica Paola Martínez Pérez

Adicionalmente a las charlas y capacitaciones relacionadas en la tabla anterior, se anexan los registros de las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Necoclí a las auxiliares de tránsito vinculadas al Tramo 3 (San Pedro de Urabá – Necoclí), orientadas al fortalecimiento de sus competencias para el adecuado desarrollo de las actividades de regulación y control del tránsito en los frentes de obra:

Ver **Anexo 33**. Capacitaciones obra e interventoría.

g. Accidentes laborales presentados en el periodo

Durante el período de reporte del presente informe, no se registraron accidentes de trabajo.

Ver **Anexo 31**. Consolidado Accidentalidad de obra e interventoría.

h. Seguimiento PESV, Maquinaria, Vehículos y Equipos

Durante el período evaluado, el contratista continuó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos técnicos definidos para la ejecución del proyecto.

Es importante resaltar que, conforme avanzan las actividades de limpieza, instalación de alcantarillas y ejecución de bacheos, el contratista ha venido implementando progresivamente el PMT en los diferentes frentes de trabajo. Actualmente, se cuenta con señalización vertical fija y tijera portátil.

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Por otra parte, en relación con la maquinaria y equipos, con corte a la fecha del presente informe, el contratista dispone en campo de:

Tabla 12. Listado de maquinaria y vehículos

CAMIONETAS				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
CAMIONETA	NISSAN	GSN496	NP300 FRONTIER	2020
CAMIONETA	CHEVROLET	UFX623	LUV D MAX	2011
CAMIONETA	CHEVROLET	KKV764	LUD D MAX	2012
RETROEXCAVADORAS				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC063780	420F	2017
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC007836	420F	2013
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC100426	420F2	2018
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	MC763933	420	2025
RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	MC700992	H940C	2024
MOTONIVELADORA				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	MC089341	140K	2011
VIBROCOMPACTADOR				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
VIBROCOMPACTADORA	HAMM	MC055207	3411	2015
VOLQUETAS				
TIPO	MARCA	PLACA	LINEA	AÑO MODELO
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EQX512	WORKSTAR 7600 SBA	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TMW578	SIN LINEA	2008
VOLQUETA	KENWORTH	WFB823	T800	2015
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EQX516	WORKSTAR 7600 SBA	2015
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EXU895	WORKSTAR 7600 SBA	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TAY127	T800	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TAY138	T800	2015

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

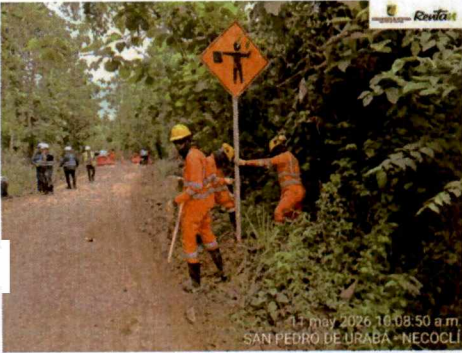
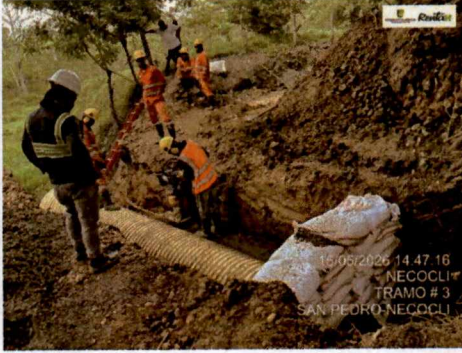
 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo intecon S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
--	---	---

VOLQUETA	KENWORTH	WFB874	T800	2015
VOLQUETA	KENWORTH	WFB876	T800	2015
FURGON	CHEVROLET	TZP922	NHR	2016
CAMIÓN	CHEVROLET	SSI249	NKR	2009
VOLQUETA	KENWORTH	SNU959	T800	2013
VOLQUETA	KENWORTH	TAY154	T800	2015
VOLQUETA	KENWORTH	TAY049	T800	2015
VOLQUETA	INTERNATIONAL	EQX513	WORKSTAR 7600 SBA	2015

Estos equipos cuentan con la documentación vigente, la cual ha sido revisada y aprobada por la interventoría.

i. Registro fotográfico:

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista e interventoría en el mes de mayo de 2026.

		
Mantenimiento de señalización de obra transversal	Verificación de controles de obra transversal	Mesa de trabajo Tramo 1

10. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Durante el período evaluado, correspondiente al mes de mayo de 2026, la Interventoría GRUPO INTECON S.A.S. realizó el seguimiento y la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objeto del contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	 Grupo INTECON S.A.S INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA
---	--	--

(PM-SST) y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte del contratista CONSORCIO URABÁ 25, en los tramos 1 San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo, 3 San Pedro de Urabá – Necoclí y 4 Mutatá – Pavarandó, en el marco del contrato cuyo objeto corresponde a la ejecución de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías de la subregión de Urabá (Lote 3), a cargo del Departamento de Antioquia.

Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció un desempeño satisfactorio en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, reflejado en los siguientes aspectos:

- Acompañamiento permanente en campo durante la ejecución de actividades de limpieza, instalación de obras transversales y bacheo.
- Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal en campo.
- Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el campamento, las Zonas de Disposición de Materiales Excedentes (ZODME) y los diferentes frentes de obra.
- Suministro permanente de hidratación a todo el personal.
- Disponibilidad de unidades sanitarias portátiles en los frentes de trabajo.
- Realización de jornadas de orden y aseo en los frentes de obra.
- Atención oportuna de las oportunidades de mejora identificadas por la interventoría.
- Desarrollo de inducciones, charlas y capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Entrega oportuna de los insumos requeridos para la estructuración de los informes semanales.

No obstante, se identificaron aspectos susceptibles de mejora que requieren fortalecimiento por parte del contratista:

- Completar la entrega de la dotación al 100 % del personal operativo, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Visual de la Gobernación de Antioquia.
- Consolidar la entrega completa de la documentación de ingreso del personal. Aunque esta ha sido remitida oportunamente, se han evidenciado documentos faltantes que posteriormente han requerido subsanación.
- Garantizar la entrega previa y oportuna de la documentación requerida para la revisión y aprobación de maquinaria, volquetas y vehículos antes de su ingreso y puesta en operación dentro del proyecto.
- Realizar el mantenimiento, reposición y ajuste permanente de la señalización y demarcación temporal en cada uno de los frentes de obra intervenidos.
- Fortalecer las actividades de planeación y logística para garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos y socializados con las comunidades para los cierres y aperturas de vía.
- Mejorar el diligenciamiento, control documental y conservación de los registros asociados al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
--	--	---

- Estructurar e implementar el Protocolo de Bioseguridad, cuya adopción ha sido postergada desde el mes de marzo de 2026. Lo anterior evidencia un incumplimiento reiterado frente a los requerimientos establecidos en el Anexo 14 del informe mensual, toda vez que el contratista ha informado de manera consecutiva que su implementación se realizará durante el mes siguiente, sin que a la fecha dicha gestión se haya materializado.

Finalmente, se destaca que durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, situación que permitió la ejecución de las actividades programadas sin afectaciones al normal desarrollo del contrato.

11. CONCLUSIONES:

Desde el punto de vista administrativo, el contratista evidencia un adecuado nivel de organización en la ejecución de sus actividades, atendiendo de manera oportuna las observaciones y requerimientos formulados por la interventoría. Asimismo, se resalta la comunicación efectiva entre las partes, aspecto que ha facilitado la gestión y el seguimiento de los temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.

El acompañamiento permanente del componente SST durante la ejecución de las actividades en campo ha contribuido al fortalecimiento del control operativo en labores de limpieza, instalación de alcantarillas y bacheo. De igual manera, se evidencia un avance progresivo en la consolidación de la cultura de prevención y autocuidado entre los trabajadores.

No obstante, persisten oportunidades de mejora relacionadas con la gestión documental, el control de registros, la administración de equipos y maquinaria, la conservación de la señalización temporal y la implementación del Protocolo de Bioseguridad, aspectos que deberán ser objeto de seguimiento y control durante los próximos períodos de ejecución.

12. RECOMENDACIONES.

- Fortalecer la ejecución, control y trazabilidad de las inspecciones preoperacionales y periódicas realizadas a maquinaria, camionetas, volquetas, equipos de atención de emergencias y elementos de protección personal, considerando que los registros aportados no corresponden a la totalidad de los elementos evidenciados en campo.
- Optimizar la oportunidad en la entrega de los insumos requeridos para la elaboración de los informes semanales y mensuales, con el fin de garantizar su revisión, consolidación y remisión dentro de los plazos contractuales establecidos.

	GRUPO INTECON S.A.S Contrato de Interventoría No 20250429 DE 2025 INFORME SST MENSUAL N° 4	
---	---	---

- Garantizar la entrega previa de la documentación requerida para la revisión y aprobación de maquinaria, volquetas y vehículos antes de su ingreso y puesta en operación en el proyecto.
- Realizar de manera permanente las actividades de mantenimiento, reposición y ajuste de la señalización y demarcación temporal en los diferentes frentes de obra.
- Fortalecer la planeación y logística operativa para asegurar el cumplimiento de los horarios de cierre y apertura de vía previamente socializados con las comunidades del área de influencia.
- Mejorar el diligenciamiento, organización, control y conservación de los registros asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Priorizar la estructuración, aprobación e implementación del Protocolo de Bioseguridad, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y a los requerimientos establecidos en el Anexo 14 del informe mensual.

Objeto del contrato de interventoría. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN URABÁ (LOTE 3) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO
