

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	991 de 2021	Contratista:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Contrato de Interventoría No.	985 de 2021	Interventoría:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

INFORME MENSUAL No.	60	MES O PERIODO:	may-26
----------------------------	----	-----------------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Items no previstos		35
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		48
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	60
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	76
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	80
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	144
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	148
4.6	Resumen ensayo de laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	152
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	536
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	542
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		829
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	830
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	832
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	833
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	845
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	856
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	857
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		885
5.1	Información general del contrato		885
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		886
5.3	Informes especialistas y profesionales		926
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1020
5.5	Informe matriz de riesgos.		1021
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1037
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		1037
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1038
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1039
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1042
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1055
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1058
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1063
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1070
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1071
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1073
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1075
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		1086
8	Anexos		1090
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1090
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1105
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1282
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1289


Nota:



Firmado digitalmente
por GALLEGO
SANCHEZ KAREN
DANIELA
Fecha: 2026.08.07
14:06:47 -05'00'

Firma: _____
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0815 de fecha 17 DE MARZO 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

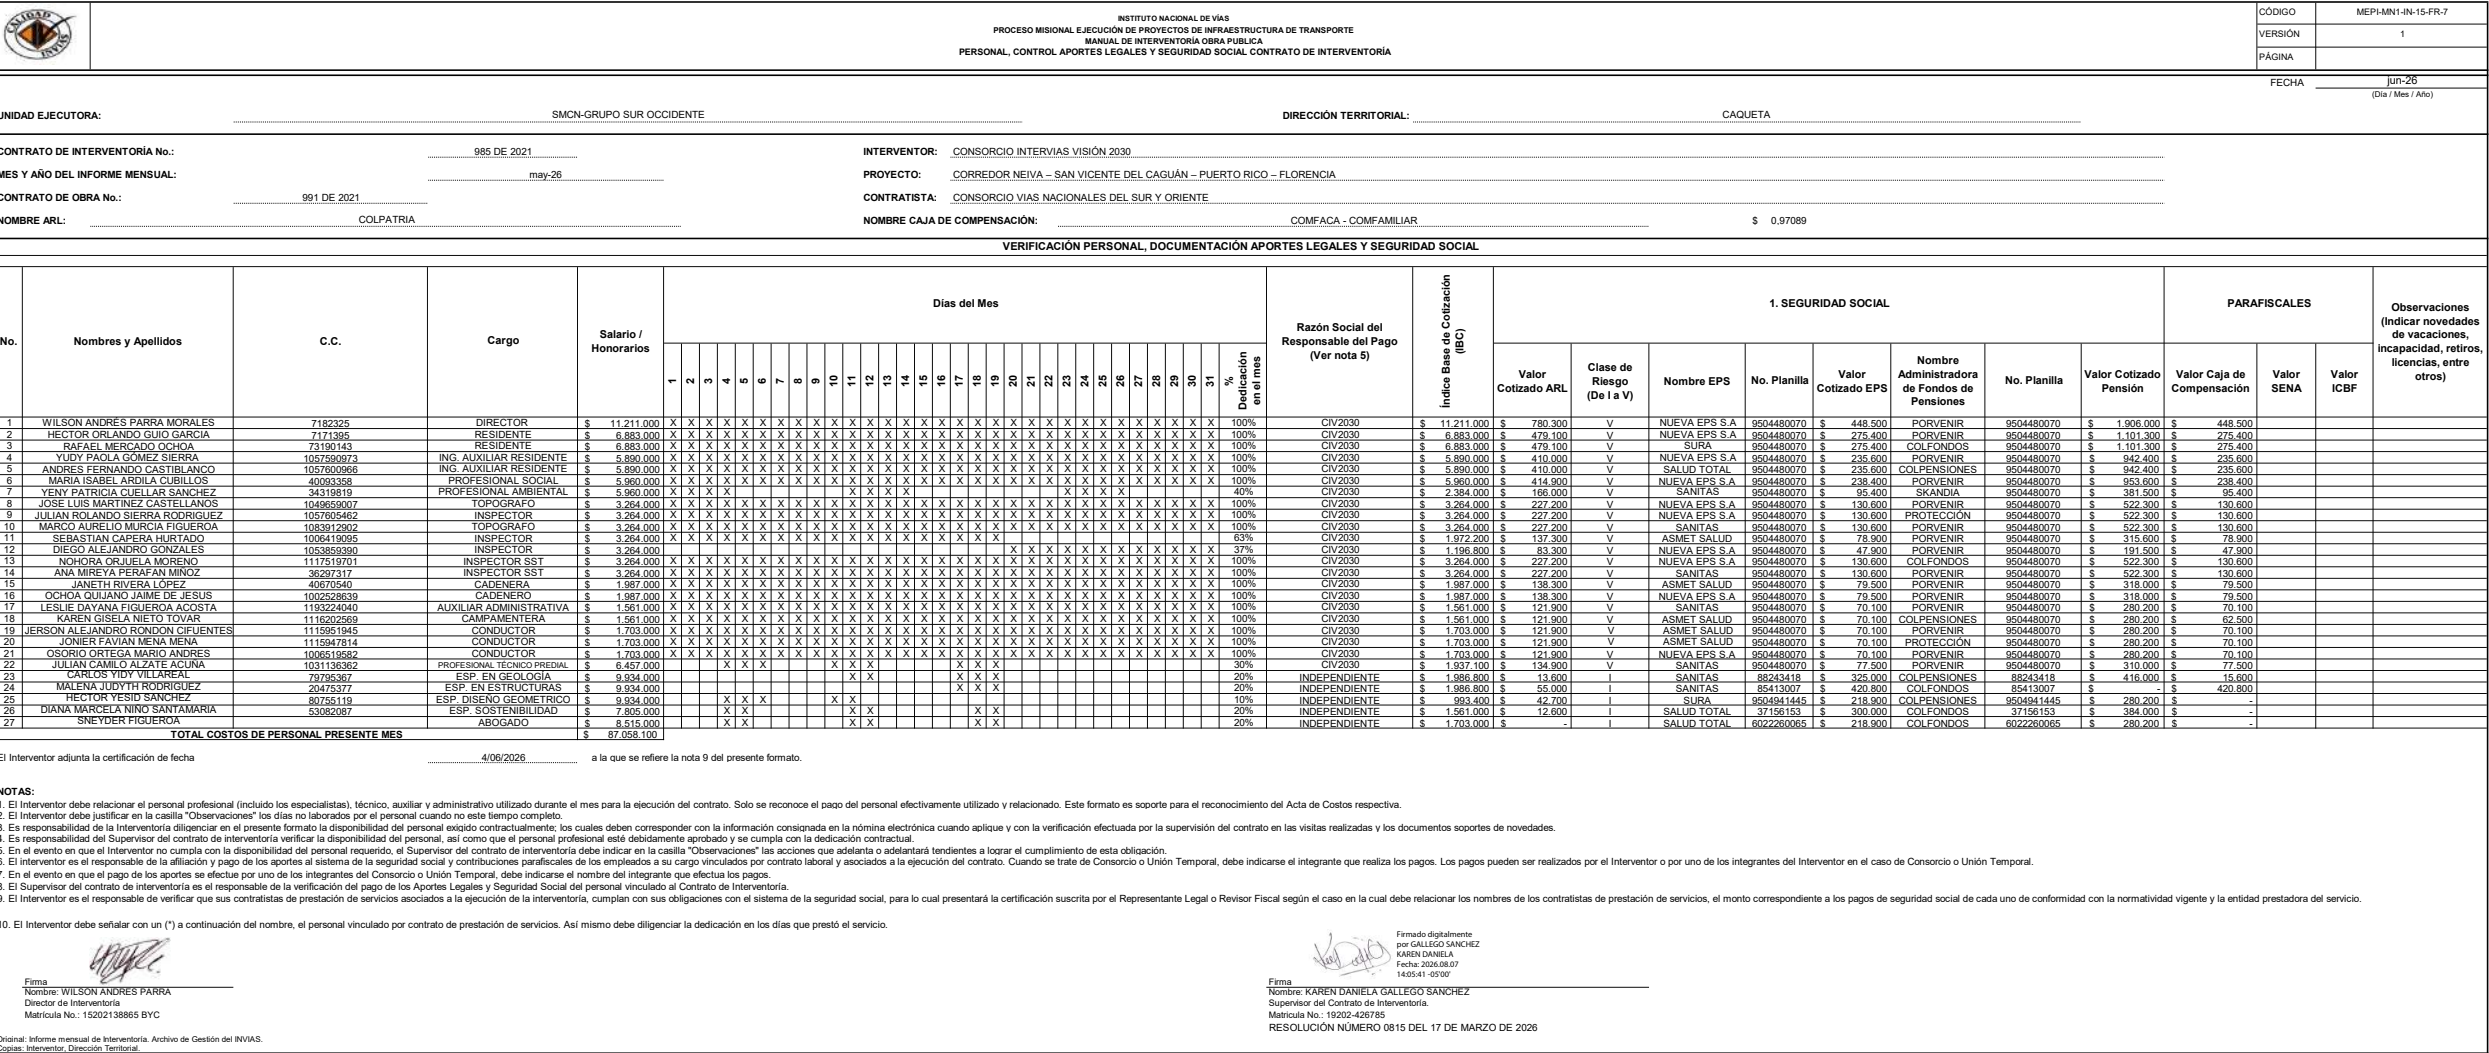

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPLMN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

										FECHA	5/06/2026 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA						

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030				
MES INFORME MENSUAL: mayo-26					PROYECTO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021					CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	127125	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 442.826.389,00	\$ -
2025	347425	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Adicional	\$ 1.200.000.000,00	\$ -
2026	158726	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 1.414.581.018,00	\$ 1.255.502.318,00
2026	158726	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 442.826.389,00	\$ -
2026	158726	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 31.481.482,00	\$ - \$ 486.095.517,00
2026	244226	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 1.345.947.145,00	\$ 1.345.947.145,00
2026	244226	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 16.234.568,00	\$ 16.234.568,00
2026	244226	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACIÓN	Contrato Principal	\$ 98.929.398,00	\$ 98.929.398,00
TOTAL						\$ 4.992.826.389	\$ 2.716.613.429,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 34.699.975.248,00
-------------------------------	----------------------

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
55	dic-25	\$ 44.622.474,00	\$ 8.478.270,00	\$ 53.100.744,00		\$ 53.100.744		No. 127125 de (06/03/2025)	\$ 37.370.412	\$ 21.822.408.862		PROYECTO 135
55	dic-25	\$ 239.235.504,00	\$ 45.454.746,00	\$ 284.690.250,00		\$ 284.690.250		No. 347425 de (07/05/2025)	\$ 200.348.198	\$ 21.537.718.612		PROYECTO 132
56	ene-26	\$ 31.403.708,00	\$ 5.966.704,00	\$ 37.370.412,00		\$ 37.370.412		No. 127125 de (06/03/2025)	\$ -	\$ 21.500.348.200	INVIAS-CP-R26-4174	PROYECTO 135
56	ene-26	\$ 168.359.830,00	\$ 31.988.368,00	\$ 200.348.198,00		\$ 200.348.198		No. 347425 de (07/05/2025)	\$ -	\$ 21.300.000.002	INVIAS-CP-R26-4174	PROYECTO 132
								No. 244226 de (05/02/2026)	\$ 1.461.111.111			PROYECTO 132
								No. 158726 de (27/01/2026)	\$ 1.888.888.889			PROYECTO 135
56	ene-26	\$ 43.187.946,00	\$ 8.205.710,00	\$ 51.393.656,00		\$ 51.393.656		No. 158726 de (27/01/2026)	\$ 1.837.495.233	\$ 21.248.606.346	INVIAS-CP-R26-4174	PROYECTO 135

57	feb-26	\$ 246.078.366,00	\$ 46.754.890,00	\$ 292.833.256,00		\$ 292.833.256		No. 158726 de (27/01/2026)	\$ 1.544.661.977	\$ 20.955.773.090	INVIAS-CP-R26-4176	PROYECTO 135
58	mar-26	\$ 242.991.310,00	\$ 46.168.349,00	\$ 289.159.659,00		\$ 289.159.659		No. 158726 de (27/01/2026)	\$ 1.255.502.318	\$ 20.666.613.431		PROYECTO 135
59	abr-26	\$ 247.982.294,00	\$ 47.116.636,00	\$ 295.098.930,00		\$ 295.098.930		No. 158726 de (27/01/2026)	\$ 960.403.388	\$ 20.371.514.501		PROYECTO 135
60	may-26	\$ 243.119.446,00	\$ 46.192.695,00	\$ 289.312.141,00		\$ 289.312.141		No. 158726 de (27/01/2026)	\$ 671.091.247	\$ 20.082.202.360		PROYECTO 135
TOTALES		\$ 12.283.842.759,00	\$ 2.333.930.129,00	\$ 14.617.772.888,00	\$ 980.381.756	\$ 13.637.391.132	\$ -		\$ 2.132.202.358	\$ 20.082.202.360		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	\$ 10.375.813.419	\$ 1.971.404.553	\$ 12.347.217.972
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	\$ 1.908.029.340	\$ 362.525.576	\$ 2.270.554.916
*			
VALOR TOTAL	\$ 12.283.842.759	\$ 2.333.930.129	\$ 14.617.772.888


*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865 BYC

Firmado digitalmente
por GALLEG0 SANCHEZ
KAREN DANIELA
Fecha: 2026.08.07
14:06:11 -05'00'
Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEG0 SANCHI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 19202-426785
RESOLUCIÓN NÚMERO 0815 DEL 17 DE MARZO DE 2026



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA 1 DE 2

FECHA	31/05/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta WLF668	DUSTER 2000 CC 4X4	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Camioneta IMQ033	DUSTER 2000 CC 4X4	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Camioneta WCZ002	NISSAN 2488 CC 4X4	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	HP 255 G7	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Computador	ASUS NOTE BOOK PC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Computador	LENOVO E490	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO THINKBOOK 14-IML	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO IDEAPAD SLIM 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	ASUS ALL IN 1	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO EDEAPAD 3 RYZEN 5	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	ASUS S510U	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A		A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO IDEAPAD SLIM 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A												
Computador	LENOVO IDEAPAD SLIM 3																				A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO THINKBOOK 14-IML	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	ASUS VIBOOK 1415	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	HP ALLIN ONE 22DD0XXX	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	ACER ASPIRE 5	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO IDEAPAD SLIM 3	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	ASUS X542U	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	Lenovo ThinkBook 15-IML	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	HP PROBOOK 450 G10	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Computador	LENOVO E490	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
Celular	REDMI NOT 8 PRO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	SAMSUNG A14	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	IPHONE 11	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	IPHONE 16	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	SAMSUNG A53	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	IPHONE 13	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	REDMI NOTE 13 PRO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	IPHONE 16E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	HUAWEI AQM - LX1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Celular	REDMI 12	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

[illegible]

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

ESTACION TOTAL TOPCON 18/09/2026
NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 18/09/2026
ESTACION TOTAL GEOMAX 16/07/2026
NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4 16/07/2026
CAMIONETA IMQ033 DUSTER 2000 CC 4X4 SOAT: 30/11/2026 **TÉCNICO MECÁNICA:** 27/11/2026
CAMIONETA WFL-668 CC SOAT:31/11/2026 **TÉCNICO MECÁNICA:**15/10/2026
CAMIONETA WC2002 2488 CC SOAT:25/07/2026 **TÉCNICO MECÁNICA:**20/06/2026

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma _____
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Firma 14:07:49 -05'00'
Nombre: KAREN DANIELA GALLEG0 SANCHEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 19202-426785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

		FECHA	31/05/2026 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
 INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
(Indicar día, mes y año)
 PLAZO INICIAL: (114) MESES
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-ago-30
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐
 APROBADO: SI ☒ NO ☐
 VERSIÓN No. 1
 FECHA DE VERSIÓN: 6/07/2021

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☒ NO ☐
 No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2
 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 5/12/2023

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ☒ NO ☐
 No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 2
 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 2026

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐
 APROBADO: SI ☐ NO ☐
 FECHA DE APROBACIÓN: N/A

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 40
 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 40

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

Se realiza verificación del cumplimiento de las especificaciones generales de construcción INVIAS 2013, mediante ensayos de calidad de los materiales utilizados en cada una de las actividades ejecutadas.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	1 DE 2

FECHA	31/05/2026 (Día / Mes / Año)
-------	--

OBSERVACIONES:
Se hace seguimiento a quejas presentadas ante el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente para el correspondiente periodo, con el fin de dar cumplimiento con los requerimientos solicitados.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCON	274737	18/03/2026	C26CEY 190 18/03/2026	18/09/2026	PUERTO RICO
2	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	WS059736	18/03/2026	C26CEY 191 18/03/2026	18/09/2026	PUERTO RICO
3	ESTACION TOTAL	GEOMAX	2108528	16/01/2026	6175 16/01/2026	16/07/2026	NEIVA
4	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON AT-B4	RX6893	16/01/2026	6174 16/01/2026	16/07/2026	NEIVA

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES

Director de Interventoría

Matrícula No. : 15202138865BYC



Firma

Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ

Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula No. : 19202-426785

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	991 de 2021	Contratista:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Contrato de Interventoría No.	985 de 2021	Interventoría:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

INFORME MENSUAL No.	60	MES O PERIODO:	may-26
----------------------------	----	-----------------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Items no previstos		35
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		48
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		59
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	60
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	76
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	80
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	144
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	148
4.6	Resumen ensayo de laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	152
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	536
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	542
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		829
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	830
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	832
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	833
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	845
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	856
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	857
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		885
5.1	Información general del contrato		885
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		886
5.3	Informes especialistas y profesionales		926
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1020
5.5	Informe matriz de riesgos.		1021
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1037
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		1037
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1038
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1039
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1042
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1055
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1058
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1063
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1070
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1071
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1073
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1075
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		1086
8	Anexos		1090
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		1090
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		1105
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		1282
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		1289

Nota:

Firma: _____
 Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0815 de fecha 17 DE MARZO 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 93,735,215.241	MANO DE OBRA CALIFICADA:	148
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 96,562,691.715	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	132
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	103.02%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	90
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	370
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
PR05+445 Ruta 6504, Suministro e instalación de MDC-19		PR10+900 Ruta 3001, Instalacion de mallá de alta resistencia para estabilización de talud	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
Firma  Nombre: WILSON-ANDRÉS PARRA MORALES Director de Interventoría Matrícula No. : 15202138865BYC Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial			



INFORME MENSUAL N°60

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2026**



LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización	5
Ilustración 2 - Esquema de Localización	6
Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio	9
Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas	9



LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra	11
Tabla 2 Información Contrato Interventoría	57
Tabla 3. Correspondencia Enviada Interventor al Contratista	105
Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista	111



1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 58 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2026, en desarrollo del Contrato de Obra N° 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.



2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

2.1 LOCALIZACIÓN

Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.


Ilustración 1 - Esquema de localización



Fuente: Web Google Earth



Ilustración 2 - Esquema de Localización

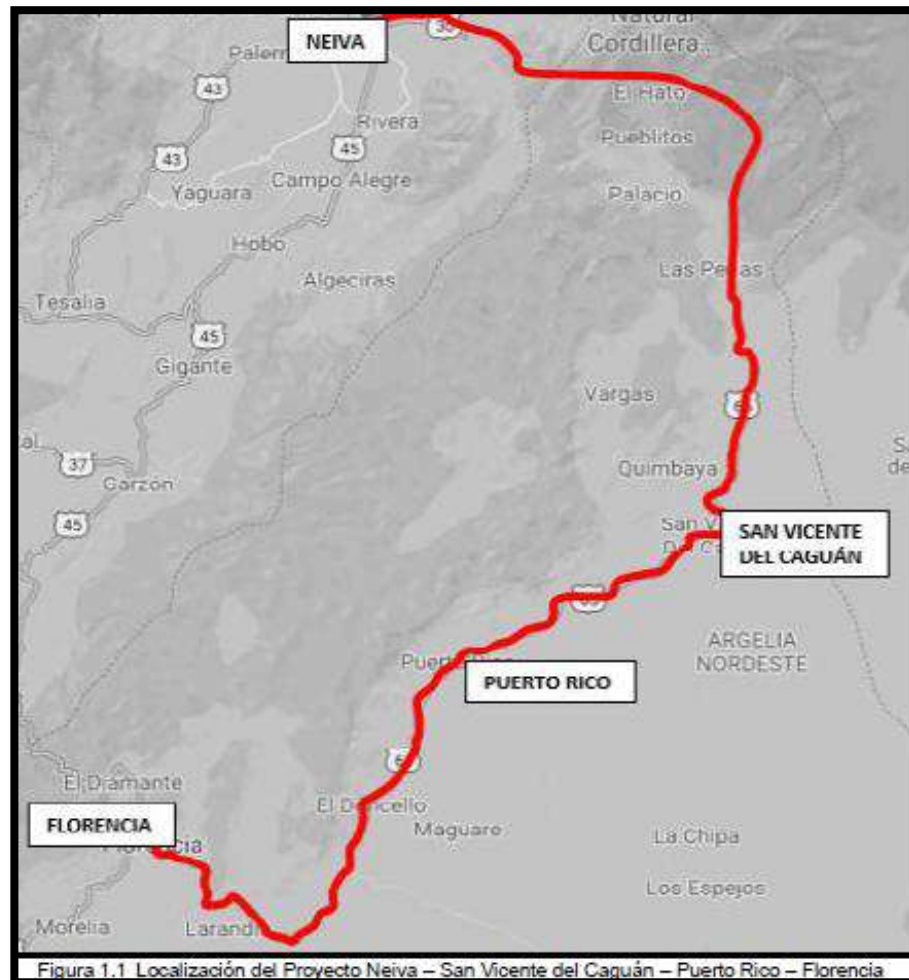

Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país. Los municipios del área de influencia directa son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia en el departamento del Caquetá y Neiva en el departamento del



Huila, el corredor está comprendido por la Región Andina y Amazónica de Colombia, con grandes riquezas naturales en dónde los principales cultivos son de maíz, frijol, patilla (sandía), plátano, café y yuca, de igual manera se observa ganadería extensiva (siendo esta zona una de las que más aporta ganado en pie al interior del país) y algunos espacios para el manejo de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos, aves de corral (pollos y gallinas para producción de huevo y carne). Trabajo de campo equipo social.

Estos departamentos están habitados por diferentes comunidades y culturas indígenas; alrededor del corredor vial se puede encontrar el Volcán del Puracé, el Nevado del Huila, el Páramo de Sumapaz, la Zona plana del Río Magdalena, y sobre el corredor atraviesa el parque regional Iberia Ceibas ubicado en la ruta 3001 entre el PR31+713 y el PR47+924. La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

El corredor objeto de intervención del contrato de referencia está conformado por varias rutas, la ruta 30 que está dividida en la 3001 y 3002 las cuales están conformadas de la siguiente manera: RUTA 3001: Neiva - Balsillas: Tramo que atraviesa lugares como Neiva, La Victoria (Neiva), Santa Helena (Neiva) y Balsillas (Límite Caquetá) en Huila. RUTA 3002: Balsillas - Mina Blanca: Tramo que atraviesa lugares como Balsillas (Límite Huila), Rovira (San Vicente del Caguán, Acceso), Guayabal (San Vicente del Caguán), Perlas II (San Vicente del Caguán), Mina Blanca (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Entre Mina Blanca (San Vicente del Caguán), Río Caguán (San Vicente del Caguán) , Yarí (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Dentro del área de intervención también se encuentra la Ruta 65, en los tramos 3 y 4 comprende la ciudad de Florencia involucrando como área directa a 500 metros los municipios El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, esta ruta se encuentra dividida de la siguiente manera: Ruta 6503: Florencia – Puerto Rico Ruta 6504: Puerto Rico – Minas Blanca.

Con la ejecución de esta obra en una zona afectada significativamente por el conflicto armado colombiano, la débil presencia institucional, se beneficia a más de 250.000 habitantes del departamento del Caquetá, que podrán acceder a servicios básicos como salud, educación y ofertas institucionales que se garantizan en las cabeceras municipales, de igual manera permite que la comercialización de los productos que se hagan en menor tiempo y con calidad, ya que los tiempos de transitabilidad se optimizan.



De igual manera se valorizan los predios de estas zonas y se mejora la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en estas zonas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 344 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.


2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 344 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Asfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial “Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia” en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.
- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc.)

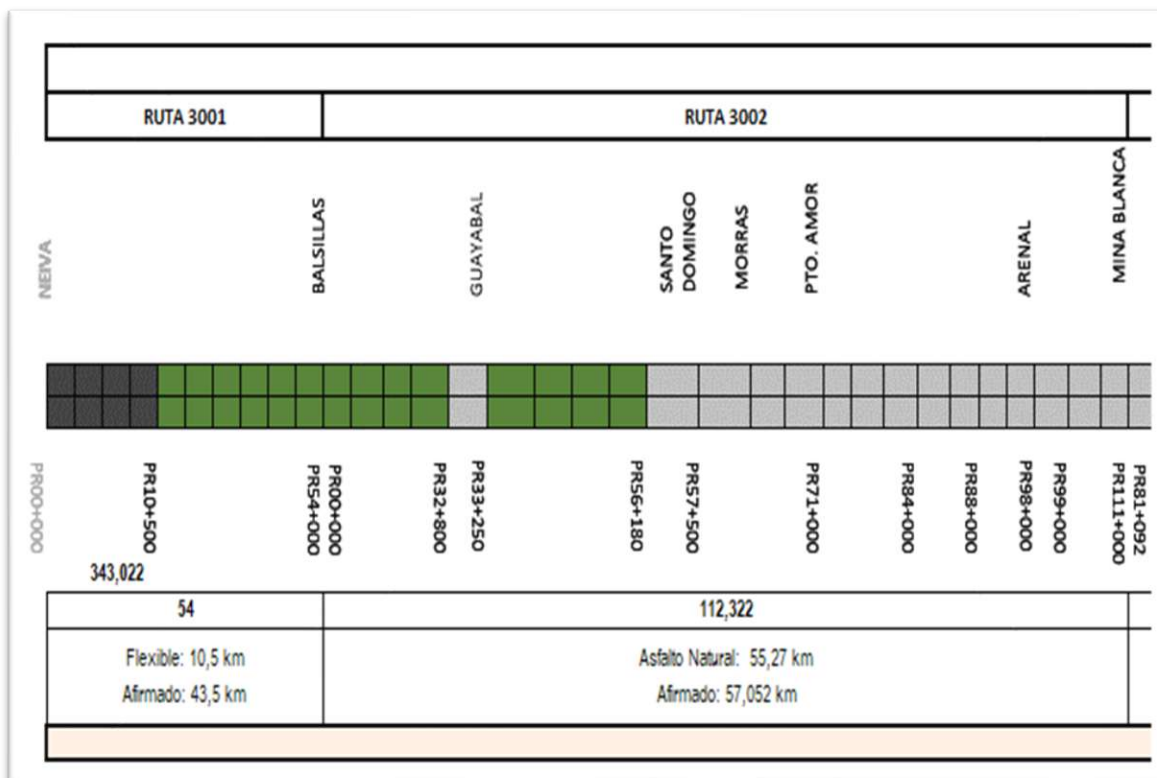

Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán



3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021. OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CTO DE OBRA No.	Contrato de Obra No 991 de 2021		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES



FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR INICIAL CTO.	\$399.567.436.436 M/CTE,	VALOR ANTICIPO.	\$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	\$9.885.528.230 M/CTE	VALOR ADICIÓN 2	\$3.600.000.000 M/CTE
VALOR TOTAL DEL CTO.	\$413.052.964.666 M/CTE		

Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades:

✓ RUTA 6503, FLORENCIA – PUERTO RICO

- Suministro, instalación y compactación de Terraplén.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR38+085	PR38+259	Calzada completa	Acceso Sur a puente

- Suministro e instalación de Manto TRM 500 para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR38+300	PR38+400	Derecho	Muro mecánicamente estabilizado
PR38+305	PR38+400	Izquierdo	Muro mecánicamente estabilizado



- Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras.

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR38+303	PR38+303	Calzada completa	Placa de aproximación E2
PR38+303	PR38+303	Carril izquierdo	Barrera New Jersey placa de aproximación E2
PR38+303	PR38+303	Carril derecho	Barrera New Jersey placa de aproximación E2
PR38+307	PR38+317	Izquierdo	Barrera New Jersey – M1
PR38+317	PR38+327	Izquierdo	Barrera New Jersey – M2
PR38+327	PR38+337	Izquierdo	Barrera New Jersey – M3
PR38+337	PR38+347	Izquierdo	Barrera New Jersey – M4
PR38+347	PR38+357	Izquierdo	Barrera New Jersey – M5
PR38+357	PR38+367	Izquierdo	Barrera New Jersey – M6
PR38+367	PR38+377	Izquierdo	Barrera New Jersey – M7
PR38+377	PR38+387	Izquierdo	Barrera New Jersey – M8
PR38+387	PR38+397	Izquierdo	Barrera New Jersey – M9
PR38+397	PR38+407	Izquierdo	Barrera New Jersey – M10
PR38+407	PR38+417	Izquierdo	Barrera New Jersey – M11
PR38+417	PR38+427	Izquierdo	Barrera New Jersey – M12
PR38+427	PR38+437	Izquierdo	Barrera New Jersey – M13
PR38+465	PR38+475	Izquierdo	Barrera New Jersey – M17
PR38+475	PR38+485	Izquierdo	Barrera New Jersey – M18



PR38+485	PR38+495	Izquierdo	Barrera New Jersey – M19
PR38+495	PR38+505	Izquierdo	Barrera New Jersey – M20
PR38+505	PR38+515	Izquierdo	Barrera New Jersey – M21
PR38+515	PR38+525	Izquierdo	Barrera New Jersey – M22
PR38+301	PR38+311	Derecho	Barrera New Jersey – M1
PR38+311	PR38+321	Derecho	Barrera New Jersey – M2
PR38+321	PR38+331	Derecho	Barrera New Jersey – M3
PR38+331	PR38+341	Derecho	Barrera New Jersey – M4
PR38+341	PR38+351	Derecho	Barrera New Jersey – M5
PR38+351	PR38+361	Derecho	Barrera New Jersey – M6
PR38+361	PR38+371	Derecho	Barrera New Jersey – M7

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR38+303	PR38+303	Calzada completa	Placa de aproximación puente E2
PR38+990	PR38+990	Carril derecho	Estructura descole alcantarilla

- Construcción de barrera New Jersey en concreto de resistencia 28 MPa.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR38+215	PR38+225	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M15



PR38+235	PR38+245	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+255	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M17
PR38+255	PR38+256	Izquierdo	Zarpa barrera New Jersey – M18
PR38+155	PR38+165	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M8
PR38+165	PR38+175	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M9
PR38+175	PR38+185	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M10
PR38+185	PR38+195	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+249	Derecho	Zarpa barrera New Jersey – M17
PR38+307	PR38+317	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M1
PR38+317	PR38+327	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M2
PR38+327	PR38+337	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M3
PR38+337	PR38+347	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M4
PR38+347	PR38+357	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M5
PR38+357	PR38+367	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M6
PR38+367	PR38+377	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M7



PR38+377	PR38+387	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M8
PR38+387	PR38+397	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M9
PR38+397	PR38+407	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M10
PR38+465	PR38+475	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M17
PR38+475	PR38+485	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M18
PR38+485	PR38+495	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M19
PR38+495	PR38+505	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M20
PR38+505	PR38+515	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M21
PR38+515	PR38+525	Izquierdo	Zarpa Barrera New Jersey – M22
PR38+215	PR38+225	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+255	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M17
PR38+255	PR38+256	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M18
PR38+185	PR38+195	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M16



PR38+245	PR38+255	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M17
PR38+255	PR38+256	Izquierdo	Corona Barrera New Jersey – M18
PR38+155	PR38+165	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M8
PR38+165	PR38+175	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M9
PR38+175	PR38+185	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M10
PR38+185	PR38+195	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+249	Derecho	Muro Barrera New Jersey – M17
PR38+085	PR38+095	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M1
PR38+095	PR38+105	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M2
PR38+105	PR38+115	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M3
PR38+115	PR38+125	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M4
PR38+125	PR38+135	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M5
PR38+135	PR38+145	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M6
PR38+145	PR38+155	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M7
PR38+155	PR38+165	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M8



PR38+165	PR38+175	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M9
PR38+175	PR38+185	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M10
PR38+185	PR38+195	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M11
PR38+195	PR38+205	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M12
PR38+205	PR38+215	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M13
PR38+215	PR38+225	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M14
PR38+225	PR38+235	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M15
PR38+235	PR38+245	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M16
PR38+245	PR38+249	Derecho	Corona Barrera New Jersey – M17
PR38+259	PR38+259	Izquierdo	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+259	PR38+259	Derecho	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+303	PR38+303	Izquierdo	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+303	PR38+303	Derecho	Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación
PR38+307	PR38+317	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M1
PR38+317	PR38+327	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M2
PR38+465	PR38+475	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M17



PR38+475	PR38+485	Izquierdo	Muro Barrera New Jersey – M18
----------	----------	-----------	-------------------------------

- Excavación sin clasificar de la explanación y canales.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR38+000	PR38+055	Calzada completa	Subrasante

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR38+000	PR38+055	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR38+000	PR38+055	Calzada completa

- Suministro e instalación de afirmado.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR38+990	PR38+990	Derecho	Relleno sobre muro y aletas alcantarilla

- Imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) en actividades de mantenimiento vial.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR37+760	PR38+020	Calzada completa	Primera capa
PR38+625	PR41+430	Calzada completa	Primera capa

- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 en actividades de mantenimiento vial.



PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR36+130	PR36+230	Carril izquierdo	Primera capa
PR36+670	PR36+740	Carril derecho	Primera capa
PR37+760	PR38+020	Calzada completa	Primera capa
PR38+625	PR41+430	Calzada completa	Primera capa

✓ **RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA**

- Replanteo eje de alineamiento, levantamiento topográfico inicial para cálculo de cantidades de excavación en construcción de obras hidráulicas.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR00+454	PR00+454	Derecho	Estructura box culvert
PR05+735	PR05+735	Izquierdo	Estructura box culvert
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Estructura box culvert
PR09+874	PR09+874	Derecho	Estructura alcantarilla

- Demolición de estructuras existentes.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR00+454	PR00+454	Derecho	Estructura box culvert
PR05+735	PR05+735	Izquierdo	Estructura box culvert
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Estructura box culvert
PR09+874	PR09+874	Derecho	Estructura alcantarilla
PR09+916	PR09+960	Derecho	Cuneta



PR09+925	PR10+000	Izquierdo	Cuneta
----------	----------	-----------	--------

- Remoción de alcantarillas.

PR	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR06+875	Izquierdo	Tubería - Alcantarilla
PR09+872	Derecho	Tubería - Alcantarilla

- Excavación sin clasificar de la explanación y canales.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR09+853	PR09+862	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+864	PR09+870	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+850	PR10+000	Calzada completa	Subrasante

- En conjunto comisión topográfica de contratista e interventoría hacen medición y cálculo de cantidades de excavación.
- Excavación sin clasificar para construcción de obras hidráulicas.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura y tubería encoleta alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Descole box culvert
PR08+027	PR08+095	Derecho	Filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Filtro
PR08+253	PR08+264	Izquierdo	Muro de contención
PR09+866	PR09+874	Derecho	Estructura descole alcantarilla



- Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación en los siguientes tramos:

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR09+853	PR09+862	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+864	PR09+870	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+850	PR10+000	Calzada completa	Subrasante
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Estructura y tubería encole alcantarilla
PR07+481	PR07+481	Derecho	Descole box culvert
PR08+027	PR08+095	Derecho	Filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Filtro
PR08+253	PR08+264	Izquierdo	Muro de contención
PR09+866	PR09+874	Derecho	Estructura descole alcantarilla

- Suministro e instalación de afirmado.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR06+875	PR06+875	Izquierdo	Relleno sobre tubería alcantarilla
PR09+872	PR09+872	Derecho	Relleno sobre tubería alcantarilla
PR09+853	PR09+862	Izquierdo	Mejoramiento de fallo
PR09+864	PR09+870	Izquierdo	Mejoramiento de fallo



- Suministro e Instalación de Geotextil no tejido.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Suministro e instalación de Tubería perforada 4".

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Suministro e Instalación de Material granular drenante.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL / COSTADO	OBRA
PR08+027	PR08+095	Izquierdo	Construcción de filtro
PR08+190	PR08+235	Izquierdo	Construcción de filtro

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.



LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+320	Calzada completa
PR03+324	PR03+330	Calzada completa
PR07+915	PR07+915	Acceso a predio
PR09+700	PR09+830	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+320	Calzada completa
PR03+324	PR03+330	Calzada completa
PR07+915	PR07+915	Acceso a predio
PR09+700	PR09+830	Calzada completa

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+330	Calzada completa
PR07+100	PR07+370	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	CARRIL
PR03+300	PR03+330	Calzada completa
PR07+100	PR07+370	Calzada completa

- Imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1).

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR03+298	PR03+300	Carril izquierdo	Primera capa
PR03+300	PR03+331	Calzada completa	Primera capa



PR03+331	PR03+332	Carril Derecho	Primera capa
PR05+620	PR05+714	Calzada completa	Primera capa
PR06+180	PR06+764	Calzada completa	Primera capa
PR06+764	PR06+790	Carril Derecho	Primera capa
PR03+290	PR03+295	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+295	PR03+335	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+335	PR03+337	Carril Derecho	Segunda capa
PR05+440	PR05+705	Calzada completa	Segunda capa
PR03+230	PR03+283	Carril Derecho	Tercera capa
PR03+283	PR03+341	Calzada completa	Tercera capa
PR03+341	PR03+343	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+394	PR05+439	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+439	PR05+696	Calzada completa	Tercera capa

- Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR03+380	PR03+380	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+390	PR03+390	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+298	PR03+300	Carril izquierdo	Primera capa
PR03+300	PR03+331	Calzada completa	Primera capa
PR03+331	PR03+332	Carril Derecho	Primera capa
PR05+620	PR05+714	Calzada completa	Primera capa
PR06+180	PR06+764	Calzada completa	Primera capa
PR06+764	PR06+790	Carril Derecho	Primera capa
PR03+290	PR03+295	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+295	PR03+335	Calzada completa	Segunda capa
PR03+335	PR03+337	Carril Derecho	Segunda capa
PR05+440	PR05+705	Calzada completa	Segunda capa
PR03+230	PR03+283	Carril Derecho	Tercera capa
PR03+283	PR03+341	Calzada completa	Tercera capa
PR03+341	PR03+343	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+394	PR05+439	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+439	PR05+696	Calzada completa	Tercera capa



- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

PR INICIAL	PR FINAL	CARRIL /COSTADO	OBRA
PR03+380	PR03+380	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+390	PR03+390	Costado izquierdo	Acceso a predio
PR03+298	PR03+300	Carril izquierdo	Primera capa
PR03+300	PR03+331	Calzada completa	Primera capa
PR03+331	PR03+332	Carril Derecho	Primera capa
PR05+620	PR05+714	Calzada completa	Primera capa
PR06+180	PR06+764	Calzada completa	Primera capa
PR06+764	PR06+790	Carril Derecho	Primera capa
PR03+290	PR03+295	Carril izquierdo	Segunda capa
PR03+295	PR03+335	Calzada completa	Segunda capa
PR03+335	PR03+337	Carril Derecho	Segunda capa
PR05+440	PR05+705	Calzada completa	Segunda capa
PR03+230	PR03+283	Carril Derecho	Tercera capa
PR03+283	PR03+341	Calzada completa	Tercera capa
PR03+341	PR03+343	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+394	PR05+439	Carril izquierdo	Tercera capa
PR05+439	PR05+696	Calzada completa	Tercera capa

- Instalación de tubería de concreto reforzado diámetro 36".

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR06+875	Izquierdo	Tubería	Alcantarilla
PR09+872	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de obras.

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR08+098	Izquierdo	Solado de limpieza caja encole	Alcantarilla



PR08+253	Izquierdo	Solado zarpa	Muro de contención
PR08+280	Izquierdo	Solado zarpa	Muro de contención

- Acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras.

PR	CARRIL / COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR00+454	Derecho	Placa inferior y muros	Box culvert
PR08+098	Izquierdo	Estructura encole	Alcantarilla
PR08+253	Izquierdo	Zarpa y vástago	Muro de contención
PR08+280	Izquierdo	Zarpa y vástago	Muro de contención

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto.

PR	COSTADO / CARRIL	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR06+875	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR07+858	Izquierdo	Muro y aletas	Alcantarilla
PR07+858	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR08+098	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR08+098	Izquierdo	Muro caja	Alcantarilla
PR08+253	Izquierdo	Zarpa y vástago	Muro de contención

✓ RUTA 3002, BALSILLAS – MINAS BLANCAS

- Se realiza remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias en las siguientes abscisas:



ABSCISA
PR16+700
PR19+100
PR19+680
PR21+364
PR25+565
PR26+900
PR27+762
PR28+265
PR29+000
PR32+393
PR36+512
PR36+525
PR36+850
PR37+000
PR37+285
PR39+500
PR39+925
PR41+500
PR41+900
PR43+550
PR44+000
PR44+287
PR45+025
PR45+150
PR45+508
PR47+000



PR48+400

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realiza demolición de estructuras de drenaje existentes en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR15+620	Izquierdo
PR15+780	Izquierdo

- Se realiza remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias en las siguientes abscisas:

ABSCISA
PR29+195
PR31+027
PR32+250
PR32+323
PR34+300
PR34+330
PR34+500
PR34+750
PT37+000

- Se realiza excavación mecánica, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO	OBSERVACIONES
PR15+772-PR15+798	Derecho	Excavación mecánica cajeo aproximación a subrasante Carril derecho
PR 15+802	Derecho	Excavación Mecánica para la construcción de box culvert, cuerpo medio hacia descole



- Se realiza relleno en recebo de las estructuras (obras de arte), en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO	OBSERVACIONES
PR15+802	Derecho	Suelo de fundación box culvert

- Se realiza suministro e instalación de concreto de 14 Mpa, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO	OBSERVACIONES
Alcantarilla PR15+960	Margen derecho	- Solado para apoyo de tubería - Solado para placa de descole - Solado dentellón
Alcantarilla PR15+960	Margen izquierdo	Solado para placa de encole
Alcantarilla PR15+745	Margen izquierdo	Solado para placa de encole
Box culvert PR15+802	Margen derecho	- Solado para placa de descole - Solado dentellón
Box culvert PR15+802	Margen derecho	- Solado para placa de descole - Solado dentellón

- Suministro e instalación de acero $F_y=420$ Mpa utilizado en la construcción de cunetas en zonas de accesos y curvas en las siguientes abscisas:



ABSCISA	COSTADO
PR16+117	Izquierdo
PR16+131	Izquierdo
PR16+127	Izquierdo
PR16+125	Izquierdo

- Se realiza instalación de acero $F_y=420$ Mpa para construcción de las siguientes obras de drenaje:

ABSCISA	COSTADO
Acero de refuerzo para construcción de cabezal descole de alcantarilla PR15+960	Derecho
Acero de refuerzo para construcción de poceta PR15+960	Izquierdo
Acero de refuerzo para construcción de box culvert PR15+802	Derecho
Acero de refuerzo para construcción de palca de descole y aletas de Box culvert PR15+620	Derecho
Acero de refuerzo para construcción de poceta PR15+745	Izquierdo

- Se realiza la adecuación del terreno, nivelación y conformación de superficie de apoyo para instalación de formaleta y posterior suministro e instalación de concreto de 17.5 Mpa de resistencia vaciado in situ para construcción de cunetas, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR16+131– PR16+133	Izquierdo
PR16+117	Izquierdo
PR16+127	Izquierdo
PR16+125	Izquierdo



- Suministro e instalación de concreto con resistencia a la compresión de 28 Mpa para la construcción de las siguientes obras de drenaje.

ABSCISAS	COSTADO
Construcción de losa superior de box culvert PR15+620	Derecho
Construcción de losa de poceta PR15+745	Izquierdo
Construcción de muros de poceta PR15+745	Izquierdo
Construcción de losa de poceta PR15+960	Izquierdo
Construcción de muros de poceta PR15+960	Izquierdo
Construcción de Cabezal descole de alcantarilla PR15+960	Derecho
Construcción de Box culvert PR15+802	Derecho
Construcción de Cabezal descole de Box culvert PR15+620	Derecho
Construcción de solera descole de Box culvert PR15+802	Derecho

- Se realiza suministro e instalación de geotextil no tejido, material granular filtrante y tubería perforada de 4" para la construcción de filtro transversal, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR15+620	Izquierdo

- Se realiza suministro e instalación de cinta PVC Sika o similar, en las siguientes abscisas:



ABSCISA	COSTADO
Losa poceta de alcantarilla PR15+745	Izquierdo
Losa poceta de alcantarilla PR15+960	Izquierdo
Placa de descole alcantarilla PR15+960	Derecho
Losa inferior de Box culvert PR15+802	Derecho
Placa de descole Box culvert PR15+802	Derecho
Placa de descole Box culvert PR15+620	Derecho

- Se realiza suministro e instalación Malla Hexagonal de Alta Resistencia para la estabilización de taludes, en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR10+995 – PR11+005	Derecho

- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan proyección y cálculo de cantidades de obra para acta N°60 correspondiente al mes de mayo 2026.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

- ÍTEMS NO PREVISTOS No. 1 - 2022

Se realizo la inclusión del paquete No. 1 mediante acta de modificación de cantidades No.2 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (4-oct-2022), reprogramación al programa de inversiones No.2 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (4-oct-2022), acta de fijación de ítems no previstos No. 1

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

N° Np Paquete No. 3	Descripción
NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5
NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)



NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)
NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)
NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)
NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)
NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar
NP9	Geotextil NT 4000 o Similar
NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2 - 2023**

Se realizó la inclusión del paquete No.2 mediante acta de modificación de cantidades No. 4 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (5-may-2023), reprogramación al programa de inversiones No.3 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (5-may-2023), acta de fijación de ítems no previstos No. 2

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

Nº Np Paquete No. 3	Descripción
NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)
NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos



NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos
NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro
NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
NP21	Concreto Plástico 28 MPA para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max=15m rasante
NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503
NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3**

Se realizó la inclusión del paquete No.3 mediante acta de modificación de cantidades No. 6 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (17-jun-2024), reprogramación al programa de inversiones No. 5 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (17-jun-2024), acta de fijación de ítems no previstos No. 3

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:



N° Np Paquete No. 3	Descripción
NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M
NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa
NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado
NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.
NP35	Corte de asfalto H=11cm
NP36	Hidrosiembra manual
NP37	Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros
NP38	Tala De Árboles Clase 2 - H: 5.01 A 10 Metros
NP39	Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros
NP40	Tala De Árboles Clase 4 - H :15,01 A 20 Metros

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4**

Se realizo la inclusión del paquete No.4 mediante acta de modificación de cantidades No. 8 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (06-mar-2025), reprogramación al programa de inversiones No. 7 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (06-mar-2025), acta de fijación de ítems no previstos No. 4

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

N° Np actual	Descripción
NP 41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm
NP 42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia
NP 43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)
NP 44	Suministro e instalación de Captafaro
NP 45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)



NP 46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
NP 51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos
NP 52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá
NP 53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá
NP 54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm
NP 55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm
NP 56	Desmante Y Retiro De Junta Existente
NP 57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardarruedas (No incluye el acero)
NP 58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardarruedas (No incluye el acero)
NP 59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila
NP 60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila
NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano
NP 62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila
NP 63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"
NP 64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES - 2024**

Se realizo la inclusión del paquete de ítems no previstos para compensaciones ambientales con la aprobación por parte de Subdirección de Sostenibilidad del Instituto



Nacional de Vías, mediante oficio 2024S-VBOG-089103 del 27 de noviembre de 2024, donde se aprueban los Nps y el Plan de Inversión Ambiental (PIA)

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

1. Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022 ruta 3001 Los Ítems No Previstos para la actividad de por el cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro, siembra y riego de árboles, de acuerdo a la Resolución 2330 del 2022	Unidad
Mantenimiento por unidad de árbol de acuerdo a la Resolución 2330 de 2022. Se realizará 4 mantenimientos por 1 año.	Unidad
Mantenimiento mensual y trimestral epífitas de acuerdo con la Resolución 2230 de 2022	Visita
Mantenimiento epífitas anual de acuerdo a la Resolución 2230 de 2022	Visita
2. Compensación requerida por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 artículo decimo ruta 3001	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 de 2022 ruta 3001. No incluye siembra, ni transporte	Unidad
3. Compensación requerida permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo ruta 6504	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6504. No incluye siembra, ni transporte	Unidad
Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SEXTO numeral 17 ruta 6504	Unidad
4. Compensación requerida permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6503	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte	Unidad



Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SEXTO numeral 16 ruta 6503	Unidad
5. Compensación requerida por Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto ruta 6503 en el marco de la emergencia en los municipios de la montaña y el paujil departamento del Caquetá	
Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal PAF CT-DTC 0673 de 2023 ARTICULO QUINTO Ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte	Unidad

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 5 - 2025**

Se realizo la inclusión del paquete No.5 mediante acta de modificación de cantidades No. 9 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (20-mar-2025), reprogramación al programa de inversiones No. 8 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (20-mar-2025), acta de fijación de ítems no previstos No. 5
Lo ítems no previstos presentados son los siguientes:

N° Np Paquete No. 5	Descripción
NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro
NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600
NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60
NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar
NP69	Suministro y fabricación de estructura metálica puente las delicias
NP70	Montaje de estructura metálica puentes las delicias
NP71	Transporte de estructura metálica puente las delicias
NP72	Suministro e instalación de drenajes en tubería PVC 4"

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 6**

Se realizo la inclusión del paquete No.6 mediante acta de modificación de cantidades No. 11 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (29-oct-2025), reprogramación al programa de inversiones No.



10 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (29-oct-2025), acta de fijación de ítems no previstos No. 6 (8-sep-2025). Los ítems no previstos presentados por el contratista son los siguientes:

N° Np Paquete No. 6	Descripción
NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcho manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)
NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias
NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)
NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias
NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503
NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503
NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión
NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS
NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS
NP82	Prueba de Carga Para Puente
NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 7**

El contratista realizó la radicación de los ítems no previstos paquete No. 7 mediante comunicado CVNSO-0991-868-2025 el 26 de diciembre de 2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría, para lo cual, el 20 de enero de 2026 se realizó mesa de trabajo en conjunto contratista e interventoría donde se formularon las observaciones y se encuentran en proceso de atención por parte del contratista.

Los ítems no previstos presentados por el contratista son los siguientes:



N° Np Paquete No. 7	Descripción
NP84	Suministro e instalación de junta de dilatación elastomérica Expansión 50mm
NP85	Suministro e instalación de concreto de 21MPa para recubrimiento de gaviones e=0.05m (No incluye acero de refuerzo)
NP86	Dren Horizontal d=2" - Long max=30m para el sitio crítico PR16+400 RN 6504
NP87	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP88	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP89	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP90	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP91	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025
NP92	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS – DE ACUERDO CON RES. 1916 DE 2025

La radicación de los Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	RECIBIDO	ASUNTO	ENVIADO	FECHA	ASUNTO
14-ago-25	CVNSO-0991-539-2025	Presentación del paquete de APU's de Ítems No. 7 No Previstos	C-245-3967-1350-25	29/08/2025	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-539-2025 con asunto "Presentación del paquete de APU's de Ítems No. 7 No Previstos"
			C-245-4170-1708-25	18/11/2025	Solicitud urgente y reiterada de presentación de APUs ajustados y soportes técnicos de Ítems No Previstos (NPs) para el Paquete N.º 7, incluyendo la Junta de Dilatación "NP 73" y los ítems de Señalización



					Vertical "NP 80 y NP 81".
26-dic-25	CVNSO-0991-868-2025	Respuesta al comunicado C-245-3967-1350-25 y C-245-4170-1708-25 "Presentación del paquete de APU's de Ítems No. 7 No Previstos"			
20-ene-26	Mesa de trabajo	Considerando la entrega de los documentos correspondientes al paquete de Ítems No Previstos N.º 7, la Interventoría convoco mesa de trabajo para el día 20 de enero de 2026, a las 9:00 a. m., con el propósito de agilizar la revisión y el proceso de conciliación, a fin de continuar con el trámite de aprobación de los NPS N.º 7.			
16-mar-2026	CVNSO-0991-180-2026	CVNSO-0991-180-2026 Alcance a comunicado CVNSO-0991-868-2025 "Presentación del paquete de APU's de Ítems No. 7 No Previstos"			
26-mar-2026	Mesa de trabajo	Considerando la entrega de los documentos correspondientes al paquete de Ítems No Previstos N.º 7, la Interventoría convoco mesa de trabajo para el			



		día 26 de enero de 2026, a las 1':00 a. m., con el propósito de agilizar la revisión y el proceso de conciliación, a fin de continuar con el trámite de aprobación de los NPS N.º 7.			
			C-245-4590-0964-26	24/04/2026	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-180-2026 con asunto "Alcance a comunicado CVNSO-0991-868-2025 "Presentación del paquete de APU de Ítems No. 7 No Previstos"
16-may-2026	CVNSO-0991-298-2026	Respuesta a Comunicados: i) C-245-4590-0964-26 con asunto "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-180-2026 con asunto "Alcance a comunicado CVNSO 0991-868-2025 "Presentación del paquete de APU de Ítems No. 7 No Previstos" y ii) C-245-4622-1041-26 con asunto: "RESPUESTA A COMUNICADO C-245-4544-0805-26, ASUNTO: REQUERIMIENTO DE REPORTE DE AVANCES EN TRÁMITES DE PERMISOS Y PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN SOBRE EL SECTOR QUEBRADA LAS DECILIAS – ACTAS ACTAEL_1 Y ACTAPE_1."			



			C-245- 4684-1225- 26	25/05/2026	Entrega de documentación de Ítems N°7, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021
--	--	--	----------------------------	------------	--

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES - 2025**

El contratista realizó la radicación de los ítems no previstos de actividades ambientales paquete No. 2 mediante comunicado CVNSO-0991-869-2025 el 26 de diciembre de 2025, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Los ítems no previstos presentados por el contratista son los siguientes:

Descripción Ítems No Previstos	Unidad
Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares en cumplimiento a requerimientos de la Autoridad Ambiental indicados en actos administrativos (Incluye insumos).	Unidad
Ahuyentamiento y rescate de Fauna Silvestre - Según artículo quinto de la Resolución 1916 de 2025	Mes
Construcción y adecuación de vivero para el manejo de epifitas, autorizadas por la Resolución 1916 de 2025	Unidad
Suministro de plántulas de Aguacate Hass y Aguacate Lorena para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal Resolución 1916 de 2025 (No incluye siembra).	Unidad
Suministro de plántulas de limón común, naranja y mandarina para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal Resolución 1916 de 2025 (No incluye siembra).	Unidad

La radicación de los Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:



FECHA	RECIBIDO	ASUNTO	ENVIADO	FECHA	ASUNTO
26-dic-25	CVNSO-0991-869-2025	Entrega del paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.			
			C-245-4446-0498-26	3-mar-2026	Respuesta al oficio CVNSO-0991-869-2025 con asunto "Entrega del paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.".
31-mar-26	CVNSO-0991-209-2026	Respuesta comunicación C-245 4446-0498-26 Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales			
			C-245-4646-1092-26	11-may-2026	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-209-2026 con asunto "Respuesta comunicación C-245-4446-0498-26 Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales."
22-may-26	CVNSO-0991-313-2026	Respuesta a comunicado C-245-4646-1092-26. "Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales."			
			C-245-4685-1226-26	25-may-2026	Respuesta a oficio CVNSO-0991-313-2026, con asunto Respuesta a comunicado C-245-4646-1092-26.



					“Observaciones paquete N°2 de Ítems No Previstos de actividades ambientales.
--	--	--	--	--	--

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.11 el cual contiene el ajuste de acuerdo con el acta de modificación de cantidades de obra N°12 y la actualización del valor básico a ejecutar en la vigencia del año 2026 de acuerdo con el Plan de Intervención. En este programa de inversiones se establece el porcentaje programado 28.34% y el porcentaje de ejecución es de 28.85% de cada una de las actividades a corte de 31 de mayo de 2026.

En la programación en el mes de mayo se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Construcción de box culvert y alcantarillas.
6. Construcción de obras (sitios atípicos).
7. Construcción de obras de estabilización de taludes.
8. Construcción de puente las Delicias PR38+295
9. Remoción de derrumbes.

En el mes de mayo se remitieron 7 conceptos de especialistas, contando con la aprobación de los siguientes volúmenes:

Especialista en geotecnia: Ruta 6503 – PR54+579 comunicado con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-211-2026 con asunto "Respuesta comunicado C- 245-3971-1354-25 "Alcance a comunicado C-245-2913 1478-24 con asunto "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-469-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones –



Geotécnico del Sitio Crítico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"""". mediante comunicado C-245-4645-1090-26 con concepto de NO OBJECCIÓN el 11 de mayo de 2026.

Especialista en fundaciones: PR 16+000 comunicado con asunto Respuesta a oficio CVNSO-0991-075-2026 con asunto "Respuesta comunicado C-245-4056-1515-25 "Remisión Volumen Geotecnia – Fundaciones Punto Crítico PR16+000 RN3002"." mediante comunicado C-245-4651-1105-26 con concepto de No objeción el 12 de mayo de 2026.

En el proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca, en la ruta 6503, se continúan actividades para la construcción del puente sobre la quebrada Las Delicias, se realiza suministro, instalación y compactación de Terraplén del PR38+085 a PR38+259 calzada completa acceso Sur a puente, se realiza suministro e instalación de Manto TRM 500 para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos del PR38+300 a PR38+400 costado derecho y PR38+305 a PR38+400 costado izquierdo, se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras en PR38+303 calzada completa placa de aproximación E2, PR38+303 carril izquierdo Barrera New Jersey placa de aproximación E2, PR38+303 carril derecho Barrera New Jersey placa de aproximación E2, PR38+307 a PR38+317 carril izquierdo Barrera New Jersey – M1, PR38+317 a PR38+327 carril izquierdo Barrera New Jersey – M2, PR38+327 a PR38+337 carril izquierdo Barrera New Jersey – M3, PR38+337 a PR38+347 carril izquierdo Barrera New Jersey – M4, PR38+347 a PR38+357 carril izquierdo Barrera New Jersey – M5, PR38+357 a PR38+367 carril izquierdo Barrera New Jersey – M6, PR38+367 a PR38+377 carril izquierdo Barrera New Jersey – M7, PR38+377 a PR38+387 carril izquierdo Barrera New Jersey – M8, PR38+387 a PR38+397 carril izquierdo Barrera New Jersey – M9, PR38+397 a PR38+407 carril izquierdo Barrera New Jersey – M10, PR38+407 a PR38+417 carril izquierdo Barrera New Jersey – M11, PR38+417 a PR38+427 carril izquierdo Barrera New Jersey – M12, PR38+427 a PR38+437 carril izquierdo Barrera New Jersey – M13, PR38+465 a PR38+475 carril izquierdo Barrera New Jersey – M17, PR38+475 a PR38+485 carril izquierdo Barrera New Jersey – M18, PR38+485 a PR38+495 carril izquierdo Barrera New Jersey – M19, PR38+495 a PR38+505 carril izquierdo Barrera New Jersey – M20, PR38+505 a PR38+515 carril izquierdo Barrera New Jersey – M21, PR38+515 a PR38+525 carril izquierdo Barrera New Jersey – M22, PR38+301 a PR38+311 carril derecho Barrera New Jersey – M1, PR38+311 a PR38+321 carril derecho Barrera New Jersey – M2, PR38+321 a PR38+331 carril derecho Barrera New Jersey – M3, PR38+331 a PR38+341 carril derecho Barrera New Jersey – M4, PR38+341 a PR38+351 carril derecho Barrera New Jersey – M5, PR38+351 a PR38+361 carril



derecho Barrera New Jersey – M6, PR38+361 a PR38+371 carril derecho Barrera New Jersey – M7. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto en PR38+303 Calzada completa placa de aproximación puente E2 y PR38+990 carril derecho Estructura descole alcantarilla. Se continua actividad de construcción de barrera New Jersey en concreto de resistencia 28 MPa de PR38+215 a PR38+225 carril izquierdo zarpa barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+255 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M17, PR38+255 a PR38+256 carril izquierdo Zarpa barrera New Jersey – M18, PR38+155 a PR38+165 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M8, PR38+165 a PR38+175 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M9, PR38+175 a PR38+185 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M10, PR38+185 a PR38+195 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+249 carril derecho Zarpa barrera New Jersey – M17, PR38+307 a PR38+317 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M1, PR38+317 a PR38+327 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M2, PR38+327 a PR38+337 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M3, PR38+337 a PR38+347 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M4, PR38+347^a a PR38+357 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M5, PR38+357 a PR38+367 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M6, PR38+367 a PR38+377 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M7, PR38+377 a PR38+387 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M8, PR38+387 a PR38+397 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M9, PR38+397 a PR38+407 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M10, PR38+465 a PR38+475 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M17, PR38+475 a PR38+485 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M18, PR38+485 a PR38+495 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M19, PR38+495 a PR38+505 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M20, PR38+505 a PR38+515 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M21, PR38+515 a PR38+525 carril izquierdo Zarpa Barrera New Jersey – M22, PR38+215 a PR38+225 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+255 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M17, PR38+255 a PR38+256 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M18, PR38+185 a PR38+195 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril izquierdo Corona



Barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+255 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M17, PR38+255 a PR38+256 carril izquierdo Corona Barrera New Jersey – M18, PR38+155 a PR38+165 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M8, PR38+165 a PR38+175 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M9, PR38+175 a PR38+185 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M10, PR38+185 a PR38+195 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+249 carril derecho Muro Barrera New Jersey – M17, PR38+085 a PR38+095 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M1, PR38+095 a PR38+105 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M2, PR38+105 a PR38+115 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M3, PR38+115 a PR38+125 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M4, PR38+125 a PR38+135 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M5, PR38+135 a PR38+145 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M6, PR38+145 a PR38+155 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M7, PR38+155 a PR38+165 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M8, PR38+165 a PR38+175 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M9, PR38+175 a PR38+185 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M10, PR38+185 a PR38+195 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M11, PR38+195 a PR38+205 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M12, PR38+205 a PR38+215 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M13, PR38+215 a PR38+225 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M14, PR38+225 a PR38+235 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M15, PR38+235 a PR38+245 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M16, PR38+245 a PR38+249 carril derecho Corona Barrera New Jersey – M17, PR38+259 a PR38+259 carril izquierdo Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+259 a PR38+259 carril derecho Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+303 a PR38+303 carril izquierdo Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+303 a PR38+303 carril derecho Muro y corona Barrera New Jersey – Placa aproximación, PR38+307 a PR38+317 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M1, PR38+317 a PR38+327 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M2, PR38+465 a PR38+475 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M17, PR38+475 a PR38+485 carril izquierdo Muro Barrera New Jersey – M18. Se continua actividad de excavación sin clasificar de la explanación y canales en PR38+000 a PR38+055 calzada completa Subrasante, comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase



granular y se realiza suministro, instalación, nivelación y compactación. Se realiza suministro e instalación de afirmado PR38+990 carril derecho relleno sobre muro y aletas alcantarilla. Mediante comunicado C-245-4613-1022-26 radicado el 4 de mayo 2026, esta Interventoría en atención al comunicado CVNSO-0991-248-2026 mediante el cual el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente se pronuncia respecto de los oficios C-245-4534-0775-26 y C-245-4558-084926, esta Interventoría se permite dar respuesta y reiterar los siguientes requerimientos: Adoptar los correctivos pertinentes frente a los retrasos identificados en las actividades de las rampas de acceso (Id. 9 al 19), conforme a la programación aprobada para la vigencia 2026. Presentar, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles contados a partir de la recepción del presente comunicado, un informe técnico detallado que justifique de manera individualizada las causas de cada actividad retrasada. Se reitera al Contratista que la mención genérica de la situación de pagos no constituye, por sí sola, una justificación técnica suficiente, debiendo acreditarse en cada caso la relación directa entre la causa alegada y la actividad específicamente afectada. Lo anterior, en atención a que cualquier retraso debe contar con un sustento documental que permita atender los requerimientos presentes y futuros de los entes de vigilancia y control. Garantizar la disponibilidad permanente del equipo mínimo requerido en el frente de obra del puente (planta de concreto, mixer, trituradora, retroexcavadora de orugas, motoniveladora, compactadores y volquetas). El 5 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4622-1041-26 en atención al comunicado CVNSO-0991-254-2026 mediante el cual el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente presenta el avance de las gestiones adelantadas para la reubicación de la red de media tensión en el sector Quebrada Las Delicias, y una vez realizada la revisión técnica de la documentación soporte remitida para el ítem NP93 – Suministro y transporte de insumos para reubicación de redes eléctricas puente vehicular Las Delicias PR38+200 R6503, esta Interventoría se permite formular observaciones, las cuales una vez sean subsanadas se continuara con el trámite de revisión y aprobación del ítem NP93. El 30 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4699-1285-26 interventoría solicita información sobre los avances en la atención del evento ocurrido el día 27 de mayo de 2026 en el PR 38+295, sector Puente Las Delicias, esto con el propósito de realizar el debido monitoreo a las situaciones que puedan derivarse de la ejecución de las actividades constructivas. De acuerdo con la información reportada, durante la ejecución de actividades de extendido de material pétreo para la conformación del terraplén en el estribo del puente sobre la Quebrada Las Delicias, una volqueta al servicio del proyecto, en desarrollo de maniobras de descargue, habría hecho contacto con una red eléctrica de media tensión que alimenta el transformador No.



13043, situación que generó afectación en el servicio prestado a un predio ubicado en el área de incidencia directa de la obra.

Se continua actividad de mantenimiento vial, se realiza imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) del PR37+760 a PR38+020 calzada completa y PR38+625 a PR41+430 calzada completa, se realiza suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 en actividades de mantenimiento vial del PR36+130 a PR36+230 carril izquierdo, PR36+670 a PR36+740 carril derecho, PR37+760 a PR38+020 calzada completa, PR38+625 a PR41+430 calzada completa.

En la ruta 6504, continúan actividades constructivas para pavimentación, comisión topográfica replantea eje de alineamiento y hace levantamiento topográfico inicial para cálculo de cantidades de excavación en construcción de obras hidráulicas localizadas en PR00+454 carril derecho Estructura box culvert, PR05+735 carril izquierdo Estructura box culvert, PR06+875 carril izquierdo Estructura alcantarilla, PR07+481 carril derecho Estructura box culvert, PR09+874 carril derecho Estructura alcantarilla. Se realiza demolición de estructuras existentes en PR00+454 carril derecho Estructura box culvert, PR05+735 carril izquierdo Estructura box culvert, PR06+875 carril izquierdo Estructura alcantarilla, PR07+481 carril derecho Estructura box culvert, PR09+874 carril derecho Estructura alcantarilla, PR09+916 a PR09+960 carril derecho Cuneta, PR09+925 a PR10+000 carril izquierdo Cuneta. Se realiza remoción de alcantarillas en PR06+875 carril izquierdo Tubería – Alcantarilla, PR09+872 carril derecho Tubería – Alcantarilla. Se realiza excavación sin clasificar de la explanación y canales del PR09+853 a PR09+862 carril izquierdo Mejoramiento de fallo, PR09+864 a PR09+870 carril izquierdo Mejoramiento de fallo, PR09+850 a PR10+000 Calzada completa Subrasante. En conjunto comisión topográfica de contratista e interventoría hacen medición y cálculo de cantidades de excavación, también se realiza excavación sin clasificar para construcción de obras hidráulicas en PR06+875 carril izquierdo Estructura y tubería encole alcantarilla, PR07+481 carril derecho descole box culvert, PR08+027 a PR08+095 carril derecho Filtro, PR08+190 a PR08+235 carril izquierdo Filtro, PR08+253 a PR08+264 carril izquierdo Muro de contención y PR09+866 a PR09+874 carril derecho Estructura descole alcantarilla. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación. Se realiza suministro e instalación de afirmado PR06+875 carril izquierdo Relleno sobre tubería alcantarilla, PR09+872 carril derecho Relleno sobre tubería alcantarilla, PR09+853 a PR09+862 carril izquierdo Mejoramiento de fallo y PR09+864 a PR09+870 carril izquierdo Mejoramiento de fallo, se realiza suministro e Instalación de Geotextil no tejido, instalación de Tubería perforada 4" e instalación de Material granular



drenante. del PR08+027 a PR08+095 carril izquierdo construcción de filtro y PR08+190 a PR08+235 carril izquierdo construcción de filtro, comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular del PR03+300 a PR03+320 calzada completa, PR03+324 a PR03+330 calzada completa, PR07+915 a PR07+915 acceso a predio, PR09+700 a PR09+830 calzada completa, se realiza suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular. Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de base granular PR03+300 a PR03+330 calzada completa y PR07+100 a PR07+370 calzada completa, se realiza el suministro, Instalación, nivelación y compactación de base granular. Se realiza imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) de PR03+298 a PR03+300 carril izquierdo Primera capa, PR03+300 a PR03+331 calzada completa Primera capa, PR03+331 a PR03+332 carril derecho Primera capa, PR05+620 a PR05+714 calzada completa Primera capa, PR06+180 a PR06+764 calzada completa Primera capa, PR06+764 a PR06+790 carril derecho Primera capa, en segunda capa del PR03+290 a PR03+295 carril izquierdo, PR03+295 a PR03+335 carril izquierdo, PR03+335 a PR03+337 carril derecho, PR05+440 a PR05+705 calzada completa, PR03+230 a PR03+283 carril derecho, en tercera capa PR03+283 a PR03+341 calzada completa, PR03+341 a PR03+343 carril izquierdo, PR05+394 a PR05+439 carril izquierdo, PR05+439 a PR05+696 calzada completa, comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica y se realiza el suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 de PR03+380 a PR03+380 costado izquierdo acceso a predio y PR03+390 a PR03+390 costado izquierdo acceso a predio, en primera capa PR03+298 a PR03+300 carril izquierdo, PR03+300 a PR03+331 calzada completa, PR03+331 a PR03+332 carril derecho, PR05+620 a PR05+714 calzada completa, PR06+180 a PR06+764 calzada completa, PR06+764 a PR06+790 carril derecho, en segunda capa PR03+290 a PR03+295 carril izquierdo, PR03+295 a PR03+335 calzada completa, PR03+335 a PR03+337 carril derecho, PR05+440 a PR05+705 calzada completa y en tercera capa PR03+230 a PR03+283 carril derecho, PR03+283 a PR03+341 calzada completa, PR03+341 a PR03+343 carril izquierdo, PR05+394 a PR05+439 carril izquierdo y PR05+439 a PR05+696 calzada completa. El 12 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4655-1109-26 está interventoría solicita copia de los soportes documentales que den cuenta de los trámites, gestiones y actuaciones adelantadas en territorio respecto al requerimiento de identificación de redes eléctricas y levantamiento de acta de vecindad RUTA NACIONAL 6504 - PR 8+250 y PR 7+980, lo anterior con el fin de contar con información fehaciente que permita validar el estado



actual de las actuaciones reportadas, así como avalar y consolidar la documentación correspondiente dentro del expediente contractual y de seguimiento del proyecto. El 22 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4678-1201-26 se emiten observaciones al ajuste del diseño geométrico entre PR08 y PR12 de la Ruta 6504.

Se realiza instalación de tubería de concreto reforzado diámetro 36" para construcción de alcantarillas en PR06+875 carril izquierdo y PR09+872 carril derecho, Se realiza suministro e instalación de concreto 14 Mpa para construcción de obras hidráulicas localizadas en PR08+098 carril izquierdo Solado de limpieza caja encole, PR08+253 carril izquierdo Solado zarpa y PR08+280 carril izquierdo Solado zarpa. Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo $f_y=420$ Mpa para construcción de obras en PR00+454 carril derecho Placa inferior y muros Box culvert, PR08+098 carril izquierdo Estructura encole alcantarilla, PR08+253 carril izquierdo Zarpa y vástago Muro de contención, PR08+280 carril izquierdo Zarpa y vástago Muro de contención. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras. Se realiza toma de muestras de concreto PR06+875 carril derecho Muro y aletas alcantarilla, PR07+858 carril izquierdo Muro y aletas alcantarilla, PR07+858 carril derecho Muro y aletas alcantarilla, PR08+098 carril derecho Muro y aletas alcantarilla, PR08+098 carril izquierdo muro caja alcantarilla, PR08+253 carril izquierdo Zarpa y vástago Muro de contención.

Mediante comunicado C-245-4648-1094-26 radicado el 11 de mayo de 2026, interventoría relaciona los elementos estructurales en obras ejecutadas en la Ruta 6503 y 6504, en el cual se presenta No conformidad de acuerdo a los resultados del ensayo de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13, evaluados bajo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, Capítulo 6, Artículo 630, numeral 630.4.2 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. De acuerdo con la revisión de los resultados obtenidos, se evidencia que estos no cumplen con los parámetros establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en consecuencia, y conforme a lo indicado en el numeral 630.5.2.9 – Resistencia, se solicita la toma de núcleos de dichos elementos, siguiendo los lineamientos de la norma INV E-418, con el fin de verificar y certificar la calidad del material instalado, en concordancia con los requisitos técnicos vigentes. El 13 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4660-1117-26 se emite No conformidad a elementos estructurales en obras ejecutadas en la Ruta 6503 y 6504 en los cuales se presenta No conformidad de acuerdo a los resultados del ensayo de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13, evaluados bajo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, Capítulo 6, Artículo 630, numeral 630.4.2 Estudio de la mezcla y



obtención de la fórmula de trabajo. El 20 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4677-1182-26 interventoría relaciona los elementos estructurales en obras ejecutadas en la Ruta 6503 y 6504, en el cual se presenta No conformidad de acuerdo a los resultados del ensayo de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13, evaluados bajo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, Capítulo 6, Artículo 630, numeral 630.4.2 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. De acuerdo con la revisión de los resultados obtenidos, se evidencia que estos no cumplen con los parámetros establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en consecuencia, y conforme a lo indicado en el numeral 630.5.2.9 – Resistencia, se solicita la toma de núcleos de dichos elementos, siguiendo los lineamientos de la norma INV E-418, con el fin de verificar y certificar la calidad del material instalado, en concordancia con los requisitos técnicos vigentes.

Mediante comunicado C-245-4658-1112-26 radicado el 12 de mayo 2026 esta Interventoría emite respuesta al contratista de obra conforme a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, las normas de ensayo aplicables (INV E-402, INV E-410, INV E-418), la NSR-10 Título C, y las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Obra No. 991 de 2021, referente al No cumplimiento de Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13.

El 25 de mayo 2026 mediante comunicado C-245-4683-1213-26 esta Interventoría en el marco del seguimiento a la calidad de los materiales, informa que ha evidenciado reiterados incumplimientos en los resultados de resistencia a la compresión del concreto ejecutado en obra frente a la resistencia de diseño especificada. Con el ánimo de garantizar la estabilidad de la obra y obrando bajo los principios de colaboración, esta Interventoría ha propuesto diversas alternativas complementarias para identificar las causas raíz de estas deficiencias y plantear planes de mejora. Sin embargo, ante la postura del Contratista de desestimar los resultados del control oficial de Interventoría basándose en criterios no contemplados en la norma para la aceptación final del material, nos permitimos informar que, en adelante, el proceso de control, evaluación, aceptación y trámite de pago de los elementos de concreto estructural se desarrollará con estricto apego y literalidad a los lineamientos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, las normas INV aplicables, la NSR-10 y las demás disposiciones técnicas y contractuales vigentes.

En la ruta 3002, se realizaron actividad de remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias desde el PR16+700 al PR48+400 en 34 puntos.



En la ruta 3001, se realizaron actividad de remoción de derrumbes provocados por la ola invernal que ha afectado de manera directa la zona, se realiza la atención de las emergencias desde el PR29+195 al PR37+000 en 9 puntos.

Se adelantan actividades constructivas en diferentes puntos de la vía, iniciando con la demolición de estructuras existentes correspondientes al Box Culvert ubicado en el PR 15+620 y a la alcantarilla localizada en el PR 15+780. De manera simultánea, se ejecutan actividades de excavación mecánica para el cajeo y conformación de la aproximación a subrasante en el carril derecho entre los sectores PR 15+772 y PR 15+798, así como excavación mecánica para la construcción del cuerpo medio hacia el descole del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho.

Como parte de la preparación y adecuación de las estructuras hidráulicas, se realiza el mejoramiento del suelo de fundación mediante suministro e instalación de material granular para la construcción del Box Culvert ubicado en el PR 15+802. Adicionalmente, se ejecuta relleno para estructuras con recebo en el suelo de fundación de la misma estructura. De igual manera, se adelanta la construcción de un filtro transversal contra el Box Culvert ubicado en el PR 15+620 hacia menores, mediante el suministro e instalación de geotextil no tejido, tubería perforada y material granular drenante.

Continuando con las actividades constructivas, se ejecuta concreto de 14 MPa para la construcción de diferentes elementos de solado requeridos en las estructuras hidráulicas. Estas actividades comprenden el solado de dentellón y descole de alcantarilla en el PR 15+960 costado derecho, el solado de pocetas de alcantarilla en los PR 15+745 y PR 15+960 costado izquierdo, así como el solado del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho, incluyendo la solera de la estructura. De igual forma, se ejecuta concreto de 14 MPa para el solado de la solera y dentellón del Box Culvert localizado en el PR 15+620 costado derecho.

Posteriormente, se adelantan actividades de instalación de acero de refuerzo para la construcción de diferentes elementos estructurales. Entre estas se encuentran la construcción de cunetas en los sectores PR 16+117, PR 16+125, PR 16+127, PR 16+131 y PR 16+133 costado izquierdo; la construcción del cabezal de descole de alcantarilla en el PR 15+960 costado derecho; la construcción de pocetas en los PR 15+745 y PR 15+960 costado izquierdo; la construcción del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho; y la construcción de la solera y aletas de descole del Box Culvert localizado en el PR 15+620 costado derecho.

Seguidamente, se realiza el suministro e instalación de cinta PVC tipo Sika O-22 o similar para garantizar la impermeabilización de juntas en diferentes estructuras hidráulicas. Estas actividades se ejecutan en la losa de la poceta de alcantarilla ubicada en el PR 15+745



costado izquierdo, en la losa de la poceta de alcantarilla localizada en el PR 15+960 costado izquierdo, en la solera de la alcantarilla del PR 15+960 costado derecho, en la losa del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho y en las soleras de descole de los Box Culvert localizados en los PR 15+620 y PR 15+802 costado derecho.

Una vez culminadas las actividades de preparación y armado, se procede con la fundida de concreto de 28 MPa para la construcción de diversos elementos estructurales. Estas actividades incluyen la construcción de la losa superior y del cabezal de descole del Box Culvert ubicado en el PR 15+620 costado derecho; la construcción de la losa y muros de las pocetas localizadas en los PR 15+745 y PR 15+960 costado izquierdo; la construcción del cuerpo estructural del Box Culvert ubicado en el PR 15+802 costado derecho; y la construcción de la solera de descole asociada a esta misma estructura.

Finalmente, se adelanta la construcción de cunetas mediante suministro e instalación de concreto de 17,5 MPa en los sectores PR 16+117, PR 16+125, PR 16+127, PR 16+131 y PR 16+133 costado izquierdo, previa adecuación y conformación de la superficie de apoyo. Adicionalmente, se ejecuta el suministro e instalación de malla hexagonal de alta resistencia para la estabilización y protección de taludes entre los sectores PR 11+005 y PR 10+995.

En general se presenta un avance de 0.51% con respecto a la ejecución del 28.85% vs la inversión programada del 28.34% determinados respecto al valor básico de obra para este periodo al 31 de mayo de 2026.

3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS.

- No se registraron situaciones inesperadas durante el mes de mayo.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 991 DE 2021

4.1 INFORME SEMANAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENITORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CORREO: 8671-8801-3012-976-3 LECCIÓN: 1 Página:									
		FECHA: 3 de junio de 2025 (Día / Mes / Año)									
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA SEMANA No.: 258 del 29/06/2025 al 3/06/2025 Último Informe Semanal NO											
SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENITORIA: ING. KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JAIDER DEVA REY											
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato) El alcance Monico contempla, el avance a la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III, del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caquán- Puerto Rico - Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENITORIA:									
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE INTEGRANTES: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMALTA CONTRATO No.: 991 DE 2021 FECHA DE INICIO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030		INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 INTEGRANTES: CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL, SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICO CPS S.A. - CELOO S.A.S. - ARTIFICIAL CIVIL INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S. CONTRATO No.: 985 DE 2021 FECHA DE INICIO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/2030 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030									
VALOR INICIAL: \$ 399.587.436.436.00 VALOR ADICIONES: \$ 13.485.528.230.00 VALOR ACUMULADO: \$ 413.052.964.666.00 VALOR ANTIPO: \$ 9.885.528.230.00 VALOR AMORTIZADO: \$ 2.580.235.856.00 SALDO POR AMORTIZAR: \$ 7.305.292.374.00		VALOR INICIAL: \$ 23.499.975.248.00 VALOR ADICIONES: \$ 1.200.000.000.00 VALOR ACUMULADO: \$ 34.699.975.248.00 VALOR ANTIPO: \$ 980.381.756.00 VALOR AMORTIZADO: \$ 980.381.756.00 SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025					
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 20.789.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 26.766.666.667	\$ 31.366.666.667					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 20.789.631.333	\$ 13.833.333.333	\$ 27.766.666.667	\$ 26.766.666.667	\$ 31.366.666.667					
INTERVENITORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.333.333.333	\$ 1.466.666.667	\$ 3.233.333.333	\$ 3.233.333.333	\$ 3.133.333.333					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 2.333.333.333	\$ 1.466.666.667	\$ 3.233.333.333	\$ 3.233.333.333	\$ 3.133.333.333					
CONTRATO	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030					
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 41.650.000.000	\$ 37.052.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 76.672.222.222	\$ 88.927.777.777					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 41.650.000.000	\$ 37.052.222.222	\$ 46.277.777.778	\$ 76.672.222.222	\$ 88.927.777.777					
INTERVENITORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 3.350.000.000	\$ 2.977.777.778	\$ 3.722.222.222	\$ 5.327.777.778	\$ 6.922.222.222					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 3.350.000.000	\$ 2.977.777.778	\$ 3.722.222.222	\$ 5.327.777.778	\$ 6.922.222.222					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 334.899.238.546.00										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 94.850.567.899.00	28.34%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ 96.268.196.107.50	28.75%									
AVANCE O ATRÁS DE OBRA	\$ (1.418.128.208.50)	-0.42%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 539.235.968.00	0.16%									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 94.850.567.899.00	28.34%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 96.268.196.107.50	28.75%									
AVANCE O ATRÁS EN LA INVERSIÓN	\$ (1.418.128.208.50)	-0.42%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 568.658.829.00	0.17%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 595.517.656.25	0.30%									
SI		NO									
X			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	INVASI-CPJ-626-6903	DEL	29/05/2026								
PERÍODO FACTURADO	ABRIL, 2026										
VALOR FACTURA	\$ 2.774.558.044.00										
TOTAL INVERSIÓN	\$ 14.689.193.722.00	42.33%									
PROGRAMADA	\$ 14.689.193.722.00	42.33%									
EJECUTADA	\$ 14.689.193.722.00	42.33%									
INVERSIÓN PROG. EN LA SEMANA	\$ 74.250.024.00	0.21%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 74.250.024.00	0.21%									
SI		NO									
X			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	INVASI-CPJ-626-1176	DEL	30/04/2026								
PERÍODO FACTURADO	FEBRERO, 2026										
VALOR FACTURA	\$ 292.833.256.00										
Otorgado \$	\$ 9.885.528.230.00										
Amortizado \$	\$ 2.580.235.856.00										
Saldo \$	\$ 7.305.292.374.00										
En el mes:											
Acumulado:											
Otorgado \$	\$ 980.381.756.00										
Amortizado \$	\$ 980.381.756.00										
Saldo \$	\$ -										
Otorgado \$	\$ 980.381.756.00										
Amortizado \$	\$ 980.381.756.00										
Saldo \$	\$ -										
Meta Física Programada %	28.34%	Avance o Atraso Físico %	0.42%								
Meta Física Ejecutada %	28.75%										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acum. a 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Total 2026	% 2026	Ejecutado Total proyecto	% Total proyecto
Estudios y diseños	KM	57	56.60	0.40	Prog	0.2	0.2	0.40	100.0%	56.62	99.33%
Exploraciones	KM	57	20.04	5.10	Prog	0.90	0.90	1.80	100.0%	20.04	35.16%
Bases, subbases y Alcantarillas	KM	57	18.74	5.10	Prog	0.90	0.90	1.80	100.0%	20.04	35.16%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	17.40	5.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	17.40	30.35%
Estructuras y Dinámicas	KM	57	16.90	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	16.90	29.65%
Seguridad y Seguridad	KM	57	7.00	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	7.00	12.28%
Obras Varías	KM	57	1.83	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	1.83	3.21%
Transportes	KM	57	19.19	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	19.19	33.83%
Puente Vehicular PR38-200 RN 6503 sobre la Quebrada Las Delicias	UND	1	0.71	0.29	Prog	0.00	0.29	0.29	29.00%	0.66	93.06%
Bombeo no Previsto	KM	57	19.19	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	19.19	33.83%
Descripción	Unidad	Cantidad	Ejecutado acum. a 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Total 2026	% 2026	Ejecutado Total proyecto	% Total proyecto
Estudios y diseños	KM	57	56.60	0.40	Prog	0.2	0.2	0.40	100.0%	56.62	99.33%
Exploraciones	KM	57	20.04	5.10	Prog	0.90	0.90	1.80	100.0%	20.04	35.16%
Bases, subbases y Alcantarillas	KM	57	18.74	5.10	Prog	0.90	0.90	1.80	100.0%	20.04	35.16%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	17.40	5.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	17.40	30.35%
Estructuras y Dinámicas	KM	57	16.90	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	16.90	29.65%
Seguridad y Seguridad	KM	57	7.00	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	7.00	12.28%
Obras Varías	KM	57	1.83	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	1.83	3.21%
Transportes	KM	57	19.19	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	19.19	33.83%
Puente Vehicular PR38-200 RN 6503 sobre la Quebrada Las Delicias	UND	1	0.71	0.29	Prog	0.00	0.29	0.29	29.00%	0.66	93.06%
Bombeo no Previsto	KM	57	19.19	4.70	Prog	0.70	0.70	1.40	100.0%	19.19	33.83%

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
31/05/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-26 PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO No. 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV221	FREIGHTLINER/ 2022	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV225	FREIGHTLINER/ 2022	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZOT35	DAEWOO/ 2011	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	R	R	R	I	R	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW077	DAEWOO/ 2015	22TON	NEIVA	I	A	I	A	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	A	A	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW454	DAEWOO/ 2014	22TON	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLL809	DAEWOO/ 2015	22TON	NEIVA	I	A	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLL812	DAEWOO/ 2015	22TON	NEIVA	I	A	I	A	R	R	R	R	R	I	R	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	I
RETRO DE LLANTAS RC-016	DOSSAN / 2021	0,76M3	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-051	CATERPILLAR / 2021	1000kg	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	I	
CAMIONETA NISSAN ZZ0887	NISSAN	1000 KG / 5P	NEIVA	I	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA MITSUBISHI KWT225	MITSUBISHI	689 KG / 5P	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMPERO KXY-317	SUZUKI	4P	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIÓN UTILITARIO KSO400	CHEVROLET	3950 KG	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MOTOSOLDADOR MS012	MILLER	100-225 AMP	NEIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MOTOSOLDADOR MS006	MILLER	100-225 AMP	NEIVA	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJS-944	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJS-945	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN596	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK 363	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO 410	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	R	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV 225	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
CARRO RIEGO SZN 833	DAEWOO 2011	14 M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	R	R	A	I	A	A	A	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV246	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO 0414	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV 218	FREIGHTLINER	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
CARRO RIEGO WLK034	DAEWOO 2015	14 M3	PUERTO RICO	I	A	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK364	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SPUI185	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SWP 834	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	R	I	R	R	R	R	R	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SOQ 182	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
CARRO RIEGO WFT 501	DAEWOO 2014	14 M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SOQ 185	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT 531	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SOQ 189	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	R	R	I	A	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT 526	DAEWOO 2014	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW085	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	R	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFW458	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT506	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN824	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK038	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	R	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK039	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT784	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK362	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN824	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	R	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE SPUI190	DAEWOO	22TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	I
VOLQUETA WLL810	DAEWOO 2015	14 m3	PUERTO RICO	I	A	I	R	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	R	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MIXER WFW 091	DAEWOO 2015	6 M3	PUERTO RICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MIXER WLK379	DAEWOO	15.86 TON	PUERTO RICO	I	R	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	R	R	R	I	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MIXER WLK377	DAEWOO	15.86 TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	R	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I
MIXER WCX 889	DAEWOO	15.86 TON	PUERTO RICO	I	R	I	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I

f



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN
1
PÁGINA

FECHA
31/05/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-26 PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO No. 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA JXU-053	NISSAN	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA KWP-027	MITSUBISHI	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA MUR-340	TOYOTA	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMIONETA RBZ418	TOYOTA	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMPERO KXV-002	SUZUKI	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CAMION SERVICIO CHEVROLET KSO 396	MACK	55 TON	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	R	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MOTONIVELADORA MO-015	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MOTONIVELADORA MO-024	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MOTONIVELADORA MO 012	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MOTONIVELADORA MO 009	CATERPILLAR	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-055	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-010	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-054	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-069	DOSSAN	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
VIBRO COMPACTADOR DE LLANTAS VC 075		0.69M3																																
VIBRO COMPACTADOR DOBLE TANDEN VC 074		0.69M3	PUERTO RICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-036	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-043	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
MINICARGADOR MC-035	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
EXCAVADORA DE ORUGAS EX-032	DOSSAN	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
RETRO DE LLANTAS RC-017	DOSSAN/ 2020	0.5M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CARGADOR DE LLANTAS CG-018	DOSSAN/ 2020	3M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
CARGADOR DE LLANTAS CG-015	DOSSAN/ 2015	3M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
TRITURADORA MOVIL TR-020	METSO S3.9/ 2021	10M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
TRITURADORA MOVIL TR-021	METSO LOCOTRAC/ 2021	6M3	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA DE ASFALTO CIBER PL-005	CIBER/2021	180T/h	PUERTO RICO	I	R	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	A	A	R	I	A	A	A	A	A	A	I
PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO	PC-004	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	R	R	R	R	I
GENERADOR ELECTRICO GE-004	PERKINS/2016	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
GENERADOR ELECTRICO GE-020	STANFORD/2021	N/A	PUERTO RICO	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I
FINISHER PV012			PUERTO RICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	92	92	92	93	93	93	90	93	93	93	93	93	93	93
TOTAL ACTIVO				0	82	12	80	79	81	78	67	79	12	81	83	76	83	70	81	13	13	82	81	83	72	82	11	85	85	82	81	81	81	10
TOTAL EN REPARACIÓN				1	6	1	8	9	7	10	8	9	1	7	5	12	8	9	9	2	2	9	11	9	9	10	2	8	8	11	12	12	3	
TOTAL INACTIVO				91	4	79	4	4	4	4	17	4	79	4	4	4	1	13	1	77	77	1	1	1	12	1	77	0	0	0	0	0	0	80

RESUMEN PERIODO / MES		No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		93	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		64	69%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		7	8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		21	22%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-025 salio del proyecto el dia 04 de mayo de 2026, FINISHER PV 012, VIBROCOMPACTADOR DOBLE TANDEN VC 074, VIBROCONPACTADOR DE LLANTAS VC 075 ingresaron el 14 de mayo de 2026, MIXER WFW 091 ingreso el dia 26 de mayo de 2026.

Handwritten signature



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/05/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-26 PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO No. 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

- El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
- Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
- Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
- En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
- Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCON
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 25202134261 CND

Firma
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-122413 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA


b

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																				CODIGO		MEPHM2-IV-15-FR-6																							
																						VERSION		1																							
																						PAGINA																									
																								5																							
																						FECHA		8 Julio 2026 (Dia / Mes / Año)																							
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCION TERRITORIAL:										CAQUETA																									
CONTRATO DE OBRA No:		991 DE 2021																				CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																							
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		may-26																				PROYECTO:		CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA																							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		985 DE 2021																				INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																							
NOMBRE ARL:		Seguros Bolívar																				NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:																									
		VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																													
42	CAVEDES PERDOMO EDIL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.472.800	\$ 172.200	V	SANITAS	9504470881	\$ 99.000	COLFONDOS	9504470881	\$ 395.700	\$ 45.000	-	-	-											
43	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	1.115.944.252	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.095	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.772.295	\$ 123.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 70.900	PORVENIR	9504470881	\$ 283.600	\$ 70.900	-	-	-											
44	CICERY CASTELLON LUZMILA	40.077.088	PROFESIONAL SOCIAL	\$ 3.997.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 4.791.067	\$ 333.500	V	SANITAS	9504470881	\$ 191.700	PORVENIR	9504470881	\$ 766.600	\$ 191.700	-	-	-											
45	CORRALES DIOGA PEDRO LUIS	1.117.494.448	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.750.907	\$ 121.900	V	ASMET SALUD	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	VACACIONES 21 ABRIL											
46	CORREA OSPINA JOSE ADOLFO	96.361.076	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.250.000	\$ 156.600	V	NEUEVA EPS	9504470881	\$ 90.000	PORVENIR	9504470881	\$ 360.000	\$ 90.000	-	-	-											
47	CORTES ARIAS OSCAR NAN	1.081.159.862	CADENERO II	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 442.652	\$ 30.900	V	NEUEVA EPS	9504470881	\$ 17.800	PORVENIR	9504470881	\$ 70.900	\$ 17.800	-	-	RENUNCIO EL 06-04-2026											
48	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1.003.828.405	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.761.466	\$ 122.600	V	NEUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 70.500	COLPENSIONES	9504470881	\$ 281.900	\$ 70.500	-	-	INCAPACIDAD POR UN DIA 25 AL 27 DE ABRIL											
49	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1.004.074.473	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.750.906	\$ 121.900	V	NEUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-											
50	CRUZ ROJAS ESNEIDER	1.031.130.848	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.763.371	\$ 122.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 70.600	PROTECCION	9504470881	\$ 282.200	\$ 70.600	-	-	VACACIONES 16 DE ABRIL											
51	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33.101.811	DIRECTOR JURIDICO	\$ 11.046.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 10.835.390	\$ 754.200	V	SANITAS	9504470881	\$ 433.500	COLFONDOS	9504470881	\$ 1.733.700	\$ 433.500	\$ 216.708	\$ 325.062	-											
52	DAZ HOYOS JHON JAIRO	15.670.086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	\$ 2.547.135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.665.001	\$ 185.500	V	EPS SUR (ANTES SUSALUD)	9504470881	\$ 106.700	COLPENSIONES	9504470881	\$ 426.500	\$ 106.700	-	-	-											
53	DAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1.104.422.998	AUXILIAR DE MECANICA A	\$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.047.320	\$ 212.100	V	MUTUAL SER	9504470881	\$ 121.900	PROTECCION	9504470881	\$ 487.600	\$ 57.000	-	-	-											
54	DIJUARA GUTIERREZ CRISTIAN	1.075.294.781	ELECTROMECANICO B	\$ 2.350.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.350.000	\$ 163.600	V	NEUEVA EPS	9504470881	\$ 94.000	PORVENIR	9504470881	\$ 376.000	\$ 94.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 16-04-2026											
55	ENDO CHAVARRO YUDOR ALEXIS	1.006.460.256	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.875.000	\$ 130.500	V	SALUD TOTAL	9504470881	\$ 75.000	PORVENIR	9504470881	\$ 300.000	\$ 54.600	-	-	FIRMA DE CONTRATO 6 DE ABRIL DE 2026											
56	ENDO VALENCIA JUVENAL	17.783.500	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.706.035	\$ 188.400	V	NEUEVA EPS	9504470881	\$ 108.300	COLPENSIONES	9504470881	\$ 433.000	\$ 108.300	-	-	VACACIONES 27 Y 28 DE ABRIL											
57	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5.268.520	LABORATORISTA	\$ 2.477.328	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.270.281	\$ 227.700	V	NEUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 130.900	PORVENIR	9504470881	\$ 523.300	\$ 130.900	-	-	-											
58	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1.116.923.581	AUXILIAR DE MECANICA A	\$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.736.121	\$ 190.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 109.500	PORVENIR	9504470881	\$ 437.800	\$ 109.500	-	-	-											
59	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	96.333.479	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.859.535	\$ 129.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 74.400	PORVENIR	9504470881	\$ 297.600	\$ 23.100	-	-	-											
60	ESQUEVEL SALGADO JAIRO	96.356.264	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.418.372	\$ 168.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 96.800	PORVENIR	9504470881	\$ 387.000	\$ 96.800	-	-	-											
61	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1.113.516.378	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.767.188	\$ 123.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 70.700	COLPENSIONES	9504470881	\$ 282.800	\$ 70.700	-	-	-											
62	FERRRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1.075.236.534	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.781.060	\$ 124.000	V	NEUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 71.300	PORVENIR	9504470881	\$ 285.000	\$ 71.300	-	-	10 PERMISO MEDIA JORNADA; 11 PERMISO POR CITA MEDICA											
63	FLORES LARA MOISES	17.788.380	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.768.189	\$ 123.100	V	SANITAS	9504470881	\$ 70.800	PORVENIR	9504470881	\$ 283.000	\$ 70.800	-	-	-											
64	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1.079.176.760	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.069.252	\$ 144.100	V	NEUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 82.800	COLFONDOS	9504470881	\$ 331.100	\$ 82.800	-	-	-											
65	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1.017.246.567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	\$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 828.001	\$ 57.700	V	SAVA SALUD	9504470881	\$ 33.200	PORVENIR	9504470881	\$ 132.500	\$ 68.400	-	-	RENUNCIA AL CARGO 6 DE ABRIL DE 2026											
66	GALAN GALAN JAVIER	79.473.478	TOPOGRAFO	\$ 2.689.656	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.194.789	\$ 222.400	V	FAMISANAR	9504470881	\$ 127.800	COLPENSIONES	9504470881	\$ 511.200	\$ 127.800	-	-	-											
67	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILLO	1.005.076.003	OPERADOR DE TRITURADORA	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.506.504	\$ 244.100	V	NEUEVA EPS	9504470881	\$ 140.300	PORVENIR	9504470881	\$ 561.100	\$ 140.300	-	-	-											
68	GALINDEZ JHON ALEXANDER	1.116.914.182	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.250.000	\$ 156.600	V	FAMISANAR EPS	9504470881	\$ 90.000	PORVENIR	9504470881	\$ 360.000	\$ 90.000	-	-	-											
69	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	1.115.944.721	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.766.644	\$ 123.000	V	NEUEVA EPS	9504470881	\$ 70.700	PORVENIR	9504470881	\$ 282.700	\$ 70.700	-	-	-											
70	GAMEZ LEGRO GLDARDO	96.353.628	CONSERJE	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.750.906	\$ 121.900	V	SANITAS	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	-											
71	GARBELLO REYES OVIDIO	96.361.025	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.182.192	\$ 221.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 127.300	PORVENIR	9504470881	\$ 509.200	\$ 127.300	-	-	-											
72	GARZON LOSADA DIEGO FABIAN	1.083.883.017	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 2.250.000	\$ 156.600	V	SANITAS	9504470881	\$ 90.000	COLFONDOS	9504470881	\$ 360.000	\$ 90.000	-	-	-											
73	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	1.053.829.095	INGENIERO RESIDENTE / RESIDENTE DE OBRA	\$ 5.260.000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	\$ 5.626.504	\$ 391.700	V	FAMISANAR	9504470881	\$ 225.100	PROTECCION	9504470881	\$ 900.300	\$ 225.100	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 6 DE ABRIL; INCAPACIDAD DEL 7 AL 31 DE ABRIL											
74	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1.193.467.970	CONDUCTOR DOBLETRUQUE	\$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 3.051.379	\$ 212.400	V	NEUEVA E.P.S.	9504470881	\$ 122.100	PORVENIR	9504470881	\$ 488.300	\$ 122.100	-	-	-											
75	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1.119.211.470	AUXILIAR DE LABORATORIO	\$ 1.733.385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.907.040	\$ 132.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 76.300	PORVENIR	9504470881	\$ 305.200	\$ 76.300	-	-	-											
76	GUTIERREZ LOZANO NORMAN YUET	1.115.945.030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRAFICO	\$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.750.906	\$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9504470881	\$ 70.100	PORVENIR	9504470881	\$ 280.200	\$ 70.100	-	-	PCM 9 DE ABRIL TODO EL DIA											
77	GUTIERREZ TRUJILLO JORIAN ANDRES	1.130.024.014	SOLDADOR C	\$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	\$ 1.900																							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO DE OBRA																				CODIGO	MEPMINI-IN-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																						VERSION	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																						PAGINA		DE	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																						FECHA	8	Julio	2026 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCION TERRITORIAL:					CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATO DE OBRA No:		991 DE 2021										CONTRATISTA:					CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		may-26										PROYECTO:					CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAQUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		995 DE 2021										INTERVENTOR:					CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOMBRE ARL:		Seguros Bolívar										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
90	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLEMO	93.444.597	OPERADOR DE MOTOR/VIAS	\$	3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPH/MI-VI-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												PÁGINA	DE	5	FECHA	8	Julio	2026	(Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCION TERRITORIAL:		CAQUETA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO DE OBRA No:		991 DE 2021										CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		may-26										PROYECTO:		CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAJAN – PUERTO RICO – FLORENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:		995 DE 2021										INTERVENITOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NOMBRE ARL:		Seguros Bolívar										NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
135	PERDOMO PULIDO EDINSON	1.075.270.671	AYUDANTE DE OBRA	\$	1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA		DE	
--------	--	----	--

FECHA	8	Julio	2026
(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: _____ GRUPO SUR OCCIDENTE _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ CAQUETA _____

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MESES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-26 PROYECTO: CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolívar NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

[illegible]

OBSERVACIONES: La navilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con rosetas de notoria del mes de abril de 2026. De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vías (Invia), interventor y contratista, se acordó que se reinscriban las navillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

4. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la declaración contractual.
5. La responsabilidad de la Interventoría resolver todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido dentro de una lista calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
6. En el evento en que el Contratista no cumpla con la declaración del personal profesional, el Interventor deberá adicionar la casilla "Observaciones" en el contrato.
7. En el evento en que el Contratista no cumpla con la declaración del personal profesional, el Interventor deberá adicionar la casilla "Observaciones" en el contrato.
8. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
9. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
10. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normalidad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
11. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas con la normalidad vigente y la entidad prestadora del servicio.
12. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la declaración en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCON
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-134261 CND

Firma _____
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Cartagena, D.T y C, junio 11 de 2026

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

445

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de mayo del año 2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



Firma Electrónica por Walter Aguas G.
E Sign ID 86245C
Fecha 11-06-2026 09:28:17 am
CICON S.A.S
Colombia

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
Designado por Anaya & Anaya S.A.S
C.C.#19.873.182
T.P.#80370-T

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: 991 de 2021

Objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.”

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Mayo de 2026. Para constancia se firma a los 05 días del mes de Junio de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ

Revisor Fiscal
T.P. 73746-T



**NIT. 806014108
MANGA, CALLE 25 No. 24 A 16
EDIFICIO TWINS BAY, PISO 9
(605) 642 4505 - 642 4506
CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Mayo de 2026.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de Junio de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE



JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6165AB69047A5B92

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

222053-T

JULIETH LIZETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102630151

RESOLUCION INSCRIPCION 1234 **FECHA 08/11/2016**

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA 239319



225648

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PAX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idecs.com

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL KMA CONSTRUCCIONES S A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2026-04	2026-05	289803314		9504470881	E	2026/05/07	2026/05/07	BANCOLOMBIA		\$2,440,476,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
Sucursal: BOGOTA (189 Afiliados)					\$465,977,825	\$74,711,400			\$468,315,397	\$18,666,400			\$459,962,005	\$18,425,800			\$468,315,397	\$28,656,200		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (183 Afiliados)					\$56,571,624	\$8,992,100			\$56,725,018	\$2,194,600			\$38,397,086	\$1,555,400			\$56,725,018	\$0		\$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)					\$6,262,892	\$993,100			\$6,262,892	\$241,500			\$5,037,462	\$203,800			\$6,262,892	\$0		\$0
1	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	\$58,954	\$9,500	EPS037	1	\$58,954	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,954	\$0	\$0
2	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	\$58,954	\$9,500	EPS037	1	\$58,954	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,954	\$0	\$0
3	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	1	\$58,652	\$9,400	ESSC62	1	\$58,652	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,652	\$0	\$0
4	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	1	\$58,652	\$9,400	ESSC62	1	\$58,652	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,652	\$0	\$0
5	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	\$76,795	\$12,300	EPS037	1	\$76,795	\$3,100	CCF13	1	\$65,900	\$2,700	14-7	1	\$76,795	\$0	\$0
6	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	\$76,795	\$12,300	EPS037	1	\$76,795	\$3,100	CCF13	1	\$65,900	\$2,700	14-7	1	\$76,795	\$0	\$0
7	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	\$63,036	\$10,100	EPS037	1	\$63,036	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,036	\$0	\$0
8	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	\$63,036	\$10,100	EPS037	1	\$63,036	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,036	\$0	\$0
9	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	\$92,254	\$14,800	ESSC07	1	\$92,254	\$3,700	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$92,254	\$0	\$0
10	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	\$92,254	\$14,800	ESSC07	1	\$92,254	\$3,700	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$92,254	\$0	\$0
11	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	1	\$85,905	\$13,800	EPS010	1	\$85,905	\$3,500	CCF13	1	\$84,905	\$3,400	14-7	1	\$85,905	\$0	\$0
12	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	1	\$85,905	\$13,800	EPS010	1	\$85,905	\$3,500	CCF13	1	\$84,905	\$3,400	14-7	1	\$85,905	\$0	\$0
13	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	1	\$59,641	\$9,600	ESSC62	1	\$59,641	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,641	\$0	\$0
14	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	1	\$59,641	\$9,600	ESSC62	1	\$59,641	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,641	\$0	\$0
15	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	1	\$59,883	\$9,600	EPS005	1	\$59,883	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,883	\$0	\$0
16	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	1	\$59,883	\$9,600	EPS005	1	\$59,883	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,883	\$0	\$0
17	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	1	\$97,300	\$15,600	EPS041	1	\$97,300	\$3,900	CCF13	1	\$76,000	\$3,100	14-7	1	\$97,300	\$0	\$0
18	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	1	\$97,300	\$15,600	EPS041	1	\$97,300	\$3,900	CCF13	1	\$76,000	\$3,100	14-7	1	\$97,300	\$0	\$0
19	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
20	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
21	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	\$102,763	\$16,500	EPS005	1	\$102,763	\$4,200	CCF13	1	\$87,000	\$3,500	14-7	1	\$102,763	\$0	\$0
22	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	\$102,763	\$16,500	EPS005	1	\$102,763	\$4,200	CCF13	1	\$87,000	\$3,500	14-7	1	\$102,763	\$0	\$0
23	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	1	\$106,903	\$17,200	EPS037	1	\$106,903	\$4,300	CCF13	1	\$83,334	\$3,400	14-7	1	\$106,903	\$0	\$0
24	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	1	\$106,903	\$17,200	EPS037	1	\$106,903	\$4,300	CCF13	1	\$83,334	\$3,400	14-7	1	\$106,903	\$0	\$0
25	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	\$102,599	\$16,500	EPS037	1	\$102,599	\$4,200	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,599	\$0	\$0
26	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	\$102,599	\$16,500	EPS037	1	\$102,599	\$4,200	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,599	\$0	\$0
27	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	\$102,599	\$12,400	EPS037	1	\$102,599	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$102,599	\$0	\$0
28	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	1	\$59,011	\$9,500	EPS005	1	\$59,011	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,011	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
29	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	1	\$59,011	\$9,500	EPS005	1	\$59,011	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,011	\$0	1	\$0	\$0
30	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	2	\$287,839	\$46,100	EPS002	2	\$287,839	\$11,600	CCF13	2	\$223,334	\$9,000	14-7	2	\$287,839	\$0	2	\$0	\$0
31	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	2	\$287,839	\$46,100	EPS002	2	\$287,839	\$11,600	CCF13	2	\$270,084	\$10,900	14-7	2	\$287,839	\$0	2	\$0	\$0
32	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	2	\$287,839	\$46,100	EPS002	2	\$287,839	\$11,600	CCF13	2	\$266,973	\$10,700	14-7	2	\$287,839	\$0	2	\$0	\$0
33	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	\$143,920	\$23,100	EPS002	1	\$143,920	\$5,800	CCF13	1	\$111,667	\$4,500	14-7	1	\$143,920	\$0	1	\$0	\$0
34	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	1	\$143,920	\$23,100	EPS002	1	\$143,920	\$5,800	CCF13	1	\$111,667	\$4,500	14-7	1	\$143,920	\$0	1	\$0	\$0
35	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	6	\$483,721	\$77,400	EPS037	6	\$483,721	\$19,400	CCF13	6	\$460,000	\$18,400	14-7	6	\$483,721	\$0	6	\$0	\$0
36	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	2	\$161,241	\$25,800	EPS037	2	\$161,241	\$6,500	CCF13	2	\$150,667	\$6,100	14-7	2	\$161,241	\$0	2	\$0	\$0
37	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	2	\$161,241	\$25,800	EPS037	2	\$161,241	\$6,500	CCF13	2	\$149,778	\$6,000	14-7	2	\$161,241	\$0	2	\$0	\$0
38	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	1	\$80,621	\$12,900	EPS037	1	\$80,621	\$3,300	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$80,621	\$0	1	\$0	\$0
39	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	1	\$80,621	\$12,900	EPS037	1	\$80,621	\$3,300	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$80,621	\$0	1	\$0	\$0
40	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	\$105,000	\$16,800	EPS037	1	\$105,000	\$4,200	CCF13	1	\$104,444	\$4,200	14-7	1	\$105,000	\$0	1	\$0	\$0
41	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	3	\$210,011	\$33,700	EPS037	3	\$210,011	\$8,500	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$210,011	\$0	3	\$0	\$0
42	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	\$105,000	\$16,800	EPS037	1	\$105,000	\$4,200	CCF13	1	\$88,334	\$3,600	14-7	1	\$105,000	\$0	1	\$0	\$0
43	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	1	\$105,000	\$16,800	EPS037	1	\$105,000	\$4,200	CCF13	1	\$88,334	\$3,600	14-7	1	\$105,000	\$0	1	\$0	\$0
44	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	\$179,534	\$28,800	MIN001	1	\$179,534	\$7,200	CCF13	1	\$162,000	\$6,500	14-7	1	\$179,534	\$0	1	\$0	\$0
45	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	\$179,534	\$28,800	MIN001	1	\$179,534	\$7,200	CCF13	1	\$162,000	\$6,500	14-7	1	\$179,534	\$0	1	\$0	\$0
46	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	1	\$179,534	\$21,600	MIN001	1	\$179,534	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$179,534	\$0	1	\$0	\$0
47	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	1	\$64,760	\$10,400	EPS037	1	\$64,760	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,760	\$0	1	\$0	\$0
48	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	1	\$64,760	\$10,400	EPS037	1	\$64,760	\$2,600	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,760	\$0	1	\$0	\$0
49	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	\$87,385	\$14,000	EPS005	1	\$87,385	\$3,500	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$87,385	\$0	1	\$0	\$0
50	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	\$87,385	\$14,000	EPS005	1	\$87,385	\$3,500	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$87,385	\$0	1	\$0	\$0
51	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	1	\$120,733	\$19,400	EPS005	1	\$120,733	\$4,900	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$120,733	\$0	1	\$0	\$0
52	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	1	\$120,733	\$19,400	EPS005	1	\$120,733	\$4,900	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$120,733	\$0	1	\$0	\$0
53	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	\$89,334	\$14,300	EPS002	1	\$89,334	\$3,600	CCF13	1	\$86,742	\$3,500	14-7	1	\$89,334	\$0	1	\$0	\$0
54	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	\$89,334	\$14,300	EPS002	1	\$89,334	\$3,600	CCF13	1	\$76,667	\$3,100	14-7	1	\$89,334	\$0	1	\$0	\$0
55	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	\$89,334	\$14,300	EPS002	1	\$89,334	\$3,600	CCF13	1	\$76,667	\$3,100	14-7	1	\$89,334	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (63 Afiliados)						\$18,431,657	\$2,922,500			\$18,585,051	\$710,600			\$12,717,851	\$515,500			\$18,585,051	\$0		\$0	\$0
56	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	1	\$71,789	\$11,500	EPS005	1	\$71,789	\$2,900	CCF32	1	\$68,334	\$2,800	14-7	1	\$71,789	\$0	1	\$0	\$0
57	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	1	\$71,789	\$11,500	EPS005	1	\$71,789	\$2,900	CCF32	1	\$68,334	\$2,800	14-7	1	\$71,789	\$0	1	\$0	\$0
58	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	\$93,334	\$15,000	EPS005	1	\$93,334	\$3,800	CCF32	1	\$93,334	\$3,800	14-7	1	\$93,334	\$0	1	\$0	\$0
59	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	\$93,334	\$15,000	EPS005	1	\$93,334	\$3,800	CCF32	1	\$93,334	\$3,800	14-7	1	\$93,334	\$0	1	\$0	\$0
60	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	\$63,364	\$10,200	EPS037	1	\$63,364	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,364	\$0	1	\$0	\$0
61	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	\$63,364	\$10,200	EPS037	1	\$63,364	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,364	\$0	1	\$0	\$0
62	CC	1118364489	AYA GUILLOMBO YARLEDY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$0	\$0	14-7	30	\$1,750,905	\$0	30	\$0	\$0
63	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	\$71,675	\$11,500	EPS005	1	\$71,675	\$2,900	CCF32	1	\$71,600	\$2,900	14-7	1	\$71,675	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte				
64	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	\$71,675			\$11,500		EPS005	1	\$71,675	\$2,900	CCF32	1	\$71,600	\$2,900	14-7	1	\$71,675	\$0	1	\$0	\$0
65	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	\$71,675			\$11,500		EPS005	1	\$71,675	\$2,900	CCF32	1	\$71,600	\$2,900	14-7	1	\$71,675	\$0	1	\$0	\$0
66	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	\$66,800			\$10,700		EPS037	1	\$66,800	\$2,700	CCF32	1	\$66,800	\$2,700	14-7	1	\$66,800	\$0	1	\$0	\$0
67	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	\$66,800			\$10,700		EPS037	1	\$66,800	\$2,700	CCF32	1	\$66,800	\$2,700	14-7	1	\$66,800	\$0	1	\$0	\$0
68	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	\$64,389			\$10,400		ESSC24	1	\$64,389	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,389	\$0	1	\$0	\$0
69	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	\$64,389			\$10,400		ESSC24	1	\$64,389	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$64,389	\$0	1	\$0	\$0
70	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	1	\$104,234			\$16,700		EPS041	1	\$104,234	\$4,200	CCF32	1	\$94,234	\$3,800	14-7	1	\$104,234	\$0	1	\$0	\$0
71	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	1	\$104,234			\$16,700		EPS041	1	\$104,234	\$4,200	CCF32	1	\$94,234	\$3,800	14-7	1	\$104,234	\$0	1	\$0	\$0
72	CC	1097182827	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,364			\$9,400		EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
73	CC	1097182827	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,364			\$9,400		EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
74	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	1	\$75,000			\$12,000		EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
75	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	1	\$75,000			\$12,000		EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
76	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	3	\$175,091			\$28,100		EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$175,091	\$0	3	\$0	\$0
77	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	\$58,547			\$9,400		EPS037	1	\$58,547	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,547	\$0	1	\$0	\$0
78	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	\$58,547			\$9,400		EPS037	1	\$58,547	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,547	\$0	1	\$0	\$0
79	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	\$76,100			\$12,200		EPS037	1	\$76,100	\$3,100	CCF32	1	\$76,100	\$3,100	14-7	1	\$76,100	\$0	1	\$0	\$0
80	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	\$76,100			\$12,200		EPS037	1	\$76,100	\$3,100	CCF32	1	\$76,100	\$3,100	14-7	1	\$76,100	\$0	1	\$0	\$0
81	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275			\$13,900		EPS005	1	\$115,275	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
82	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	3	\$345,825			\$41,500		EPS005	3	\$345,825	\$0	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$345,825	\$0	3	\$0	\$0
83	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275			\$18,500		EPS005	1	\$115,275	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
84	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275			\$18,500		EPS005	1	\$115,275	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
85	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	1	\$115,275			\$18,500		EPS005	1	\$115,275	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$115,275	\$0	1	\$0	\$0
86	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	\$58,364			\$9,400		EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
87	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	\$58,364			\$9,400		EPS017	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
88	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	1	\$102,703			\$16,500		EPS037	1	\$102,703	\$4,200	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,703	\$0	1	\$0	\$0
89	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	1	\$102,703			\$16,500		EPS037	1	\$102,703	\$4,200	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$102,703	\$0	1	\$0	\$0
90	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	1	\$82,288			\$13,200		EPS005	1	\$82,288	\$3,300	CCF32	1	\$69,334	\$2,800	14-7	1	\$82,288	\$0	1	\$0	\$0
91	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	1	\$82,288			\$13,200		EPS005	1	\$82,288	\$3,300	CCF32	1	\$69,334	\$2,800	14-7	1	\$82,288	\$0	1	\$0	\$0
92	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	\$63,644			\$10,200		EPS037	1	\$63,644	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,644	\$0	1	\$0	\$0
93	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	\$63,644			\$10,200		EPS037	1	\$63,644	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,644	\$0	1	\$0	\$0
94	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	\$61,000			\$7,400		EPS041	1	\$61,000	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
95	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	\$61,000			\$9,800		EPS041	1	\$61,000	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	\$61,000			\$9,800		EPS041	1	\$61,000	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
97	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	1	\$58,364			\$9,400		EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
98	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	1	\$58,364			\$9,400		EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
99	CC	1075294781	DUCUARA GUTIERREZ CRISTIAN	230301	1	\$78,334	\$12,600	EPS037	1	\$78,334	\$3,200	CCF32	1	\$78,334	\$3,200	14-7	1	\$78,334	\$0	1	\$0	\$0
100	CC	1075294781	DUCUARA GUTIERREZ CRISTIAN	230301	1	\$78,334	\$12,600	EPS037	1	\$78,334	\$3,200	CCF32	1	\$78,334	\$3,200	14-7	1	\$78,334	\$0	1	\$0	\$0
101	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$18,700	EPS037	1	\$116,387	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
102	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$18,700	EPS037	1	\$116,387	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
103	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$18,700	EPS037	1	\$116,387	\$4,700	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
104	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	1	\$116,387	\$14,000	EPS037	1	\$116,387	\$0	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$116,387	\$0	1	\$0	\$0
105	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	\$68,312	\$11,000	EPS005	1	\$68,312	\$2,800	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,312	\$0	1	\$0	\$0
106	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	1	\$68,312	\$11,000	EPS005	1	\$68,312	\$2,800	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,312	\$0	1	\$0	\$0
107	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	\$92,222	\$14,800	EPS017	1	\$92,222	\$3,700	CCF32	1	\$89,656	\$3,600	14-7	1	\$92,222	\$0	1	\$0	\$0
108	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	\$92,222	\$14,800	EPS017	1	\$92,222	\$3,700	CCF32	1	\$89,656	\$3,600	14-7	1	\$92,222	\$0	1	\$0	\$0
109	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	3	\$190,000	\$22,800	EPS017	3	\$190,000	\$0	CCF32	3	\$0	\$0	14-7	3	\$190,000	\$0	3	\$0	\$0
110	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	1	\$63,334	\$10,200	EPS017	1	\$63,334	\$2,600	CCF32	1	\$63,334	\$2,600	14-7	1	\$63,334	\$0	1	\$0	\$0
111	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	1	\$63,334	\$10,200	EPS017	1	\$63,334	\$2,600	CCF32	1	\$63,334	\$2,600	14-7	1	\$63,334	\$0	1	\$0	\$0
112	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	7	\$444,241	\$71,100	EPS037	7	\$444,241	\$17,800	CCF32	7	\$0	\$0	14-7	7	\$444,241	\$0	7	\$0	\$0
113	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	2	\$126,927	\$20,400	EPS037	2	\$126,927	\$5,100	CCF32	2	\$116,727	\$4,700	14-7	2	\$126,927	\$0	2	\$0	\$0
114	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	1	\$63,464	\$10,200	EPS037	1	\$63,464	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,464	\$0	1	\$0	\$0
115	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	1	\$63,464	\$10,200	EPS037	1	\$63,464	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,464	\$0	1	\$0	\$0
116	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	1	\$63,464	\$10,200	EPS037	1	\$63,464	\$2,600	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$63,464	\$0	1	\$0	\$0
117	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
118	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$98,348	\$4,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
119	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
120	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	\$108,679	\$17,400	EPS005	1	\$108,679	\$4,400	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$108,679	\$0	1	\$0	\$0
121	CC	1048278544	MALAGON MADRONERO JORGE ALFREDO	230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS005	1	\$66,667	\$2,700	CCF32	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
122	CC	1048278544	MALAGON MADRONERO JORGE ALFREDO	230301	1	\$66,667	\$10,700	EPS005	1	\$66,667	\$2,700	CCF32	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
123	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	1	\$75,800	\$12,200	EPS005	1	\$75,800	\$3,100	CCF32	1	\$75,800	\$3,100	14-7	1	\$75,800	\$0	1	\$0	\$0
124	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	1	\$75,800	\$12,200	EPS005	1	\$75,800	\$3,100	CCF32	1	\$75,800	\$3,100	14-7	1	\$75,800	\$0	1	\$0	\$0
125	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	1	\$75,307	\$12,100	EPS002	1	\$75,307	\$3,100	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,307	\$0	1	\$0	\$0
126	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	1	\$75,307	\$12,100	EPS002	1	\$75,307	\$3,100	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,307	\$0	1	\$0	\$0
127	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	6	\$351,514	\$56,300	EPS005	6	\$351,514	\$14,100	CCF32	6	\$350,181	\$14,100	14-7	6	\$351,514	\$0	6	\$0	\$0
128	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	1	\$58,586	\$9,400	EPS005	1	\$58,586	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,586	\$0	1	\$0	\$0
129	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	4	\$234,343	\$37,500	EPS005	4	\$234,343	\$9,400	CCF32	4	\$233,454	\$9,400	14-7	4	\$234,343	\$0	4	\$0	\$0
130	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	4	\$234,343	\$37,500	EPS005	4	\$234,343	\$9,400	CCF32	4	\$233,454	\$9,400	14-7	4	\$234,343	\$0	4	\$0	\$0
131	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	1	\$58,586	\$9,400	EPS005	1	\$58,586	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,586	\$0	1	\$0	\$0
132	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	1	\$58,586	\$9,400	EPS005	1	\$58,586	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,586	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte													
133	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	4	\$233,454			\$37,400	EPS037	4			\$233,454			\$9,400	CCF32	4			\$0			\$0			\$0						
134	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
135	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
136	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	2	\$116,727			\$18,700	ESSC62	2			\$116,727			\$4,700	CCF32	2			\$0			\$0	14-7	2		\$116,727	\$0	2		\$0	\$0
137	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	1	\$58,901			\$9,500	ESSC62	1			\$58,901			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,901	\$0	1		\$0	\$0
138	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	1	\$58,901			\$9,500	ESSC62	1			\$58,901			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,901	\$0	1		\$0	\$0
139	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	1	\$157,667			\$25,300	EPS005	1			\$157,667			\$6,400	CCF32	1			\$124,334			\$5,000	14-7	1		\$157,667	\$0	1		\$0	\$0
140	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	1	\$157,667			\$25,300	EPS005	1			\$157,667			\$6,400	CCF32	1			\$124,334			\$5,000	14-7	1		\$157,667	\$0	1		\$0	\$0
141	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	2	\$116,727			\$18,700	EPS005	2			\$116,727			\$4,700	CCF32	2			\$0			\$0	14-7	2		\$116,727	\$0	2		\$0	\$0
142	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	4	\$233,454			\$37,400	EPS005	4			\$233,454			\$9,400	CCF32	4			\$0			\$0	14-7	4		\$233,454	\$0	4		\$0	\$0
143	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364			\$7,100	EPS005	1			\$58,364			\$0	CCF32	1			\$0			\$0	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
144	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364			\$7,100	EPS005	1			\$58,364			\$0	CCF32	1			\$0			\$0	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
145	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364			\$7,100	EPS005	1			\$58,364			\$0	CCF32	1			\$0			\$0	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
146	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364			\$9,400	EPS005	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
147	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	1	\$58,364			\$9,400	EPS005	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
148	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	\$0			\$0	EPS037	1			\$76,697			\$3,100	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$76,697	\$0	1		\$0	\$0
149	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	\$0			\$0	EPS037	1			\$76,697			\$3,100	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$76,697	\$0	1		\$0	\$0
150	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	1	\$75,000			\$12,000	EPS005	1			\$75,000			\$3,000	CCF32	1			\$75,000			\$3,000	14-7	1		\$75,000	\$0	1		\$0	\$0
151	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	1	\$75,000			\$12,000	EPS005	1			\$75,000			\$3,000	CCF32	1			\$75,000			\$3,000	14-7	1		\$75,000	\$0	1		\$0	\$0
152	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
153	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
154	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
155	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
156	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	1	\$63,176			\$10,200	EPS002	1			\$63,176			\$2,600	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$63,176	\$0	1		\$0	\$0
157	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	1	\$63,176			\$10,200	EPS002	1			\$63,176			\$2,600	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$63,176	\$0	1		\$0	\$0
158	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	\$58,381			\$9,400	EPS037	1			\$58,381			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,381	\$0	1		\$0	\$0
159	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	\$58,381			\$9,400	EPS037	1			\$58,381			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,381	\$0	1		\$0	\$0
160	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	1	\$63,381			\$10,200	EPS037	1			\$63,381			\$2,600	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$63,381	\$0	1		\$0	\$0
161	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	1	\$63,381			\$10,200	EPS037	1			\$63,381			\$2,600	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$63,381	\$0	1		\$0	\$0
162	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	1	\$63,381			\$10,200	EPS037	1			\$63,381			\$2,600	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$63,381	\$0	1		\$0	\$0
163	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
164	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	2	\$116,727			\$18,700	EPS037	2			\$116,727			\$4,700	CCF32	2			\$0			\$0	14-7	2		\$116,727	\$0	2		\$0	\$0
165	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
166	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	\$58,364			\$9,400	EPS037	1			\$58,364			\$2,400	CCF32	1			\$58,364			\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
167	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
168	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
169	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
170	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
171	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	\$62,388	\$10,000	EPS041	1	\$62,388	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,388	\$0	1	\$0	\$0
172	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	1	\$92,187	\$14,800	EPS002	1	\$92,187	\$3,700	CCF32	1	\$81,667	\$3,300	14-7	1	\$92,187	\$0	1	\$0	\$0
173	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	1	\$92,187	\$14,800	EPS002	1	\$92,187	\$3,700	CCF32	1	\$81,667	\$3,300	14-7	1	\$92,187	\$0	1	\$0	\$0
174	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	1	\$101,667	\$16,300	EPS005	1	\$101,667	\$4,100	CCF32	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$101,667	\$0	1	\$0	\$0
175	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	1	\$101,667	\$16,300	EPS005	1	\$101,667	\$4,100	CCF32	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$101,667	\$0	1	\$0	\$0
176	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	\$58,603	\$9,400	EPS037	1	\$58,603	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,603	\$0	1	\$0	\$0
177	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	\$58,603	\$9,400	EPS037	1	\$58,603	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,603	\$0	1	\$0	\$0
178	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	\$58,603	\$9,400	EPS037	1	\$58,603	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,603	\$0	1	\$0	\$0
179	CC	1003804498	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	230201	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
180	CC	1003804498	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	230201	1	\$58,364	\$9,400	EPS005	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
181	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	\$83,830	\$13,500	EPS037	1	\$83,830	\$3,400	CCF32	1	\$67,517	\$2,800	14-7	1	\$83,830	\$0	1	\$0	\$0
182	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	\$83,830	\$13,500	EPS037	1	\$83,830	\$3,400	CCF32	1	\$67,517	\$2,800	14-7	1	\$83,830	\$0	1	\$0	\$0
183	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS037	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
184	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS037	1	\$75,000	\$3,000	CCF32	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
185	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
186	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS041	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
187	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS005	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
188	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	1	\$59,176	\$9,500	EPS005	1	\$59,176	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,176	\$0	1	\$0	\$0
189	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	1	\$59,176	\$9,500	EPS005	1	\$59,176	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,176	\$0	1	\$0	\$0
190	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	\$60,677	\$9,800	EPS037	1	\$60,677	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,677	\$0	1	\$0	\$0
191	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	\$60,677	\$9,800	EPS037	1	\$60,677	\$2,500	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,677	\$0	1	\$0	\$0
192	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS037	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$0	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
193	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
194	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$0	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
195	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$60,938	\$9,800	EPS037	1	\$60,938	\$2,500	CCF32	1	\$61,334	\$2,500	14-7	1	\$60,938	\$0	1	\$0	\$0
196	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$60,938	\$9,800	EPS037	1	\$60,938	\$2,500	CCF32	1	\$61,334	\$2,500	14-7	1	\$60,938	\$0	1	\$0	\$0
197	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	\$60,938	\$9,800	EPS037	1	\$60,938	\$2,500	CCF32	1	\$61,334	\$2,500	14-7	1	\$60,938	\$0	1	\$0	\$0
198	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	1	\$280,267	\$47,900	EPS005	1	\$280,267	\$11,300	CCF32	1	\$246,934	\$9,900	14-7	1	\$280,267	\$0	1	\$0	\$0
199	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	1	\$280,267	\$47,900	EPS005	1	\$280,267	\$11,300	CCF32	1	\$246,934	\$9,900	14-7	1	\$280,267	\$0	1	\$0	\$0
200	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	\$59,830	\$9,600	EPS005	1	\$59,830	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,830	\$0	1	\$0	\$0
201	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	\$59,830	\$9,600	EPS005	1	\$59,830	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,830	\$0	1	\$0	\$0
202	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	1	\$59,567	\$9,600	EPS037	1	\$59,567	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,567	\$0	1	\$0	\$0
203	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	1	\$59,567	\$9,600	EPS037	1	\$59,567	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,567	\$0	1	\$0	\$0
204	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	1	\$99,734	\$16,000	EPS037	1	\$99,734	\$4,000	CCF32	1	\$99,734	\$4,000	14-7	1	\$99,734	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
205	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	1	\$99,734	\$16,000	EPS037	1	\$99,734	\$4,000	CCF32	1	\$99,734	\$4,000	14-7	1	\$99,734	\$0	1	\$0	\$0
206	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	2	\$116,727	\$18,700	EPS037	2	\$116,727	\$4,700	CCF32	2	\$116,727	\$4,700	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
207	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS037	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$0	28	\$0	\$0
208	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	1	\$127,071	\$20,400	EPS037	1	\$127,071	\$5,100	CCF32	1	\$105,000	\$4,200	14-7	1	\$127,071	\$0	1	\$0	\$0
209	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	1	\$127,071	\$20,400	EPS037	1	\$127,071	\$5,100	CCF32	1	\$105,000	\$4,200	14-7	1	\$127,071	\$0	1	\$0	\$0
210	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	1	\$200,000	\$32,000	EPS005	1	\$200,000	\$8,000	CCF32	1	\$200,000	\$8,000	14-7	1	\$200,000	\$0	1	\$0	\$0
211	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	1	\$200,000	\$32,000	EPS005	1	\$200,000	\$8,000	CCF32	1	\$200,000	\$8,000	14-7	1	\$200,000	\$0	1	\$0	\$0
212	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	5	\$421,417	\$67,500	EPS037	5	\$421,417	\$16,900	CCF32	5	\$0	\$0	14-7	5	\$421,417	\$0	5	\$0	\$0
213	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	1	\$84,284	\$13,500	EPS037	1	\$84,284	\$3,400	CCF32	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,284	\$0	1	\$0	\$0
214	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	1	\$84,284	\$13,500	EPS037	1	\$84,284	\$3,400	CCF32	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,284	\$0	1	\$0	\$0
215	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	1	\$129,000	\$20,700	EPS037	1	\$129,000	\$5,200	CCF32	1	\$129,000	\$5,200	14-7	1	\$129,000	\$0	1	\$0	\$0
216	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	1	\$129,000	\$20,700	EPS037	1	\$129,000	\$5,200	CCF32	1	\$129,000	\$5,200	14-7	1	\$129,000	\$0	1	\$0	\$0
217	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
218	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF32	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					\$5,075,316	\$812,500			\$5,075,316	\$203,600			\$2,272,171	\$91,500			\$5,075,316	\$0		\$0	\$0	
219	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	1	\$68,270	\$11,000	ESSC62	1	\$68,270	\$2,800	CCF40	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,270	\$0	1	\$0	\$0
220	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	1	\$68,270	\$11,000	ESSC62	1	\$68,270	\$2,800	CCF40	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$68,270	\$0	1	\$0	\$0
221	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
222	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
223	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$195,418	\$7,900	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
224	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	2	\$442,267	\$70,800	EPS017	2	\$442,267	\$17,700	CCF40	2	\$372,134	\$14,900	14-7	2	\$442,267	\$0	2	\$0	\$0
225	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
226	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	2	\$442,267	\$70,800	EPS017	2	\$442,267	\$17,700	CCF40	2	\$439,929	\$17,600	14-7	2	\$442,267	\$0	2	\$0	\$0
227	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$217,627	\$8,800	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
228	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	17	\$2,506,304	\$401,100	EPS017	17	\$2,506,304	\$100,300	CCF40	17	\$0	\$0	14-7	17	\$2,506,304	\$0	17	\$0	\$0
229	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
230	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	1	\$221,134	\$35,400	EPS017	1	\$221,134	\$8,900	CCF40	1	\$186,067	\$7,500	14-7	1	\$221,134	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (90 Afiliados)					\$24,396,675	\$3,878,600			\$24,396,675	\$942,000			\$16,104,654	\$653,300			\$24,396,675	\$0		\$0	\$0	
231	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	1	\$60,768	\$9,800	EPS037	1	\$60,768	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,768	\$0	1	\$0	\$0
232	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	1	\$60,768	\$9,800	EPS037	1	\$60,768	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,768	\$0	1	\$0	\$0
233	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	1	\$89,534	\$14,400	EPS041	1	\$89,534	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,534	\$0	1	\$0	\$0
234	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	1	\$89,534	\$14,400	EPS041	1	\$89,534	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,534	\$0	1	\$0	\$0
235	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	1	\$94,814	\$15,200	EPS041	1	\$94,814	\$3,800	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$94,814	\$0	1	\$0	\$0
236	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	1	\$94,814	\$15,200	EPS041	1	\$94,814	\$3,800	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$94,814	\$0	1	\$0	\$0
237	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	1	\$65,890	\$10,600	ESSC62	1	\$65,890	\$2,700	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$65,890	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
238	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	1	\$65,890			\$10,600		ESSC62	1	\$65,890	\$2,700	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$65,890	\$0	\$0
239	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	\$229,927			\$36,800		EPS017	1	\$229,927	\$9,200	CCF13	1	\$213,260	\$8,600	14-7	1	\$229,927	\$0	\$0
240	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	\$229,927			\$36,800		EPS017	1	\$229,927	\$9,200	CCF13	1	\$213,260	\$8,600	14-7	1	\$229,927	\$0	\$0
241	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	1	\$450,000			\$76,600		EPS037	1	\$450,000	\$18,000	CCF13	1	\$416,667	\$16,700	14-7	1	\$450,000	\$0	\$0
242	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	1	\$450,000			\$76,600		EPS037	1	\$450,000	\$18,000	CCF13	1	\$416,667	\$16,700	14-7	1	\$450,000	\$0	\$0
243	CC	1093775884	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	230301	1	\$156,667			\$25,100		EPS037	1	\$156,667	\$6,300	CCF13	1	\$140,000	\$5,600	14-7	1	\$156,667	\$0	\$0
244	CC	1093775884	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	230301	1	\$156,667			\$25,100		EPS037	1	\$156,667	\$6,300	CCF13	1	\$140,000	\$5,600	14-7	1	\$156,667	\$0	\$0
245	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	1	\$65,522			\$10,500		EPS037	1	\$65,522	\$2,700	CCF13	1	\$58,400	\$2,400	14-7	1	\$65,522	\$0	\$0
246	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	1	\$65,522			\$10,500		EPS037	1	\$65,522	\$2,700	CCF13	1	\$58,400	\$2,400	14-7	1	\$65,522	\$0	\$0
247	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	1	\$192,684			\$30,900		EPS037	1	\$192,684	\$7,800	CCF13	1	\$176,017	\$7,100	14-7	1	\$192,684	\$0	\$0
248	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	1	\$192,684			\$30,900		EPS037	1	\$192,684	\$7,800	CCF13	1	\$176,017	\$7,100	14-7	1	\$192,684	\$0	\$0
249	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	1	\$146,732			\$23,500		EPS010	1	\$146,732	\$5,900	CCF13	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$146,732	\$0	\$0
250	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	1	\$146,732			\$23,500		EPS010	1	\$146,732	\$5,900	CCF13	1	\$101,667	\$4,100	14-7	1	\$146,732	\$0	\$0
251	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	1	\$84,225			\$13,500		EPSIC6	1	\$84,225	\$3,400	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,225	\$0	\$0
252	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	1	\$84,225			\$13,500		EPSIC6	1	\$84,225	\$3,400	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$84,225	\$0	\$0
253	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	2	\$433,334			\$52,100		EPS005	2	\$433,334	\$0	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$433,334	\$0	\$0
254	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	1	\$216,666			\$26,000		EPS005	1	\$216,666	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$216,666	\$0	\$0
255	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	1	\$216,667			\$34,700		EPS005	1	\$216,667	\$8,700	CCF13	1	\$183,334	\$7,400	14-7	1	\$216,667	\$0	\$0
256	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	1	\$216,667			\$34,700		EPS005	1	\$216,667	\$8,700	CCF13	1	\$183,334	\$7,400	14-7	1	\$216,667	\$0	\$0
257	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	1	\$59,710			\$9,600		ESSC62	1	\$59,710	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,710	\$0	\$0
258	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	1	\$59,710			\$9,600		ESSC62	1	\$59,710	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,710	\$0	\$0
259	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	14	\$870,613			\$139,300		ESSC62	14	\$870,613	\$34,900	CCF13	14	\$0	\$0	14-7	14	\$870,613	\$0	\$0
260	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	5	\$310,919			\$49,800		ESSC62	5	\$310,919	\$12,500	CCF13	5	\$292,038	\$11,700	14-7	5	\$310,919	\$0	\$0
261	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	2	\$124,368			\$19,900		ESSC62	2	\$124,368	\$5,000	CCF13	2	\$116,815	\$4,700	14-7	2	\$124,368	\$0	\$0
262	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$62,184			\$10,000		ESSC62	1	\$62,184	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,184	\$0	\$0
263	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	1	\$62,184			\$10,000		ESSC62	1	\$62,184	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,184	\$0	\$0
264	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359			\$9,500		ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	\$0
265	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359			\$9,500		ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	\$0
266	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359			\$9,500		ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	\$0
267	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	\$59,359			\$9,500		ESSC62	1	\$59,359	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,359	\$0	\$0
268	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	1	\$58,364			\$9,400		ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
269	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	1	\$58,364			\$9,400		ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
270	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	1	\$58,364			\$9,400		ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0
271	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	1	\$58,364			\$9,400		ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
272	CC 1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	1	\$59,508	\$9,600	ESSC62	1	\$59,508	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,508	\$0	1	\$0	\$0
273	CC 1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	1	\$59,508	\$9,600	ESSC62	1	\$59,508	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,508	\$0	1	\$0	\$0
274	CC 40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	2	\$317,067	\$50,800	EPS005	2	\$317,067	\$12,700	CCF13	2	\$317,067	\$12,700	14-7	2	\$317,067	\$0	2	\$0	\$0
275	CC 40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	1	\$158,534	\$25,400	EPS005	1	\$158,534	\$6,400	CCF13	1	\$141,000	\$5,700	14-7	1	\$158,534	\$0	1	\$0	\$0
276	CC 40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	1	\$158,534	\$25,400	EPS005	1	\$158,534	\$6,400	CCF13	1	\$141,000	\$5,700	14-7	1	\$158,534	\$0	1	\$0	\$0
277	CC 1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
278	CC 1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
279	CC 1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
280	CC 96361076	CORREA OSPINA JOSE ADOLFO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS037	1	\$75,000	\$3,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
281	CC 96361076	CORREA OSPINA JOSE ADOLFO	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS037	1	\$75,000	\$3,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
282	CC 1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	1	\$59,302	\$9,500	ESSC62	1	\$59,302	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,302	\$0	1	\$0	\$0
283	CC 1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	1	\$59,302	\$9,500	ESSC62	1	\$59,302	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,302	\$0	1	\$0	\$0
284	CC 1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	1	\$59,302	\$9,500	ESSC62	1	\$59,302	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,302	\$0	1	\$0	\$0
285	CC 17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	1	\$86,539	\$13,900	EPS037	1	\$86,539	\$3,500	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$86,539	\$0	1	\$0	\$0
286	CC 17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	1	\$86,539	\$13,900	EPS037	1	\$86,539	\$3,500	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$86,539	\$0	1	\$0	\$0
287	CC 5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	1	\$107,607	\$17,300	EPS037	1	\$107,607	\$4,400	CCF13	1	\$86,567	\$3,500	14-7	1	\$107,607	\$0	1	\$0	\$0
288	CC 5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	1	\$107,607	\$17,300	EPS037	1	\$107,607	\$4,400	CCF13	1	\$86,567	\$3,500	14-7	1	\$107,607	\$0	1	\$0	\$0
289	CC 1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	\$78,334	\$12,600	ESSC62	1	\$78,334	\$3,200	CCF13	1	\$78,334	\$3,200	14-7	1	\$78,334	\$0	1	\$0	\$0
290	CC 1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	\$78,334	\$12,600	ESSC62	1	\$78,334	\$3,200	CCF13	1	\$78,334	\$3,200	14-7	1	\$78,334	\$0	1	\$0	\$0
291	CC 96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	1	\$62,390	\$10,000	ESSC62	1	\$62,390	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,390	\$0	1	\$0	\$0
292	CC 96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	1	\$62,390	\$10,000	ESSC62	1	\$62,390	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$62,390	\$0	1	\$0	\$0
293	CC 96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	1	\$66,429	\$10,700	ESSC62	1	\$66,429	\$2,700	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$66,429	\$0	1	\$0	\$0
294	CC 96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	1	\$66,429	\$10,700	ESSC62	1	\$66,429	\$2,700	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$66,429	\$0	1	\$0	\$0
295	CC 1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	1	\$121,334	\$19,500	EPS037	1	\$121,334	\$4,900	CCF13	1	\$88,000	\$3,600	14-7	1	\$121,334	\$0	1	\$0	\$0
296	CC 1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	1	\$121,334	\$19,500	EPS037	1	\$121,334	\$4,900	CCF13	1	\$88,000	\$3,600	14-7	1	\$121,334	\$0	1	\$0	\$0
297	CC 1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	1	\$121,334	\$14,600	EPS037	1	\$121,334	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$121,334	\$0	1	\$0	\$0
298	CC 1116914182	GALINDEZ JHON ALEXANDER	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS017	1	\$75,000	\$3,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
299	CC 1116914182	GALINDEZ JHON ALEXANDER	230301	1	\$75,000	\$12,000	EPS017	1	\$75,000	\$3,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
300	CC 1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,636	\$9,400	EPS037	1	\$58,636	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,636	\$0	1	\$0	\$0
301	CC 1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,636	\$9,400	EPS037	1	\$58,636	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,636	\$0	1	\$0	\$0
302	CC 1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	1	\$58,636	\$9,400	EPS037	1	\$58,636	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,636	\$0	1	\$0	\$0
303	CC 96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	\$95,513	\$11,500	ESSC62	1	\$95,513	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$95,513	\$0	1	\$0	\$0
304	CC 96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	\$95,512	\$11,500	ESSC62	1	\$95,512	\$0	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$95,512	\$0	1	\$0	\$0
305	CC 96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	\$95,513	\$15,300	ESSC62	1	\$95,513	\$3,900	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$95,513	\$0	1	\$0	\$0
306	CC 96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	\$95,513	\$15,300	ESSC62	1	\$95,513	\$3,900	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$95,513	\$0	1	\$0	\$0
307	CC 1083883017	GARZON LOSADA DIEGO FABIAN	231001	1	\$75,000	\$12,000	EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0
308	CC 1083883017	GARZON LOSADA DIEGO FABIAN	231001	1	\$75,000	\$12,000	EPS005	1	\$75,000	\$3,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$75,000	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
309	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	1	\$96,078			\$15,400	EPS037	1		\$96,078	\$3,900	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$96,078	\$0	1		\$0	\$0
310	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	1	\$96,078			\$15,400	EPS037	1		\$96,078	\$3,900	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$96,078	\$0	1		\$0	\$0
311	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	1	\$61,642			\$9,900	ESSC62	1		\$61,642	\$2,500	CCF13	1		\$59,434	\$2,400	14-7	1		\$61,642	\$0	1		\$0	\$0
312	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	1	\$61,642			\$9,900	ESSC62	1		\$61,642	\$2,500	CCF13	1		\$59,434	\$2,400	14-7	1		\$61,642	\$0	1		\$0	\$0
313	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
314	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
315	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	1	\$61,262			\$9,900	ESSC62	1		\$61,262	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$61,262	\$0	1		\$0	\$0
316	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	1	\$61,262			\$9,900	ESSC62	1		\$61,262	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$61,262	\$0	1		\$0	\$0
317	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
318	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
319	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	1	\$81,489			\$13,100	ESSC62	1		\$81,489	\$3,300	CCF13	1		\$73,334	\$3,000	14-7	1		\$81,489	\$0	1		\$0	\$0
320	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	1	\$81,489			\$13,100	ESSC62	1		\$81,489	\$3,300	CCF13	1		\$73,334	\$3,000	14-7	1		\$81,489	\$0	1		\$0	\$0
321	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	1	\$101,667			\$16,300	EPS005	1		\$101,667	\$4,100	CCF13	1		\$93,334	\$3,800	14-7	1		\$101,667	\$0	1		\$0	\$0
322	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	1	\$101,667			\$16,300	EPS005	1		\$101,667	\$4,100	CCF13	1		\$93,334	\$3,800	14-7	1		\$101,667	\$0	1		\$0	\$0
323	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	1	\$60,458			\$9,700	EPS037	1		\$60,458	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$60,458	\$0	1		\$0	\$0
324	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	1	\$60,458			\$9,700	EPS037	1		\$60,458	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$60,458	\$0	1		\$0	\$0
325	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	1	\$77,765			\$12,500	EPS005	1		\$77,765	\$3,200	CCF13	1		\$76,667	\$3,100	14-7	1		\$77,765	\$0	1		\$0	\$0
326	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	1	\$77,765			\$12,500	EPS005	1		\$77,765	\$3,200	CCF13	1		\$76,667	\$3,100	14-7	1		\$77,765	\$0	1		\$0	\$0
327	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	2	\$140,007			\$22,500	EPS017	2		\$140,007	\$5,700	CCF13	2		\$0	\$0	14-7	2		\$140,007	\$0	2		\$0	\$0
328	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	1	\$79,688			\$12,800	EPS017	1		\$79,688	\$3,200	CCF13	1		\$105,000	\$4,200	14-7	1		\$79,688	\$0	1		\$0	\$0
329	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	1	\$79,688			\$12,800	EPS017	1		\$79,688	\$3,200	CCF13	1		\$105,000	\$4,200	14-7	1		\$79,688	\$0	1		\$0	\$0
330	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	1	\$126,390			\$20,300	EPS037	1		\$126,390	\$5,100	CCF13	1		\$105,000	\$4,200	14-7	1		\$126,390	\$0	1		\$0	\$0
331	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	1	\$126,390			\$20,300	EPS037	1		\$126,390	\$5,100	CCF13	1		\$105,000	\$4,200	14-7	1		\$126,390	\$0	1		\$0	\$0
332	CC	1115941829	LOPEZ MENDEZ JOSE LUIS	230301	1	\$75,000			\$12,000	ESSC62	1		\$75,000	\$3,000	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$75,000	\$0	1		\$0	\$0
333	CC	1115941829	LOPEZ MENDEZ JOSE LUIS	230301	1	\$75,000			\$12,000	ESSC62	1		\$75,000	\$3,000	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$75,000	\$0	1		\$0	\$0
334	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	1	\$79,334			\$12,700	EPS037	1		\$79,334	\$3,200	CCF13	1		\$69,334	\$2,800	14-7	1		\$79,334	\$0	1		\$0	\$0
335	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	1	\$79,334			\$12,700	EPS037	1		\$79,334	\$3,200	CCF13	1		\$69,334	\$2,800	14-7	1		\$79,334	\$0	1		\$0	\$0
336	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	1	\$67,099			\$10,800	EPS005	1		\$67,099	\$2,700	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$67,099	\$0	1		\$0	\$0
337	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	1	\$67,099			\$10,800	EPS005	1		\$67,099	\$2,700	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$67,099	\$0	1		\$0	\$0
338	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
339	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
340	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	1	\$94,234			\$15,100	EPS037	1		\$94,234	\$3,800	CCF13	1		\$94,234	\$3,800	14-7	1		\$94,234	\$0	1		\$0	\$0
341	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	1	\$94,234			\$15,100	EPS037	1		\$94,234	\$3,800	CCF13	1		\$94,234	\$3,800	14-7	1		\$94,234	\$0	1		\$0	\$0
342	CC	1115940793	MONTTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	1	\$61,085			\$9,800	ESSC62	1		\$61,085	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$61,085	\$0	1		\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
343	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	1	\$61,085	\$9,800	ESSC62	1	\$61,085	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,085	\$0	1	\$0	\$0
344	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	1	\$61,085	\$9,800	ESSC62	1	\$61,085	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,085	\$0	1	\$0	\$0
345	CC	71192417	MONTOYA GÓMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	1	\$58,364	\$9,400	MIN001	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
346	CC	71192417	MONTOYA GÓMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	1	\$58,364	\$9,400	MIN001	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
347	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	1	\$121,508	\$19,500	EPS002	1	\$121,508	\$4,900	CCF13	1	\$0	\$0	14-7	1	\$121,508	\$0	1	\$0	\$0
348	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	29	\$3,523,722	\$563,800	EPS002	29	\$3,523,722	\$141,000	CCF13	29	\$0	\$0	14-7	29	\$3,523,722	\$0	29	\$0	\$0
349	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	1	\$98,568	\$15,800	EPS005	1	\$98,568	\$4,000	CCF13	1	\$75,028	\$3,100	14-7	1	\$98,568	\$0	1	\$0	\$0
350	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	1	\$98,568	\$15,800	EPS005	1	\$98,568	\$4,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$98,568	\$0	1	\$0	\$0
351	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	1	\$98,568	\$15,800	EPS005	1	\$98,568	\$4,000	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$98,568	\$0	1	\$0	\$0
352	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	1	\$105,388	\$16,900	EPS002	1	\$105,388	\$4,300	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$105,388	\$0	1	\$0	\$0
353	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	1	\$105,388	\$16,900	EPS002	1	\$105,388	\$4,300	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$105,388	\$0	1	\$0	\$0
354	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	1	\$58,696	\$9,400	EPS037	1	\$58,696	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,696	\$0	1	\$0	\$0
355	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	1	\$58,696	\$9,400	EPS037	1	\$58,696	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,696	\$0	1	\$0	\$0
356	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	1	\$60,728	\$9,800	MIN001	1	\$60,728	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,728	\$0	1	\$0	\$0
357	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	1	\$60,728	\$9,800	MIN001	1	\$60,728	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,728	\$0	1	\$0	\$0
358	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
359	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
360	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
361	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	1	\$58,364	\$9,400	ESSC62	1	\$58,364	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0
362	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	2	\$169,400	\$27,200	EPS037	2	\$169,400	\$6,800	CCF13	2	\$169,400	\$6,800	14-7	2	\$169,400	\$0	2	\$0	\$0
363	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	1	\$84,700	\$13,600	EPS037	1	\$84,700	\$3,400	CCF13	1	\$84,700	\$3,400	14-7	1	\$84,700	\$0	1	\$0	\$0
364	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	1	\$84,700	\$13,600	EPS037	1	\$84,700	\$3,400	CCF13	1	\$84,700	\$3,400	14-7	1	\$84,700	\$0	1	\$0	\$0
365	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	1	\$58,563	\$9,400	ESSC62	1	\$58,563	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,563	\$0	1	\$0	\$0
366	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	1	\$58,563	\$9,400	ESSC62	1	\$58,563	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,563	\$0	1	\$0	\$0
367	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	1	\$58,563	\$9,400	ESSC62	1	\$58,563	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,563	\$0	1	\$0	\$0
368	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	1	\$101,234	\$16,200	EPS005	1	\$101,234	\$4,100	CCF13	1	\$84,067	\$3,400	14-7	1	\$101,234	\$0	1	\$0	\$0
369	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	1	\$101,234	\$16,200	EPS005	1	\$101,234	\$4,100	CCF13	1	\$84,067	\$3,400	14-7	1	\$101,234	\$0	1	\$0	\$0
370	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	1	\$66,667	\$10,700	EPS037	1	\$66,667	\$2,700	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
371	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	1	\$66,667	\$10,700	EPS037	1	\$66,667	\$2,700	CCF13	1	\$66,667	\$2,700	14-7	1	\$66,667	\$0	1	\$0	\$0
372	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	1	\$60,063	\$9,700	ESSC62	1	\$60,063	\$2,500	CCF13	1	\$59,567	\$2,400	14-7	1	\$60,063	\$0	1	\$0	\$0
373	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	1	\$60,063	\$9,700	ESSC62	1	\$60,063	\$2,500	CCF13	1	\$59,567	\$2,400	14-7	1	\$60,063	\$0	1	\$0	\$0
374	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	1	\$60,063	\$9,700	ESSC62	1	\$60,063	\$2,500	CCF13	1	\$59,567	\$2,400	14-7	1	\$60,063	\$0	1	\$0	\$0
375	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	1	\$115,498	\$18,500	EPS002	1	\$115,498	\$4,700	CCF13	1	\$86,667	\$3,500	14-7	1	\$115,498	\$0	1	\$0	\$0
376	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	1	\$115,498	\$18,500	EPS002	1	\$115,498	\$4,700	CCF13	1	\$86,667	\$3,500	14-7	1	\$115,498	\$0	1	\$0	\$0
377	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	1	\$61,265	\$9,900	ESSC62	1	\$61,265	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,265	\$0	1	\$0	\$0
378	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	1	\$61,265	\$9,900	ESSC62	1	\$61,265	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,265	\$0	1	\$0	\$0
379	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	1	\$166,667	\$26,700	EPS037	1	\$166,667	\$6,700	CCF13	1	\$150,000	\$6,000	14-7	1	\$166,667	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
380	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	1	\$166,667	\$26,700	EPS037	1	\$166,667	\$6,700	CCF13	1	\$150,000	\$6,000	14-7	1	\$166,667	\$0	1	\$0	\$0
381	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	10	\$604,526	\$96,800	EPS037	10	\$604,526	\$24,200	CCF13	10	\$0	\$0	14-7	10	\$604,526	\$0	10	\$0	\$0
382	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	2	\$120,906	\$19,400	EPS037	2	\$120,906	\$4,900	CCF13	2	\$116,727	\$4,700	14-7	2	\$120,906	\$0	2	\$0	\$0
383	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	1	\$60,453	\$9,700	EPS037	1	\$60,453	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,453	\$0	1	\$0	\$0
384	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	1	\$60,453	\$9,700	EPS037	1	\$60,453	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,453	\$0	1	\$0	\$0
385	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	1	\$58,885	\$9,500	EPS037	1	\$58,885	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,885	\$0	1	\$0	\$0
386	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	1	\$58,885	\$9,500	EPS037	1	\$58,885	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,885	\$0	1	\$0	\$0
387	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	1	\$81,114	\$13,000	EPS005	1	\$81,114	\$3,300	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$81,114	\$0	1	\$0	\$0
388	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	1	\$81,114	\$13,000	EPS005	1	\$81,114	\$3,300	CCF13	1	\$70,000	\$2,800	14-7	1	\$81,114	\$0	1	\$0	\$0
389	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	1	\$89,017	\$14,300	EPS005	1	\$89,017	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,017	\$0	1	\$0	\$0
390	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	1	\$89,017	\$14,300	EPS005	1	\$89,017	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,017	\$0	1	\$0	\$0
391	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	1	\$58,656	\$9,400	ESSC62	1	\$58,656	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,656	\$0	1	\$0	\$0
392	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	1	\$58,656	\$9,400	ESSC62	1	\$58,656	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,656	\$0	1	\$0	\$0
393	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	1	\$83,713	\$13,400	EPS037	1	\$83,713	\$3,400	CCF13	1	\$81,667	\$3,300	14-7	1	\$83,713	\$0	1	\$0	\$0
394	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	1	\$83,713	\$13,400	EPS037	1	\$83,713	\$3,400	CCF13	1	\$81,667	\$3,300	14-7	1	\$83,713	\$0	1	\$0	\$0
395	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	3	\$178,961	\$28,700	EPS005	3	\$178,961	\$7,200	CCF13	3	\$0	\$0	14-7	3	\$178,961	\$0	3	\$0	\$0
396	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	1	\$59,697	\$9,600	EPS005	1	\$59,697	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,697	\$0	1	\$0	\$0
397	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	1	\$59,697	\$9,600	EPS005	1	\$59,697	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,697	\$0	1	\$0	\$0
398	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	1	\$59,697	\$9,600	EPS005	1	\$59,697	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,697	\$0	1	\$0	\$0
399	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	1	\$59,697	\$9,600	EPS005	1	\$59,697	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,697	\$0	1	\$0	\$0
400	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	1	\$59,309	\$9,500	EPS037	1	\$59,309	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,309	\$0	1	\$0	\$0
401	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	1	\$59,309	\$9,500	EPS037	1	\$59,309	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$59,309	\$0	1	\$0	\$0
402	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	2	\$145,743	\$23,400	EPS005	2	\$145,743	\$5,900	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$145,743	\$0	2	\$0	\$0
403	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	1	\$109,302	\$17,500	EPS005	1	\$109,302	\$4,400	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$109,302	\$0	1	\$0	\$0
404	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	1	\$109,302	\$17,500	EPS005	1	\$109,302	\$4,400	CCF13	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$109,302	\$0	1	\$0	\$0
405	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	1	\$60,033	\$9,700	EPS037	1	\$60,033	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,033	\$0	1	\$0	\$0
406	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	1	\$60,033	\$9,700	EPS037	1	\$60,033	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$60,033	\$0	1	\$0	\$0
407	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	1	\$61,309	\$9,900	ESSC62	1	\$61,309	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,309	\$0	1	\$0	\$0
408	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	1	\$61,309	\$9,900	ESSC62	1	\$61,309	\$2,500	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$61,309	\$0	1	\$0	\$0
409	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	1	\$89,600	\$14,400	EPS005	1	\$89,600	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,600	\$0	1	\$0	\$0
410	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	1	\$89,600	\$14,400	EPS005	1	\$89,600	\$3,600	CCF13	1	\$73,334	\$3,000	14-7	1	\$89,600	\$0	1	\$0	\$0
411	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	2	\$137,785	\$22,100	EPS005	2	\$137,785	\$5,600	CCF13	2	\$0	\$0	14-7	2	\$137,785	\$0	2	\$0	\$0
412	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	1	\$103,334	\$16,600	EPS005	1	\$103,334	\$4,200	CCF13	1	\$103,334	\$4,200	14-7	1	\$103,334	\$0	1	\$0	\$0
413	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	1	\$103,334	\$16,600	EPS005	1	\$103,334	\$4,200	CCF13	1	\$103,334	\$4,200	14-7	1	\$103,334	\$0	1	\$0	\$0
414	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	1	\$103,334	\$16,600	EPS005	1	\$103,334	\$4,200	CCF13	1	\$103,334	\$4,200	14-7	1	\$103,334	\$0	1	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
415	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	1	\$65,806			\$10,600	ESSC62	1		\$65,806	\$2,700	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$65,806	\$0	1		\$0	\$0
416	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	1	\$65,806			\$10,600	ESSC62	1		\$65,806	\$2,700	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$65,806	\$0	1		\$0	\$0
417	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	1	\$59,861			\$9,600	ESSC62	1		\$59,861	\$2,400	CCF13	1		\$58,400	\$2,400	14-7	1		\$59,861	\$0	1		\$0	\$0
418	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	1	\$59,861			\$9,600	ESSC62	1		\$59,861	\$2,400	CCF13	1		\$58,400	\$2,400	14-7	1		\$59,861	\$0	1		\$0	\$0
419	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	1	\$59,861			\$7,200	ESSC62	1		\$59,861	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$59,861	\$0	1		\$0	\$0
420	CC	16783288	SARRIAS RODRIGUEZ WILSON	230301	1	\$75,000			\$12,000	EPS005	1		\$75,000	\$3,000	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$75,000	\$0	1		\$0	\$0
421	CC	16783288	SARRIAS RODRIGUEZ WILSON	230301	1	\$75,000			\$12,000	EPS005	1		\$75,000	\$3,000	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$75,000	\$0	1		\$0	\$0
422	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	1	\$84,239			\$13,500	EPS005	1		\$84,239	\$3,400	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$84,239	\$0	1		\$0	\$0
423	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	1	\$84,239			\$13,500	EPS005	1		\$84,239	\$3,400	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$84,239	\$0	1		\$0	\$0
424	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	1	\$80,000			\$12,800	EPS037	1		\$80,000	\$3,200	CCF13	1		\$70,000	\$2,800	14-7	1		\$80,000	\$0	1		\$0	\$0
425	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	1	\$80,000			\$12,800	EPS037	1		\$80,000	\$3,200	CCF13	1		\$70,000	\$2,800	14-7	1		\$80,000	\$0	1		\$0	\$0
426	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	1	\$92,767			\$14,900	ESSC62	1		\$92,767	\$3,800	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$92,767	\$0	1		\$0	\$0
427	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	1	\$92,767			\$14,900	ESSC62	1		\$92,767	\$3,800	CCF13	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$92,767	\$0	1		\$0	\$0
428	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARGENIO	230301	1	\$58,745			\$7,100	ESSC62	1		\$58,745	\$0	CCF13	1		\$0	\$0	14-7	1		\$58,745	\$0	1		\$0	\$0
429	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARGENIO	230301	1	\$58,745			\$9,400	ESSC62	1		\$58,745	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,745	\$0	1		\$0	\$0
430	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARGENIO	230301	1	\$58,745			\$9,400	ESSC62	1		\$58,745	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,745	\$0	1		\$0	\$0
431	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	1	\$94,781			\$15,200	ESSC62	1		\$94,781	\$3,800	CCF13	1		\$94,667	\$3,800	14-7	1		\$94,781	\$0	1		\$0	\$0
432	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	1	\$94,781			\$15,200	ESSC62	1		\$94,781	\$3,800	CCF13	1		\$94,667	\$3,800	14-7	1		\$94,781	\$0	1		\$0	\$0
433	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
434	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
435	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	1	\$60,722			\$9,800	ESSC62	1		\$60,722	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$60,722	\$0	1		\$0	\$0
436	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	1	\$60,722			\$9,800	ESSC62	1		\$60,722	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$60,722	\$0	1		\$0	\$0
437	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	1	\$60,722			\$9,800	ESSC62	1		\$60,722	\$2,500	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$60,722	\$0	1		\$0	\$0
438	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	1	\$183,334			\$29,400	EPS002	1		\$183,334	\$7,400	CCF13	1		\$150,000	\$6,000	14-7	1		\$183,334	\$0	1		\$0	\$0
439	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	1	\$183,334			\$29,400	EPS002	1		\$183,334	\$7,400	CCF13	1		\$150,000	\$6,000	14-7	1		\$183,334	\$0	1		\$0	\$0
440	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
441	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	1	\$58,364			\$9,400	ESSC62	1		\$58,364	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$58,364	\$0	1		\$0	\$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						\$196,464			\$31,600				\$196,464	\$8,000				\$150,000	\$6,000				\$196,464	\$0			\$0	\$0
442	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	1	\$98,232			\$15,800	EPS037	1		\$98,232	\$4,000	CCF69	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$98,232	\$0	1		\$0	\$0
443	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	1	\$98,232			\$15,800	EPS037	1		\$98,232	\$4,000	CCF69	1		\$75,000	\$3,000	14-7	1		\$98,232	\$0	1		\$0	\$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						\$421,412			\$67,600				\$421,412	\$17,200				\$408,630	\$16,800				\$421,412	\$0			\$0	\$0
444	CC	1006517075	CASTANEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	1	\$62,802			\$10,100	ESSC62	1		\$62,802	\$2,600	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$62,802	\$0	1		\$0	\$0
445	CC	1006517075	CASTANEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	1	\$62,802			\$10,100	ESSC62	1		\$62,802	\$2,600	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$62,802	\$0	1		\$0	\$0
446	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	1	\$59,860			\$9,600	ESSC62	1		\$59,860	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$59,860	\$0	1		\$0	\$0
447	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	1	\$59,860			\$9,600	ESSC62	1		\$59,860	\$2,400	CCF13	1		\$58,364	\$2,400	14-7	1		\$59,860	\$0	1		\$0	\$0
448	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	\$58,696			\$9,400	ESSC62	1		\$58,696	\$2,400	CCF13	1		\$58,446	\$2,400	14-7	1		\$58,696	\$0	1		\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
449	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	\$58,696	\$9,400	ESSC62	1	\$58,696	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,696	\$0	1	\$0	\$0
450	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	\$58,696	\$9,400	ESSC62	1	\$58,696	\$2,400	CCF13	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,696	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: SANTIAGO DE TOLU Depto: SUCRE (1 Afiliados)						\$1,618,540	\$259,200		\$1,618,540	\$64,900			\$1,556,318	\$62,500			\$1,618,540	\$0		\$0	\$0	
451	CC	1091673754	OSPINO GARCIA YUREINY MARCELA	230301	5	\$735,700	\$117,800	EPS005	5	\$735,700	\$29,500	CCF41	5	\$735,700	\$29,500	14-7	5	\$735,700	\$0	5	\$0	\$0
452	CC	1091673754	OSPINO GARCIA YUREINY MARCELA	230301	4	\$588,560	\$94,200	EPS005	4	\$588,560	\$23,600	CCF41	4	\$573,004	\$23,000	14-7	4	\$588,560	\$0	4	\$0	\$0
453	CC	1091673754	OSPINO GARCIA YUREINY MARCELA	230301	1	\$147,140	\$23,600	EPS005	1	\$147,140	\$5,900	CCF41	1	\$123,807	\$5,000	14-7	1	\$147,140	\$0	1	\$0	\$0
454	CC	1091673754	OSPINO GARCIA YUREINY MARCELA	230301	1	\$147,140	\$23,600	EPS005	1	\$147,140	\$5,900	CCF41	1	\$123,807	\$5,000	14-7	1	\$147,140	\$0	1	\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$168,668	\$27,000		\$168,668	\$6,800			\$150,000	\$6,000			\$168,668	\$0		\$0	\$0	
455	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	1	\$84,334	\$13,500	EPS005	1	\$84,334	\$3,400	CCF10	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$84,334	\$0	1	\$0	\$0
456	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	1	\$84,334	\$13,500	EPS005	1	\$84,334	\$3,400	CCF10	1	\$75,000	\$3,000	14-7	1	\$84,334	\$0	1	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (186 Afiliados)						\$409,406,201	\$65,719,300		\$411,590,379	\$16,471,800			\$421,564,919	\$16,870,400			\$411,590,379	\$28,656,200		\$0	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)						\$47,091,375	\$7,535,700		\$47,091,375	\$1,884,700			\$48,132,368	\$1,926,400			\$47,091,375	\$3,278,900		\$0	\$0	
457	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	28	\$1,740,227	\$278,500	EPS037	28	\$1,740,227	\$69,700	CCF13	28	\$1,740,227	\$69,700	14-7	28	\$1,740,227	\$121,200	28	\$0	\$0
458	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	28	\$1,691,680	\$270,700	ESSC62	28	\$1,691,680	\$67,700	CCF13	28	\$1,691,680	\$67,700	14-7	28	\$1,691,680	\$117,800	28	\$0	\$0
459	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	28	\$2,180,793	\$349,000	EPS037	28	\$2,180,793	\$87,300	CCF13	28	\$2,180,794	\$87,300	14-7	28	\$2,180,793	\$151,800	28	\$0	\$0
460	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	28	\$1,680,517	\$268,900	EPS037	28	\$1,680,517	\$67,300	CCF13	28	\$1,680,517	\$67,300	14-7	28	\$1,680,517	\$117,000	28	\$0	\$0
461	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	28	\$2,862,812	\$458,100	ESSC07	28	\$2,862,812	\$114,600	CCF13	28	\$2,862,812	\$114,600	14-7	28	\$2,862,812	\$199,300	28	\$0	\$0
462	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	28	\$2,493,191	\$399,000	EPS010	28	\$2,493,191	\$99,800	CCF13	28	\$2,493,192	\$99,800	14-7	28	\$2,493,191	\$173,600	28	\$0	\$0
463	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	28	\$1,647,906	\$263,700	ESSC62	28	\$1,647,906	\$66,000	CCF13	28	\$1,647,907	\$66,000	14-7	28	\$1,647,906	\$114,700	28	\$0	\$0
464	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	28	\$1,648,403	\$263,800	EPS005	28	\$1,648,403	\$66,000	CCF13	28	\$1,648,404	\$66,000	14-7	28	\$1,648,403	\$114,800	28	\$0	\$0
465	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	28	\$3,311,904	\$530,000	EPS041	28	\$3,311,904	\$132,500	CCF13	28	\$3,311,905	\$132,500	14-7	28	\$3,311,904	\$230,600	28	\$0	\$0
466	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
467	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	28	\$2,856,800	\$457,100	EPS005	28	\$2,856,800	\$114,300	CCF13	28	\$2,856,800	\$114,300	14-7	28	\$2,856,800	\$198,900	28	\$0	\$0
468	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	28	\$3,029,042	\$484,700	EPS037	28	\$3,029,042	\$121,200	CCF13	28	\$3,029,043	\$121,200	14-7	28	\$3,029,042	\$210,900	28	\$0	\$0
469	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	3	\$341,666	\$54,700	EPS037	3	\$341,666	\$13,700	CCF13	3	\$867,689	\$34,800	14-7	3	\$341,666	\$23,800	3	\$0	\$0
470	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	28	\$1,776,836	\$284,300	EPS005	28	\$1,776,836	\$71,100	CCF13	28	\$1,776,837	\$71,100	14-7	28	\$1,776,836	\$123,700	28	\$0	\$0
471	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	22	\$3,579,764	\$572,800	EPS002	22	\$3,579,764	\$143,200	CCF13	22	\$3,579,766	\$143,200	14-7	22	\$3,579,764	\$249,200	22	\$0	\$0
472	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	18	\$1,409,676	\$225,600	EPS037	18	\$1,409,676	\$56,400	CCF13	18	\$1,409,680	\$56,400	14-7	18	\$1,409,676	\$98,200	18	\$0	\$0
473	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	24	\$2,553,334	\$408,600	EPS037	24	\$2,553,334	\$102,200	CCF13	24	\$2,553,334	\$102,200	14-7	24	\$2,553,334	\$177,800	24	\$0	\$0
474	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	3	\$573,666	\$91,800	MIN001	3	\$573,666	\$23,000	CCF13	3	\$1,088,619	\$43,600	14-7	3	\$573,666	\$40,000	3	\$0	\$0
475	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	28	\$1,802,284	\$288,400	EPS037	28	\$1,802,284	\$72,100	CCF13	28	\$1,802,284	\$72,100	14-7	28	\$1,802,284	\$125,500	28	\$0	\$0
476	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	28	\$2,053,332	\$328,600	EPS005	28	\$2,053,332	\$82,200	CCF13	28	\$2,053,334	\$82,200	14-7	28	\$2,053,332	\$143,000	28	\$0	\$0
477	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICARTE	25-14	28	\$3,421,424	\$547,500	EPS005	28	\$3,421,424	\$136,900	CCF13	28	\$3,421,425	\$136,900	14-7	28	\$3,421,424	\$238,200	28	\$0	\$0
478	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	27	\$2,801,940	\$448,400	EPS002	27	\$2,801,940	\$112,100	CCF13	27	\$2,801,941	\$112,100	14-7	27	\$2,801,940	\$195,100	27	\$0	\$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (63 Afiliados)						\$127,325,198	\$20,454,000		\$129,509,376	\$5,183,300			\$134,282,090	\$5,373,900			\$129,509,376	\$9,017,200		\$0	\$0	
479	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	28	\$2,165,390	\$346,500	EPS005	28	\$2,165,390	\$86,700	CCF32	28	\$2,165,390	\$86,700	14-7	28	\$2,165,390	\$150,800	28	\$0	\$0
480	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	28	\$2,613,332	\$418,200	EPS005	28	\$2,613,332	\$104,600	CCF32	28	\$2,613,334	\$104,600	14-7	28	\$2,613,332	\$181,900	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
481	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	28	\$1,784,177	\$285,500	EPS037	28	\$1,784,177	\$71,400	CCF32	28	\$1,784,178	\$71,400	14-7	28	\$1,784,177	\$124,200	28	\$0	\$0
482	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	27	\$1,933,200	\$309,400	EPS005	27	\$1,933,200	\$77,400	CCF32	27	\$1,933,200	\$77,400	14-7	27	\$1,933,200	\$134,600	27	\$0	\$0
483	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	28	\$1,870,400	\$299,300	EPS037	28	\$1,870,400	\$74,900	CCF32	28	\$1,870,400	\$74,900	14-7	28	\$1,870,400	\$130,200	28	\$0	\$0
484	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	28	\$1,804,177	\$288,700	ESSC24	28	\$1,804,177	\$72,200	CCF32	28	\$1,804,178	\$72,200	14-7	28	\$1,804,177	\$125,600	28	\$0	\$0
485	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	28	\$2,938,532	\$470,200	EPS041	28	\$2,938,532	\$117,600	CCF32	28	\$2,938,533	\$117,600	14-7	28	\$2,938,532	\$204,600	28	\$0	\$0
486	CC	1097182827	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS041	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
487	CC	1081154948	BURGOS GÓMEZ ANDRÉS CAMILO	230301	28	\$2,116,236	\$338,600	EPS005	28	\$2,116,236	\$84,700	CCF32	28	\$2,116,236	\$84,700	14-7	28	\$2,116,236	\$147,300	28	\$0	\$0
488	CC	26429849	CABALLERO GONZÁLEZ OLIVA JOHANA	230301	25	\$1,459,088	\$233,500	EPS037	25	\$1,459,088	\$58,400	CCF32	25	\$1,634,177	\$65,400	14-7	25	\$1,459,088	\$101,600	25	\$0	\$0
489	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	28	\$2,130,800	\$341,000	EPS037	28	\$2,130,800	\$85,300	CCF32	28	\$2,130,800	\$85,300	14-7	28	\$2,130,800	\$148,400	28	\$0	\$0
490	CC	7719307	CADENA DÍAZ NELSON	25-14	2	\$727,533	\$116,500	EPS005	2	\$727,533	\$29,200	CCF32	2	\$2,517,046	\$100,700	14-7	2	\$727,533	\$50,700	2	\$0	\$0
491	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS017	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
492	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	15	\$1,587,921	\$254,100	EPS037	15	\$1,587,921	\$63,600	CCF32	15	\$1,822,431	\$72,900	14-7	15	\$1,587,921	\$110,600	15	\$0	\$0
493	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	28	\$2,308,224	\$369,400	EPS005	28	\$2,308,224	\$92,400	CCF32	28	\$2,308,224	\$92,400	14-7	28	\$2,308,224	\$160,700	28	\$0	\$0
494	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS037	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
495	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	3	\$259,652	\$41,600	EPS041	3	\$259,652	\$10,400	CCF32	3	\$637,022	\$25,500	14-7	3	\$259,652	\$18,100	3	\$0	\$0
496	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS041	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
497	CC	1075294781	DUCUARA GUTIERREZ CRISTIAN	230301	28	\$2,193,332	\$351,000	EPS037	28	\$2,193,332	\$87,800	CCF32	28	\$2,193,334	\$87,800	14-7	28	\$2,193,332	\$152,700	28	\$0	\$0
498	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	9	\$1,315,512	\$210,500	EPS037	9	\$1,315,512	\$52,700	CCF32	9	\$2,331,724	\$93,300	14-7	9	\$1,315,512	\$91,600	9	\$0	\$0
499	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	28	\$1,932,628	\$309,300	EPS005	28	\$1,932,628	\$77,400	CCF32	28	\$1,932,628	\$77,400	14-7	28	\$1,932,628	\$134,600	28	\$0	\$0
500	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	28	\$3,010,345	\$481,700	EPS017	28	\$3,010,345	\$120,500	CCF32	28	\$3,010,346	\$120,500	14-7	28	\$3,010,345	\$209,600	28	\$0	\$0
501	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	25	\$1,583,332	\$253,400	EPS017	25	\$1,583,332	\$63,400	CCF32	25	\$1,583,334	\$63,400	14-7	25	\$1,583,332	\$110,200	25	\$0	\$0
502	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	18	\$1,202,451	\$192,400	EPS037	18	\$1,202,451	\$48,100	CCF32	18	\$1,459,086	\$58,400	14-7	18	\$1,202,451	\$83,700	18	\$0	\$0
503	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	26	\$2,914,587	\$466,400	EPS005	26	\$2,914,587	\$116,600	CCF32	26	\$2,914,590	\$116,600	14-7	26	\$2,914,587	\$202,900	26	\$0	\$0
504	CC	1048278544	MALAGON MADRONEO JORGE ALFREDO	230301	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS005	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF32	28	\$1,866,667	\$74,700	14-7	28	\$1,866,667	\$130,000	28	\$0	\$0
505	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	28	\$2,122,400	\$339,600	EPS005	28	\$2,122,400	\$84,900	CCF32	28	\$2,122,400	\$84,900	14-7	28	\$2,122,400	\$147,800	28	\$0	\$0
506	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS002	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF32	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0
507	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	13	\$758,726	\$121,400	EPS005	13	\$758,726	\$30,400	CCF32	13	\$758,726	\$30,400	14-7	13	\$758,726	\$52,900	13	\$0	\$0
508	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	24	\$1,400,724	\$224,200	EPS037	24	\$1,400,724	\$56,100	CCF32	24	\$1,634,177	\$65,400	14-7	24	\$1,400,724	\$97,500	24	\$0	\$0
509	CC	1075241161	MOLINA MEDINA ARNOLDO ALBERTO	230301	18	\$1,350,000	\$216,000	EPS005	18	\$1,350,000	\$54,000	CCF32	18	\$1,350,000	\$54,000	14-7	18	\$1,350,000	\$94,000	18	\$0	\$0
510	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	26	\$1,522,724	\$243,700	ESSC62	26	\$1,522,724	\$61,000	CCF32	26	\$1,634,177	\$65,400	14-7	26	\$1,522,724	\$106,000	26	\$0	\$0
511	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	28	\$4,481,333	\$717,100	EPS005	28	\$4,481,333	\$179,300	CCF32	28	\$4,481,333	\$179,300	14-7	28	\$4,481,333	\$312,000	28	\$0	\$0
512	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	19	\$1,108,907	\$177,500	EPS005	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF32	19	\$1,459,087	\$58,400	14-7	19	\$1,108,907	\$77,200	19	\$0	\$0
513	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	\$0	\$0	EPS037	28	\$2,184,178	\$87,400	CCF32	28	\$2,184,178	\$87,400	14-7	28	\$2,184,178	\$152,100	28	\$0	\$0
514	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF32	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
515	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	28	\$1,639,350	\$262,300	EPS037	28	\$1,639,350	\$65,600	CCF32	28	\$1,639,351	\$65,600	14-7	28	\$1,639,350	\$114,100	28	\$0	\$0
516	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS037	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
517	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	28	\$1,761,736	\$281,900	EPS002	28	\$1,761,736	\$70,500	CCF32	28	\$1,761,736	\$70,500	14-7	28	\$1,761,736	\$122,700	28	\$0	\$0
518	CC	7733534	PATINO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	28	\$1,657,258	\$265,200	EPS037	28	\$1,657,258	\$66,300	CCF32	28	\$1,657,258	\$66,300	14-7	28	\$1,657,258	\$115,400	28	\$0	\$0
519	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	27	\$1,885,347	\$301,700	EPS037	27	\$1,885,347	\$75,500	CCF32	27	\$1,885,347	\$75,500	14-7	27	\$1,885,347	\$131,300	27	\$0	\$0
520	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	25	\$1,459,088	\$233,500	EPS037	25	\$1,459,088	\$58,400	CCF32	25	\$1,575,813	\$63,100	14-7	25	\$1,459,088	\$101,600	25	\$0	\$0
521	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	25	\$1,504,551	\$240,800	EPS041	25	\$1,504,551	\$60,200	CCF32	25	\$1,504,552	\$60,200	14-7	25	\$1,504,551	\$104,800	25	\$0	\$0
522	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	28	\$2,609,645	\$417,600	EPS002	28	\$2,609,645	\$104,400	CCF32	28	\$2,609,645	\$104,400	14-7	28	\$2,609,645	\$181,700	28	\$0	\$0
523	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	28	\$2,846,667	\$455,500	EPS005	28	\$2,846,667	\$113,900	CCF32	28	\$2,846,667	\$113,900	14-7	28	\$2,846,667	\$198,200	28	\$0	\$0
524	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	27	\$1,767,637	\$282,900	EPS037	27	\$1,767,637	\$70,800	CCF32	27	\$1,767,639	\$70,800	14-7	27	\$1,767,637	\$123,100	27	\$0	\$0
525	CC	1003804498	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	230201	28	\$1,650,891	\$264,200	EPS005	28	\$1,650,891	\$66,100	CCF32	28	\$1,650,891	\$66,100	14-7	28	\$1,650,891	\$115,000	28	\$0	\$0
526	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	28	\$2,450,405	\$392,100	EPS037	28	\$2,450,405	\$98,100	CCF32	28	\$2,450,405	\$98,100	14-7	28	\$2,450,405	\$170,600	28	\$0	\$0
527	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS037	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF32	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0
528	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS041	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
529	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	26	\$1,522,624	\$243,700	EPS005	26	\$1,522,624	\$61,000	CCF32	26	\$1,634,177	\$65,400	14-7	26	\$1,522,624	\$106,000	26	\$0	\$0
530	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	28	\$1,712,869	\$274,100	EPS037	28	\$1,712,869	\$68,600	CCF32	28	\$1,712,869	\$68,600	14-7	28	\$1,712,869	\$119,300	28	\$0	\$0
531	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	23	\$1,410,667	\$225,800	EPS037	23	\$1,410,667	\$56,500	CCF32	23	\$1,410,667	\$56,500	14-7	23	\$1,410,667	\$98,200	23	\$0	\$0
532	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	28	\$7,914,133	\$1,345,500	EPS005	28	\$7,914,133	\$316,600	CCF32	28	\$7,914,133	\$316,600	14-7	28	\$7,914,133	\$550,900	28	\$0	\$0
533	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
534	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	28	\$1,788,814	\$286,300	EPS037	28	\$1,788,814	\$71,600	CCF32	28	\$1,788,814	\$71,600	14-7	28	\$1,788,814	\$124,600	28	\$0	\$0
535	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	28	\$2,792,532	\$446,900	EPS037	28	\$2,792,532	\$111,800	CCF32	28	\$2,792,534	\$111,800	14-7	28	\$2,792,532	\$194,400	28	\$0	\$0
536	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	28	\$3,631,814	\$581,100	EPS037	28	\$3,631,814	\$145,300	CCF32	28	\$3,631,815	\$145,300	14-7	28	\$3,631,814	\$252,800	28	\$0	\$0
537	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	28	\$5,600,000	\$896,000	EPS005	28	\$5,600,000	\$224,000	CCF32	28	\$5,600,000	\$224,000	14-7	28	\$5,600,000	\$389,800	28	\$0	\$0
538	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	23	\$1,971,416	\$315,500	EPS037	23	\$1,971,416	\$78,900	CCF32	23	\$1,971,417	\$78,900	14-7	23	\$1,971,416	\$137,300	23	\$0	\$0
539	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	28	\$3,612,000	\$578,000	EPS037	28	\$3,612,000	\$144,500	CCF32	28	\$3,612,000	\$144,500	14-7	28	\$3,612,000	\$251,400	28	\$0	\$0
540	CC	1075253257	VIDALES CELADA CRISTHIAN ANDRES	230201	4	\$300,000	\$48,000	EPS005	4	\$300,000	\$12,000	CCF32	4	\$300,000	\$12,000	14-7	4	\$300,000	\$20,900	4	\$0	\$0
541	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS037	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						\$2,623,004	\$419,800			\$2,623,004	\$105,100			\$2,623,010	\$105,100			\$2,623,004	\$182,600		\$0	\$0
542	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	28	\$1,935,276	\$309,700	ESSC62	28	\$1,935,276	\$77,500	CCF40	28	\$1,935,277	\$77,500	14-7	28	\$1,935,276	\$134,700	28	\$0	\$0
543	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230301	2	\$687,728	\$110,100	EPS017	2	\$687,728	\$27,600	CCF40	2	\$687,733	\$27,600	14-7	2	\$687,728	\$47,900	2	\$0	\$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (93 Afiliados)						\$218,796,945	\$35,138,500			\$218,796,945	\$8,755,700			\$222,957,766	\$8,922,000			\$218,796,945	\$15,232,800		\$0	\$0
544	CC	96332811	ABENDANO CRUZ JOSE ESAUL	230301	28	\$1,736,527	\$277,900	EPS037	28	\$1,736,527	\$69,500	CCF13	28	\$1,736,527	\$69,500	14-7	28	\$1,736,527	\$120,900	28	\$0	\$0
545	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	28	\$2,331,132	\$373,000	EPS041	28	\$2,331,132	\$93,300	CCF13	28	\$2,331,133	\$93,300	14-7	28	\$2,331,132	\$162,300	28	\$0	\$0
546	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	28	\$2,448,213	\$391,800	EPS041	28	\$2,448,213	\$98,000	CCF13	28	\$2,448,213	\$98,000	14-7	28	\$2,448,213	\$170,400	28	\$0	\$0
547	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	28	\$2,061,238	\$329,800	ESSC62	28	\$2,061,238	\$82,500	CCF13	28	\$2,061,239	\$82,500	14-7	28	\$2,061,238	\$143,500	28	\$0	\$0
548	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	28	\$6,471,278	\$1,035,500	EPS017	28	\$6,471,278	\$258,900	CCF13	28	\$6,471,278	\$258,900	14-7	28	\$6,471,278	\$450,500	28	\$0	\$0
549	CC	10499735	ARBOLEDA CARACAS HECTOR FABIO	230301	10	\$750,667	\$120,200	EPS005	10	\$750,667	\$30,100	CCF13	10	\$750,667	\$30,100	14-7	10	\$750,667	\$52,300	10	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
550	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	28	\$12,666,667	\$2,153,500	EPS037	28	\$12,666,667	\$506,700	CCF13	28	\$12,666,667	\$506,700	14-7	28	\$12,666,667	\$881,700	28	\$0	\$0
551	CC	1093775884	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	230301	28	\$4,420,000	\$707,200	EPS037	28	\$4,420,000	\$176,800	CCF13	28	\$4,420,000	\$176,800	14-7	28	\$4,420,000	\$307,700	28	\$0	\$0
552	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	15	\$995,227	\$159,300	EPS037	15	\$995,227	\$39,900	CCF13	15	\$2,330,542	\$93,300	14-7	15	\$995,227	\$69,300	15	\$0	\$0
553	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	28	\$5,428,466	\$868,600	EPS037	28	\$5,428,466	\$217,200	CCF13	28	\$5,428,467	\$217,200	14-7	28	\$5,428,466	\$377,900	28	\$0	\$0
554	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	28	\$4,281,716	\$685,100	EPS010	28	\$4,281,716	\$171,300	CCF13	28	\$4,281,717	\$171,300	14-7	28	\$4,281,716	\$298,100	28	\$0	\$0
555	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	28	\$2,403,083	\$384,500	EPSIC6	28	\$2,403,083	\$96,200	CCF13	28	\$2,403,083	\$96,200	14-7	28	\$2,403,083	\$167,300	28	\$0	\$0
556	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	25	\$5,483,333	\$877,400	EPS005	25	\$5,483,333	\$219,400	CCF13	25	\$5,483,333	\$219,400	14-7	25	\$5,483,333	\$381,700	25	\$0	\$0
557	CC	1115941257	CASANOVA CASANOVA JONATAN	230301	28	\$1,704,513	\$272,800	ESSC62	28	\$1,704,513	\$68,200	CCF13	28	\$1,704,513	\$68,200	14-7	28	\$1,704,513	\$118,700	28	\$0	\$0
558	CC	1115946742	CASANOVA CASANOVA REIMON	230301	7	\$408,545	\$65,400	ESSC62	7	\$408,545	\$16,400	CCF13	7	\$1,225,324	\$49,100	14-7	7	\$408,545	\$28,500	7	\$0	\$0
559	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	26	\$1,594,847	\$255,200	ESSC62	26	\$1,594,847	\$63,800	CCF13	26	\$1,594,849	\$63,800	14-7	26	\$1,594,847	\$111,100	26	\$0	\$0
560	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	28	\$1,773,454	\$283,800	ESSC62	28	\$1,773,454	\$71,000	CCF13	28	\$1,773,455	\$71,000	14-7	28	\$1,773,454	\$123,500	28	\$0	\$0
561	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC62	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
562	CC	1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	28	\$1,653,279	\$264,600	ESSC62	28	\$1,653,279	\$66,200	CCF13	28	\$1,653,279	\$66,200	14-7	28	\$1,653,279	\$115,100	28	\$0	\$0
563	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	26	\$4,156,932	\$665,200	EPS005	26	\$4,156,932	\$166,300	CCF13	26	\$4,156,933	\$166,300	14-7	26	\$4,156,932	\$289,400	26	\$0	\$0
564	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	27	\$1,575,815	\$252,200	ESSC62	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF13	27	\$1,575,815	\$63,100	14-7	27	\$1,575,815	\$109,700	27	\$0	\$0
565	CC	96361076	CORREA OSPINA JOSE ADOLFO	230301	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS037	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF13	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0
566	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	27	\$1,585,465	\$253,700	ESSC62	27	\$1,585,465	\$63,500	CCF13	27	\$1,585,465	\$63,500	14-7	27	\$1,585,465	\$110,400	27	\$0	\$0
567	CC	17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	28	\$2,532,957	\$405,300	EPS037	28	\$2,532,957	\$101,400	CCF13	28	\$2,532,958	\$101,400	14-7	28	\$2,532,957	\$176,300	28	\$0	\$0
568	CC	1006460256	ENDO CHAVARRO YULDOR ALEXIS	230301	25	\$1,875,000	\$300,000	EPS002	25	\$1,875,000	\$75,000	CCF13	25	\$1,875,000	\$75,000	14-7	25	\$1,875,000	\$130,500	25	\$0	\$0
569	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	28	\$3,055,067	\$488,900	EPS037	28	\$3,055,067	\$122,300	CCF13	28	\$3,055,067	\$122,300	14-7	28	\$3,055,067	\$212,700	28	\$0	\$0
570	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	28	\$2,579,453	\$412,800	ESSC62	28	\$2,579,453	\$103,200	CCF13	28	\$2,579,454	\$103,200	14-7	28	\$2,579,453	\$179,600	28	\$0	\$0
571	CC	96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	28	\$1,734,755	\$277,600	ESSC62	28	\$1,734,755	\$69,400	CCF13	28	\$1,734,756	\$69,400	14-7	28	\$1,734,755	\$120,800	28	\$0	\$0
572	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	28	\$2,285,514	\$365,700	ESSC62	28	\$2,285,514	\$91,500	CCF13	28	\$2,285,514	\$91,500	14-7	28	\$2,285,514	\$159,100	28	\$0	\$0
573	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	3	\$463,999	\$74,300	EPS037	3	\$463,999	\$18,600	CCF13	3	\$1,749,178	\$70,000	14-7	3	\$463,999	\$32,300	3	\$0	\$0
574	CC	1116914182	GALINDEZ JHON ALEXANDER	230301	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF13	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0
575	CC	1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	27	\$1,590,736	\$254,600	EPS037	27	\$1,590,736	\$63,700	CCF13	27	\$1,590,737	\$63,700	14-7	27	\$1,590,736	\$110,800	27	\$0	\$0
576	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	26	\$2,800,141	\$448,100	ESSC62	26	\$2,800,141	\$112,100	CCF13	26	\$2,800,142	\$112,100	14-7	26	\$2,800,141	\$194,900	26	\$0	\$0
577	CC	1083883017	GARZON LOSADA DIEGO FABIAN	231001	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF13	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0
578	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	28	\$2,859,223	\$457,500	EPS037	28	\$2,859,223	\$114,400	CCF13	28	\$2,859,223	\$114,400	14-7	28	\$2,859,223	\$199,100	28	\$0	\$0
579	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	28	\$1,783,756	\$285,500	ESSC62	28	\$1,783,756	\$71,400	CCF13	28	\$1,783,756	\$71,400	14-7	28	\$1,783,756	\$124,200	28	\$0	\$0
580	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC62	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
581	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	28	\$1,710,780	\$273,800	ESSC62	28	\$1,710,780	\$68,500	CCF13	28	\$1,710,780	\$68,500	14-7	28	\$1,710,780	\$119,100	28	\$0	\$0
582	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	28	\$1,645,120	\$263,300	ESSC62	28	\$1,645,120	\$65,900	CCF13	28	\$1,645,121	\$65,900	14-7	28	\$1,645,120	\$114,600	28	\$0	\$0
583	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	28	\$2,053,332	\$328,600	ESSC62	28	\$2,053,332	\$82,200	CCF13	28	\$2,053,334	\$82,200	14-7	28	\$2,053,332	\$143,000	28	\$0	\$0
584	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	28	\$2,863,333	\$458,200	EPS005	28	\$2,863,333	\$114,600	CCF13	28	\$2,863,333	\$114,600	14-7	28	\$2,863,333	\$199,300	28	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
585	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	28	\$2,015,099	\$322,500	EPS037	28	\$2,015,099	\$80,700	CCF13	28	\$2,015,099	\$80,700	14-7	28	\$2,015,099	\$140,300	28	\$0	\$0
586	CC	17788518	HOYOS AGUDELO BIRMAN DE JESUS	230301	4	\$300,000	\$48,000	ESSC62	4	\$300,000	\$12,000	CCF13	4	\$300,000	\$12,000	14-7	4	\$300,000	\$20,900	4	\$0	\$0
587	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	28	\$2,792,940	\$446,900	EPS005	28	\$2,792,940	\$111,800	CCF13	28	\$2,792,941	\$111,800	14-7	28	\$2,792,940	\$194,400	28	\$0	\$0
588	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	26	\$3,009,999	\$481,600	EPS017	26	\$3,009,999	\$120,400	CCF13	26	\$3,010,000	\$120,400	14-7	26	\$3,009,999	\$209,500	26	\$0	\$0
589	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	28	\$3,540,000	\$566,400	EPS037	28	\$3,540,000	\$141,600	CCF13	28	\$3,540,000	\$141,600	14-7	28	\$3,540,000	\$246,400	28	\$0	\$0
590	CC	1115941829	LOPEZ MENDEZ JOSE LUIS	230301	28	\$2,267,063	\$362,800	ESSC62	28	\$2,267,063	\$90,700	CCF13	28	\$2,267,063	\$90,700	14-7	28	\$2,267,063	\$157,800	28	\$0	\$0
591	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	28	\$2,241,332	\$358,700	EPS037	28	\$2,241,332	\$89,700	CCF13	28	\$2,241,333	\$89,700	14-7	28	\$2,241,332	\$156,000	28	\$0	\$0
592	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS005	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
593	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC62	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
594	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	28	\$2,638,532	\$422,200	EPS037	28	\$2,638,532	\$105,600	CCF13	28	\$2,638,534	\$105,600	14-7	28	\$2,638,532	\$183,700	28	\$0	\$0
595	CC	96361778	MOLINA GAVIRIA WILLINGTON	25-14	10	\$750,000	\$120,000	ESSC62	10	\$750,000	\$30,000	CCF13	10	\$750,000	\$30,000	14-7	10	\$750,000	\$52,200	10	\$0	\$0
596	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	27	\$2,034,073	\$325,500	ESSC62	27	\$2,034,073	\$81,400	CCF13	27	\$2,034,074	\$81,400	14-7	27	\$2,034,073	\$141,600	27	\$0	\$0
597	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	28	\$1,634,178	\$261,500	MIN001	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
598	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	27	\$2,739,808	\$438,400	EPS005	27	\$2,739,808	\$109,600	CCF13	27	\$2,739,810	\$109,600	14-7	27	\$2,739,808	\$190,700	27	\$0	\$0
599	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	28	\$3,209,782	\$513,600	EPS002	28	\$3,209,782	\$128,400	CCF13	28	\$3,209,783	\$128,400	14-7	28	\$3,209,782	\$223,500	28	\$0	\$0
600	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS037	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
601	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	28	\$1,719,435	\$275,200	MIN001	28	\$1,719,435	\$68,800	CCF13	28	\$1,719,435	\$68,800	14-7	28	\$1,719,435	\$119,700	28	\$0	\$0
602	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC62	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
603	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC62	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
604	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	26	\$2,202,200	\$352,400	EPS037	26	\$2,202,200	\$88,100	CCF13	26	\$2,202,200	\$88,100	14-7	26	\$2,202,200	\$153,300	26	\$0	\$0
605	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	27	\$1,575,815	\$252,200	ESSC62	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF13	27	\$1,575,815	\$63,100	14-7	27	\$1,575,815	\$109,700	27	\$0	\$0
606	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	28	\$2,853,867	\$456,700	EPS005	28	\$2,853,867	\$114,200	CCF13	28	\$2,853,867	\$114,200	14-7	28	\$2,853,867	\$198,700	28	\$0	\$0
607	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	28	\$1,866,667	\$298,700	EPS037	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF13	28	\$1,866,667	\$74,700	14-7	28	\$1,866,667	\$130,000	28	\$0	\$0
608	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	27	\$1,659,453	\$265,600	ESSC62	27	\$1,659,453	\$66,400	CCF13	27	\$1,659,453	\$66,400	14-7	27	\$1,659,453	\$115,500	27	\$0	\$0
609	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	28	\$3,702,785	\$592,500	EPS002	28	\$3,702,785	\$148,200	CCF13	28	\$3,702,785	\$148,200	14-7	28	\$3,702,785	\$257,800	28	\$0	\$0
610	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	28	\$1,761,118	\$281,800	ESSC62	28	\$1,761,118	\$70,500	CCF13	28	\$1,761,119	\$70,500	14-7	28	\$1,761,118	\$122,600	28	\$0	\$0
611	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	28	\$4,700,000	\$752,000	EPS037	28	\$4,700,000	\$188,000	CCF13	28	\$4,700,000	\$188,000	14-7	28	\$4,700,000	\$327,200	28	\$0	\$0
612	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	16	\$992,709	\$158,900	EPS037	16	\$992,709	\$39,800	CCF13	16	\$1,517,450	\$60,700	14-7	16	\$992,709	\$69,100	16	\$0	\$0
613	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	28	\$1,733,760	\$277,500	EPS037	28	\$1,733,760	\$69,400	CCF13	28	\$1,733,761	\$69,400	14-7	28	\$1,733,760	\$120,700	28	\$0	\$0
614	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	28	\$2,361,444	\$377,900	EPS005	28	\$2,361,444	\$94,500	CCF13	28	\$2,361,444	\$94,500	14-7	28	\$2,361,444	\$164,400	28	\$0	\$0
615	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	28	\$2,094,833	\$335,200	EPS005	28	\$2,094,833	\$83,800	CCF13	28	\$2,094,833	\$83,800	14-7	28	\$2,094,833	\$145,900	28	\$0	\$0
616	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	28	\$1,654,074	\$264,700	ESSC62	28	\$1,654,074	\$66,200	CCF13	28	\$1,654,075	\$66,200	14-7	28	\$1,654,074	\$115,200	28	\$0	\$0
617	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	28	\$2,286,667	\$365,900	EPS037	28	\$2,286,667	\$91,500	CCF13	28	\$2,286,667	\$91,500	14-7	28	\$2,286,667	\$159,200	28	\$0	\$0
618	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	23	\$1,382,353	\$221,200	EPS005	23	\$1,382,353	\$55,300	CCF13	23	\$1,517,449	\$60,700	14-7	23	\$1,382,353	\$96,300	23	\$0	\$0
619	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	28	\$1,682,527	\$269,300	EPS037	28	\$1,682,527	\$67,400	CCF13	28	\$1,682,527	\$67,400	14-7	28	\$1,682,527	\$117,200	28	\$0	\$0
620	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	26	\$2,637,307	\$422,000	EPS005	26	\$2,637,307	\$105,500	CCF13	26	\$2,637,307	\$105,500	14-7	26	\$2,637,307	\$183,600	26	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
621	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	28	\$2,082,310	\$333,200	EPS037	28	\$2,082,310	\$83,300	CCF13	28	\$2,082,310	\$83,300	14-7	28	\$2,082,310	\$145,000	28	\$0	\$0
622	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	28	\$1,634,178	\$261,500	ESSC62	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF13	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$113,800	28	\$0	\$0
623	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	28	\$2,619,757	\$419,200	EPS005	28	\$2,619,757	\$104,800	CCF13	28	\$2,619,758	\$104,800	14-7	28	\$2,619,757	\$182,400	28	\$0	\$0
624	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	25	\$2,583,331	\$413,400	EPS005	25	\$2,583,331	\$103,400	CCF13	25	\$2,583,334	\$103,400	14-7	25	\$2,583,331	\$179,800	25	\$0	\$0
625	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARGENIO	230301	28	\$1,724,508	\$276,000	ESSC62	28	\$1,724,508	\$69,000	CCF13	28	\$1,724,509	\$69,000	14-7	28	\$1,724,508	\$120,100	28	\$0	\$0
626	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	3	\$175,200	\$28,100	ESSC62	3	\$175,200	\$7,100	CCF13	3	\$238,871	\$9,600	14-7	3	\$175,200	\$12,200	3	\$0	\$0
627	CC	16783288	SARRIAS RODRIGUEZ WILSON	230301	28	\$2,100,000	\$336,000	EPS005	28	\$2,100,000	\$84,000	CCF13	28	\$2,100,000	\$84,000	14-7	28	\$2,100,000	\$146,200	28	\$0	\$0
628	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	28	\$2,819,156	\$451,100	EPS005	28	\$2,819,156	\$112,800	CCF13	28	\$2,819,156	\$112,800	14-7	28	\$2,819,156	\$196,300	28	\$0	\$0
629	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	28	\$2,260,000	\$361,600	EPS037	28	\$2,260,000	\$90,400	CCF13	28	\$2,260,000	\$90,400	14-7	28	\$2,260,000	\$157,300	28	\$0	\$0
630	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	28	\$2,530,849	\$405,000	ESSC62	28	\$2,530,849	\$101,300	CCF13	28	\$2,530,850	\$101,300	14-7	28	\$2,530,849	\$176,200	28	\$0	\$0
631	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARGENIO	230301	27	\$1,634,808	\$261,600	ESSC62	27	\$1,634,808	\$65,400	CCF13	27	\$1,634,809	\$65,400	14-7	27	\$1,634,808	\$113,800	27	\$0	\$0
632	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	28	\$2,650,667	\$424,200	ESSC62	28	\$2,650,667	\$106,100	CCF13	28	\$2,650,667	\$106,100	14-7	28	\$2,650,667	\$184,500	28	\$0	\$0
633	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	28	\$1,648,403	\$263,800	ESSC62	28	\$1,648,403	\$66,000	CCF13	28	\$1,648,404	\$66,000	14-7	28	\$1,648,403	\$114,800	28	\$0	\$0
634	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRÉS	230301	27	\$1,894,995	\$303,200	ESSC62	27	\$1,894,995	\$75,800	CCF13	27	\$1,894,997	\$75,800	14-7	27	\$1,894,995	\$131,900	27	\$0	\$0
635	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	28	\$5,199,999	\$832,000	EPS002	28	\$5,199,999	\$208,000	CCF13	28	\$5,200,000	\$208,000	14-7	28	\$5,199,999	\$362,000	28	\$0	\$0
636	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	28	\$1,696,155	\$271,400	ESSC62	28	\$1,696,155	\$67,900	CCF13	28	\$1,696,156	\$67,900	14-7	28	\$1,696,155	\$118,100	28	\$0	\$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						\$3,006,621	\$481,100			\$3,006,621	\$120,300			\$3,006,622	\$120,300			\$3,006,621	\$209,300		\$0	\$0
637	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	28	\$3,006,621	\$481,100	EPS037	28	\$3,006,621	\$120,300	CCF69	28	\$3,006,622	\$120,300	14-7	28	\$3,006,621	\$209,300	28	\$0	\$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						\$5,102,286	\$816,400			\$5,102,286	\$204,200			\$5,102,290	\$204,200			\$5,102,286	\$355,200		\$0	\$0
638	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	28	\$1,782,487	\$285,200	ESSC62	28	\$1,782,487	\$71,300	CCF13	28	\$1,782,488	\$71,300	14-7	28	\$1,782,487	\$124,100	28	\$0	\$0
639	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	28	\$1,713,744	\$274,200	ESSC62	28	\$1,713,744	\$68,600	CCF13	28	\$1,713,745	\$68,600	14-7	28	\$1,713,744	\$119,300	28	\$0	\$0
640	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	27	\$1,606,055	\$257,000	ESSC62	27	\$1,606,055	\$64,300	CCF13	27	\$1,606,057	\$64,300	14-7	27	\$1,606,055	\$111,800	27	\$0	\$0
Ciudad: SANTIAGO DE TOLU Depto: SUCRE (1 Afiliados)						\$2,842,327	\$454,800			\$2,842,327	\$113,700			\$2,842,327	\$113,700			\$2,842,327	\$197,900		\$0	\$0
641	CC	1091673754	OSPINO GARCIA YUREINY MARCELA	230301	19	\$2,842,327	\$454,800	EPS005	19	\$2,842,327	\$113,700	CCF41	19	\$2,842,327	\$113,700	14-7	19	\$2,842,327	\$197,900	19	\$0	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$2,618,445	\$419,000			\$2,618,445	\$104,800			\$2,618,446	\$104,800			\$2,618,445	\$182,300		\$0	\$0
642	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	28	\$2,618,445	\$419,000	EPS005	28	\$2,618,445	\$104,800	CCF10	28	\$2,618,446	\$104,800	14-7	28	\$2,618,445	\$182,300	28	\$0	\$0
Total Afiliados(189)						\$465,977,825	\$74,711,400			\$468,315,397	\$18,666,400			\$459,962,005	\$18,425,800			\$468,315,397	\$28,656,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289803314	9504470881	E	2026/05/07	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	\$2,440,476,400

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					188	\$74,711,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13		\$8,757,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34		\$15,390,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	120		\$43,502,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20		\$6,705,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1		\$354,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					186	\$28,656,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	186		\$28,656,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)					187	\$18,425,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1		\$110,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	118		\$11,926,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1		\$126,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	64		\$5,889,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1		\$176,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2		\$196,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					189	\$18,666,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	45		\$3,370,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1		\$77,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2		\$289,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7		\$992,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3		\$181,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1		\$122,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	63		\$6,326,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9		\$771,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1		\$103,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10		\$1,328,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	47		\$5,104,800
TOTAL					189	\$140,459,800

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	289803314	9504470881	E	2026-05-07													X				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$386,979						\$62,000										
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$386,979						\$62,000										
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$10,835,390						\$1,733,700										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		1		\$386,979						\$2,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		1		\$386,979						\$2,000										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		28		\$10,835,390						\$54,200										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		1		\$386,979						\$2,000										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		1		\$386,979						\$2,000										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		28		\$10,835,390						\$54,200										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$386,979						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$386,979						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		28	0.522%	\$10,835,390						\$56,600										
CCF		COMFENALCO CARTAGENA		1	4%	\$386,979						\$15,500										
CCF		COMFENALCO CARTAGENA		1	4%	\$386,979						\$15,500										
CCF		COMFENALCO CARTAGENA		28	4%	\$10,835,390						\$433,500										
EPS		SANITAS		1	4%	\$386,979						\$15,500										
EPS		SANITAS		1	4%	\$386,979						\$15,500										
EPS		SANITAS		28	4%	\$10,835,390						\$433,500										

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 10:56.

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	289803314	9504470881	E	2026-05-07									X				L				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		1	16%	\$168,167						\$27,000										
AFP		PROTECCION		1	16%	\$168,167						\$27,000										
AFP		PROTECCION		1	16%	\$168,167						\$27,000										
AFP		PROTECCION		27	16%	\$4,570,500						\$731,300										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$168,167						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$168,167						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$168,167						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		27	6.96%	\$4,570,500						\$318,200										
CCF		COMFABOY		1	4%	\$158,167						\$6,400										
CCF		COMFABOY		1	4%	\$158,167						\$6,400										
CCF		COMFABOY		1	4%	\$158,167						\$6,400										
CCF		COMFABOY		27	4%	\$4,570,500						\$182,900										
EPS		NUEVA E.P.S.		1	4%	\$168,167						\$6,800										
EPS		NUEVA E.P.S.		1	4%	\$168,167						\$6,800										
EPS		NUEVA E.P.S.		1	4%	\$168,167						\$6,800										
EPS		NUEVA E.P.S.		27	4%	\$4,570,500						\$182,900										

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 11:01.

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	289803314	9504470881	E	2026-05-07													L				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		1	16%	\$249,694						\$40,000										
AFP		COLFONDOS		1	16%	\$249,694						\$40,000										
AFP		COLFONDOS		28	16%	\$6,991,406						\$1,118,700										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		1		\$249,694						\$1,300										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		1		\$249,694						\$1,300										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		28		\$6,991,406						\$35,000										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		1		\$249,694						\$1,300										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		1		\$249,694						\$1,300										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		28		\$6,991,406						\$35,000										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$249,694						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$249,694						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		28	0.522%	\$6,991,406						\$36,500										
CCF		COMPENSAR		1	4%	\$249,694						\$10,000										
CCF		COMPENSAR		1	4%	\$249,694						\$10,000										
CCF		COMPENSAR		28	4%	\$6,991,406						\$279,700										
EPS		COMPENSAR		1	4%	\$249,694						\$10,000										
EPS		COMPENSAR		1	4%	\$249,694						\$10,000										
EPS		COMPENSAR		28	4%	\$6,991,406						\$279,700										

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 10:53.

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	289803314	9504470881	E	2026-05-07									X				L				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$631,059						\$101,000										
AFP		COLPENSIONES		1	16%	\$631,059						\$101,000										
AFP		COLPENSIONES		28	16%	\$17,871,018						\$2,859,400										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		1		\$631,059						\$3,200										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		1		\$631,059						\$3,200										
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		28		\$17,871,018						\$89,400										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		1		\$631,059						\$3,200										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		1		\$631,059						\$3,200										
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		28		\$17,871,018						\$89,400										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$631,059						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		1	0%	\$631,059						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		28	6.96%	\$17,871,018						\$1,243,900										
CCF		COMPENSAR		1	4%	\$758,726						\$30,400										
CCF		COMPENSAR		1	4%	\$758,726						\$30,400										
CCF		COMPENSAR		28	4%	\$17,871,020						\$714,900										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	12.5%	\$631,059						\$78,900										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	12.5%	\$631,059						\$78,900										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		28	12.5%	\$17,871,018						\$2,233,900										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	3%	\$758,726						\$22,800										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	3%	\$758,726						\$22,800										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		28	3%	\$17,871,020						\$536,200										
PARAFISCALES		SENA		1	2%	\$758,726						\$15,200										
PARAFISCALES		SENA		1	2%	\$758,726						\$15,200										
PARAFISCALES		SENA		28	2%	\$17,871,020						\$357,500										

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 10:55.

Se certifica que DANIEL ESTEBAN POLANIA NARVAEZ identificado(a) con CC 1003953459 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	289803314	9504470881	E	2026-05-07											X	X					
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		11	16%	\$641,999						\$102,800										
AFP		PORVENIR		17	16%	\$992,180						\$158,800										
AFP		PORVENIR		2	12%	\$116,727						\$14,100										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		11	0%	\$641,999						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		17	0%	\$992,180						\$0										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		2	0%	\$116,727						\$0										
CCF		COMFAMILIAR HUILA		11	0%	\$0						\$0										
CCF		COMFAMILIAR HUILA		17	0%	\$0						\$0										
CCF		COMFAMILIAR HUILA		2	0%	\$0						\$0										
EPS		NUEVA E.P.S.		11	4%	\$641,999						\$25,700										
EPS		NUEVA E.P.S.		17	4%	\$992,180						\$39,700										
EPS		NUEVA E.P.S.		2	0%	\$116,727						\$0										

Este certificado se expide el día 2026-05-11 a las 08:24.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

ZIMA SEGURIDAD LTDA

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIBER ACOSTA MENESES identificado(a) con CC 1122342596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,156,083	4%	\$126,300
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,156,083	16%	\$505,000
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,156,083		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,156,083		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,156,083	6.96%	\$219,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,156,083	4%	\$126,300

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:18.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN FERNANDO VALDERRAMA OLAYA identificado(a) con CC 1075224004

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,021,749	4%	\$120,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,021,749	16%	\$483,500
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,021,749		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,021,749		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,021,749	4.35%	\$131,500
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,021,749	4%	\$120,900

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:12.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN ARNEY MEDINA AVILES identificado(a) con CC 1075278572

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								\$2,797,261	4%	\$111,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								\$2,797,261	16%	\$447,600
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X								\$2,797,261		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X								\$2,797,261		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X								\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X								\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								\$2,797,261	4.35%	\$121,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								\$2,797,261	4%	\$111,900

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:14.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRAYAN STEVEN PELAEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 1003635491

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$2,831,402	4%	\$113,300
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,831,402	16%	\$453,100
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$2,831,402		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$2,831,402		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,831,402	6.96%	\$197,100
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,831,402	4%	\$113,300

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:15.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO ANDRES ALDANA MURILLO identificado(a) con CC 1010122548

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,243,597	4%	\$129,800
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,243,597	16%	\$519,000
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,243,597		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,243,597		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,243,597	4.35%	\$141,100
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,243,597	4%	\$129,800

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:16.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN MANUEL ADRADA VELANDIA identificado(a) con CC 1075220227

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$2,916,790	4%	\$116,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,916,790	16%	\$466,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$2,916,790		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$2,916,790		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,916,790	4.35%	\$126,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,916,790	4%	\$116,700

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:17.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

ZIMA SEGURIDAD LTDA

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILMAR DIAZ AGUDELO identificado(a) con CC 17788765

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X								\$3,403,555	4%	\$136,200
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								\$3,403,555	16%	\$544,600
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X								\$3,403,555		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X								\$3,403,555		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X								\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X								\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								\$3,403,555	4.35%	\$148,100
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X								\$3,403,555	4%	\$136,200

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 12:02.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEXANDER SILVA MOLANO identificado(a) con CC 1115951473

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,147,961	4%	\$126,000
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,147,961	16%	\$503,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,147,961		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,147,961		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,147,961	4.35%	\$137,000
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,147,961	4%	\$126,000

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:56.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VICTOR MANUEL CAMARGO JARAMILLO identificado(a) con CC 1006404268

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$2,976,022	4%	\$119,100
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,976,022	16%	\$476,200
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$2,976,022		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$2,976,022		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,976,022	4.35%	\$129,500
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$2,976,022	4%	\$119,100

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:58.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERMINSO GALINDEZ AMAYA identificado(a) con CC 1115951927

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,555,366	4%	\$142,300
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,555,366	16%	\$568,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,555,366		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,555,366		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,555,366	4.35%	\$154,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,555,366	4%	\$142,300

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:58.

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURICIO MOLANO CASERES identificado(a) con CC 1115946689

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,396,698	4%	\$135,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,396,698	16%	\$543,500
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,396,698		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,396,698		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,396,698	4.35%	\$147,800
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,396,698	4%	\$135,900

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:59.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN ALEXANDER SUAREZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1115953110

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,428,126	4%	\$137,200
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,428,126	16%	\$548,600
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,428,126		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,428,126		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,428,126	4.35%	\$149,200
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,428,126	4%	\$137,200

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 12:04.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO CESAR CARRILLO CASTAÑO identificado(a) con CC 1115944312

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	7		X							X									\$580,500	4%	\$23,300
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	7		X							X									\$580,500	16%	\$92,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	7		X							X									\$580,500		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	7		X							X									\$580,500		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	7		X							X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	7		X							X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	7		X							X									\$580,500	4.35%	\$25,300
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	7		X							X									\$1,650,498	4%	\$66,100

Este certificado se expide el día 2026-05-22 a las 08:38.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIBER ACOSTA MENESES identificado(a) con CC 1122342596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,156,083	4%	\$126,300
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,156,083	16%	\$505,000
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,156,083		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,156,083		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,156,083	6.96%	\$219,700
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,156,083	4%	\$126,300

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 11:18.

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE DANIEL GAITAN BUITRAGO identificado(a) con CC 1122238943

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504612869	320781553	E	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30									X									\$3,396,698	4%	\$135,900
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,396,698	16%	\$543,500
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30									X									\$3,396,698		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30									X									\$3,396,698		\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30									X									\$0	0%	\$0
9504612869	320781553	E	2026-05-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,396,698	4.35%	\$147,800
9504612869	320781553	E	2026-05-19	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									\$3,396,698	4%	\$135,900

Este certificado se expide el día 2026-05-20 a las 12:00.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901761110	5	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA NIMAIMA	CC Arkacentro Oficina A05-A06	NIMAIMA-CUNDINAMARCA	2657492	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	292783590	9504523025	E	2026/05/06	2026/05/08	BANCOLOMBIA	2	\$6,265,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: IBAGUE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$121,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: IBAGUE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$121,900		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$121,900		\$0	\$0	
1	CC	2231397	LOPEZ MONTEALEGRE LUIS FERNANDO	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF50	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PUENTE LAS DELICIAS (14 Afiliados)					\$18,442,866	\$2,951,600			\$18,442,866	\$738,600			\$18,442,866	\$738,600			\$18,442,866	\$1,284,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PUENTE LAS DELICIAS (14 Afiliados)					\$18,442,866	\$2,951,600			\$18,442,866	\$738,600			\$18,442,866	\$738,600			\$18,442,866	\$1,284,200		\$0	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (14 Afiliados)					\$18,442,866	\$2,951,600			\$18,442,866	\$738,600			\$18,442,866	\$738,600			\$18,442,866	\$1,284,200		\$0	\$0	
2	CC	17689380	AGUIRRE ROJAS EDWIN FABIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
3	CC	1119215717	BOCANEGRA SANCHEZ DEIBY	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
4	CC	1006517800	CABRERA GONZALES BRAYER EDUARDO	230201	4	\$233,454	\$37,400	ESSC62	4	\$233,454	\$9,400	CCF13	4	\$233,454	\$9,400	14-11	4	\$233,454	\$16,300	4	\$0	\$0
5	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
6	CC	1006955887	CORDOBA CAPERA JHONATAN	230301	4	\$233,454	\$37,400	EP5037	4	\$233,454	\$9,400	CCF13	4	\$233,454	\$9,400	14-11	4	\$233,454	\$16,300	4	\$0	\$0
7	CC	1118026879	CULMA CUMACO ANIBAL	230301	4	\$233,454	\$37,400	ESSC62	4	\$233,454	\$9,400	CCF13	4	\$233,454	\$9,400	14-11	4	\$233,454	\$16,300	4	\$0	\$0
8	CC	1118027576	LOPEZ VELEZ MISAEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
9	CC	96332717	LOZANO SANTOS LEONEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
10	CC	1117527061	MUÑOZ SILVA KELLY JOHANA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
11	CC	1117508343	PELAEZ VEGA JAIDER ESNEIDER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
12	CC	1007593935	PEÑA POSADA ERICK	230301	4	\$233,454	\$37,400	ESSC62	4	\$233,454	\$9,400	CCF13	4	\$233,454	\$9,400	14-11	4	\$233,454	\$16,300	4	\$0	\$0
13	CC	1006528679	POSADA TIMOTE CRISTIAN DAMIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
14	CC	1119218385	SANCHEZ BOCANEGRA JOHN JAIR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
15	CC	11440219	SARAY QUIJANO FRANKY ORLANDO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(15)					\$20,193,771	\$3,231,800			\$20,193,771	\$808,700			\$20,193,771	\$808,700			\$20,193,771	\$1,406,100		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$3,231,800	\$4,800	\$0	\$3,236,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$500	\$0	\$280,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,353,800	\$3,400	\$0	\$2,357,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$597,800	\$900	\$0	\$598,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,406,100	\$2,100	\$0	\$1,408,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$1,406,100	\$2,100	\$0	\$1,408,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	\$808,700	\$1,300	\$0	\$810,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	14	\$738,600	\$1,100	\$0	\$739,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$808,700	\$1,500	\$0	\$810,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$308,600	\$500	\$0	\$309,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$289,800	\$500	\$0	\$290,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$140,200	\$300	\$0	\$140,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,300
TOTAL				15	\$6,255,300	\$9,700	\$0	\$6,265,000

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL NEOTECNO INGENIERIA SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-05	293947251	9504537313	E	2026/05/12	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	\$6,688,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: NEOTECNO FLORENCIA (14 Afiliados)					\$21,594,495	\$3,455,900			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$1,503,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: EL PAUJIL (14 Afiliados)					\$21,594,495	\$3,455,900			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$1,503,500		\$0	\$0	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (14 Afiliados)					\$21,594,495	\$3,455,900			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$1,503,500		\$0	\$0	
1	CC	1118027440	ARIAS CESAR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
2	CC	70528411	DIAZ ELKIN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
3	CC	16189082	DIAZ WILDER	230301	22	\$1,283,997	\$205,500	ESSC62	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF13	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	\$89,400	22	\$0	\$0
4	CC	1063817930	GUERRERO JHON	230201	18	\$1,050,543	\$168,100	ESSC62	18	\$1,050,543	\$42,100	CCF13	18	\$1,050,543	\$42,100	14-11	18	\$1,050,543	\$73,200	18	\$0	\$0
5	CC	1042465956	HUYKE NAHUM	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
6	CC	1006529505	LEAL LUIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
7	CC	1118020476	LLANOS LIBARDO	230201	22	\$1,283,997	\$205,500	ESSC62	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF13	22	\$1,283,997	\$51,400	14-11	22	\$1,283,997	\$89,400	22	\$0	\$0
8	CC	1006419312	PEÑA SANDRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
9	CC	1002499713	RIVERO JHON	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
10	CC	12603532	ROCHA MILETH	230301	8	\$466,908	\$74,800	EP5048	8	\$466,908	\$18,700	CCF13	8	\$466,908	\$18,700	14-11	8	\$466,908	\$32,500	8	\$0	\$0
11	CC	1118026106	SANCHEZ RICARDO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
12	CC	17955383	URBAEZ ROBERT	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
13	CC	96332903	URBINA EDWIN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
14	CC	1006514779	ZAMBRANO JOSE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC62	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(14)					\$21,594,495	\$3,455,900			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$864,600			\$21,594,495	\$1,503,500		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	\$3,455,900	\$0	\$0	\$3,455,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,802,100	\$0	\$0	\$2,802,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$653,800	\$0	\$0	\$653,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$1,503,500	\$0	\$0	\$1,503,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$1,503,500	\$0	\$0	\$1,503,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$864,600	\$0	\$0	\$864,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	14	\$864,600	\$0	\$0	\$864,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$864,600	\$0	\$0	\$864,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$565,500	\$0	\$0	\$565,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$88,800	\$0	\$0	\$88,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				14	\$6,688,600	\$0	\$0	\$6,688,600

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTAS

Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9504372394	282799058	E	2026-05-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																		\$4,744,314	4%	\$189,800
9504372394	282799058	E	2026-05-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		\$4,744,314	16%	\$759,100
9504372394	282799058	E	2026-05-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	30																		\$4,744,314		\$0
9504372394	282799058	E	2026-05-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	30																		\$4,744,314		\$0
9504372394	282799058	E	2026-05-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	30																		\$0	0%	\$0
9504372394	282799058	E	2026-05-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	30																		\$0	0%	\$0
9504372394	282799058	E	2026-05-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		\$4,744,314	6.96%	\$330,300
9504372394	282799058	E	2026-05-05	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		\$4,744,314	4%	\$189,800

Este certificado se expide el día 2026-05-07 a las 07:46.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de mayo de 2026.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los 3 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



WILSON ANDRÉS PARRA

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de
Interventoría.

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. Karen Daniela Gallego INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Juan Francisco Cubillos, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPMI-MI-R-15-FR-6
VERSIÓN 1		PÁGINA 1 DE 2	
FECHA 09/10/2021 (Día/Mes/Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
CONTRATO DE OBRA No: 091.06.2021		CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y OCCIDENTE	
MES INFORME MENSUAL: 07/02/20		PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 005 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA


Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	209935	C-2401-0000-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 3.600.000.000,00	\$ -
2025	119125	C-2401-0000-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 218.395.081,00	\$ -
2025	119125	C-2401-0000-132-511020-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.330.844.908,00	\$ -
2025	119125	C-2401-0000-132-511020-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	\$ 18.108.315.587,00	\$ -
2025	126725	C-2401-0000-132-511020-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 6.074.377.314,00	\$ -
2025	126725	C-2401-0000-132-511020-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.901.548.611,00	\$ -
2025	126725	C-2401-0000-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 135.185.185,00	\$ -
TOTAL						\$ 31.366.666.667,00	\$ -
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2026	245126	C-2401-0000-132-511020-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 30.895.372.299,00	\$ 26.162.376.543,00
2026	245126	C-2401-0000-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 372.664.321,00	\$ -
2026	245126	C-2401-0000-132-511020-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 2.270.862.269,00	\$ -
2026	163826	C-2401-0000-132-511020-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 6.074.377.315,00	\$ 5.970.702.936,00
2026	163826	C-2401-0000-132-511020-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.901.548.611,00	\$ 82.271.142,00
2026	163826	C-2401-0000-132-511020-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 135.185.185,00	\$ -
TOTAL						\$ 41.680.000.000,00	\$ 32.215.382.621,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 413.052.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137,00	\$ -	\$ 25.821.137	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00		X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00		X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518,00	\$ -	\$ 326.243.518	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00		X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00		X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562,00	\$ -	\$ 152.527.562	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.379.510.886,00	\$ 399.062.844.219,00		X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00	\$ -	\$ 2.091.735	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.377.419.151,00	\$ 399.060.752.484,00		X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806,00	\$ -	\$ 376.670.806	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00		X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00		X	
ADICION 1														
7	OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980,00	\$ -	\$ 291.042.980	\$ -	9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 408.569.609.908,00	X	Adicion presupuestal No. 1
7	AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	\$ 9.709.705.365,00	\$ 408.278.566.928,00	X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00	\$ -	\$ 163.505.393	\$ -	9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.379.533.305,00	\$ 408.115.061.535,00	X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00	\$ -	\$ 2.745.463	\$ -	9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.376.787.842,00	\$ 408.112.316.072,00	X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00	\$ 1.310.010,00	\$ 96.349.856,00	\$ 2.402.243,00	\$ 93.947.613,00	\$ 9.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 23.282.840.229,00	\$ 408.015.966.216,00		X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00	\$ 23.853.865,00	\$ 932.883.806,00	\$ 9.889.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 22.349.956.423,00	\$ 407.059.228.545,00		X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00	\$ 7.921.421,00	\$ 309.793.220,00	\$ 9.881.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 22.040.163.203,00	\$ 406.741.513.904,00		X	
12	OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00	\$ 35.287.500,00	\$ 1.380.033.727,00	\$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 20.660.129.476,00	\$ 405.326.192.677,00		X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00	\$ 24.906.210,00	\$ 974.039.240,00	\$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 19.686.090.236,00	\$ 404.327.247.227,00		X	
REPROGRAMACIÓN #2														
		jul-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 19.686.090.236,00	\$ 404.327.247.227,00	X	
14	OBRA	ago-22	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00	\$ 54.642.385,00	\$ 2.136.970.149,00	\$ 9.736.514.606,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 17.549.120.087,00	\$ 402.135.634.693,00		X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 35.576.902,00	\$ 1.391.351.717,00	\$ 9.700.897.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 16.157.768.370,00	\$ 400.708.706.074,00		X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.488.799,00	\$ 1.583.364.591,00	\$ 39.584.115,00	\$ 1.543.780.476,00	\$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 14.613.987.894,00	\$ 399.125.341.483,00		X	
17	OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00	\$ 30.782.801,00	\$ 1.200.529.252,00	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.413.458.642,00	\$ 397.894.029.430,00		X	
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00	\$ -	\$ 1.470.957	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.411.987.685,00	\$ 397.892.558.473,00		X	
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00	\$ -	\$ 1.291.488	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.410.696.197,00	\$ 397.891.266.985,00		X	
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00	\$ -	\$ 6.437.488	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.404.258.709,00	\$ 397.884.829.497,00		X	
12	AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00	\$ -	\$ 16.875.556	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.387.383.153,00	\$ 397.867.953.941,00		X	
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00	\$ -	\$ 25.582.410	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.361.800.743,00	\$ 397.842.371.531,00		X	
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00	\$ -	\$ 171.845.456	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.189.955.287,00	\$ 397.670.526.075,00		X	
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00	\$ -	\$ 159.596.215	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 13.030.359.072,00	\$ 397.510.929.860,00		X	
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00	\$ -	\$ 227.121.525	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 12.803.237.547,00	\$ 397.283.808.335,00		X	
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00	\$ -	\$ 175.548.289	\$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 12.627.689.258,00	\$ 397.108.260.046,00		X	
18	OBRA	nov-22	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00	\$ 29.608.467,00	\$ 1.154.662.230,00	\$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 11.473.037.028,00	\$ 395.924.001.349,00		X	
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00	\$ -	\$ 226.811.374	\$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 11.246.225.654,00	\$ 395.697.189.975,00		X	
19	OBRA	dic-22	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00	\$ 36.461.924,00	\$ 1.422.015.023,00	\$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 9.824.210.631,00	\$ 394.238.713.028,00		X	
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.980,00	\$ 208.829.221,00	\$ -	\$ 208.829.221	\$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	\$ 9.615.381.410,00	\$ 394.029.883.807,00		X	
20	OBRA	ene-23	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 44.983.350,00	\$ 1.754.350.646,00	\$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 35.627.697.431,00	\$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X	
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00	\$ -	\$ 223.670.855	\$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 35.404.026.576,00	\$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X	
21	OBRA	feb-23	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592,00	\$ 60.171.315,00	\$ 2.346.681.277,00	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 33.057.345.299,00	\$ 389.600.028.364,00		X	
21	AJUSTES	feb-23	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00	\$ -	\$ 485.583.802	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 32.751.761.497,00	\$ 389.114.442.562,00		X	
22	OBRA	mar-23	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00	\$ 70.279.764,00	\$ 2.740.910.791	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 29.830.850.706,00	\$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X	
22	AJUSTES	mar-23	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00	\$ -	\$ 416.881.983	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 29.413.968.723,00	\$ 385.886.370.024,00		X	
23	OBRA	abr-23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.730.223,00	\$ 2.991.617.962,00	\$ 74.790.446,00	\$ 2.916.827.513	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 26.497.141.210,00	\$ 382.894.752.062,00	64556 de 04/07/2023	X	
23	AJUSTES	abr-23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00	\$ -	\$ 676.769.584	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 25.820.371.626,00	\$ 382.217.982.478,00	59957 de 20/06/2023	X	
24	OBRA	may-23	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597,00	\$ 95.879.585,00	\$ 3.739.303.032	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 22.081.068.594,00	\$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X	
24	AJUSTES	may-23	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00	\$ -	\$ 995.189.133	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$ 21.085.879.461,00	\$ 377.387.160.748,00	75773 de 04/08/2023	X	

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL. CONTRATO DE OBRA														CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		ME/PMI-IN-15-FR-R 1 1 DE 2							
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA									
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021														CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE									
MES INFORME MENSUAL: 09/20														NUEVA SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 005 DE 2021														CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2020									
25	OBRA	jun-23	\$	2.929.238.304,00	\$	21.405.972,00	\$	2.950.644.276,00	\$	73.766.107,00	\$	2.876.878.169,00	\$	9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	18.209.001.292,00	\$	374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	\$	3.620.505.517,00	\$	26.457.540,00	\$	3.646.963.057,00	\$	91.174.076,00	\$	3.555.788.981,00	\$	9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	14.653.212.311,00	\$	370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	\$	726.653.150,00	\$	5.310.156,00	\$	731.963.308,00	\$	-	\$	731.963.308	\$	9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	13.921.249.003,00	\$	370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	\$	974.606.520,00	\$	7.122.125,00	\$	981.728.645,00	\$	-	\$	981.728.645	\$	9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	12.939.520.358,00	\$	369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	\$	2.932.713.891,00	\$	21.431.371,00	\$	2.954.145.262,00	\$	73.853.632,00	\$	2.880.291.630	\$	8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	10.059.228.728,00	\$	366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	\$	862.011.163,00	\$	6.299.312,00	\$	868.310.475,00	\$	-	\$	868.310.475	\$	8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	9.190.918.253,00	\$	365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	\$	2.706.088.522	\$	19.743.244	\$	2.725.831.766,00	\$	68.145.794,00	\$	2.657.685.972	\$	8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	6.533.232.281,00	\$	362.528.023.959,00	84760 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	\$	1.973.566.110,00	\$	14.422.215,00	\$	1.987.988.425,00	\$	49.699.711,00	\$	1.938.286.714,00	\$	8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	4.594.943.567,00	\$	360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	\$	606.161.703,00	\$	4.429.643,00	\$	610.591.346,00	\$	-	\$	610.591.346	\$	8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	3.984.352.221,00	\$	359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	\$	505.693.569,00	\$	3.695.453,00	\$	509.389.022,00	\$	-	\$	509.389.022	\$	8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	3.474.963.199,00	\$	359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	\$	1.341.894.886,00	\$	9.806.155,00	\$	1.351.701.041,00	\$	33.792.526	\$	1.317.908.515	\$	8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	2.157.054.684,00	\$	358.068.354.125,00	87868 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	\$	347.394.511,00	\$	2.538.602,00	\$	349.933.163,00	\$	-	\$	349.933.163	\$	8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	1.807.121.521,00	\$	357.718.420.862,00	87864 de 12/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	\$	996.672.111,00	\$	7.283.373,00	\$	1.003.956.484,00	\$	25.098.887,00	\$	978.566.597	\$	8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	828.264.924,00	\$	356.714.465.478,00	88015 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	\$	283.880.482,00	\$	2.074.511,00	\$	285.954.993,00	\$	-	\$	285.954.993	\$	8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	\$	542.309.931,00	\$	356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	\$	1.567.939.894,00	\$	69.860.222,00	\$	1.637.800.116,00	\$	40.945.003	\$	1.596.855.113	\$	8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	26.712.121.485,00	\$	354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	\$	1.377.852.860,00	\$	10.068.925,00	\$	1.387.921.785,00	\$	34.698.045	\$	1.353.232.740	\$	8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	25.358.897.745,00	\$	353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	\$	3.305.147,00	\$	24.153,00	\$	3.329.300,00	\$	-	\$	3.329.300,00	\$	8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	25.355.568.445,00	\$	353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	\$	1.822.783,00	\$	13.320,00	\$	1.836.103,00	\$	-	\$	1.836.103,00	\$	8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	25.353.732.340,66	\$	353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-24	\$	328.022.246,00	\$	2.397.086,00	\$	330.419.332,00	\$	-	\$	330.419.332,00	\$	8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	25.023.313.008,66	\$	353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	\$	475.850.522,00	\$	3.477.369,00	\$	479.327.891,00	\$	-	\$	479.327.891	\$	8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	24.543.985.117,66	\$	352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	\$	2.102.620.456,00	\$	15.365.303,00	\$	2.117.985.759,00	\$	52.949.644	\$	2.065.036.115	\$	8.654.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	22.478.949.002,66	\$	350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	\$	2.440.745.157,00	\$	17.836.215,00	\$	2.458.581.372,00	\$	63.459.374	\$	2.395.121.998	\$	8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	20.083.827.004,66	\$	348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	\$	661.244.553,00	\$	4.832.172,00	\$	666.076.725,00	\$	-	\$	666.076.725	\$	8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	19.417.750.279,66	\$	347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	\$	2.275.185.600,00	\$	38.968.164,00	\$	2.314.153.764,00	\$	64.586.808	\$	2.249.566.956	\$	8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	17.168.183.323,66	\$	345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	\$	748.434.632,00	\$	5.469.328,00	\$	753.903.962,00	\$	-	\$	753.903.962	\$	8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	16.414.279.361,66	\$	344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	\$	628.970.127,00	\$	4.596.320,00	\$	633.566.447,00	\$	-	\$	633.566.447	\$	8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	15.780.712.914,66	\$	343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	\$	2.160.141.566,00	\$	68.026.296,00	\$	2.228.167.862,00	\$	56.225.783	\$	2.171.942.079	\$	8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	13.608.770.835,66	\$	341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	\$	576.148.866,00	\$	4.210.319,00	\$	580.359.185,00	\$	-	\$	580.359.185	\$	8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	13.028.411.650,66	\$	340.835.080.852,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	\$	3.189.948.164,00	\$	23.311.160,00	\$	3.213.259.324,00	\$	95.698.445	\$	3.117.560.879	\$	8.394.301.519,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	9.910.850.771,66	\$	337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	\$	2.453.722.811,00	\$	43.824.946,00	\$	2.497.547.757,00	\$	69.359.634	\$	2.428.198.123	\$	8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	6.482.862.648,66	\$	335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	\$	2.232.069.298,00	\$	16.283.263,00	\$	2.248.352.561,00	\$	66.647.753	\$	2.181.704.808	\$	8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	4.300.957.841,66	\$	332.875.921.240,00	14053 de 20/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	\$	880.571.775,00	\$	6.434.946,00	\$	887.006.723,00	\$	-	\$	887.006.723	\$	8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	3.413.951.118,66	\$	331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	\$	577.306.253,00	\$	4.218.776,00	\$	581.525.029,00	\$	-	\$	581.525.029	\$	8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	2.832.426.089,66	\$	331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	\$	462.130.018,00	\$	3.377.104,00	\$	465.507.122,00	\$	-	\$	465.507.122	\$	8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 09/03/2024	\$	2.366.918.967,66	\$	330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	\$	1.155.576.481,00	\$	8.444.597,00	\$	1.164.021.078,00	\$	34.667.294	\$	1.129.353.784	\$	8.223.629.438,00	240424 20/03								



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA	5	junio	202
-------	---	-------	-----

UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
-------------------	----------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.:	991 de 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL:	may-26	PROYECTO:	NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INVENTORÍA No.:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

95	AJUSTE (D)	dic-20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.524.992.644,00		\$ 18.638,00	\$ 300.075.011.281,00	5903 de 29/05/2026		
56	OBRA	ene-26	\$ 337.235.957,00	\$ 56.504.917,00	\$ 393.740.874,00	\$ -	\$ 393.740.874,00	\$ 7.524.992.644,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 41.256.277.764,00	\$ 299.681.270.407,00	3259 de 16/04/2026	X	
57	OBRA	feb-26	\$ 1.404.814.354,00	\$ 24.659.940,00	\$ 1.429.274.294,00	\$ 39.774.546	\$ 1.389.499.748	\$ 7.485.218.098,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 39.866.778.016,00	\$ 298.251.996.113,00	3261 de 16/04/2026	X	
58	OBRA	mar-26	\$ 3.210.946.867,00	\$ 23.414.416,00	\$ 3.234.361.283,00	\$ 95.765.158	\$ 3.138.596.125	\$ 7.389.452.940,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 36.728.181.891,00	\$ 295.017.634.830,00	4986 de 14/05/2026	X	
56	AJUSTE (D)	ene-26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.389.452.940,00		\$ 36.728.181.891,00	\$ 295.017.634.830,00	5903 de 29/05/2026		
57	OBRA	feb-26	\$ 443.467.622,00	\$ 3.240.725,00	\$ 446.708.347,00		\$ 446.708.347	\$ 7.389.452.940,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 36.281.473.544,00	\$ 294.570.926.483,00	5850 de 28/05/2026	X	
59	AJUSTE (D)	abr-26	\$ 2.832.970.487,00	\$ 25.748.123,00	\$ 2.858.718.610,00	\$ 84.160.566	\$ 2.774.558.044	\$ 7.305.292.374,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 33.506.915.500,00	\$ 291.712.207.873,00	5903 de 29/05/2026	X	
58	AJUSTE (D)	mar-26	\$ 1.282.193.007,00	\$ 9.369.872,00	\$ 1.291.562.879,00		\$ 1.291.562.879	\$ 7.305.292.374,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 32.215.352.621,00	\$ 290.420.645.006,00		X	
59	AJUSTE (D)	abr-26	\$ 1.139.392.357,00	\$ 8.326.329,00	\$ 1.147.718.686,00		\$ 1.147.718.686	\$ 7.305.292.374,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 31.067.633.935,00	\$ 289.272.926.332,00			
60	OBRA	may-26	\$ 3.359.868.212,00	\$ 35.424.544,00	\$ 3.395.292.756,00	\$ 99.010.805	\$ 3.296.281.951	\$ 7.206.281.569,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	\$ 27.771.351.984,00	\$ 285.877.633.588,00		X	
	TOTALES		\$ 125.537.024.755,00	\$ 1.638.306.347,00	\$ 127.175.331.102,00	\$ 2.679.246.661,00	\$ 124.496.084.441,00	\$ 7.206.281.569,00		\$ 27.771.351.984,00	\$ 285.877.633.584,00			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 96.562.691.715,00	\$ 705.650.441,00	\$ 97.268.342.156,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	\$ 24.542.154.518,00	\$ 179.346.513,00	\$ 24.721.501.031,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.660.500.000,00	\$ 315.495.000,00	\$ 1.975.995.000,00
DISEÑOS SITIOS ATÍPICOS	\$ 2.221.389.003,00	\$ 422.060.111,00	\$ 2.643.429.114,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 62.500.000	\$ 11.875.000	\$ 74.375.000,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 110.149.437,00	\$ 510.448,00	\$ 110.659.885,00
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ 368.427.883	\$ 2.692.357	\$ 371.120.240,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 9.232.199,00	\$ 676.477,00	\$ 9.908.676,00
VALOR TOTAL	\$ 125.537.024.755,00	\$ 1.638.306.347,00	\$ 127.175.331.102,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma 
JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN
Director de obra
Matrícula No.: 25202-134261CND

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de inventaria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Interventor y Dirección Territorial

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

31/05/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

RUTA 6504 FRENTE DE OBRA: PUERTO RICO A MAYORES - FRENTE #2

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	24.0	20.0	24.0	23.0	23.0	18.0	24.0	24.0	22.0	19.0	20.5	23.0	23.5	24.0	22.0	21.0	23.0	20.0	22.5	21.5	16.0	10.0	23.0	21.0	24.0	23.0	23.0	18.0	21.0	22.0	23.0	666	
Lluvias moderadas	0	2	0	0.5	1.0	2	0	0	2	3	4	1	0.5	0	2	2	1	4	0.5	0.5	7	12	1	1	0	1	1	6	3	2	1	60.5	
Lluvias intensas	0	2	0	0.5	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17.5	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JUAN CARLOS TRIANA SIERRA

Residente de Obra

Matrícula No. 70202-089601 TLM

Firma


Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoría

Matrícula No. : 13202-122413 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN		1									
																					PÁGINA		1 DE 1									
FECHA																												31/04/2026 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																		
CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2026														PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030																		
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
RUTA 6503 FRENTE DE OBRA: PAUJIL - MONTAÑITA																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	21,0	19,0	19,0	24,0	24,0	20,5	24,0	24,0	24,0	15,0	24,0	12,0	20,0	22,0	23,0	24,0	23,0	20,0	24,0	21,0	11,0	8,0	9,0	21,0	17,0	21,0	19,0	14,0	20,0	24,0	15,0	606,5
Lluvias moderadas	2,0	3,0	4,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	8,0	4,0	2,0	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	3,0	8,0	10,0	15,0	1,0	5,0	3,0	5,0	7,0	4,0	0,0	6,0	104,0
Lluvias intensas	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	33,5	
Total horas	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: Ruta 6503																																
 Firma Nombre: GIOVANNI CARDENAS SANDOVAL Residente de Obra Matrícula No. 25202-335895 CND  Firma Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA Residente de Interventoría Matrícula No. : 13202-122413 BLV																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO
MEP/MNT-IN-15-FR-10
VERSIÓN
1
PÁGINA
1 DE 1

FECHA
31 de Mayo de 2026

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026 PROYECTO: PROYECTO 135 RUTA 3001 CORREDOR NEIVA - BALSILLAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco	23	23	21	20	21	20	24	24	23	24	22	21	24	21	22	23	23	22	23	24	22	20	21	24	21	23	23	22	18	21	22	685	
Lluvias moderadas	1	1	3	4	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	2	1	1	2	1	0	2	0	0	0	3	1	1	2	0	0	0	34	
Lluvias intensas	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	6	3	2	25		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guzmán García
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0790

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS									
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE									
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
CÓDIGO								MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
VERSION								1	
PAGINA									
FECHA								30/05/2026	
(Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grupo Sur Occidente					DIRECCIÓN TERRITORIAL: Caquetá				
CONTRATO DE OBRA No.: 980 de 2021					CONTRATISTA: Consorcio Vías Nacionales del Sur y Occidente				
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					PROYECTO:				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mayo 2026					INTERVENTOR: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 de 2021									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
INVENTARIO	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
ENSAYOS CAQUETÁ, RUTA 6504 y 6503									
AGREGADOS PARA CONCRETO									
FINES									
1	4/05/2026	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E-213/13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	ARTICULO 630 AG19 INV 213-13	No cumple	No	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
2	4/05/2026	Límite líquido	INV-E-126-13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	≤ NL	NL	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
	4/05/2026	Índice de plasticidad	INV-E-125-13 INV-E-126-13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	≤ NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
3	8/05/2026	Equivalente de arena de suelos y agregados finos	INV-E-133-13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	Mínimo 60%	60.30%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
4	20/05/2026	Contenido aproximado de materia orgánica en arenas	INV-E-212/13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	Igual a muestra patrón	11 Ambar medio	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
5	19/05/2026	Determinación de la Cantidad de Material Fino que Pasa al Tamiz No 200 en los agregados	INV-E-214-13	Unidad Industrial KMA PR 5+300 Ruta 6504	1	ARTICULO 630 TABLA 630 - 2 Máximo 5,0 %	7.10%	No	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
6	30/05/2026	Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de sodio	INV-E-220-13	Unidad Industrial KMA PR 5+300 Ruta 6504	1	Sulfato de Sodio Max <10%	fino 7.7% Grueso 0.0%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
7	23/05/2026	Determinación Terrones de Arcilla y Partículas Desechables.	INV-E-211/13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	ART. 630 Tabla 630-1 Máximo 3%	Agregado grueso 0.0 Agregado Fino 1.08%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
GRUESO									
8	4/05/2026	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E-213/13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	ART. 630 - Tabla 630-4 AG19	No Cumple	No	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
9	26/05/2026	Resistencia de los agregados por medio de la máquina de los ángeles	INV-E-218-13	Unidad Industrial KMA PR 5+300 Ruta 6504	2	ART.630 Tabla 630-3 Máximo 40 %	47.20%	No	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
10	19/05/2026	Índice de Alargamiento y Aplanamiento de los Agregados	INV-E-230-13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	Max. 25%	Alargamiento=20% Aplanamiento=11%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
11	30/05/2026	Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de sodio	INV-E-220-13	Unidad Industrial KMA PR 5+300 Ruta 6504	1	Sulfato de Sodio Max <12%	fino 0.0% Grueso 6.19%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
12	26/05/2026	Determinación de Terrones de Arcilla y Partículas Desechables	INV-E-211/13	Unidad industrial de KMA PR5-300 ruta 6504	1	Máximo 3%	Agregado grueso 0.84% Agregado Fino 0.0	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO									
13	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6504: 7+770 C.I. PATA DEL MURO	2	Min 100% Resistencia esperada 56 D	72.30%	NO	Material Argos Estructural
14	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: 38+085 A 38+095 C.I. ZARPA MODULO 1	2	Min 100% Resistencia esperada 56 D	94.90%	NO	Material Argos Estructural
15	21-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: 38+105 A 38+115 C.I. ZARPA MODULO 3 - 38+095 A 38+105 CUERPO MODULO 2	2	Min 100% Resistencia esperada 56 D	99.20%	NO	Material Argos Estructural
16	22-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6504: 7+770 C.I. VASTAGO DE MURO	2	Min 100% Resistencia esperada 56 D	101.70%	SI	Material Argos Estructural
17	25-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: PR38+125 A PR38+135 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 5 ZARPA C.I. --- PR38+095 A PR38+105 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 2 ZARPA C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 56 D	100%	SI	Material Argos Estructural
18	4-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: 38+200 TABLERO PUENTES LAS DELICIAS ETAPA 2 - MUESTRA 1 RUTA 6502: PR38+095 A PR38+105 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 2 CORONA C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	104.80%	SI	Material Argos Estructural
19	4-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: 38+200 TABLERO PUENTES LAS DELICIAS ETAPA 2 - MUESTRA 2	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	100.90%	SI	Material Argos Estructural
20	5-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: PR38+125 A PR38+135 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 5 ZARPA C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	70.60%	NO	Material Argos Estructural
21	6-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+125 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 4 VASTAGO C.I. --- PR38+125 A PR38+135 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 5 VASTAGO C.I. --- PR38+135 A PR38+145 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 6 ZARPA C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	79.80%	NO	Material Argos Estructural
22	7-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 3 CORONA C.I. --- PR38+135 A PR38+145 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 4 VASTAGO C.I. --- PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 ZARPA C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	96.00%	NO	Material Argos Estructural
23	11-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	INV-E-410-13	RUTA 6503: PR38+155 A PR38+125 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 4 CORONA C.I. --- PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 8 ZARPA C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	87.00%	NO	Material Argos Estructural

6

24	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+165 A PR38+175 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 9 ZARPA C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	84.90%	No	Material Argos Estructural
25	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: 7+550.C.I. PATA MURO - 6+874 C.D. PISO DESCOLE ALCANTARILLA	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	87.00%	No	Material Argos Estructural
26	13-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 VÁSTAGO C.I. — PR38+155 A PR38+165 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 8 VÁSTAGO C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	93.60%	No	Material Argos Estructural
27	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: 38+280 LOSA DE APROXIMACION ESTRIBO 1 - NEW JERSEY	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	61.90%	No	Material Argos Estructural
28	15-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: PR7+550.C.I. PATA DEL MURO - PR8+874 C.D. PLACA DESCOLE	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	55.80%	No	Material Argos Estructural
29	15-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+125 A PR38+135 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 5 CORONA C.I. — PR38+135 A PR38+145 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 6 VÁSTAGO C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	57.70%	No	Material Argos Estructural
30	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+145 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 6 CORONA C.I. — PR38+175 A PR38+185 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 10 ZARPA C.I. — PR38+185 A PR38+195 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 2 VÁSTAGO C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	55.70%	No	Material Argos Estructural
31	18-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 CORONA C.I. — PR38+155 A PR38+165 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 11 ZARPA C.I. — PR38+165 A PR38+175 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 3 VÁSTAGO C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	52.90%	No	Material Argos Estructural
32	18-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: 7+890.C.I. VASTAGO DEL MURO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	67.90%	No	Material Argos Estructural
33	19-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+155 A PR38+165 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 8 CORONA C.I. — PR38+165 A PR38+175 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 1 VÁSTAGO C.I. — PR38+175 A PR38+185 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 12 ZARPA C.I. — PR38+185 A PR38+195 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 ZARPA C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	72.70%	No	Material Argos Estructural
34	20-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+175 A PR38+185 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 10 VÁSTAGO C.I. — PR38+185 A PR38+195 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 11 VÁSTAGO C.I. — PR38+205 A PR38+215 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 13 ZARPA C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	64.10%	No	Material Argos Estructural
35	25-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: PR07+856 C.I Y C.D. PLACA SOLERA DESCOLE Y PLACA CAJA ENCOLE ALCANTARILLA-PR08+875 C.D. MURO Y ALETAS ALCANTARILLA-PR08+098 C.D. PLACA SOLERA DESCOLE ALCANTARILLA	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	68.90%	No	Material Argos Estructural
36	25-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+175 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 9 CORONA C.I. — PR38+175 A PR38+185 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 9 CORONA C.I. — PR38+185 A PR38+205 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 12 VÁSTAGO C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	72.60%	No	Material Argos Estructural
37	26-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+303 SOLADO PLACA DE APROXIMACIÓN ESTRIBO 2	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	100.20%	Si	Material Argos Estructural
38	6-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+085 A PR38+095 BARRERA NEW JERSEY ZARPA C.D. MODULO 1 ESTRIBO 1 — PR38+115 a PR38+125 VÁSTAGO BARRERA NEW JERSEY MODULO 4 C.D. — PR38+215 a PR38+225 ZARPA BARRERA NEW JERSEY MODULO 14 C.I. — PR38+205 a PR38+215 BARRERA NEW JERSEY VÁSTAGO C.I. MODULO 13 — PR38+185 a PR38+205 BARRERA NEW JERSEY VÁSTAGO MODULO 11 C.I. Y MODULO 12 C.I. ESTRIBO 1	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	84.70%	Si	Material Argos Estructural
39	27-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+085 A PR38+095 BARRERA NEW JERSEY ZARPA C.D. MODULO 1 ESTRIBO 1 — PR38+115 a PR38+125 VÁSTAGO BARRERA NEW JERSEY MODULO 4 C.D. — PR38+215 a PR38+225 ZARPA BARRERA NEW JERSEY MODULO 14 C.I. — PR38+205 a PR38+215 BARRERA NEW JERSEY VÁSTAGO C.I. MODULO 13 — PR38+185 a PR38+205 BARRERA NEW JERSEY VÁSTAGO MODULO 11 C.I. Y MODULO 12 C.I. ESTRIBO 1	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	103.30%	Si	Material Argos Estructural
40	7-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+145 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 6 VÁSTAGO C.D. — PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 VÁSTAGO C.D. — PR38+225 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	82.90%	Si	Material Argos Estructural
41	28-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+145 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 6 VÁSTAGO C.D. — PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 VÁSTAGO C.D. — PR38+225 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 ZARPA C.D.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	100.90%	Si	Material Argos Estructural
42	7-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: 8+097.C.D. PISO ALETA DESCOLE ALCANTARILLA.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	88.80%	Si	Material Argos Estructural
43	28-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: 8+097.C.D. PISO ALETA DESCOLE ALCANTARILLA.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	111.50%	Si	Material Argos Estructural
44	9-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+225 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 VÁSTAGO C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	87.60%	Si	Material Argos Estructural
45	30-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+225 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 VÁSTAGO C.I.	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	108.40%	Si	Material Argos Estructural
46	11-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+215 A PR38+225 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 14 CORONA C.I. — PR38+225 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 CORONA C.I. — PR38+235 A PR38+245 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 16 ZARPA C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	99.00%	Si	Material Argos Estructural
47	11-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: 7+850.C.D. CAJA ENCOLE - 7+850 C.I. ALETAS DESCOLE	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	100.10%	Si	Material Argos Estructural
48	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+235 A PR38+245 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 16 VÁSTAGO C.I. — PR38+245 A PR38+255 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 17 ZARPA C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	116.90%	Si	Material Argos Estructural
49	13-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+165 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 8 ZARPA C.D. — PR38+165 A PR38+175 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 9 ZARPA C.D. — PR38+303 C.D. NEW JERSEY PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE ESTRIBO 2	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	102.50%	Si	Material Argos Estructural
50	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+235 A PR38+245 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 16 CORONA C.I. — PR38+245 A PR38+255 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 17 VÁSTAGO C.I. — PR38+085 A PR38+095 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 1 VÁSTAGO C.D. — PR38+175 A PR38+185 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 10 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	114.90%	Si	Material Argos Estructural
51	15-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+245 A PR38+255 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 17 CORONA C.I. — PR38+185 A PR38+195 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 13 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	115.70%	Si	Material Argos Estructural
52	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+085 A PR38+095 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 1 CORONA C.D. — PR38+155 A PR38+165 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 8 VÁSTAGO C.D. — PR38+165 A PR38+175 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 9 VÁSTAGO C.D. — PR38+195 A PR38+205 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 12 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	136.00%	Si	Material Argos Estructural
53	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V E410-13	RUTA 6504: 8+098.C.I. CAJA ENCOLE - 8+098.C.D. MURO Y ALETAS DESCOLE ALCANTARILLA	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	136.50%	Si	Material Argos Estructural

16

54	18-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+175 A PR38+185 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 10 VASTAGO C.D. — PR38+205 A PR38+215 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 13 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	84.20%	Si	Material Argos Estructural
55	19-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+065 A PR38+095 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 9 VASTAGO Y CORONA C.D. — PR38+185 A PR38+195 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 11 VASTAGO C.D. — PR38+195 A PR38+205 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 12 VASTAGO C.D. — PR38+215 A PR38+225 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 14 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	76.20%	Si	Material Argos Estructural
56	20-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+235 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 ZARPA C.D. — PR38+235 A PR38+245 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 16 ZARPA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	94.00%	Si	Material Argos Estructural
57	21-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+359 VASTAGO BARRERA NEW JERSEY PLACA DE APROXIMACIÓN C.I. ESTRIBO 1 — PR38+303 VASTAGO BARRERA NEW JERSEY PLACA DE APROXIMACIÓN C.I. ESTRIBO 2 — PR38+105 A PR38+115 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 3 CORONA C.D. — PR38+245 A PR38+249 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 17 ZARPA C.D. — PR38+465 A PR38+475 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 2 MODULO 17 ZARPA C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	71.70%	Si	Material Argos Estructural
58	22-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+115 A PR38+125 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 4 CORONA C.D. — PR38+205 A PR38+215 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 13 VASTAGO C.D. — PR38+475 A PR38+485 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 2 MODULO 18 ZARPA C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	74.80%	Si	Material Argos Estructural
59	26-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+125 A PR38+135 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 5 CORONA C.D. — PR38+215 A PR38+225 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 14 VASTAGO C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	76.00%	Si	Material Argos Estructural
60	27-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+225 A PR38+235 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 15 VASTAGO C.D. — PR38+307 A PR38+317 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 2 MODULO 1 ZARPA C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	137.00%	Si	Material Argos Estructural
61	27-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6504: 8+260 C.I. ZARPA DE MURO - 8+290 C.I. ZARPA DE MURO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	86.80%	Si	Material Argos Estructural
62	28-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: PR38+135 A PR38+145 NEW JERSEYS, CORONA ESTRIBO 1 MODULO 6 C.D. — PR38+235 A PR38+245 MODULO 16 Y 17 C.I. ZARPA RUTA 6502: PR38+327 A PR38+327 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 2 MODULO 2 ZARPA C.I. — PR38+485 A PR38+495 MODULO 19 C.I. ZARPA ESTRIBO 2	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	130.00%	Si	Material Argos Estructural
63	29-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: 38+200 NEW JERSEYS, ZARPA C.I. ESTRIBO 2 MODULO 3. RUTA 6503: PR38+145 A PR38+155 BARRERA NEW JERSEY ESTRIBO 1 MODULO 7 CORONA C.D.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	95.20%	Si	Material Argos Estructural
64	30-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	IN.V E410-13	RUTA 6503: NEW JERSEYS ESTRIBO 2 PR38+485 A PR38+495 MODULO 20 C.I. ZARPA — PR38+485 A PR38+475 MODULO 17 VASTAGO C.I.	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	141.20%	Si	Material Argos Estructural
TERRAPLEN									
65	14-may-26	Determinación del Contenido organico en suelos	IN.V. E - 121-13	Unidad Industrial RUTA 6503 PR 38+200	1	Suelo Adecuado < 1%	0.920%	Si	Cantera el Doncello
66	27-may-26	Determinación del Contenido organico en suelos	IN.V. E - 121-13	Unidad Industrial RUTA 6503 PR 38+200	1	Suelo Adecuado < 1%	0.80%	Si	Cantera el Doncello
67	15-may-26	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	IN.V. E-148 -13	Unidad Industrial RUTA 6504	1	Art. 220 CBR al 95%	119.0%	Si	Cantera el Doncello
68	11-may-26	Densidad Vs Humedad - Proctor Modificado	IN.V E-142 - 13	Pr 38+085 - 38+260 Ruta 6503 Calzada completa	1	IN.V E-142	2.105 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 9,1	Si	Cantera el Doncello
69	11-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos-TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS	IN.V. E-213-13	Pr 38+085 - Pr 38+170 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	Artículo 220 -22 - Adecuado $D_{max} \leq 100mm$ $PP_{10} < 60\%$ $PP_{20} < 35\%$	Cumple Tamño máximo: 101,6 mm Pasa 10": 27,4% Pasa No 200: 2,5%	Si	Cantera el Doncello
70	11-may-26	Límite líquido	IN.V. E-126-13	Pr 38+085 - Pr 38+170 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	< 40,0	NL	Si	Cantera el Doncello
	11-may-26	Índice de plasticidad	IN.V. E-125-13 IN.V. E-126-13	Pr 38+085 - Pr 38+170 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	< Si LL>30 > (IP > 4 %)	0,0	Si	Cantera el Doncello
71	14-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos-TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS	IN.V. E-213-13	Pr 38+085 - Pr 38+180 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	Artículo 220 -22 - Adecuado $D_{max} \leq 100mm$ $PP_{10} < 60\%$ $PP_{20} < 35\%$	Cumple Tamño máximo: 101,6 mm Pasa 10": 24,8% Pasa No 200: 1,6%	Si	Cantera el Doncello
72	14-may-26	Límite líquido	IN.V. E-126-13	Pr 38+085 - Pr 38+180 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	< 40,0	NL	Si	Cantera el Doncello
	14-may-26	Índice de plasticidad	IN.V. E-125-13 IN.V. E-126-13	Pr 38+085 - Pr 38+180 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	< Si LL>30 > (IP > 4 %)	0,0	Si	Cantera el Doncello
73	16-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos-TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS	IN.V. E-213-13	Pr 38+350 - Pr 38+400 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	Artículo 220 -22 - Adecuado $D_{max} \leq 100mm$ $PP_{10} < 60\%$ $PP_{20} < 35\%$	Cumple Tamño máximo: 101,6 mm Pasa 10": 29,3% Pasa No 200: 2,2%	Si	Cantera el Doncello
74	16-may-26	Límite líquido	IN.V. E-126-13	Pr 38+350 - Pr 38+400 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	< 40,0	NL	Si	Cantera el Doncello
	16-may-26	Índice de plasticidad	IN.V. E-125-13 IN.V. E-126-13	Pr 38+350 - Pr 38+400 - Ruta 6503 Calzada completa-Estribo 1-UnicaCape	1	< Si LL>30 > (IP > 4 %)	0,0	Si	Cantera el Doncello
75	27-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos-TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS	IN.V. E-213-13	Pr 38+175 - Pr 38+260 c.d. ----- Pr 38+240 - Pr 38+260 c.c. - Ruta 6503 Estribo 1-Unica Cape	1	Artículo 220 -22 - Adecuado $D_{max} \leq 100mm$ $PP_{10} < 60\%$ $PP_{20} < 35\%$	Cumple Tamño máximo: 101,6 mm Pasa 10": 27,4% Pasa No 200: 2,5%	Si	Cantera el Doncello
76	27-may-26	Límite líquido	IN.V. E-126-13	Pr 38+175 - Pr 38+260 c.d. ----- Pr 38+240 - Pr 38+260 c.c. - Ruta 6503 Estribo 1-Unica Cape	1	< 40,0	NL	Si	Cantera el Doncello
	27-may-26	Índice de plasticidad	IN.V. E-125-13 IN.V. E-126-13	Pr 38+175 - Pr 38+260 c.d. ----- Pr 38+240 - Pr 38+260 c.c. - Ruta 6503 Estribo 1-Unica Cape	1	< Si LL>30 > (IP > 4 %)	0,0	Si	Cantera el Doncello
77	22-may-26	Índice de colapso	IN.V. E - 157 - 13	Unidad Industrial RUTA 6503	1	max: 1%	0.095%	Si	Cantera el Doncello
78	16-may-26	Determinación del Contenido De Sales Solubles En Los Suelos	IN.V. E - 158 - 13	Unidad Industrial RUTA 6503	1	< 0.2 %	0.18	Si	Cantera el Doncello
79	27-may-26	Expansión libre	ASTM D 4546	Unidad Industrial RUTA 6503	1	(< 2 %),	0.180	Si	Cantera el Doncello
PIEDRA FILTRO									
80	19-may-26	Resistencia de los agregados por medio de la maquina de los angelas	IN.V E-219 - 13	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR8+060-PR8+070-PR8+230-PR8+875-PR8+180	1	Art. 673 - 2022 ≤ 40%	29.20%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
81	5-may-26	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR IGNICION	IN.V E-121-13	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR8+060-PR8+070-PR8+230-PR8+875-PR8+180	1	Artículo 673 - 22 - table 673 ≤ 0.2%	0.12%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA

82	30-may-26	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO	LN.V. E-220-13	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180	1	Sulfato de Sodio Max ≤12%	fino 0% Grueso 1,31%	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
83	15-may-26	Determinación de Terrones de Arcilla y Partículas Desechables	LN.V E-211 - 13	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180	1	ART.673 max % 0,25	Grueso: 0,04 Fino:0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
84	4-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180	1	Art. 673 - 2022	Cumple	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
85	19-may-26	Contenido de partículas Livianas	LN.V E- 221-13	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180	1	Max 1%	0.88%	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
SUB BASE GRANULAR Art 326-13									
86	4-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR9+800 - PR9+845 - PR9+890 - PR9+860 - PR9+870 - PR9+890 - PR9+930	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
87	4-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR9+800 - PR9+845 - PR9+890 - PR9+860 - PR9+870 - PR9+890 - PR9+930	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	4-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR9+800 - PR9+845 - PR9+890 - PR9+860 - PR9+870 - PR9+890 - PR9+930	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
88	5-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR7+010 - PR8+079 - PR8+081 - PR9+900 - PR9+920 - PR9+925 - PR9+930 - PR9+940 - PR9+950	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
89	5-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR7+010 - PR8+079 - PR8+081 - PR9+900 - PR9+920 - PR9+925 - PR9+930 - PR9+940 - PR9+950	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	5-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR7+010 - PR8+079 - PR8+081 - PR9+900 - PR9+920 - PR9+925 - PR9+930 - PR9+940 - PR9+950	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
90	6-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR8+000-PR8+001-PR8+810-PR8+020-PR8+030-PR8+050-PR8+880-PR8+065-PR8+750-PR8+930	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
91	6-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR8+000-PR8+001-PR8+810-PR8+020-PR8+030-PR8+050-PR8+880-PR8+065-PR8+750-PR8+930	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	6-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR8+000-PR8+001-PR8+810-PR8+020-PR8+030-PR8+050-PR8+880-PR8+065-PR8+750-PR8+930	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
92	7-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR8+000-PR9+900-PR9+910-PR9+930-PR9+940-PR9+960-PR9+730	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
93	7-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR8+000-PR9+900-PR9+910-PR9+930-PR9+940-PR9+960-PR9+730	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	7-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR8+000-PR9+900-PR9+910-PR9+930-PR9+940-PR9+960-PR9+730	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
94	8-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR9+900-PR9+920-PR9+940-PR9+950-PR9+960-PR9+970-PR9+980-PR9+985-PR9+990	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
95	8-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR9+900-PR9+920-PR9+940-PR9+950-PR9+960-PR9+970-PR9+980-PR9+985-PR9+990	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	8-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR9+900-PR9+920-PR9+940-PR9+950-PR9+960-PR9+970-PR9+980-PR9+985-PR9+990	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
96	9-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR9+935 AL PR10+020 C.I.	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
97	9-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR9+935 AL PR10+020 C.I.	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0.0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	9-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR9+935 AL PR10+020 C.I.	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
98	11-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR9+920-PR9+960-PR9+970-PR9+980	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
99	11-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR9+920-PR9+960-PR9+970-PR9+980	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0.0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	11-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR9+920-PR9+960-PR9+970-PR9+980	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
100	23-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR4+800	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
101	23-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR4+800	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0.0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	23-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR4+800	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
102	27-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR4+800 - PR5+300	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
103	27-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR4+800 - PR5+300	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0.0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	27-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR4+800 - PR5+300	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
104	28-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6503 PR38+200	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
105	28-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6503 PR38+200	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0.0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	28-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6503 PR38+200	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
106	29-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6503 PR38+200 RT6504 PR4+800 - PR4+820 - PR6+090 - PR6+580	1	Artículo 320 - SBG 38	CUMPLE	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
107	29-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6503 PR38+200 RT6504 PR4+800 - PR4+820 - PR6+090 - PR6+580	1	Art 320 Table 320 - 2.6%	0.0	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
	29-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6503 PR38+200 RT6504 PR4+800 - PR4+820 - PR6+090 - PR6+580	1	ART.320 MAX 25%	NL	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
108	11-may-26	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	LN.V. E-148	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Mínimo 40%	CBR AL 95%=120%	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
109	29-may-26	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	LN.V. E-148	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Mínimo 40%	CBR AL 95%=111%	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA
110	4-may-26	Resistencia de los agregados por medio de la máquina de los ángeles	LN.V. E-218-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Art 320 Table 320-2 ≤ 50%	45.8%	SI	MATERIAL RIO EL AGUILA

111	28-may-26	Resistencia de los agregados por medio de la maquina de los ángeles	LN.V. E-218-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Art 320 Tabla 320-2 ≤ 50%	47.0%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
112	6-may-26	Equivalente de arena de suelos y agregados finos	LN.V. E-133-13	PR 05-300 - Ruta 6504	1	ART. 320 TABLA 320-2 CLASE C-B-A Min 25%	49.0%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
113	27-may-26	Equivalente de arena de suelos y agregados finos	LN.V. E-133-13	PR 05-300 - Ruta 6504	1	ART. 320 TABLA 320-2 CLASE C-B-A Min 25%	48.0%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
114	6-may-26	DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO	LN.V E-142/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	INV-142	2.192 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 8.2	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
115	23-may-26	DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO	LN.V E-142/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	INV-142	2.151 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 7.6	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
116	11-may-26	Resistencia del agregado al desgaste por abrasión utilizando el aparato microdesval	INV E-238/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Max 30%	17.0%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
117	11-may-26	Determinación Terrones de Arcilla y Partículas Discretnables	INV E-211/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Máximo 2%	Agregado grueso 0.96 % Agregado Fino 0.78%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
118	30-may-26	Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de sodio	LN.V. E-220-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Sulfato de Sodio ≤12% Sulfato de Magnesio ≤18%	Grueso 4.51 % Fino 9.8%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
119	29-may-26	Densidad de Compactacion	LN.V. E 161-13	RUTA 6504: PR 6-805 - LLENO ALCANTARILLA	1	≥ 90%	99%	Si	MATERIAL RIO EL AGUILA
BASE GRANULAR									
120	2-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR9-916 - PR9-920 - PR9-923 C.I.	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
121	2-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR9-916 - PR9-920 - PR9-923 C.I.	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	2-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR9-916 - PR9-920 - PR9-923 C.I.	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
122	8-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR5-630 - PR5-640 - PR5-650 - PR5-670 - PR5-730 - PR5-780 - PR5-840 - PR5-890 - PR5-910 - PR5-920 - PR5-970 - PR5-980	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
123	8-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR5-630 - PR5-640 - PR5-650 - PR5-670 - PR5-730 - PR5-780 - PR5-840 - PR5-890 - PR5-910 - PR5-920 - PR5-970 - PR5-980	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	8-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR5-630 - PR5-640 - PR5-650 - PR5-670 - PR5-730 - PR5-780 - PR5-840 - PR5-890 - PR5-910 - PR5-920 - PR5-970 - PR5-980	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
124	9-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR5-840 - PR5-900 - PR5-930 - PR5-941 - PR5-942 - PR5-943 - PR5-944 - PR5-945 - PR5-946 - PR5-950 - PR5-950	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
125	9-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR5-840 - PR5-900 - PR5-930 - PR5-941 - PR5-942 - PR5-943 - PR5-944 - PR5-945 - PR5-946 - PR5-950 - PR5-950	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	9-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR5-840 - PR5-900 - PR5-930 - PR5-941 - PR5-942 - PR5-943 - PR5-944 - PR5-945 - PR5-946 - PR5-950 - PR5-950	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
126	11-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR9-965 - PR9-966 - PR9-967 - PR9-968 - PR9-969 - PR9-970 - PR9-971 - PR9-995 C.D.	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
127	11-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR9-965 - PR9-966 - PR9-967 - PR9-968 - PR9-969 - PR9-970 - PR9-971 - PR9-995 C.D.	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	11-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR9-965 - PR9-966 - PR9-967 - PR9-968 - PR9-969 - PR9-970 - PR9-971 - PR9-995 C.D.	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
128	14-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR6-080 - PR6-085 - PR6-872	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
129	14-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR6-080 - PR6-085 - PR6-872	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	14-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR6-080 - PR6-085 - PR6-872	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
130	15-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR6-100 - PR6-110 - PR6-120 - PR6-140 - PR6-150 - PR6-160 - PR6-170 - PR6-190 - PR6-200 - PR6-210 - PR6-220 - PR6-250 - PR6-290 - PR6-300 - PR6-310	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
131	15-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR6-100 - PR6-110 - PR6-120 - PR6-140 - PR6-150 - PR6-160 - PR6-170 - PR6-190 - PR6-200 - PR6-210 - PR6-220 - PR6-250 - PR6-290 - PR6-300 - PR6-310	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	15-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR6-100 - PR6-110 - PR6-120 - PR6-140 - PR6-150 - PR6-160 - PR6-170 - PR6-190 - PR6-200 - PR6-210 - PR6-220 - PR6-250 - PR6-290 - PR6-300 - PR6-310	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
132	16-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR6-300 - PR6-320 - PR6-330 - PR6-350 - PR6-360 - PR6-370 - PR6-390 - PR6-395 - PR6-400 - PR6-400 - PR6-410 - PR6-420	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
133	16-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR6-300 - PR6-320 - PR6-330 - PR6-350 - PR6-360 - PR6-370 - PR6-390 - PR6-395 - PR6-400 - PR6-400 - PR6-410 - PR6-420	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	16-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR6-300 - PR6-320 - PR6-330 - PR6-350 - PR6-360 - PR6-370 - PR6-390 - PR6-395 - PR6-400 - PR6-400 - PR6-410 - PR6-420	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
134	19-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR6-080 - PR6-090	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
135	19-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR6-080 - PR6-090	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	19-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR6-080 - PR6-090	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
136	25-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR6-090	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
137	25-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 125/13 y 126/13	RT6504 PR6-090	1	Art 330 Tabla 330 - 2	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	25-may-26	Límite líquido	INV-E 125/13	RT6504 PR6-090	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
138	29-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RT6504 PR6-090 - PR6-340 - PR6-350 - PR6-380	1	Art 330-22 Tabla 330-3 BG-27	CUMPLE	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"

139	29-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 129/13 y 126/13	RT6504 PR6+090 - PR6+540 - PR6+550 - PR6+580	1	Art 330 Tabla 330 -- 2.	0.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
	29-may-26	Límite líquido	INV-E 129/13	RT6504 PR6+090 - PR6+540 - PR6+550 - PR6+580	1	ART.330 0	NL	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
140	16-may-26	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	INV.V. E-148	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Mínimo 95%	CBR AL 98%=154%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
141	23-may-26	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	INV.V. E-148	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Mínimo 95%	CBR AL 98%=153%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
142	8-may-26	Equivalente de arena de suelos y agregados finos	INV.V. E-133-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	TABLA 330-2 INV-22 CLASE A-B-C Min 30%	34.00%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
143	19-may-26	Equivalente de arena de suelos y agregados finos	INV.V. E-133-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	TABLA 330-2 INV-22 CLASE A-B-C Min 30%	34.00%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
144	27-may-26	DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO	INV.V E-142/13	Unidad Industrial Ruta 6504: Pr 6+205	1	INV-142	2,130 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 6.8	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
145	20-may-26	DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO	INV.V E-142/13	Unidad Industrial Ruta 6504: Ruta 6504 - PR5+625 - PR5+720	1	INV-142	2,205 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 7.0	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
146	11-may-26	DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO	INV.V E-142/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	INV-142	2,162 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 8.3	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
147	19-may-26	DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO	INV.V E-142/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	INV-142	2,172 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 7.6	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
148	8-may-26	Resistencia de los agregados tamaños menores de 37.5mm por medio de la máquina de los ángeles	INV.V. E-218-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Art 320 Tabla 320-2 Max 7%, Max 35 %	11.8% 48.2%	NO	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
149	14-may-26	Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval	INV E-238/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Max 25%	15.00%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
150	15-may-26	Evaluación de la resistencia mecánica de los agregados gruesos por el método de 10% de finos	INV E-224/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	En seco (90N) ≥ 90 Ret. Hum/Seco % ≥ 75%	139.1 KN 84%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
151	16-may-26	Angulosidad de la fracción fina, mínimo (%).	INV E- 239-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	ART. 330. MIN. 35 %	45.30%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
152	26-may-26	Determinación Terrones de Arcilla y Partículas Dispersables.	INV E-211/13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Máximo 2%	Agregado grueso 0,72 Agregado Fino 0,81	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
153	30-may-26	Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de sodio	INV.V. E-220-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Sulfato de Sodio ≤12% Sulfato de Magnesio ≤18%	Grueso 1.77 % Fino 4.3%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
154	14-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	Art. 330 - 22 Tabla 330 -- 2. UNA CARA MIN = 90% DOS CARAS MIN= 85%	UNA CARA= 97.6% DOS CARAS= 90.9%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
155	19-may-26	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS	INV. E-230-13	Unidad Industrial Ruta 6504	1	MÁX. 35%	ALARGAMIENTO = 19% APLANAMIENTO= 19%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
156	21-may-26	Densidad de Compactación	INV.V. E 161-13	Ruta 6504: PR 5+625 - PR 5+720	2	≥ 98%	105%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
157	27-may-26	Densidad de Compactación	INV.V. E 161-13	Ruta 6504: PR 6+190 - PR 6+430	5	≥ 98%	100%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
158	26-may-26	Densidad de Compactación	INV.V. E 161-13	Ruta 6504: PR 3+300 - PR 3+330	1	≥ 98%	100%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
159	27-may-26	Densidad de Compactación	INV.V. E 161-13	Ruta 6504: PR 6+430 - PR 6+530	2	≥ 98%	101%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
160	29-may-26	Densidad de Compactación	INV.V. E 161-13	Ruta 6504: PR 6+530 - PR 6+790	5	≥ 98%	101%	Si	"Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo"
MDC - 19 Agregados									
161	4-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA.	Cumple	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
162	4-may-26	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 129/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
163	4-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	51.10%	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
164	4-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 99.0% DOS CARAS= 96.6%	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
165	5-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA.	Cumple	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
166	5-may-26	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 129/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
167	5-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	51.40%	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
168	5-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98.4% DOS CARAS= 95.1%	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
169	6-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA.	Cumple	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
170	6-may-26	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 129/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
171	6-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	50.80%	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
172	6-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98.7% DOS CARAS= 95.7%	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
173	7-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA.	Cumple	Si	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo

174	7-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
175	7-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	51.70%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
176	7-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98.0% DOS CARAS= 93,9%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
177	8-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
178	8-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
179	8-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	50.10%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
180	8-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 97,9% DOS CARAS= 94,1%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
181	9-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
182	9-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
183	9-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	49.40%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
184	9-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 97,6% DOS CARAS= 93,5%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
185	12-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
186	12-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
187	12-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	49.10%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
188	12-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98,6% DOS CARAS= 95,5%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
189	13-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
190	13-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
191	13-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	51.50%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
192	13-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 97,2% DOS CARAS= 92,8%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
193	14-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
194	14-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
195	14-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	48.00%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
196	14-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98,3% DOS CARAS= 94,8%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
197	15-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
198	15-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
199	15-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	49.90%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
200	15-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 97,4% DOS CARAS= 93,4%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
201	25-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
202	25-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
203	25-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	47.10%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
204	25-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 97,7% DOS CARAS= 93,0%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
205	26-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
206	26-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
207	26-may-26		DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	50.80%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
208	26-may-26		PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 96,8% DOS CARAS= 93,7%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
209	27-may-26		Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LIMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo
210	27-may-26		DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del río Montecristo

211	27-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	51.70%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
212	27-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98,6% DOS CARAS= 95,5%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
213	29-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
214	29-may-26	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
215	29-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	48.70%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
216	29-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 97,9% DOS CARAS= 94,3%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
217	30-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	UI PR 5 + 300	1	CURVA UNIFORME Y PARALELA A LOS LÍMITES DE LA FRANJA.	Cumple	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
218	30-may-26	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD	INV-E 125/13 y 126/13	UI PR 5 + 300	1	Tabla 450-2 LP : NP	NP	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
219	30-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS	INV. E-239-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 45%	51.50%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
220	30-may-26	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	INV. E-227-13	UI PR 5 + 300	1	UNA CARA= MIN. 75% DOS CARAS= MIN. 60%	UNA CARA= 98,0% DOS CARAS= 93,6%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
221	4-may-26	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINO	INV. E-130-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 50%	54.00%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
222	8-may-26	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS	INV.V. E-230-13	UI KMA PR 5 + 300	1	MAX. 35%	Alargamiento: 19,0% Aplanamiento: 10,0%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
223	8-may-26	PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS,ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS	INV. E-240-13	UI PR 5 + 300	1	REL 5:1 MAX. 10%	1,06%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
224	6-may-26	IMPUREZAS EN AGREGADO GRUESO	INV. E-237-13	UI PR 5 + 300	1	max 0,5%	0.42%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
225	13-may-26	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINO	INV. E-130-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 50%	55.00%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
226	14-may-26	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS	INV.V. E-230-13	UI KMA PR 5 + 300	1	MAX. 35%	Alargamiento: 20,0% Aplanamiento: 12,0%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
227	14-may-26	PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS,ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS	INV. E-240-13	UI PR 5 + 300	1	REL 5:1 MAX. 10%	1.44%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
228	15-may-26	IMPUREZAS EN AGREGADO GRUESO	INV. E-237-13	UI PR 5 + 300	1	max 0,5%	0.48%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
229	26-may-26	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINO	INV. E-130-13	UI PR 5 + 300	1	MIN. 50%	57.00%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
230	28-may-26	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS	INV.V. E-230-13	UI KMA PR 5 + 300	1	MAX. 35%	Alargamiento: 22,0% Aplanamiento: 14,0%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
231	28-may-26	PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS,ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS	INV. E-240-13	UI PR 5 + 300	1	REL 5:1 MAX. 10%	1.19%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
232	27-may-26	IMPUREZAS EN AGREGADO GRUESO	INV. E-237-13	UI PR 5 + 300	1	max 0,5%	0.40%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
233	26-may-26	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	INV. E-210-13	UI PR 5 + 300	1	100 REV: MÁX. 5% 500 REV: MÁX. 25%	100 REV: 9,8% 500 REV: 45,2%	No	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
234	15-may-26	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO MICRO DEVAL	INV. E-238-13	UI PR 5 + 300	1	Max 20%	13.50%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
235	30-may-26	EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS	INV. E-224-13	UI PR 5 + 300	1	VR EN SECO= MIN. 110 Kn REL. HUMEDO/ SECO= MIN 75%	144,9 KN 84%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
236	30-may-26	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO	INV. E-220-13	UI PR 5 + 300	1	MAX: 18%	GRUESOS = 5,59% FINOS = 11,4%	SI	Material proveniente de la unidad industrial del no Montecristo
CONTROL MEZCLA MDC - 19									
237	4-may-26	Granulometría	INV. E-702-13	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	SI	Ruta 6503
238	4-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	ARF%=0,3% ± ART% ≤ ARF%+0,3 ART%=0,5% ± ARF% ≤ ART%+0,5 (5,0)	5.09%	SI	Ruta 6503
239	4-may-26	Estabilidad	INV.V.E 74013	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	Mínimo 7500 N	11746	SI	Ruta 6503
240	4-may-26	Flujo	INV. E-740-13	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.6	SI	Ruta 6503
241	4-may-26	Vacios con Aire	INV. E-736-13	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	3% a 5%	4.90%	SI	Ruta 6503
242	4-may-26	Vacios en los Agregados	INV.V.E 74013	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	Mínimo 15%	15.80%	SI	Ruta 6503
243	4-may-26	Vacios llenos con asfalto	INV.V.E 74013	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	65% a 78%	68.80%	SI	Ruta 6503
244	4-may-26	Relación llenante/fluyente	INV.V.E 74013	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	0,8 a 1,2	1.18	SI	Ruta 6503
245	4-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-740-13	PR 41+006 - PR 41+040.C.C. - PR 40+972 - PR 41+006.C.C. - PR 40+938 - PR 40+972.C.C. - PR 40+904 - PR 40+938.C.C. - PR 40+870 - PR 40+940.C.C	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3.4 Kn/mm	SI	Ruta 6503
246	5-may-26	Granulometría	INV. E-702-13	PR 40+500 - PR 40+700.BACHEO - PR 40+300 - PR 40+500.BACHEO - PR 40+050 - PR 40+300.BACHEO - PR 40+842 - PR 40+870.C.C. - PR 40+834 - PR 40+842.C.C. - PR 40+786 - PR 40+84.C.C. - PR 40+757 - PR 40+786.C.C. - PR 40+728 - PR 40+737.C.C. - PR 40+700 - PR 40+683.C.C	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	SI	Ruta 6503

273	7-may-26	Vacios en los Agregados	LNVE 74813	PR 40+470 - PR 40+500.C.C. - PR 40+440 - PR 40+470.C.C. - PR 40+430 - PR 40+480.C.C. - PR 40+380 - PR 40+410.C.C. - PR 40+360 - PR 40+390.C.C. - PR 40+320 - PR 40+350.C.C. - PR 40+290 - PR 40+320.C.C. - PR 40+260 - PR 40+290.C.C. - PR 40+230 - PR 40+260.C.C.	1	Mínimo 15%	15.80%	Si	Ruta 6503
274	7-may-26	Vacios llenos con asfalto	LNVE 74813	PR 40+470 - PR 40+500.C.C. - PR 40+440 - PR 40+470.C.C. - PR 40+430 - PR 40+480.C.C. - PR 40+380 - PR 40+410.C.C. - PR 40+360 - PR 40+390.C.C. - PR 40+320 - PR 40+350.C.C. - PR 40+290 - PR 40+320.C.C. - PR 40+260 - PR 40+290.C.C. - PR 40+230 - PR 40+260.C.C.	1	65% a 78%	69.10%	Si	Ruta 6503
275	7-may-26	Relación lianante/fligante	LNVE 74813	PR 40+470 - PR 40+500.C.C. - PR 40+440 - PR 40+470.C.C. - PR 40+430 - PR 40+480.C.C. - PR 40+380 - PR 40+410.C.C. - PR 40+360 - PR 40+390.C.C. - PR 40+320 - PR 40+350.C.C. - PR 40+290 - PR 40+320.C.C. - PR 40+260 - PR 40+290.C.C. - PR 40+230 - PR 40+260.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.19	Si	Ruta 6503
276	7-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 40+470 - PR 40+500.C.C. - PR 40+440 - PR 40+470.C.C. - PR 40+430 - PR 40+480.C.C. - PR 40+380 - PR 40+410.C.C. - PR 40+360 - PR 40+390.C.C. - PR 40+320 - PR 40+350.C.C. - PR 40+290 - PR 40+320.C.C. - PR 40+260 - PR 40+290.C.C. - PR 40+230 - PR 40+260.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3.5Kn/mm	Si	Ruta 6503
277	8-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
278	8-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ARN% ≤ ART% +0.5 (5.0)	4.97%	Si	Ruta 6503
279	8-may-26	Estabilidad	LNVE 74813	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	Mínimo 7500 N	12204	Si	Ruta 6503
280	8-may-26	Flujo	INV. E-748-13	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.6	Si	Ruta 6503
281	8-may-26	Vacios con Aire	INV. E-736-13	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	3% a 5%	4.90%	Si	Ruta 6503
282	8-may-26	Vacios en los Agregados	LNVE 74813	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	Mínimo 15%	15.90%	Si	Ruta 6503
283	8-may-26	Vacios llenos con asfalto	LNVE 74813	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	65% a 78%	69.2	Si	Ruta 6503
284	8-may-26	Relación lianante/fligante	LNVE 74813	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.19	Si	Ruta 6503
285	8-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 40+195 - PR 40+230.C.C. - PR 40+158 - PR 40+195.C.C. - PR 40+121 - PR 40+158.C.C. - PR 40+084 - PR 40+121.C.C. - PR 40+047 - PR 40+084.C.C. - PR 40+010 - PR 40+047.C.C. - PR 39+970 - PR 40+010.C.C. - PR 39+940 - PR 39+970.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3.5 Kn/mm	Si	Ruta 6503
286	9-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
287	9-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ARN% ≤ ART% +0.5 (5.0)	5.07%	Si	Ruta 6503
288	9-may-26	Estabilidad	LNVE 74813	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	Mínimo 7500 N	12497	Si	Ruta 6503
289	9-may-26	Flujo	INV. E-748-13	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.7	Si	Ruta 6503
290	9-may-26	Vacios con Aire	INV. E-736-13	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	3% a 5%	4.80%	Si	Ruta 6503
291	9-may-26	Vacios en los Agregados	LNVE 74813	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	Mínimo 15%	15.80%	Si	Ruta 6503
292	9-may-26	Vacios llenos con asfalto	LNVE 74813	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	65% a 78%	69.60%	Si	Ruta 6503
293	9-may-26	Relación lianante/fligante	LNVE 74813	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.19	Si	Ruta 6503
294	9-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 39+906 - PR 39+940.C.C. - PR 39+872 - PR 39+906.C.C. - PR 39+838 - PR 39+872.C.C. - PR 39+804 - PR 39+838.C.C. - PR 39+770 - PR 39+804.C.C. - PR 39+736 - PR 39+770.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3.5Kn/mm	Si	Ruta 6503
295	12-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
296	12-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ARN% ≤ ART% +0.5 (5.0)	5.22%	Si	Ruta 6503
297	12-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
298	12-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ARN% ≤ ART% +0.5 (5.0)	5.28%	Si	Ruta 6503
299	12-may-26	Estabilidad	LNVE 74813	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	Mínimo 7500 N	12578	Si	Ruta 6503
300	12-may-26	Flujo	INV. E-748-13	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.6	Si	Ruta 6503
301	12-may-26	Vacios con Aire	INV. E-736-13	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	3% a 5%	4.10%	Si	Ruta 6503
302	12-may-26	Vacios en los Agregados	LNVE 74813	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	Mínimo 15%	15.20%	Si	Ruta 6503
303	12-may-26	Vacios llenos con asfalto	LNVE 74813	PR 39+200 - PR 39+300 BACHEO - PR 39+732 - PR 39+770.C.C. - PR 39+694 - PR 39+732.C.C. - PR 39+656 - PR 39+694.C.C. - PR 39+618 - PR 39+656.C.C. - PR 39+580 - PR 39+618.C.C. - PR 39+542 - PR 39+580.C.C. - PR 39+504 - PR 39+542.C.C. - PR 39+470 - PR 39+504.C.C.	1	65% a 78%	73.10%	Si	Ruta 6503

7

304	12-may-26	Relación llenamantigante	LNVE 74813	PR 39-200 - PR 39-300 BACHEO - PR 39-732 - PR 39-700.C.C. - PR 39-684 - PR 39-732.C.C. - PR 39-656 - PR 39-684.C.C. - PR 39-618 - PR 39-656.C.C. - PR 39-580 - PR 39-618.C.C. - PR 39-542 - PR 39-580.C.C. - PR 39-504 - PR 39-542.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.19	Si	Ruta 6503
305	12-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 39-200 - PR 39-300 BACHEO - PR 39-732 - PR 39-700.C.C. - PR 39-684 - PR 39-732.C.C. - PR 39-656 - PR 39-684.C.C. - PR 39-618 - PR 39-656.C.C. - PR 39-580 - PR 39-618.C.C. - PR 39-542 - PR 39-580.C.C. - PR 39-504 - PR 39-542.C.C. - PR 39-470 - PR 39-504.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3,6Kn/mm	Si	Ruta 6503
306	13-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
307	13-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3	5.25%	Si	Ruta 6503
308	13-may-26	Estabilidad	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	Mínimo 7500 N	13368	Si	Ruta 6503
309	13-may-26	Flujo	INV. E-748-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	(Mínimo 2.0 y Máximo 4.0 mm)	3.7	Si	Ruta 6503
310	13-may-26	Vacos con Aire	INV. E-736-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	3% a 5%	4.40%	Si	Ruta 6503
311	13-may-26	Vacos en los Agregados	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	Mínimo 15%	15.40%	Si	Ruta 6503
312	13-may-26	Vacos llenos con asfalto	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	65% a 78%	71.20%	Si	Ruta 6503
313	13-may-26	Relación llenamantigante	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.16	Si	Ruta 6503
314	13-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3,8kn/mm	Si	Ruta 6503
315	14-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
316	14-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3	5.02%	Si	Ruta 6503
317	14-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
318	14-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3	5.10%	Si	Ruta 6503
319	14-may-26	Estabilidad	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	Mínimo 7500 N	13742	Si	Ruta 6503
320	14-may-26	Flujo	INV. E-748-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.7	Si	Ruta 6503
321	14-may-26	Vacos con Aire	INV. E-736-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	3% a 5%	4.20%	Si	Ruta 6503
322	14-may-26	Vacos en los Agregados	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	Mínimo 15%	15.20%	Si	Ruta 6503
323	14-may-26	Vacos llenos con asfalto	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	65% a 78%	72.60%	Si	Ruta 6503
324	14-may-26	Relación llenamantigante	LNVE 74813	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.15	Si	Ruta 6503
325	14-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 39-437 - PR 39-470.C.C. - PR 39-404 - PR 39-437.C.C. - PR 39-373 - PR 39-404.C.C. - PR 39-338 - PR 39-373.C.C. - PR 39-305 - PR 39-338.C.C. - PR 39-272 - PR 39-305.C.C. - PR 39-239 - PR 39-272.C.C. - PR 39-206 - PR 39-239.C.C. - PR 39-173 - PR 39-206.C.C. - PR 39-140 - PR 39-173.C.C. - PR 39-105 - PR 39-140.C.C. - PR 39-070 - PR 39-105.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	3,8kn/mm	Si	Ruta 6503
326	15-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-620.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-882 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-882.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
327	15-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-620.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-882 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-882.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ART%+0.3	5.16%	Si	Ruta 6503
328	15-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-620.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-882 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-882.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503
329	15-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-620.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-882 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-882.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ART%+0.3	4.88%	Si	Ruta 6503

t

330	15-may-26	Estabilidad	INV.E-748-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	Mínimo 7500 N	13188	Si	Ruta 6503
331	15-may-26	Flujo	INV.E-748-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.6	Si	Ruta 6503
332	15-may-26	Vacios con Aire	INV.E-736-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	3% a 5%	4.70%	Si	Ruta 6503
333	15-may-26	Vacios en los Agregados	INV.E-748-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	Mínimo 15%	15.60%	Si	Ruta 6503
334	15-may-26	Vacios llenos con asfalto	INV.E-748-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	65% a 78%	70.00%	Si	Ruta 6503
335	15-may-26	Relación llenanefligante	INV.E-748-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.17	Si	Ruta 6503
336	15-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV.E-748-13	PR 38-674 - PR 38-730.C.C. - PR 38-650 - PR 38-674.C.C. - PR 38-625 - PR 38-650.C.C. - PR 37-988 - PR 38-020.C.C. - PR 37-956 - PR 37-988.C.C. - PR 37-924 - PR 37-956.C.C. - PR 37-892 - PR 37-924.C.C. - PR 37-859 - PR 37-826 - PR 37-859.C.C. - PR 37-793 - PR 37-826.C.C. - PR 37-760 - PR 37-793.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kny/mm	3.9Kny/mm	Si	Ruta 6503
337	25-may-26	Granulometría	INV.E-762-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
338	25-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV.E-732-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ AR% ≤ ART%+0.5 (5.0)	5.21%	Si	Ruta 6504
339	25-may-26	Granulometría	INV.E-762-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
340	25-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV.E-732-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ AR% ≤ ART%+0.5 (5.0)	4.94%	Si	Ruta 6504
341	25-may-26	Granulometría	INV.E-762-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
342	25-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV.E-732-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ AR% ≤ ART%+0.5 (5.0)	5.12%	Si	Ruta 6504
343	25-may-26	Estabilidad	INV.E-748-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	Mínimo 7500 N	11647	Si	Ruta 6504
344	25-may-26	Flujo	INV.E-748-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.4	Si	Ruta 6504
345	25-may-26	Vacios con Aire	INV.E-736-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	3% a 5%	4.70%	Si	Ruta 6504
346	25-may-26	Vacios en los Agregados	INV.E-748-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	Mínimo 15%	15.70%	Si	Ruta 6504
347	25-may-26	Vacios llenos con asfalto	INV.E-748-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	65% a 78%	70.20%	Si	Ruta 6504
348	25-may-26	Relación llenanefligante	INV.E-748-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	0,8 a 1,2	1.17	Si	Ruta 6504
349	25-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV.E-748-13	PR 5-650 - PR 5-710. 1RA CAPA.C.I. - PR 5-625 - PR 5-717. 1RA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-706. 2DA CAPA.C.I. - PR 5-445 - PR 5-680. 2DA CAPA.C.D.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kny/mm	3.9Kny/mm	Si	Ruta 6504
350	26-may-26	Granulometría	INV.E-762-13	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y.C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-330. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-260 - PR 3-335. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-260 -					

b

354	26-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
355	26-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ ARF% ≤ ART%+0.5 (5.0)	4.91%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
356	26-may-26	Estabilidad	INV.E-749-13	PR 3-300- PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	Mínimo 7500 N	12835	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
357	26-may-26	Flujo	INV. E-749-13	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.3	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
358	26-may-26	Vacos con Aire	INV. E-736-13	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	3% a 5%	4.80%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
359	26-may-26	Vacos en los Agregados	INV.E-74913	PR 3-300- PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	Mínimo 15%	15.60%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
360	26-may-26	Vacos llenos con asfalto	INV.E-74913	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	65% a 78%	69.50%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
361	26-may-26	Relación lianantefigante	INV.E-74913	PR 3-300 - PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.18	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
362	26-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-749-13	PR 3-300- PR 3-332. 1RA CAPA.C.I.Y. C.D. - PR 3-296 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.D. - PR 3-290 - PR 3-335. 2DA CAPA.C.I. - PR 3-305 - PR 3-340. 3RA CAPA.C.D. - PR 3-265 - PR 3-305. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-230 - PR 3-265. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-263 - PR 3-343. 3RA CAPA.C.I. - PR 3-580 - PR 5-420 2DA CAPA.C.D. - PR 5-620 - PR 5-665 2DA CAPA.C.D. RUTA 6503 PR 37+600 - PR 37+690. BACHEO.C.C. - PR 37+390 - PR 37+450. BACHEO.C.C. - PR 36+750 - PR 36+790. BACHEO.C.C. - PR 36+650 - PR 36+740. BACHEO.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kyn/mm	4.1Kyn/mm	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
363	27-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
364	27-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ ARF% ≤ ART%+0.5 (5.0)	5.06%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
365	27-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
366	27-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ ARF% ≤ ART%+0.5 (5.0)	5.11%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
367	27-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
368	27-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ ARF% ≤ ART%+0.5 (5.0)	4.94%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
369	27-may-26	Estabilidad	INV.E-74913	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	Mínimo 7500 N	13056	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
370	27-may-26	Flujo	INV. E-749-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.4	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
371	27-may-26	Vacos con Aire	INV. E-736-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	3% a 5%	4.90%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
372	27-may-26	Vacos en los Agregados	INV.E-74913	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	Mínimo 15%	15.90%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
373	27-may-26	Vacos llenos con asfalto	INV.E-74913	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	65% a 78%	69.00%	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
374	27-may-26	Relación lianantefigante	INV.E-74913	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	0,8 a 1,2	1.11	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
375	27-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-749-13	PR 5-665 - PR 5-702. 2DA CAPA.C.D. - PR 5-440 - PR 5-697. 3RA CAPA.C.D. - PR 5-443 - PR 5-695. 3RA CAPA.C.I. - PR 5-395 - PR 5-443. 3RA CAPA.C.I. RUTA 6503 PR 36+130 - PR 36+230. BACHEO.C.C.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kyn/mm	4.0Kyn/mm	Si	Ruta 6503 Ruta 6504
376	29-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 6-180 - PR 6-525. 3RA CAPA.C.I. -- PR 6-180 - PR 6-512. 1RA CAPA.C.D.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
377	29-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 6-180 - PR 6-525. 3RA CAPA.C.I. -- PR 6-180 - PR 6-512. 1RA CAPA.C.D.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ ARF% ≤ ART%+0.5 (5.0)	4.92%	Si	Ruta 6504
378	29-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 6-180 - PR 6-525. 3RA CAPA.C.I. -- PR 6-180 - PR 6-512. 1RA CAPA.C.D.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
379	29-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 6-180 - PR 6-525. 3RA CAPA.C.I. -- PR 6-180 - PR 6-512. 1RA CAPA.C.D.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3 ART%-0.5% ≤ ARF% ≤ ART%+0.5 (5.0)	4.99%	Si	Ruta 6504
380	29-may-26	Granulometría	INV. E-762-13	PR 6-180 - PR 6-525. 3RA CAPA.C.I. -- PR 6-180 - PR 6-512. 1RA CAPA.C.D.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504

381	29-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ART% ≤ ART% +0.5 (5.0)	5.06%	Si	Ruta 6504
382	29-may-26	Estabilidad	I.N.V.E 748/13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	Mínimo 7500 N	13627	Si	Ruta 6504
383	29-may-26	Flujo	INV. E-736-13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.5	Si	Ruta 6504
384	29-may-26	Vacos con Aire	INV. E-736-13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	3% a 5%	4.00%	Si	Ruta 6504
385	29-may-26	Vacos en los Agregados	I.N.V.E 748/13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	Mínimo 15%	15.30%	Si	Ruta 6504
386	29-may-26	Vacos llenos con asfalto	I.N.V.E 748/13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	65% a 78%	73.80%	Si	Ruta 6504
387	29-may-26	Relación llenante/ligante	I.N.V.E 748/13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	0.8 a 1.2	1.18	Si	Ruta 6504
388	29-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 6+180 - PR 6+525. 3RA CAPA.C.I. --- PR 6+180 - PR 6+513. 1RA CAPA.C.D.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	4,0Kn/mm	Si	Ruta 6504
389	30-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
390	30-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ART% ≤ ART% +0.5 (5.0)	5.03%	Si	Ruta 6504
391	30-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
392	30-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ART% ≤ ART% +0.5 (5.0)	5.02%	Si	Ruta 6504
393	30-may-26	Granulometría	INV. E-782-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	TABLA 450.6 INV-13	Cumple	Si	Ruta 6504
394	30-may-26	Contenido de Asfalto Residual	INV. E-732-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF% +0.3 ART%-0.5% ≤ ART% ≤ ART% +0.5 (5.0)	4.93%	Si	Ruta 6504
395	30-may-26	Estabilidad	I.N.V.E 748/13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	Mínimo 7500 N	15127	Si	Ruta 6504
396	30-may-26	Flujo	INV. E-748-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	(Mínimo 2.0 Y Máximo 4.0 mm)	3.6	Si	Ruta 6504
397	30-may-26	Vacos con Aire	INV. E-736-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	3% a 5%	4.10%	Si	Ruta 6504
398	30-may-26	Vacos en los Agregados	I.N.V.E 748/13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	Mínimo 15%	15.20%	Si	Ruta 6504
399	30-may-26	Vacos llenos con asfalto	I.N.V.E 748/13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	65% a 78%	72.70%	Si	Ruta 6504
400	30-may-26	Relación llenante/ligante	I.N.V.E 748/13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	0.8 a 1.2	1.2	Si	Ruta 6504
401	30-may-26	Relación Estabilidad y Flujo	INV. E-748-13	PR 6+513 - PR 6+789. 3RA CAPA.C.D. --- PR 6+525 - PR 6+763. 1RA CAPA.C.I.	1	MIN 3.0 Y MAX 5.0 Kn/mm	4,4Kn/mm	Si	Ruta 6504
REGIO DE LIGA									
402	25-may-26	Contenido de agua en Emulsiones Asfálticas	I.N.V.E 761/13	Ruta 6503	1	CRR-60 Máximo 40%	37.00%	Si	ASFALTOS Y EMULSIONES DE COLOMBIA S.A.S
ENSAYOS NEVA RUTA 3881									
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO									
403	4-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR: 15+475 CABEZAL Y ALETAS DESCOLE ALCANTARILLA CONSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	103.10%	Si	Material Argos Estructura
404	5-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+109 A PR:16+074 CUNETAS CONSTADO DERECHO Y PR:16+112 A PR:16+108 CUNETAS CONSTADO IZQUIERDO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	121.70%	Si	Material Argos Estructura
405	6-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+114 A PR:16+075 CUNETAS CONSTADO IZQUIERDO PR:16+079 A PR:16+082 CUNETAS CONSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	128.30%	Si	Material Argos Estructura
406	7-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+103 A PR:16+079 CUNETAS CONSTADO IZQUIERDO Y PR:16+240 A PR:16+248 CUNETAS CONSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	121.10%	Si	Material Argos Estructura
407	9-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+027 A PR:16+079 CUNETAS CONSTADO IZQUIERDO Y PR:16+246 A PR:16+244 CUNETAS CONSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	136.70%	Si	Material Argos Estructura
408	11-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR: 16+060 A PR:16+026 CUNETAS COSTADO IZQUIERDO Y PR:16+060 A PR:16+026 CUNETAS COSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	125.60%	Si	Material Argos Estructura
409	13-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:15+020 LOSA INFERIOR BOX CULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	100.90%	Si	Material Argos Estructura
410	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+044 A PR:16+090 CUNETAS COSTADO DERECHO Y PR:16+119 A PR:16+125 CUNETAS COSTADO IZQUIERDO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	128.30%	Si	Material Argos Estructura
411	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+047 A PR:16+095 CUNETAS COSTADO DERECHO Y PR:16+119 A PR:16+124 CUNETAS COSTADO IZQUIERDO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	126.50%	Si	Material Argos Estructura
412	20-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:16+020 MURO IZQUIERDO DE BOX CULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	103.50%	Si	Material Argos Estructura
413	5-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR: 15+020 MURO DERECHO DE BOX CULVERT COSTADO DERECHO Y PR:15+960 SOLERA DE DESCOLE ALCANTARILLA COSTADO DERECHO PR:15+746LOS DE POCETA DERECH	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	104.10%	Si	Material Argos Estructura
414	26-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR: 15+020 MURO DERECHO DE BOX CULVERT COSTADO DERECHO Y PR:15+960 SOLERA DE DESCOLE ALCANTARILLA COSTADO DERECHO PR:15+746LOS DE POCETA DERECH	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	105.50%	Si	Material Argos Estructura
415	9-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR: 15+020 MEDIA SECCION LOSA SUPERIOR DE BOX CULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	99.30%	Si	Material Argos Estructura
416	30-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR: 15+020 MEDIA SECCION LOSA SUPERIOR DE BOX CULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 100% Resistencia esperada 28 D	106.00%	Si	Material Argos Estructura
417	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:15+020 MEDIA SECCION LOSA SUPERIOR DE BOX CULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	74.20%	Si	Material Argos Estructura
418	13-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:15+746 MURO DE POCETA COSTADO IZQUIERDO PR:15+960 LOSA DE POCETA COSTADO IZQUIERDO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	72.40%	Si	Material Argos Estructura
419	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:15+960 MURO DE POCETA COSTADO IZQUIERDO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	100.60%	Si	Material Argos Estructura
420	20-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E410-13	PR:15+960 CABEZAL DE ALCANTARILLA COSTADO DERECHO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	99.90%	Si	Material Argos Estructura

6

421	22-may-25	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E-410-13	PR-15+801 PLACA INFERIOR Y PATIN DE BOX COULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	106.80%	SI	Material Argos Estructura	
422	28-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V E-410-13	PR-15+801 PLACA SUPERIOR, PATIN Y MUROS LATERALES DE BOX COULVERT COSTADO DERECHO	2	Min 70% Resistencia esperada 7 D	100.30%	SI	Material Argos Estructura	
RECIBO										
423	8-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213-13	PR15+801 RN3001 Izquierdo	1	Art 610 Tabla 610-3	Cumple	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
424	13-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213-13	Unidad Industrial RN3001	1	Art 610 Tabla 610-3	Cumple	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
425	13-may-26	Índice de Plasticidad	INV-E 129/13 y 126/13	Unidad Industrial RN3001	1	Art 610 Tabla 610-2	0	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
426	13-may-26	Límite líquido	INV-E 129/13	Unidad Industrial RN3001	1	Art 610 Tabla 610-2	NL	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
427	12-may-26	Resistencia de los agregados por medio de la maquina de los angeles	I.N.V. E-219-13	Unidad Industrial RN3001	1	Art 610 Tabla 610-2 Máximo 50%	25.00%	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
428	12-may-26	Contenido de materia organica	INV E-121/13	Unidad Industrial RN3001	1	Art 610 Tabla 610-2 máximo 1 %	0.80%	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
429	12-may-26	Densidad Vs Humedad - Proctor Modificado	I.N.V E-142/13	Unidad Industrial RN3001	1	INV-142	2.155 g/cm3 HUMEDAD ÓPTIMA % 8.1	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
430	19-may-26	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	I.N.V E-148-13	Unidad Industrial RN3001	1	Art. 610-1a 908	98.0%	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
PIEDRA FILTRO										
431	6-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RUTA 3001 BOX PR15+620 Muro Lateral	1	Art. 673 - 2022	CUMPLE	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
432	8-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RUTA 3001 ALC PR15+960 Izquierdo	1	Art. 673 - 2022	CUMPLE	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
433	8-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	INV-E 213/13	RUTA 3001 NEVA BASILLAS UNIDAD INDUSTRIAL NEVA	1	Art. 673 - 2022	CUMPLE	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
434	8-may-26	Resistencia de los agregados tamaños menores de 4.75 mm por medio de la maquina de los angeles	I.N.V E-219 - 13	RUTA 3001 NEVA BASILLAS UNIDAD INDUSTRIAL NEVA	1	Art. 673 - 2022 s 40%	23.1%	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
435	9-may-26	Determinación de Terrones de Arcilla y Partículas Detonables	I.N.V E-211 - 13	RUTA 3001 NEVA BASILLAS UNIDAD INDUSTRIAL NEVA	1	ART.673 max % 0,25	Grueso: 0,58 Fino:0,24	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
436	13-may-26	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO	I.N.V. E-220-13	RUTA 3001 NEVA BASILLAS UNIDAD INDUSTRIAL NEVA	1	Sulfato de Sodio Max ≤12%	fino 2,0% Grueso 0,78%	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
437	8-may-26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR IGNICION	INV E-121-13	RUTA 3001 NEVA BASILLAS UNIDAD INDUSTRIAL NEVA	1	Artículo 673 - 22 - tabla 673 s0.2%	0.16%	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
438	8-may-26	Contenido de partículas Livianas	I.N.V E- 221-13	RUTA 3001 NEVA BASILLAS UNIDAD INDUSTRIAL NEVA	1	Art 610 - max 0.5%	Grueso 1.35 Fino:0.3	SI	TRITURADO Y AGREGADOS DE COLOMBIA	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA										
Ruta 6503 - 6504										
BASE GRANULAR Art. 330										
1	11-may-26	Límite líquido	I.N.V. E-125-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1		NL	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
2	11-may-26	Índice de plasticidad	I.N.V. E-125-13 I.N.V. E-126-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Máximo 0%	NP	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
3	12-may-26	Equivalente de arena	I.N.V. E-133-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Mínimo 30%	40%	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
4	12-may-26	Contenido de terrones de arcilla y partículas detonables	I.N.V. E-211-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Máximo 2%	Grueso: 0.17% Fino: 0.23%	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
5	11-may-26	Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos	I.N.V. E-213-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	TABLA 330-3 B0-27 INV-13	Encaja	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
6	16-may-26	Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos	I.N.V. E-220-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Max Sodio: 12 Max Magnesio: 18	Magnesio Fino: 7.4% Grueso: 3.9%	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
7	13-may-26	Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval	I.N.V. E-238	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Máximo 25%	14.40%	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
8	14-may-26	Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10 % de finos	I.N.V. E-224-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Mínimo Seco: 90 kN Humedad/seco: 75 %	Seco: 87.5 kN Humedad/seco: 80 %	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
9	13-may-26	Índices de alargamiento y achatamiento	I.N.V. E-230-13	RUTA 6504: PR05+630 a PR06+000 C.C	1	Máximo 35%	Alargamiento: 14.2% Achatamiento: 15.8%	SI	RUTA 6504 PRODUCCIÓN UNIDAD INDUSTRIAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA CANTERA MONTECRISTO	
MEZCLA ASFÁLTICA Art. 450-13										
10	4-may-26	Contenido de Asfalto promedio del lote (ART%)	I.N.V.E 732-13	RUTA 6503 - MANTENIMIENTO VIAL PR43+305 C.C	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3% (4.7 - 5.3)	5.80%	5.77%	RUTA 6504 - PLANTA UNIDAD INDUSTRIAL KMA	
11	5-may-26	Contenido de Asfalto promedio del lote (ART%)	I.N.V.E 732-13	RUTA 6503 - MANTENIMIENTO VIAL PR43+305 C.C	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3% (4.7 - 5.3)	5.80%		NO	RUTA 6504 - PLANTA UNIDAD INDUSTRIAL KMA
12	6-may-26	Contenido de Asfalto promedio del lote (ART%)	I.N.V.E 732-13	RUTA 6503 - MANTENIMIENTO VIAL PR43+305 C.C	1	ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3% (4.7 - 5.3)	5.70%		SI	RUTA 6504 - PLANTA UNIDAD INDUSTRIAL KMA
13	4-may-26	Granulometría	I.N.V.E 782-13	RUTA 6503 - MANTENIMIENTO VIAL PR43+305 C.C	1	TABLA 450.5 ART 450-22	Gradación dentro de la franja granulométrica.	SI	RUTA 6504 - PLANTA UNIDAD INDUSTRIAL KMA	
14	5-may-26	Granulometría	I.N.V.E 782-13	RUTA 6503 - MANTENIMIENTO VIAL PR43+305 C.C	1	TABLA 450.5 ART 450-22	Gradación dentro de la franja granulométrica.	SI	RUTA 6504 - PLANTA UNIDAD INDUSTRIAL KMA	
15	6-may-26	Granulometría	I.N.V.E 782-13	RUTA 6503 - MANTENIMIENTO VIAL PR43+305 C.C	1	TABLA 450.5 ART 450-22	Gradación dentro de la franja granulométrica.	SI	RUTA 6504 - PLANTA UNIDAD INDUSTRIAL KMA	
CONCRETO ESTRUCTURAL: ART 638 - 22										
16	4-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V-E-410- 22	RUTA 6503: PR38+296 C.C TABLERO PUENTE SEGUNDA ETAPA - PR38+095 al PR38+105 C.I CORONA VASTAGO BARRERA NEW JERSEY MODULO 2	2	28 MPa 28 días = 100%	82.3%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falla muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVAS 22)	
					2	28 MPa 28 días = 100%	87.1%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falla muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVAS 22)	
17	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	I.N.V-E-410- 22	RUTA 6504: PR07+950 a PR07+970 C.I ZARPA MURO DE CONTENCIÓN ML Y M2	2	28 MPa 28 días = 100%	70.0%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falla muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVAS 22)	

16

18	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6503: PR38+165 al PR38+175 C.I ZARPA BARRERA NEW JERSEY MODULO 9	2	28 MPa 28 días = 100%	72.9%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falta muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 22)
19	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6502: PR28+259 C.C PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE ESTRIBO 1	2	28 MPa 28 días = 100%	51.5%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falta muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 22)
20	15-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6504: PR06+875 C.D PLACA SOLERA Y DENTELON DESCOLE ALCANTARILLA - PR07+950 a PR07+970 C.I ZARPA MURO DE CONTENCIÓN MODULO 3	2	28 MPa 28 días = 100%	44.1%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falta muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 22)
21	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6503: PR38+175 al PR38+185 C.I ZARPA BARRERA NEW JERSEY MODULO 10 - PR38+135 al PR38+145 C.I CORDOVA VASTAGO BARRERA NEW JERSEY MODULO 6 - PR38+095 al PR38+105 C.D VASTAGO BARRERA NEW JERSEY MODULO 2	2	28 MPa 28 días = 100%	58.1%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falta muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 22)
22	18-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6504: PR07+950 a PR07+980 C.I VASTAGO MURO DE CONTENCIÓN	2	28 MPa 28 días = 100%	62.0%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL (Se falta muestras a 28 días y estas no cumplen con la resistencia de diseño, se debe hacer toma de núcleos del elemento de acuerdo a la norma INV E-418, tal como lo especifica el Art 630 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 22)
23	25-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6503: PR06+875 C.D MURO Y ALETAS ALCANTARILLA - PR07+858 C.I y PR07+858 C.D PLACA SOLERA DESCOLE Y PLACA CAJA ENCOLE ALCANTARILLA - PR08+095 C.D PLACA SOLERA DESCOLE ALCANTARILLA	2	28 MPa 28 días = 100%	98.9%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL
24	28-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	RUTA 6504: PR08+098 C.D PLACA SOLERA ALCANTARILLA	2	28 MPa 28 días = 100%	98.0%	NO	CONCRETO DOSIFICADORA UNIDAD INDUSTRIAL
Ruta 3001									
CONCRETO ESTRUCTURAL- ART 630 - 22									
25	5-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Muro derecho el Box Couvert R15+620 Margen derecha- Losa poceta PR15+745 Margen izquierda, y construcción de solera descote alcantarilla PR15-960 Margen derecha.	2	17.5 MPa 7 días = 70%	77.0%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
26	9-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Cunetas Margen izquierda PR16+137 AL PR16+070 Y PR16+246 AL PR16+244 Margen izquierda	2	17.5 MPa 28 días = 100%	135.8%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
27	9-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Construcción de media sección de losa superior de Box Couvert PR15+620 Margen derecha.	2	28 MPa 7 días = 70%	135.9%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
28	11-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Cunetas Margen izquierda PR16+060 AL PR16+036 Y PR16+060 AL PR16+036 Margen Derecha.	2	17.5 MPa 28 días = 100%	75.2%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
29	12-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Construcción de media sección de losa superior de Box Couvert PR15+620 Margen derecha.	2	28 MPa 7 días = 70%	82.4%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
30	13-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Losa inferior del Box Couvert PR15+620 Margen derecha.	2	28 MPa 28 días = 100%	83.2%	NO	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
31	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Cunetas Margen derecha PR16+108 AL PR16+074 y Cunetas PR16+112 AL PR16+128 Margen izquierda.	2	17.5 MPa 28 días = 100%	110.8%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
32	14-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Muros poceta PR15+745 Margen izquierda y Losa poceta PR15+960 Margen izquierda.	2	28 MPa 7 días = 70%	80.5%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
33	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Cunetas Margen Derecha PR16+047 AL PR16+055 y Cunetas PR16+119 AL PR16+124 Margen izquierda.	2	28 MPa 28 días = 100%	70.7%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
34	16-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Muros poceta PR15+960 Margen izquierda.	2	28 MPa 7 días = 70%	70.7%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
35	20-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Muro izquierdo del Box Couvert PR15+620 Margen derecha	2	28 MPa 28 días = 100%	73.9%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
36	20-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Cabezal de alcantarilla PR15+960 Margen Derecha	2	28 MPa 7 días = 70%	81.2%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
37	22-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Losa inferior Box Couvert PR15+802 Margen Derecha	2	28 MPa 7 días = 70%	72.3%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS
38	26-may-26	Resistencia a la compresión de cilindros	LN.V-E410- 22	Muro derecho el Box Couvert R15+620 Margen derecha- Losa poceta PR15+745 Margen izquierda, y construcción de solera descote alcantarilla PR15-960 Margen derecha.	2	28 MPa 28 días = 100%	117.9%	SI	RUTA 3001 CONCRETO PREMEZCLADO ARGOS



**SOPORTES ENSAYOS
CONTRATISTA
PROYECTO 132**

ENSAYOS TERRAPLÉN



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 - ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS

FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO

DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: lunes, 11 de mayo de 2026

TRAMO: Florencia - Puerto Rico

LOCALIZACION: Pr 38+085 - Pr 38+170 - Ruta 6503

MARGEN: Calzada completa-Estribos 1-UnicaCapa

FECHA DE TOMA: lunes, 11 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO


Peso inicial:		151010,5	Peso final:		147265	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 220 -22 - Adecuado	
						Mínimo	Máximo
8"	203,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
6"	152,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
4"	101,60	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
3"	76,20	31220,2	20,67%	20,67%	79,3%	0%	100%
1 1/2"	38,10	30617	20,27%	40,95%	59,1%	0%	100%
Nº 4	4,75	39385,4	26,08%	67,03%	33,0%	0%	100%
Nº 10	2,00	8466,9	5,61%	72,64%	27,4%	0%	80%
Nº 200	0,075	37575,8	24,88%	97,52%	2,5%	0%	35%
FONDO		3745,2	2,48%	2,48%			

CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	2807,0
Peso muestra seca + recip.	2651,7
Peso recipiente	191
% de humedad	6,3
Gravas :	67,0%
Arenas :	30,5%
Finos :	2,5%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
U.S.C.	GP
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

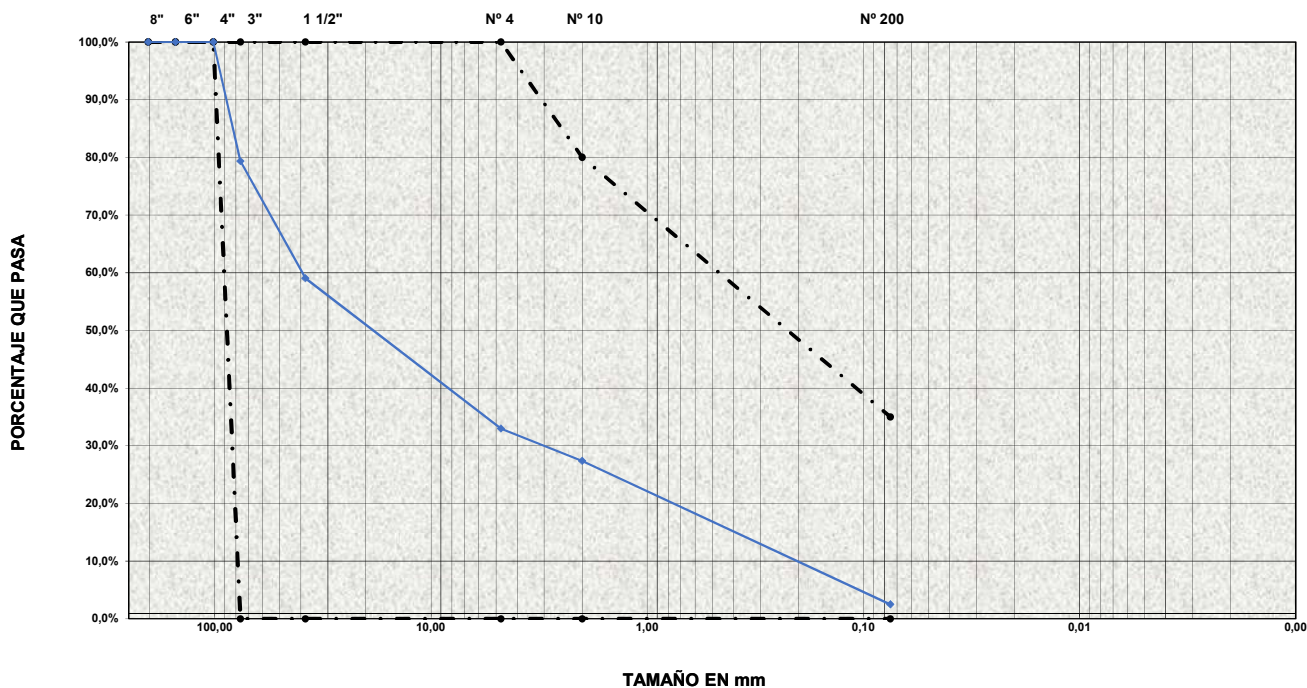

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

	DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022	Código: F-EO-056 Versión: 003 Fecha: 30/04/2025 Página 1 de 1																																																																																			
PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA" TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO		FECHA ENSAYO11 de mayo de 2026 TRAMO:Florencia - Puerto Rico LOCALIZACION:Pr 38+085 - Pr 38+170 - Ruta 6503 MARGEN:Calzada completa-Estribos 1-UnicaCapa FECHA DE TOMA:11 de mayo de 2026 No ENSAYO:																																																																																			
LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO <table><thead><tr><th>NUMERO DE GOLPES</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Recipiente N°.</td><td rowspan="4">NL</td><td rowspan="4">NL</td><td rowspan="4">NL</td></tr><tr><td>Peso de la muestra húmeda + recipiente</td></tr><tr><td>Peso de la muestra seca + recipiente</td></tr><tr><td>Peso recipiente</td></tr><tr><td>% DE HUMEDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> LIMITE PLASTICO <table><thead><tr><th>Recipiente N°.</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso de la muestra húmeda + recipiente</td><td rowspan="4">NP</td><td rowspan="4">NP</td></tr><tr><td>Peso de la muestra seca + recipiente</td></tr><tr><td>Peso recipiente</td></tr><tr><td>% DE HUMEDAD</td></tr></tbody></table>		NUMERO DE GOLPES				Recipiente N°.	NL	NL	NL	Peso de la muestra húmeda + recipiente	Peso de la muestra seca + recipiente	Peso recipiente	% DE HUMEDAD				Recipiente N°.			Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP	Peso de la muestra seca + recipiente	Peso recipiente	% DE HUMEDAD	GRANULOMETRIA <table><thead><tr><th>Peso inicial:</th><th>151011</th><th>Peso Final</th><th>147265</th></tr><tr><th>TAMIZ</th><th>PESO</th><th>% RET</th><th>% ACUM</th><th>% PASA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,0</td></tr><tr><td>8"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>6"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>4"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>3"</td><td>31220,2</td><td>20,7</td><td>20,7</td><td>79,3</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>30617,0</td><td>20,3</td><td>40,9</td><td>59,1</td></tr><tr><td>N° 4</td><td>39385,4</td><td>26,1</td><td>67,0</td><td>33,0</td></tr><tr><td>N° 10</td><td>8466,9</td><td>5,6</td><td>72,6</td><td>27,4</td></tr><tr><td>N° 200</td><td>37575,8</td><td>24,9</td><td>97,5</td><td>2,5</td></tr><tr><td>FONDO</td><td>3745,2</td><td>2,5</td><td>100,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>	Peso inicial:	151011	Peso Final	147265	TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA					100,0	8"	0,0	0,0	0,0	100,0	6"	0,0	0,0	0,0	100,0	4"	0,0	0,0	0,0	100,0	3"	31220,2	20,7	20,7	79,3	1 1/2"	30617,0	20,3	40,9	59,1	N° 4	39385,4	26,1	67,0	33,0	N° 10	8466,9	5,6	72,6	27,4	N° 200	37575,8	24,9	97,5	2,5	FONDO	3745,2	2,5	100,0	0,0
NUMERO DE GOLPES																																																																																					
Recipiente N°.	NL	NL	NL																																																																																		
Peso de la muestra húmeda + recipiente																																																																																					
Peso de la muestra seca + recipiente																																																																																					
Peso recipiente																																																																																					
% DE HUMEDAD																																																																																					
Recipiente N°.																																																																																					
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP																																																																																			
Peso de la muestra seca + recipiente																																																																																					
Peso recipiente																																																																																					
% DE HUMEDAD																																																																																					
Peso inicial:	151011	Peso Final	147265																																																																																		
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA																																																																																	
				100,0																																																																																	
8"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																	
6"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																	
4"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																	
3"	31220,2	20,7	20,7	79,3																																																																																	
1 1/2"	30617,0	20,3	40,9	59,1																																																																																	
N° 4	39385,4	26,1	67,0	33,0																																																																																	
N° 10	8466,9	5,6	72,6	27,4																																																																																	
N° 200	37575,8	24,9	97,5	2,5																																																																																	
FONDO	3745,2	2,5	100,0	0,0																																																																																	
LIMITE LIQUIDO 		RESULTADOS <table><tr><td>Limite Liquido</td><td>NL</td></tr><tr><td>Limite Plástico</td><td>NP</td></tr><tr><td>Índ. de Plasticidad</td><td>0,0</td></tr><tr><td>A.A.S.H.O.</td><td></td></tr><tr><td>Índice de Grupo</td><td></td></tr><tr><td>U.S.C</td><td>GP-GC</td></tr></table>	Limite Liquido	NL	Limite Plástico	NP	Índ. de Plasticidad	0,0	A.A.S.H.O.		Índice de Grupo		U.S.C	GP-GC																																																																							
Limite Liquido	NL																																																																																				
Limite Plástico	NP																																																																																				
Índ. de Plasticidad	0,0																																																																																				
A.A.S.H.O.																																																																																					
Índice de Grupo																																																																																					
U.S.C	GP-GC																																																																																				
ESPECIFICACION INVIAS 2022: ART. 220		Limite Liquido ≤ 40,0 Índice de Plasticidad ≤ Si LL>30 > (IP > 4 %)																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																					
EJECUTO:	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista)	APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo)																																																																																			



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 - ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS

FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO

DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: jueves, 14 de mayo de 2026

TRAMO: Florencia - Puerto Rico

LOCALIZACION: Pr 38+085 - Pr 38+180 - Ruta 6503

MARGEN: Calzada completa-Estribos 1-UnicaCapa

FECHA DE TOMA: jueves, 14 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO


Peso inicial:		150747,0	Peso final:		148324	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 220 -22 - Adecuado	
						Mínimo	Máximo
8"	203,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
6"	152,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
4"	101,60	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
3"	76,20	37217,2	24,69%	24,69%	75,3%	0%	100%
1 1/2"	38,10	29511	19,58%	44,27%	55,7%	0%	100%
Nº 4	4,75	38122,1	25,29%	69,55%	30,4%	0%	100%
Nº 10	2,00	8465,1	5,62%	75,17%	24,8%	0%	80%
Nº 200	0,075	35008,8	23,22%	98,39%	1,6%	0%	35%
FONDO		2422,8	1,61%	1,61%			

CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1269,3
Peso muestra seca + recip.	1204,5
Peso recipiente	192,6
% de humedad	6,4
Gravas :	69,6%
Arenas :	28,8%
Finos :	1,6%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
U.S.C.	GP
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

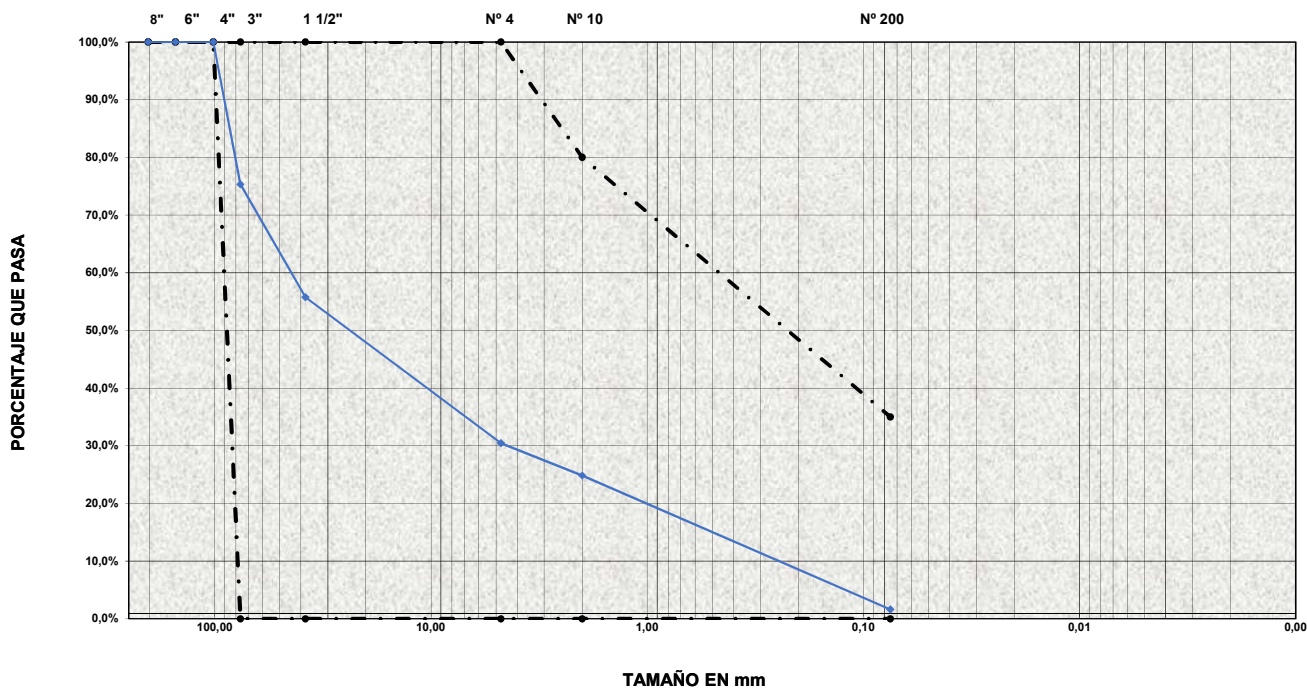

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

	DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022	Código: F-EO-056 Versión: 003 Fecha: 30/04/2025 Página 1 de 1																																																																																			
PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA" TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO		FECHA ENSAYO14 de mayo de 2026 TRAMO:Florencia - Puerto Rico LOCALIZACION:Pr 38+085 - Pr 38+180 - Ruta 6503 MARGEN:Calzada completa-Estribos 1-UnicaCapa FECHA DE TOMA:14 de mayo de 2026 No ENSAYO:																																																																																			
LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO <table><thead><tr><th>NUMERO DE GOLPES</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Recipiente N°.</td><td rowspan="4">NL</td><td rowspan="4">NL</td><td rowspan="4">NL</td></tr><tr><td>Peso de la muestra húmeda + recipiente</td></tr><tr><td>Peso de la muestra seca + recipiente</td></tr><tr><td>Peso recipiente</td></tr><tr><td>% DE HUMEDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> LIMITE PLASTICO <table><thead><tr><th>Recipiente N°.</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso de la muestra húmeda + recipiente</td><td rowspan="4">NP</td><td rowspan="4">NP</td></tr><tr><td>Peso de la muestra seca + recipiente</td></tr><tr><td>Peso recipiente</td></tr><tr><td>% DE HUMEDAD</td></tr></tbody></table>		NUMERO DE GOLPES				Recipiente N°.	NL	NL	NL	Peso de la muestra húmeda + recipiente	Peso de la muestra seca + recipiente	Peso recipiente	% DE HUMEDAD				Recipiente N°.			Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP	Peso de la muestra seca + recipiente	Peso recipiente	% DE HUMEDAD	GRANULOMETRIA <table><thead><tr><th>Peso inicial:</th><th>150747</th><th>Peso Final</th><th>148324</th></tr><tr><th>TAMIZ</th><th>PESO</th><th>% RET</th><th>% ACUM</th><th>% PASA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,0</td></tr><tr><td>8"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>6"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>4"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>3"</td><td>37217,2</td><td>24,7</td><td>24,7</td><td>75,3</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>29511,0</td><td>19,6</td><td>44,3</td><td>55,7</td></tr><tr><td>N° 4</td><td>38122,1</td><td>25,3</td><td>69,6</td><td>30,4</td></tr><tr><td>N° 10</td><td>8465,1</td><td>5,6</td><td>75,2</td><td>24,8</td></tr><tr><td>N° 200</td><td>35008,8</td><td>23,2</td><td>98,4</td><td>1,6</td></tr><tr><td>FONDO</td><td>2422,8</td><td>1,6</td><td>100,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>	Peso inicial:	150747	Peso Final	148324	TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA					100,0	8"	0,0	0,0	0,0	100,0	6"	0,0	0,0	0,0	100,0	4"	0,0	0,0	0,0	100,0	3"	37217,2	24,7	24,7	75,3	1 1/2"	29511,0	19,6	44,3	55,7	N° 4	38122,1	25,3	69,6	30,4	N° 10	8465,1	5,6	75,2	24,8	N° 200	35008,8	23,2	98,4	1,6	FONDO	2422,8	1,6	100,0	0,0
NUMERO DE GOLPES																																																																																					
Recipiente N°.	NL	NL	NL																																																																																		
Peso de la muestra húmeda + recipiente																																																																																					
Peso de la muestra seca + recipiente																																																																																					
Peso recipiente																																																																																					
% DE HUMEDAD																																																																																					
Recipiente N°.																																																																																					
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP																																																																																			
Peso de la muestra seca + recipiente																																																																																					
Peso recipiente																																																																																					
% DE HUMEDAD																																																																																					
Peso inicial:	150747	Peso Final	148324																																																																																		
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA																																																																																	
				100,0																																																																																	
8"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																	
6"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																	
4"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																	
3"	37217,2	24,7	24,7	75,3																																																																																	
1 1/2"	29511,0	19,6	44,3	55,7																																																																																	
N° 4	38122,1	25,3	69,6	30,4																																																																																	
N° 10	8465,1	5,6	75,2	24,8																																																																																	
N° 200	35008,8	23,2	98,4	1,6																																																																																	
FONDO	2422,8	1,6	100,0	0,0																																																																																	
LIMITE LIQUIDO 		RESULTADOS <table><tr><td>Limite Liquido</td><td>NL</td></tr><tr><td>Limite Plástico</td><td>NP</td></tr><tr><td>Índ. de Plasticidad</td><td>0,0</td></tr><tr><td>A.A.S.H.O.</td><td></td></tr><tr><td>Índice de Grupo</td><td></td></tr><tr><td>U.S.C</td><td>GP-GC</td></tr></table>	Limite Liquido	NL	Limite Plástico	NP	Índ. de Plasticidad	0,0	A.A.S.H.O.		Índice de Grupo		U.S.C	GP-GC																																																																							
Limite Liquido	NL																																																																																				
Limite Plástico	NP																																																																																				
Índ. de Plasticidad	0,0																																																																																				
A.A.S.H.O.																																																																																					
Índice de Grupo																																																																																					
U.S.C	GP-GC																																																																																				
ESPECIFICACION INVIAS 2022: ART. 220		<table><tr><td>Limite Liquido</td><td>≤</td><td>40,0</td></tr><tr><td>Índice de Plasticidad</td><td>≤</td><td>Si LL>30 > (IP > 4 %)</td></tr></table>	Limite Liquido	≤	40,0	Índice de Plasticidad	≤	Si LL>30 > (IP > 4 %)																																																																													
Limite Liquido	≤	40,0																																																																																			
Índice de Plasticidad	≤	Si LL>30 > (IP > 4 %)																																																																																			
OBSERVACIONES:																																																																																					
EJECUTO:	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista)	APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo)																																																																																			



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 - ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS

FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO

DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: sábado, 16 de mayo de 2026

TRAMO: Florencia - Puerto Rico

LOCALIZACION: Pr 38+350 - Pr 38+400 - Ruta 6503

MARGEN: Calzada completa-Estribos 1-UnicaCapa

FECHA DE TOMA: sábado, 16 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO


Peso inicial:		152031,0	Peso final:		148706	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 220 -22 - Adecuado	
						Mínimo	Máximo
8"	203,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
6"	152,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
4"	101,60	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
3"	76,20	34221	22,51%	22,51%	77,5%	0%	100%
1 1/2"	38,10	32578,8	21,43%	43,94%	56,1%	0%	100%
Nº 4	4,75	31416	20,66%	64,60%	35,4%	0%	100%
Nº 10	2,00	9322,8	6,13%	70,73%	29,3%	0%	80%
Nº 200	0,075	41167,2	27,08%	97,81%	2,2%	0%	35%
FONDO		3325,2	2,19%	2,19%			

CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1253,9
Peso muestra seca + recip.	1190,5
Peso recipiente	168,1
% de humedad	6,2
Gravas :	64,6%
Arenas :	33,2%
Finos :	2,2%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
U.S.C.	GP
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

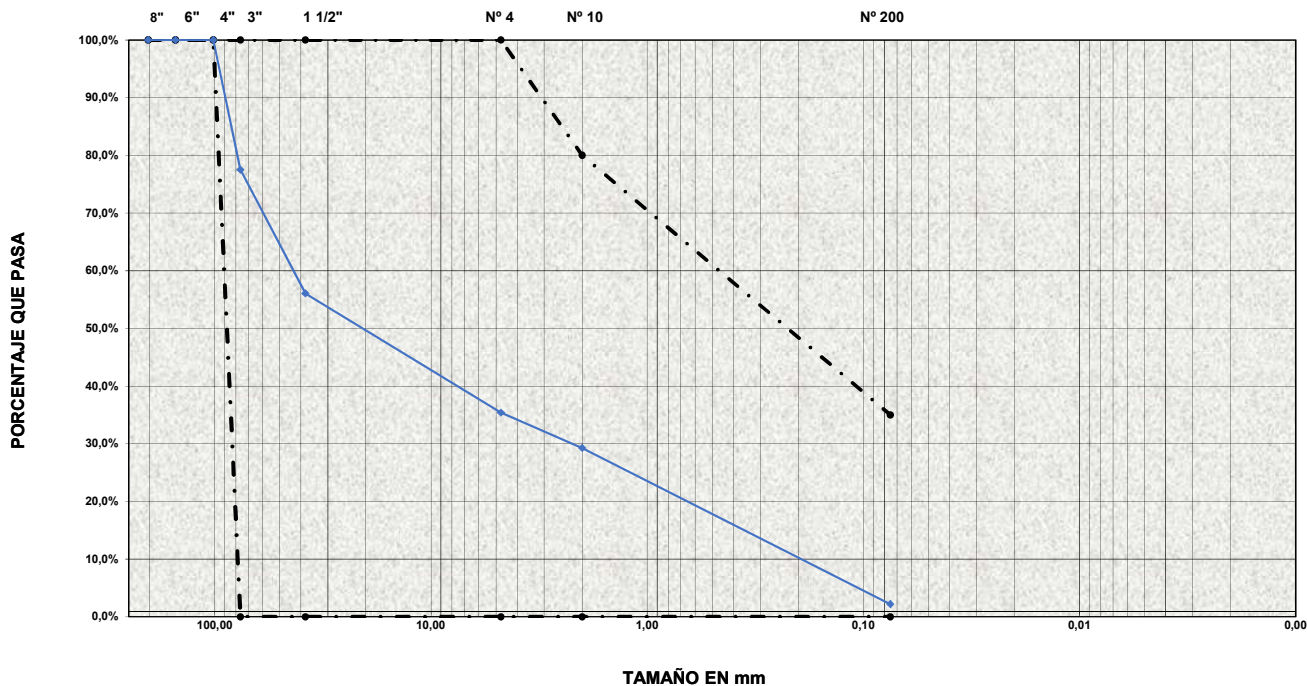

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

	DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022	Código: F-EO-056 Versión: 003 Fecha: 30/04/2025 Página 1 de 1																																																																																								
PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA" TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO		FECHA ENSAYO16 de mayo de 2026 TRAMO:Florencia - Puerto Rico LOCALIZACION:Pr 38+350 - Pr 38+400 - Ruta 6503 MARGEN:Calzada completa-Estribos 1-UnicaCapa FECHA DE TOMA:16 de mayo de 2026 No ENSAYO:																																																																																								
LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO <table><thead><tr><th>NUMERO DE GOLPES</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Recipiente N°.</td><td rowspan="3">NL</td><td rowspan="3">NL</td><td rowspan="3">NL</td></tr><tr><td>Peso de la muestra húmeda + recipiente</td></tr><tr><td>Peso de la muestra seca + recipiente</td></tr><tr><td>Peso recipiente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>% DE HUMEDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> LIMITE PLASTICO <table><thead><tr><th>Recipiente N°.</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso de la muestra húmeda + recipiente</td><td rowspan="3">NP</td><td rowspan="3">NP</td></tr><tr><td>Peso de la muestra seca + recipiente</td></tr><tr><td>Peso recipiente</td></tr><tr><td>% DE HUMEDAD</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		NUMERO DE GOLPES				Recipiente N°.	NL	NL	NL	Peso de la muestra húmeda + recipiente	Peso de la muestra seca + recipiente	Peso recipiente				% DE HUMEDAD				Recipiente N°.			Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP	Peso de la muestra seca + recipiente	Peso recipiente	% DE HUMEDAD			GRANULOMETRIA <table><thead><tr><th>Peso inicial:</th><th>152031</th><th>Peso Final</th><th>148706</th></tr><tr><th>TAMIZ</th><th>PESO</th><th>% RET</th><th>% ACUM</th><th>% PASA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,0</td></tr><tr><td>8"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>6"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>4"</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>100,0</td></tr><tr><td>3"</td><td>34221,0</td><td>22,5</td><td>22,5</td><td>77,5</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>32578,8</td><td>21,4</td><td>43,9</td><td>56,1</td></tr><tr><td>N° 4</td><td>31416,0</td><td>20,7</td><td>64,6</td><td>35,4</td></tr><tr><td>N° 10</td><td>9322,8</td><td>6,1</td><td>70,7</td><td>29,3</td></tr><tr><td>N° 200</td><td>41167,2</td><td>27,1</td><td>97,8</td><td>2,2</td></tr><tr><td>FONDO</td><td>3325,2</td><td>2,2</td><td>100,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>	Peso inicial:	152031	Peso Final	148706	TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA					100,0	8"	0,0	0,0	0,0	100,0	6"	0,0	0,0	0,0	100,0	4"	0,0	0,0	0,0	100,0	3"	34221,0	22,5	22,5	77,5	1 1/2"	32578,8	21,4	43,9	56,1	N° 4	31416,0	20,7	64,6	35,4	N° 10	9322,8	6,1	70,7	29,3	N° 200	41167,2	27,1	97,8	2,2	FONDO	3325,2	2,2	100,0	0,0
NUMERO DE GOLPES																																																																																										
Recipiente N°.	NL	NL	NL																																																																																							
Peso de la muestra húmeda + recipiente																																																																																										
Peso de la muestra seca + recipiente																																																																																										
Peso recipiente																																																																																										
% DE HUMEDAD																																																																																										
Recipiente N°.																																																																																										
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP																																																																																								
Peso de la muestra seca + recipiente																																																																																										
Peso recipiente																																																																																										
% DE HUMEDAD																																																																																										
Peso inicial:	152031	Peso Final	148706																																																																																							
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA																																																																																						
				100,0																																																																																						
8"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																						
6"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																						
4"	0,0	0,0	0,0	100,0																																																																																						
3"	34221,0	22,5	22,5	77,5																																																																																						
1 1/2"	32578,8	21,4	43,9	56,1																																																																																						
N° 4	31416,0	20,7	64,6	35,4																																																																																						
N° 10	9322,8	6,1	70,7	29,3																																																																																						
N° 200	41167,2	27,1	97,8	2,2																																																																																						
FONDO	3325,2	2,2	100,0	0,0																																																																																						
LIMITE LIQUIDO 		RESULTADOS <table><tr><td>Limite Liquido</td><td>NL</td></tr><tr><td>Limite Plástico</td><td>NP</td></tr><tr><td>Índ. de Plasticidad</td><td>0,0</td></tr><tr><td>A.A.S.H.O.</td><td></td></tr><tr><td>Índice de Grupo</td><td></td></tr><tr><td>U.S.C</td><td>GP-GC</td></tr></table>	Limite Liquido	NL	Limite Plástico	NP	Índ. de Plasticidad	0,0	A.A.S.H.O.		Índice de Grupo		U.S.C	GP-GC																																																																												
Limite Liquido	NL																																																																																									
Limite Plástico	NP																																																																																									
Índ. de Plasticidad	0,0																																																																																									
A.A.S.H.O.																																																																																										
Índice de Grupo																																																																																										
U.S.C	GP-GC																																																																																									
ESPECIFICACION INVIAS 2022: ART. 220		Limite Liquido ≤ 40,0 Índice de Plasticidad ≤ Si LL>30 > (IP > 4 %)																																																																																								
OBSERVACIONES:																																																																																										
EJECUTO:	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista)	APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo)																																																																																								



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 - ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS

FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO

DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: miércoles, 27 de mayo de 2026

TRAMO: Florencia - Puerto Rico

LOCALIZACION: Pr 38+175 - Pr 38+260.c.d. -----
Pr 38+240 - Pr 38+260.c.c. - Ruta 6503

MARGEN: Estribo 1-Unica Capa

FECHA DE TOMA: miércoles, 27 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO


Peso inicial:		150072,0	Peso final:		146342	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 220 -22 - Adecuado	
						Mínimo	Máximo
8"	203,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
6"	152,20	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
4"	101,60	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
3"	76,20	31024,5	20,67%	20,67%	79,3%	0%	100%
1 1/2"	38,10	30425,1	20,27%	40,95%	59,1%	0%	100%
Nº 4	4,75	39138,6	26,08%	67,03%	33,0%	0%	100%
Nº 10	2,00	8413,8	5,61%	72,63%	27,4%	0%	80%
Nº 200	0,075	37340,4	24,88%	97,51%	2,5%	0%	35%
FONDO		3729,6	2,49%	2,49%			

CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1716,4
Peso muestra seca + recip.	1626,8
Peso recipiente	203,9
% de humedad	6,3
Gravas :	67,0%
Arenas :	30,5%
Finos :	2,5%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
U.S.C.	GP
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

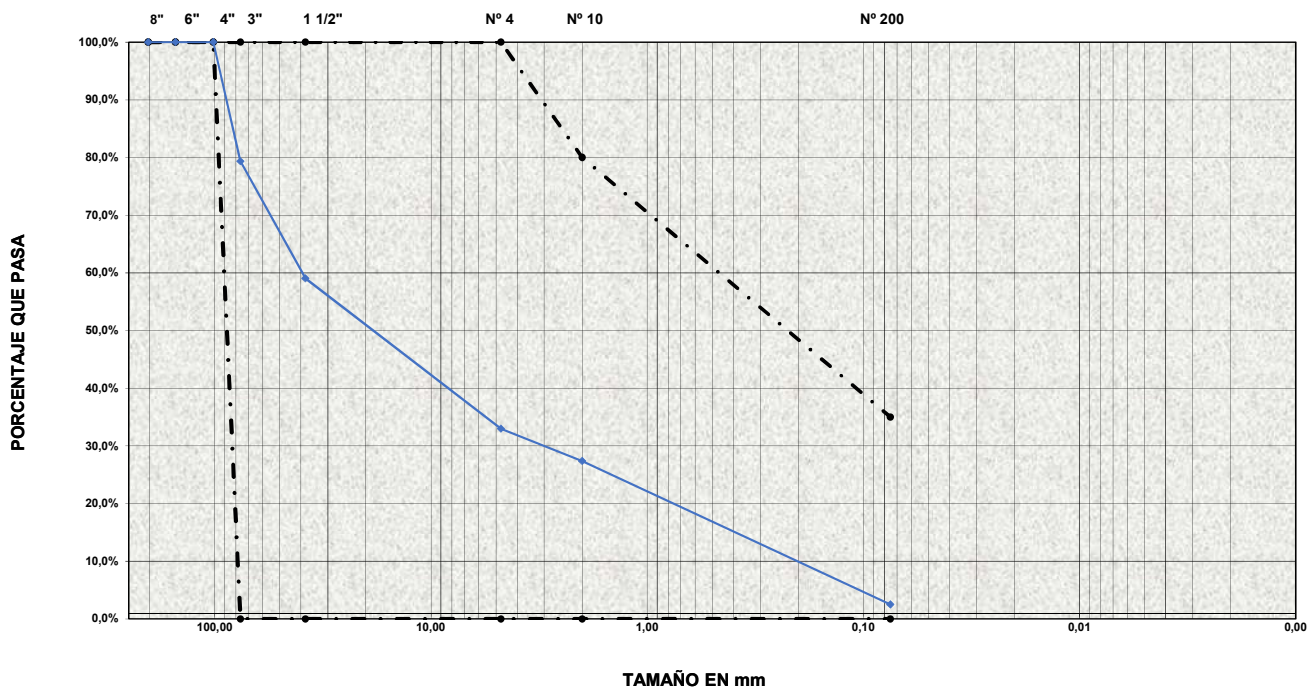

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: TERRAPLEN - SUELOS ADECUEADOS

FUENTE: RIO DONCELLO - DIVISO

DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: 27 de mayo de 2026

TRAMO: Florencia - Puerto Rico

LOCALIZACION: Pr 38+175 - Pr 38+260.c.d. -----
Pr 38+240 - Pr 38+260.c.c. - Ruta 6503

MARGEN: Estribo 1-Unica Capa

FECHA DE TOMA: 27 de mayo de 2026

No ENSAYO:

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	150072		Peso Final	146342	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA	
				100,0	
8"	0,0	0,0	0,0	100,0	
6"	0,0	0,0	0,0	100,0	
4"	0,0	0,0	0,0	100,0	
3"	31024,5	20,7	20,7	79,3	
1 1/2"	30425,1	20,3	40,9	59,1	
Nº 4	39138,6	26,1	67,0	33,0	
Nº 10	8413,8	5,6	72,6	27,4	
Nº 200	37340,4	24,9	97,5	2,5	
FONDO	3729,6	2,5	100,0	0,0	

LIMITE LIQUIDO

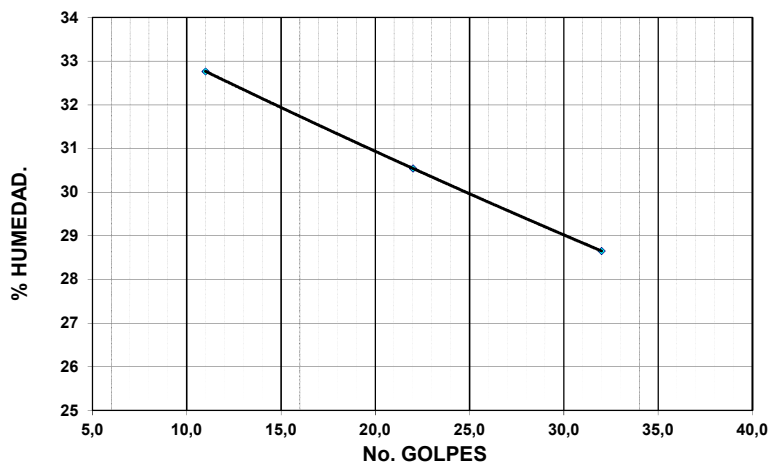

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022: ART. 220

Limite Liquido	≤	40,0
Índice de Plasticidad	≤	Si LL>30 > (IP > 4 %)

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022		CODIGO: F-EQ-048			
			VERSION: 003			
			FECHA: 30/04/2025			
			PÁGINA 1 DE 2			
PROYECTO:	CORREDORES VIALES	NEIVA	FLORENCIA	FECHA ENSAYO:	lunes, 11 de mayo de 2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			TRAMO:	Floresencia - Puerto rico Ruta 6503	
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA			LOCALIZACION:	Unidad Industrial	
MATERIAL:	TERRAPLEN			MARGEN:	Acopio	
FUENTE:	RIO DONCELLO - DIVISO			FECHA MUESTRA:	lunes, 11 de mayo de 2026	
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO			No DE ENSAYO:	-	


DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
No. de Golpes	56	56	56	56
Molde No.	1	1	1	1
No. de Capas	5	5	5	5
Masa muestra húmeda + molde, (g).	7616,00	7772,00	7863,00	7927,00
Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00
Masa muestra húmeda, (g).	4656,00	4812,00	4903,00	4967
Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,200	2,274	2,317	2,347
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,071	2,101	2,102	2,086

HUMEDAD				
Recipiente No.	27	33	60	20
Masa rec. + Muestra Hum. (g).	1013,00	1150,90	1052,80	1099,30
Masa rec. + Muestra Seca (g).	964,70	1079,00	973,30	999,40
Masa Recipiente (g).	191,20	203,70	196,00	202,10
Contenido de Humedad (%)	6,2	8,2	10,2	12,5


HUMEDAD			
PRUEBA	1	2	3
No. de Golpes	56	25	10
Molde No.	4	5	6
No. de Capas	5	5	5
Masa muestra húmeda + molde, (g).	8793,00	8614,00	8402,00
Masa molde, (g).	3999,00	3967,00	3966,00
Masa muestra húmeda, (g).	4794,00	4647,00	4436,00
Volumen molde, cm3	2125,00	2125,00	2125,00
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,256	2,187	2,088
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,068	2,004	1,913

HUMEDAD			
Recipiente No.	33	27	25
Masa rec. + Muestra Hum. (g).	1270,20	1291,90	1290,80
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1181,20	1200,00	1199,20
Masa Recipiente (g).	203,70	191,20	193,30
Contenido de Humedad (%)	9,1	9,1	9,1

CURVA PROCTOR

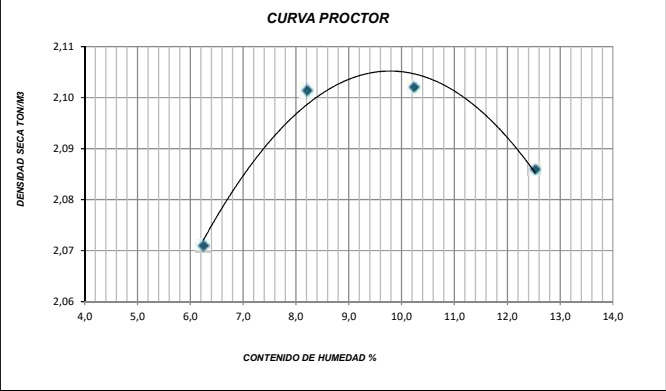

CBR vs DENSIDAD SECA MAXIMA

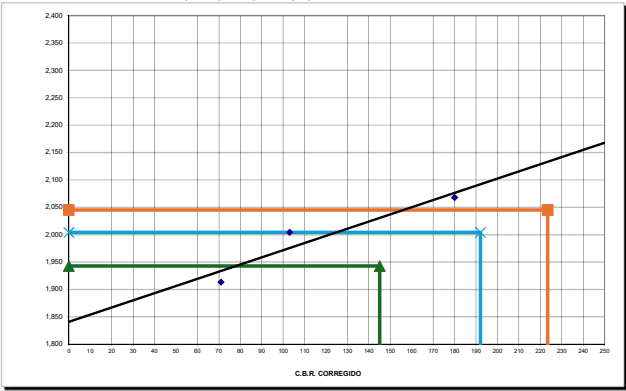

RESULTADOS DEL ENSAYO		
DENSIDAD MAX.	2,102	gr/cm3
HUMEDAD OPTIMA	10,23	%
% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%

CBR CORREG. A 01	56	25	10
CBR CORREG. A 02	121	62	40
	180	103	71

ELABORA:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)



Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero



Firma Ingeniero (VoBo)

**CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA**

NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-048

VERSION: 003

FECHA: 30/04/2025


PAGINA 2 DE 2

PROYECTO:
CONTRATISTA:
OBRA:
MATERIAL:
FUENTE:
DESCRIPCION:

CORREDORES VIALES
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TERRAPLEN
RIO DONCELLO - DIVISO
MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO : viernes, 15 de mayo de 2026
TRAMO
LOCALIZACIÓN
MARGEN
FECHA MUESTRA: lunes, 11 de mayo de 2026
N° ENSAYO:

No. DE GOLPES	10	25	56			
Molde.	6	5	4			
Masa sobrecarga utilizada (g)	4542	4542	4542			
Días de inmersión	4	4	4			
Lectura inicial (mm)	0	0	0			
Lectura Final (mm)	0	0	0			
% Expansión total	0	0	0			
Humedad de penetración.	12,2	11,3	10,6			
Penetración en milímetros	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,630	0,68	0,35	1,13	0,58	1,76	0,91
1,270	1,63	0,85	2,13	1,10	3,57	1,85
1,910	2,70	1,40	3,37	1,74	5,89	3,05
2,540	3,78	1,96	5,05	2,61	8,41	4,35
3,180	4,90	2,54	6,87	3,56	11,09	5,74
3,810	5,97	3,09	8,57	4,43	13,81	7,15
4,450	6,91	3,58	10,24	5,30	16,35	8,46
5,080	8,89	4,61	12,71	6,58	18,55	9,60
7,620	12,87	6,67	18,51	9,58	26,76	13,85
				0,00		0,00

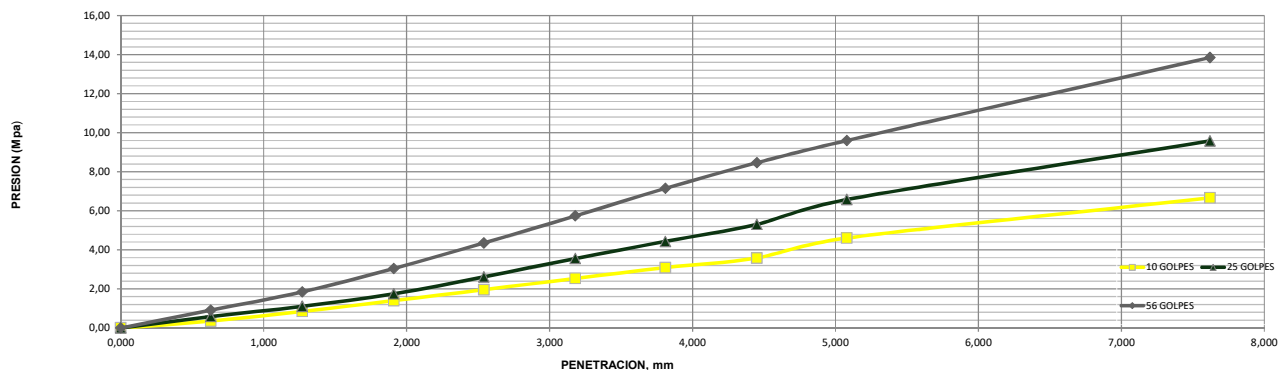

CBR AL 100%	200
CBR AL 98%	168
CBR AL 95%	119

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022: Art. 220 ≥

ELABORA:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



**DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR
IGNICION**

NORMA I.N.V. E - 121 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-89

Versión: 003

Fecha:30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA:	14/05/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	PR 38+200
OBRA:	NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	ruta 6503
TIPO DE MATERIAL:	TERRAPLEN	MARGEN:	
FUENTE:	RIO DONCELLO - DIVISO	FECHA DE TOMA:	14 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

RESULTADOS DE LABORATORIO

Prueba No.		1
Peso suelo seco al horno antes de ignición	gr	40.0
Peso suelo seco despues de ignición	gr	39.63
PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA		0.92%

ESPECIFICACION INVIAS 2022: Art. 220	Suelo Adecuado	≤	1%
--------------------------------------	----------------	---	----

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



**DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR
IGNICION**

NORMA I.N.V. E - 121 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-89

Versión: 003

Fecha:30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA:	27/05/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	PR 38+200
OBRA:	NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	ruta 6503
TIPO DE MATERIAL:	TERRAPLEN	MARGEN:	
FUENTE:	RIO DONCELLO - DIVISO	FECHA DE TOMA:	27 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

RESULTADOS DE LABORATORIO

Prueba No.	1
Peso suelo seco al horno antes de ignición	gr 40.0
Peso suelo seco despues de ignición	gr 39.68
PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA	0.80%

ESPECIFICACION INVIAS 2022: Art. 220

Suelo Adecuado

≤

1%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)


Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

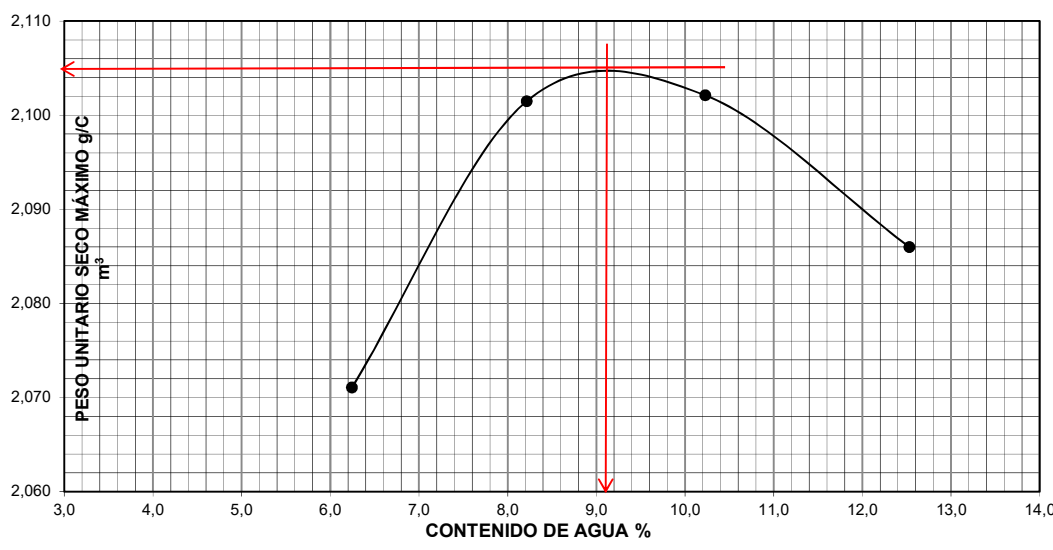		DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022		CÓDIGO: F-EO-057 VERSIÓN: 003 FECHA: 30/04/2025 PÁGINA 1 DE 1																																																																																					
PROYECTO: CONTRATISTA: OBRA: TIPO DE MATERIAL: FUENTE:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,		FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026																																																																																					
	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		TRAMO:	Florencia - Puerto Rico																																																																																					
	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"		LOCALIZACION:	Pr 38+085 - 38+260 Ruta 6503																																																																																					
	TERRAPLEN		MARGEN:	Calzada completa																																																																																					
	RIO DONCELLO - DIVISO		No ENSAYO:																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETERMINACION</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso Molde + material húmedo (g)</td> <td>7616</td> <td>7772</td> <td>7863</td> <td>7927</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso del molde (g)</td> <td>2960</td> <td>2960</td> <td>2960</td> <td>2960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso material húmedo (g)</td> <td>4656</td> <td>4812</td> <td>4903</td> <td>4967</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volúmen del molde (g/cm³)</td> <td>2116</td> <td>2116</td> <td>2116</td> <td>2116</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Densidad húmeda (g/cm³)</td> <td>2,200</td> <td>2,274</td> <td>2,317</td> <td>2,347</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">CALCULO DE HUMIDADES</td> </tr> <tr> <td>Cápsula + material húmedo (g)</td> <td>1013,0</td> <td>1150,9</td> <td>1052,8</td> <td>1099,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cápsula + material seco (g)</td> <td>964,7</td> <td>1079,0</td> <td>973,3</td> <td>999,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso del agua (g)</td> <td>48,3</td> <td>71,9</td> <td>79,5</td> <td>99,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso de la cápsula (g)</td> <td>191,2</td> <td>203,7</td> <td>196,0</td> <td>202,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peso material seco (g)</td> <td>773,5</td> <td>875,3</td> <td>777,3</td> <td>797,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contenido de agua %</td> <td>6,2</td> <td>8,2</td> <td>10,2</td> <td>12,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Densidad seca de la muestra seca (gr/cm³)</td> <td>2,071</td> <td>2,101</td> <td>2,102</td> <td>2,086</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DETERMINACION	1	2	3	4		Peso Molde + material húmedo (g)	7616	7772	7863	7927		Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960		Peso material húmedo (g)	4656	4812	4903	4967		Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116		Densidad húmeda (g/cm ³)	2,200	2,274	2,317	2,347		CALCULO DE HUMIDADES						Cápsula + material húmedo (g)	1013,0	1150,9	1052,8	1099,3		Cápsula + material seco (g)	964,7	1079,0	973,3	999,4		Peso del agua (g)	48,3	71,9	79,5	99,9		Peso de la cápsula (g)	191,2	203,7	196,0	202,1		Peso material seco (g)	773,5	875,3	777,3	797,3		Contenido de agua %	6,2	8,2	10,2	12,5		Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,071	2,101	2,102	2,086	
DETERMINACION	1	2	3	4																																																																																					
Peso Molde + material húmedo (g)	7616	7772	7863	7927																																																																																					
Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960																																																																																					
Peso material húmedo (g)	4656	4812	4903	4967																																																																																					
Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116																																																																																					
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,200	2,274	2,317	2,347																																																																																					
CALCULO DE HUMIDADES																																																																																									
Cápsula + material húmedo (g)	1013,0	1150,9	1052,8	1099,3																																																																																					
Cápsula + material seco (g)	964,7	1079,0	973,3	999,4																																																																																					
Peso del agua (g)	48,3	71,9	79,5	99,9																																																																																					
Peso de la cápsula (g)	191,2	203,7	196,0	202,1																																																																																					
Peso material seco (g)	773,5	875,3	777,3	797,3																																																																																					
Contenido de agua %	6,2	8,2	10,2	12,5																																																																																					
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,071	2,101	2,102	2,086																																																																																					
				Método empleado C % Pasa Tamiz No 200 Límite líquido NI Índice de plasticidad 0 CLASIFICACIÓN U.S.C. AASHTO DENSIDAD MÁXIMA (g/cm³) 2,105 HUMEDAD ÓPTIMA % 9,1																																																																																					
OBSERVACIONES		C.b.r. # 1																																																																																							
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO		EJECUTO		APROBÓ																																																																																					
INV E - 142		SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA		FERNEY EDUARDO ARIAS																																																																																					
		LABORATORISTA		VoBo INGENIERO																																																																																					

**PRESIÓN DE EXPANSIÓN "EXPANSIÓN LIBRE EN
CONSOLIDOMETRO"**
(ASTM D 4546/ESPEC. INVIAS 2022)

Código: F-EO-108

Versión:001

Fecha: 15/12/2025

Pag: 1 de 1

Obra

CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN -
PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y
CAQUETA

Procedencia

RIO DOCELLO - DIVISO

Muestra

1

Material

TERRAPLEN

Fecha

miércoles, 27 de mayo de 2026

Localizacion

RUTA 6503. PR 38+085 -- PR 38+260.CC


Especificacion

ARTICULO 220 - 22

Parametro

ASTM D4546 "MÉTODO B"

Tiempo (min)	Deformación (mm)	Deformación unitaria (%)	Tiempo (min)	Deformación (mm)	Deformación unitaria (%)	Resistencia a la compresión	
0,1	0,000	0,000	540	0,017	0,085	Diámetro muestra (mm)	51
0,25	0,007	0,035	600	0,018	0,090	Área (mm ²)	2026,8
0,5	0,007	0,035	660	0,019	0,095	Altura (mm)	20
1	0,008	0,040	720	0,019	0,095	Volumen (cm ³)	40,54
2	0,009	0,045	780	0,020	0,100		
3	0,010	0,050	840	0,021	0,105	P anillo+sh (g)	181,87
4	0,010	0,050	900	0,022	0,110	P anillo (g)	103,74
8	0,010	0,050	960	0,023	0,115	PORCENTAJE DE EXPANSIÓN (%)=	0,180
15	0,011	0,055	1020	0,023	0,115		
30	0,011	0,055	1080	0,026	0,130	Humedad	
60	0,012	0,060	1140	0,027	0,135		
120	0,012	0,060	1200	0,029	0,145	Tara No.	13,0
180	0,013	0,065	1260	0,030	0,150	Peso Tara + Sh	74,80
240	0,014	0,070	1320	0,032	0,160	Peso Tara + Ss	72,30
300	0,014	0,070	1380	0,035	0,175	Peso Tara	43,30
360	0,015	0,075	1440	0,036	0,180	% humedad	8,62
420	0,015	0,075				Presión de Asentamiento	6,9 Kpa
480	0,016	0,080					

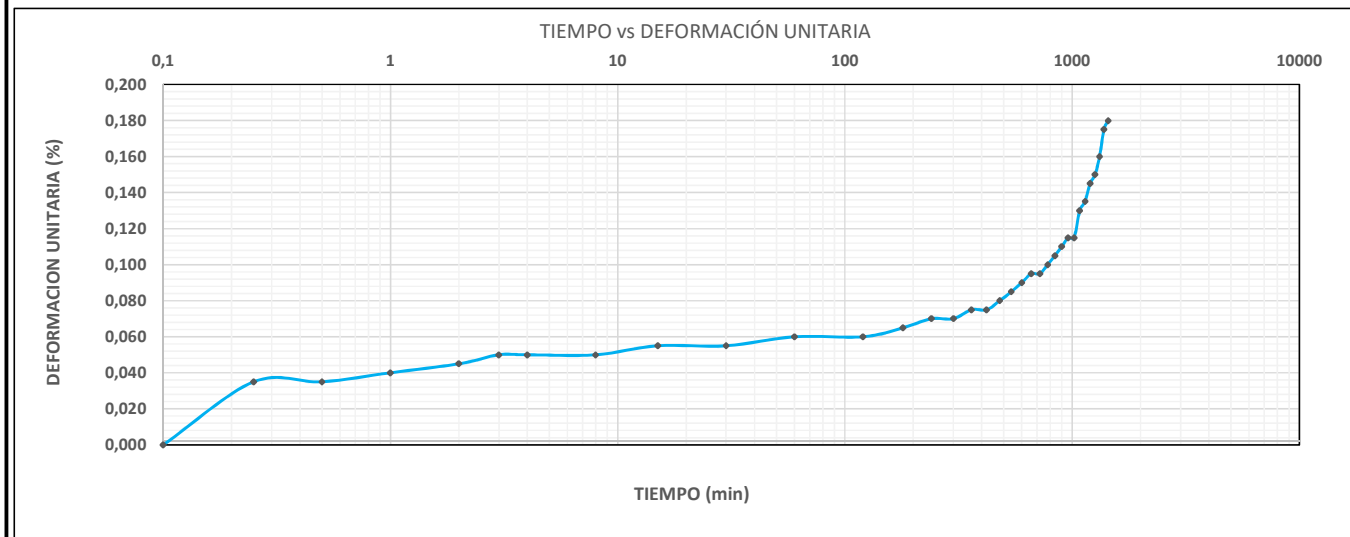

Observaciones

Expansion libre inferior al 2 %, según la norma ASTM D4546.

ELABORO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Firma (Laboratorista)

REVISO/APROBO

FERNEY EDUARDO ARIAS

Firma Ingeniero (VoBo)



Determinación del Contenido De Sales Solubles En Los Suelos

NORMA I.N.V. E - 158 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

F-EO-090

Versión:002

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA. EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA:	sábado, 16 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO	FLORENCIA - PTO RICO
TRAMO DE OBRA:	CTTO 991-2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION	ruta 6503
TIPO DE MATERIAL:	TERRAPLEN - SUELOS ADECUADOS		
FUENTE:	RIO DONCELLO - DIVISO		
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO		

Ensayo :	Nº	1	2
Masa inicial del suelo, Ms	gr		50,1
Volumen inicial del Agua Destilada, V	ml		500
Volumen Del Extracto Acuoso, Ve	ml		100
Masa Del Crisol + Masa Muestra Seca, M1	gr	210,57	202,11
Masa Del Crisol Seco Despues De Lavado, M2	gr	210,55	202,09
Masa Del Residuo Del Crisol, Mr	gr	0,0190	0,0160
Contenido De Sales Con Respecto a La Masa Del Suelo Seco, S	%	0,190	0,160
Residuo De Sales Solubles Por Litro De Extracto Acuoso, rs	g/l	0,190	0,160
Contenido de Sales Solubles Promedio Ss :	%		0,175

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022 : Art. 220

suelos seleccionados Maximo (0,2) %

Cumple	SI	X		NO	
--------	----	---	--	----	--

EJECUTÓ:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBÓ:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre (Ingeniero)

Firma (Ingeniero)



**MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO
PARCIALMENTE SATURADO
NORMA I.N.V. E - 157 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022**

Cod: F-EO-066
Versión: 002
Fecha: 30/04/2025
Pág: 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DPTOS DE HUILA	FECHA:	viernes, 22 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	FLORENCIA - PTO RICO
OBRA:	FLORENCIA - PTO RICO	LOCALIZACION:	ruta 6503
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	TERRAPLEN	MARGEN	
FUENTE:	RIO DONCELLO - DIVISO	N° ENSAYO :	

DATOS DE LA MUESTRA		INICIAL	FINAL	DATOS MOLDE	
Altura muestra (mm)		20	18,48	Peso molde (g)	103,74
Peso muestra humeda+ molde (g)		182,05	187,06	Area molde (mm2)	2026,83
Peso muestra humeda (g)		78,31	83,32		
Peso muestra seca (g)		72,04	72,58		
Altura solidos (mm)		16,38	16,50	Presión de asentamiento o fijamiento a 5 Kpa (5 minutos)	Lect (mm)
Humedad		8,7	14,8		0,0
Peso específico (g/cm3)		2,170	2,170		
Densidad material (g/cm3)		1,777	1,937		

DATOS MUESTRA SECA

Presion (Kpa)	H inicial (mm)	Lectura (0,002 mm)	Deformacion (mm)	Vacios 2H-2Ho	Relacion de vacios e	Deformación %
5,1	20,00	0,000	0,000	3,62	0,221	0,00%
12,7	18,598	701,0	1,402	2,22	0,136	7,01%
25,5	18,555	722,5	1,445	2,18	0,133	7,23%
50,9	18,546	727,0	1,454	2,17	0,132	7,27%
101,9	18,536	732,0	1,464	2,16	0,132	7,32%
203,8	18,523	738,5	1,477	2,15	0,131	7,39%

DATOS MUESTRA INUNDADA

203,8	18,504	748,0	1,496	2,13	0,130	7,48%
407,5	18,488	756,0	1,512	2,11	0,129	7,56%
815,1	18,484	758,0	1,516	2,11	0,129	7,58%

Δh = cambio de altura del especimen por inundacion, mm

0,019


ho = altura inicial del especimen, mm.

20,00

Índice colapso (Ie)

0,095%

DEFORMACION VS PRESION

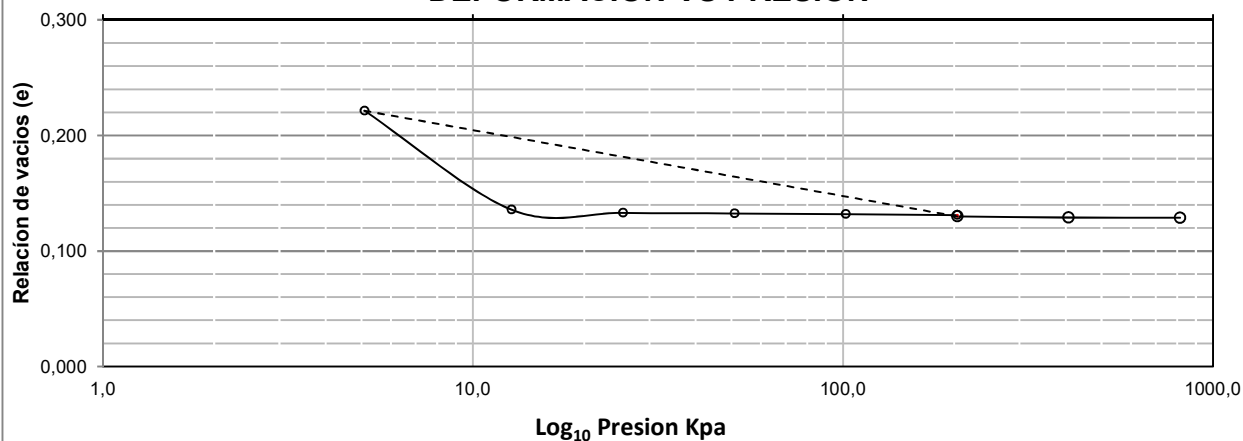

Observaciones: Especificación % maximo 1,0 **SI CUMPLE**
% Porcentaje Maximo 1 - Según Especificación INVE-A-220-22

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

ELABORÓ:

Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS

Jefe Laboratorio

APROBÓ:

Firma Jefe Laboratorio (VoBo)

Ensayos
Piedra Filtro
Zona Industrial
Proyecto 132

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:

CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,
EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA:

CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA

TIPO DE MATERIAL:

PIEDRA FILTRO

FUENTE:

UNIDAD INDUSTRIAL KMA

DESCRIPCION:

MATERIAL DE RIO EL AGUILA

FECHA ENSAYO

lunes, 4 de mayo de 2026

TRAMO:

Florencia - San Vicente

LOCALIZACION:

RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-
PR8+230-PR6+875-PR8+180

MARGEN:

FECHA DE TOMA:

lunes, 4 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO

Peso inicial:		20719,8	Peso final:		20718	ESPEC. INVIAS 2022	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	ARTICULO 673 - 2022	
						Mínimo	Máximo
4"	100	0			100,0%	N.A	N.A
3"	75,00	5771	27,85%	27,85%	72,1%	N.A	N.A
2 1/2"	63,00	3361	16,22%	44,07%	55,9%	N.A	N.A
2"	50,00	3126	15,09%	59,16%	40,8%	N.A	N.A
1 1/2"	37,50	4507	21,75%	80,91%	19,1%	N.A	N.A
1"	25,00	3825	18,46%	99,37%	0,6%	N.A	N.A
3/4"	19,00	128,0	0,62%	99,99%	0,0%	N.A	N.A
FONDO			0,00%				


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	2833,00
Peso muestra seca + recip.	2825
Peso recipiente	196
% de humedad	0,3

Gravas :	100,0%
Arenas :	N.A
Finos :	N.A
A.A.S.H.T.O. :	N.A
Índice de Grupo	N.A
U.S.C.	N.A
Limite Líquido :	N.A
Limite Plástico :	N.A
Índice de Plasticidad :	N.A

CURVA GRANULOMETRICA

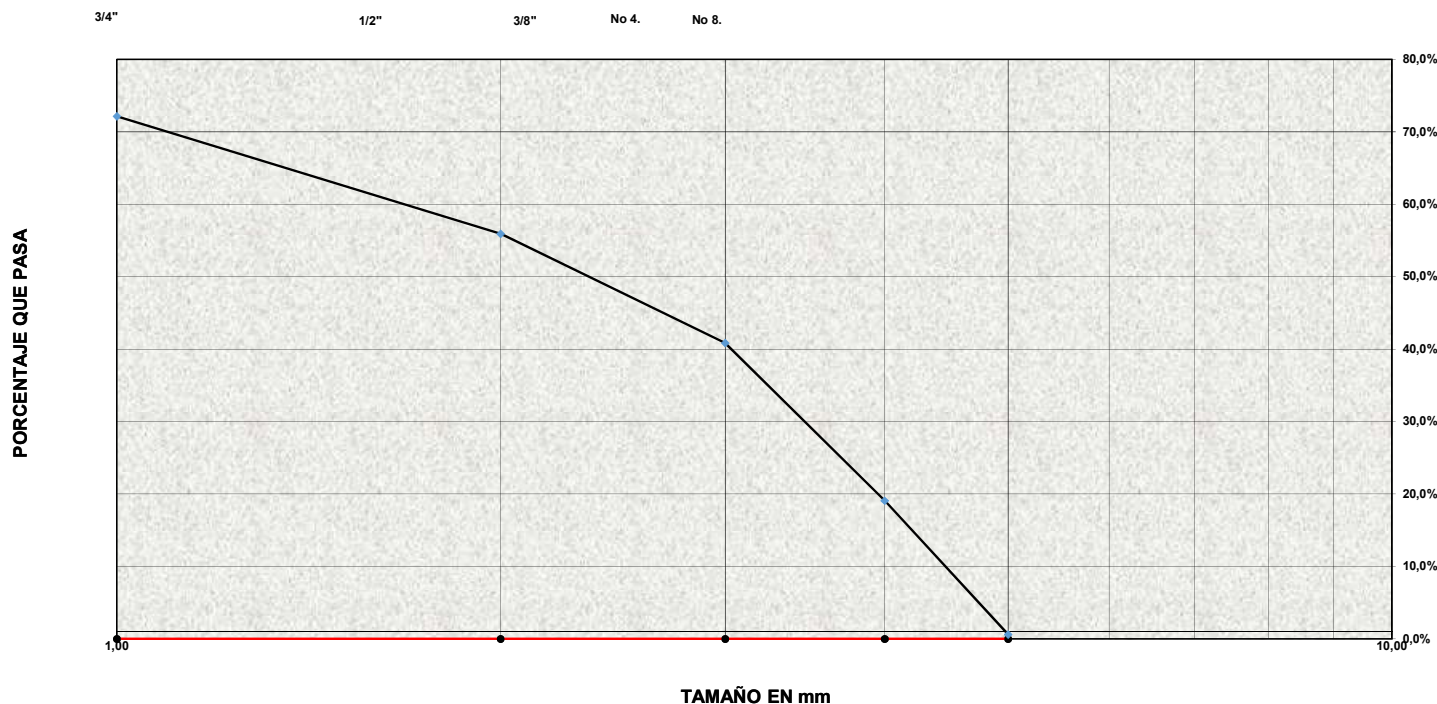

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)




Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero



Firma Ingeniero (VoBo)



**RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm
(3/4") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES**
NORMA I.N.V. E - 219 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-051
Versión: 002
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Florencia - San vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070- PR8+230-PR6+875-PR8+180
TIPO DE MATERIAL:	PIEDRA FILTRO	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDA INDUSTRIAL KMA	FECHA DE ENSAYO:	19 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL RIO EL AGUILA	No ENSAYO:	

TABLA 1 Y 2 INVIAS 218 - 219 DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
TAMAÑOS		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA, (g)						
PASA	RETENIDO	A	B	C	D	E	F	G
3 "	2 1/2 "					2500 ± 50		
2 1/2 "	2 "					2500 ± 50		
2 "	1 1/2 "					5000 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2 "	1 "	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
1 "	3/4 "	1250 ± 25						5000 ± 25
3/4 "	1/2 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
1/2 "	3/8 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
3/8 "	1/4 "			2500 ± 10				
1/4 "	No. 4			2500 ± 10				
No. 4	No. 8				5000 ± 10			
No. DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
No. DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000

Prueba en:	Seco	Seco	Húmedo	Rel: Hum/Sec
Gradación utilizada	E			
Numero de esferas a ser utilizadas	12			
Numero de revoluciones	1000			
Peso de la muestra antes del ensayo, grs	10070			
Peso de la muestra después del ensayo, grs	7126			
Perdida por desgaste, grs	2944			
% DE DESGASTE	29,2			
ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022:ART. 673	≤ 40%			

OBSERVACIONES: _____

EJECUTO:



SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

LABORATORISTA

APROBO:



FERNEY EDUARDO ARIAS

VoBo INGENIERO



DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS

NORMA I.N.V. E - 211 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-059

VERSIÓN: 003

FECHA: 30/04/2025

PAGINA 1 DE 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA DE ENSAYO	15 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Florencia - San vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180
TIPO DE MATERIAL:	PIEDRA FILTRO	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA	FECHA DE TOMA:	14 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO EL AGUILA	No DE ENSAYO:	-

FRACCION DEL AGREGADO GRUESO

TAMIZ		PESO INICIAL, grs	PESO FINAL, grs	RETENIDO GRADACION ORIGINAL (%)	PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)
PASA	RETENIDO					
Mayores a 1 1/2"						
>1 1/2"	1 1/2"	6789	6787	80,9	0,03	0,02
1 1/2"	3/4"	4567	4562	19,1	0,11	0,02
3/4"	3/8"					
3/8"	N°4					
TOTALES :		11356	11349,00	100,0	0,14	0,04

NOTA 1: Si el agregado contiene menos del 00,5% de cualquiera de los tamaños especificados no se debera ensayar dicho tamaño y se tomara como % de particulas deleznable de acuerdo al tamiz siguiente mayor o menor.

COLORACIÓN DEL AGUA:	ALGO TURBIA	<u>X</u>
	TURBIA	
	MUY TURBIA	

FRACCION DEL AGREGADO FINO

TAMIZ		PESO INICIAL (grs)	PESO FINAL, grs	RETENIDO GRADACION ORIGINAL (%)	PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)
PASA	RETENIDO					
No. 4	No. 16	N/A	N/A			

COLORACIÓN DEL AGUA:	ALGO TURBIA	
	<u>TURBIA</u>	
	MUY TURBIA	

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: Art. 673	≤ 0.25% MAX
--	-------------

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

NOMBRE (Laboratorista)

FIRMA (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

NOMBRE INGENIERO (VoBo)

FIRMA INGENIERO (VoBo)



DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR IGNICION
NORMA I.N.V. E - 121 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-89
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA:	5/05/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Florencia - San vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180
TIPO DE MATERIAL:	PIEDRA FILTRO	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA	FECHA DE TOMA:	5 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO EL AGUILA	No ENSAYO:	

RESULTADOS DE LABORATORIO

Prueba No.	1
Peso suelo seco al horno antes de ignición	gr 40,0
Peso suelo seco despues de ignición	gr 39,95
PORCENTAJE DE MATERIA ORGANICA	0,12%

ESPECIFICACION INVIAS 2022: Art. 673

≤

0,2%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO
NORMA I.N.V. E-220 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-061
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: PIEDRA FILTRO
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA
DESCRIPCIÓN: MATERIAL DE RIO EL AGUILA

FECHA ENSAYO: sábado, 30 de mayo de 2026
TRAMO: Florencia - San vicente
LOCALIZACIÓN: RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180
MARGEN: -
FECHA DE TOMA: lunes, 25 de mayo de 2026
No ENSAYO: -

Numero de ciclos :	Solución utilizada	Densidad de la solución (g/cm3)
5	SODIO	1.168.0

Agregado Grueso									
Fracción		Peso de la fracción recomendada, grs	Peso de las fracciones, grs		Cantidad de partículas del ensayo		Gradación original, %	Fracción perdida, %	
Pasa	Retenido		Inicial	Final	Antes	Después		% que pasa el tamiz designado	perdida ponderada en %
3 1/2"	3"	7000 ± 1000	7895,3	7885,3			27,9	0,13%	0,04%
3"	2 1/2"	7000 ± 1000	6178,2	6143,2			16,22	0,57%	0,09%
2 1/2"	1 1/2"	5000 ± 300	4826,7	4772,5			36,84	1,12%	0,41%
1 1/2"	3/4"	1500 ± 50	1516,8	1455,8			19,08	4,02%	0,77%
TOTALES			20417,00	20256,80			100,00		1,31%
Perdida total : %								1,31%	

Nota: el % retenido en gradación original de los tamices individuales deben tener mas del 5%, si no se toma el % de perdida del tamaño mayor mas proximo.

EXAMEN CUALITATIVO DE LAS PARTÍCULAS GRUESAS										
TAMANO TAMIZ		PARTICULAS QUE EXHIBEN ALTERACIONES								
		R		D		A		E		No TOTAL DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO
		No	%	No	%	No	%	No	%	
DE 2 1/2" A 1 1/2"										
DE 1 1/2" A 3/4"										

R	ROTURA
D	DESINTEGRACIÓN
A	AGRIETAMIENTO
E	EXFOLIACIÓN

Agregado Fino									
Fracción		Peso de la fracción recomendada, grs	Peso de las fracciones, grs		Cantidad de partículas del ensayo		Gradación original, %	Fracción perdida, %	
Pasa	Retenido		Inicial	Final	Antes	Después		% que pasa el tamiz designado	perdida ponderada en %
3/8"	Nº 4	100	N/A						
Nº 4	Nº 8	100	N/A						
Nº 8	Nº 16	100	N/A						
Nº 16	Nº 30	100	N/A						
Nº 30	Nº 50	100	N/A						
Nº 50	Nº 100	100	N/A						
MENORES DE Nº 100		-	-	-				-	-
TOTALES									
Perdida total : %									

ESPECIFICACIÓN DEL INVIAS 2022:ART. 673

Sulfato de Sodio	X	≤ 12 %
Sulfato de Magnesio		≤ 18%

OBSERVACIONES:

EJECUTO: SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre
Firma (Laboratorista)

APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre
Firma Ingeniero (VoBo)

 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	CONTENIDO DE PARTICULAS LIVIANAS NORMA I.N.V. E-221 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022	F-EO-106
		Version 1
		Fecha: 04/09/2025

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
OBRA:	CTTO 991 - 2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR8+005-PR8+030-PR9+060-PR8+070-PR8+230-PR6+875-PR8+180
TIPO DE MATERIAL:	PIEDRA FILTRO	MARGEN / COSTADO:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA	FECHA DE TOMA:	martes, 19 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO EL AGUILA	No ENSAYO:	

LÍQUIDO PESADO UTILIZADO:	COLORURO DE ZINC	DENSIDAD (gr/cc)	2,0
---------------------------	------------------	------------------	-----

CONTENIDO DE PARTÍCULAS LIVIANAS AGREGADO GRUESO

PESO DE LA MUESTRA (g)	PESO SECO PARTÍCULAS RETENIDAS COLADOR (g)	PESO MUESTRA SECA RETENIDAS TAMIZ Nº 4	PORCENTAJE DE PARTÍCULAS LIVIANAS
10980	96,0	10884	0,88

% PARTÍCULAS LIVIANAS AGREGADO GRUESO:

0,88

COI CONTENIDO DE PARTICULAS LIVIANAS AGREGADO FINO

PESO DE LA MUESTRA (g)	PESO SECO PARTÍCULAS RETENIDAS COLADOR (g)	PESO MUESTRA SECA RETENIDAS TAMIZ Nº 50	PORCENTAJE DE PARTÍCULAS LIVIANAS
N/A	N/A	N/A	

% PARTÍCULAS LIVIANAS AGREGADO FINO:

OBSERVACIONES:

ESPECIFICACION INVIAS 2022. ARTICULO 673 = MAX. 1.0 %

EJECUTO:	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA	APROBO:	FERNEY EDUARDO ARIAS
	Nombre (Laboratorista)		Nombre Ingeniero
			
	Firma		Firma

Ensayos
Subbase Granular
Zona Industrial
Proyecto 132



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:

CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,
EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA:

CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL:

SUB BASE GRANULAR / SBG-38

FUENTE:

UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA

DESCRIPCION:

MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO

lunes, 4 de mayo de 2026

TRAMO:

Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION:

RT6504 PR9+800 - PR9+845 - PR9+850 -
PR9+860 - PR9+870 - PR9+890 - PR9+933

MARGEN:

Calzada Completa

FECHA DE TOMA:

lunes, 4 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO

Peso inicial:		15377,0	Peso final:		14584	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	2587,3	16,83%	16,83%	83,2%	75%	95%
1/2"	12,50	4154,5	27,02%	43,84%	56,2%	55%	85%
3/8"	9,50	932,9	6,07%	49,91%	50,1%	45%	75%
Nº 4	4,75	1517,7	9,87%	59,78%	40,2%	30%	60%
Nº 10	2,00	1231,3	8,01%	67,79%	32,2%	20%	45%
Nº 40	0,43	2642,9	17,19%	84,97%	15,0%	8%	30%
Nº 200	0,075	1517,3	9,87%	94,84%	5,2%	2%	15%
FONDO		40,9	0,27%	95,11%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1423,2
Peso muestra seca + recip.	1369,7
Peso recipiente	203,8
% de humedad	4,6

Gravas :	59,8%
Arenas :	35,1%
Finos :	15,0%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

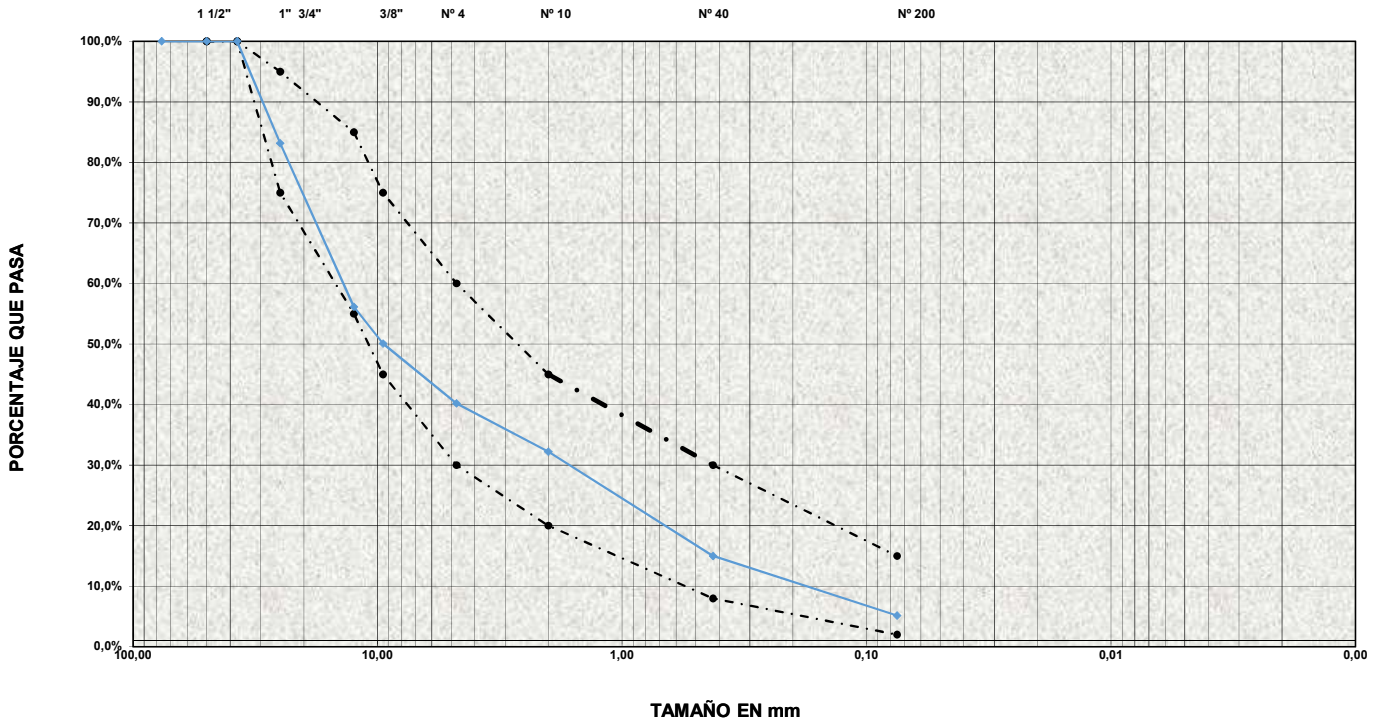

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	4 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+800 - PR9+845 - PR9+850 - PR9+860 - PR9+870 - PR9+890 - PR9+933
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	4 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITE DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15377		Peso Final	14584	
TAMIZ	PESO	% RET		% ACUM	% PASA
					100,0
1 1/2"	0,0	0,0		0,0	100,0
1"	2587,3	16,8		16,8	83,2
1/2"	4154,5	27,0		43,8	56,2
3/8"	932,9	6,1		49,9	50,1
Nº 4	1517,7	9,9		59,8	40,2
Nº 10	1231,3	8,0		67,8	32,2
Nº 40	2642,9	17,2		85,0	15,0
Nº 200	1517,3	9,9		94,8	5,2
FONDO	40,9	0,3		95,1	4,9

LIMITE LIQUIDO

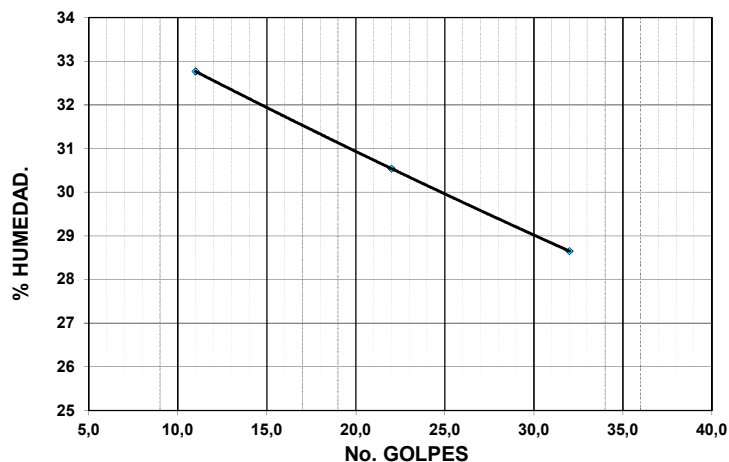

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1


PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	sábado, 23 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR4+800
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	sábado, 23 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO							
Peso inicial:		15579,0	Peso final:		14496	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	885,8	5,69%	5,69%	94,3%	75%	95%
1/2"	12,50	2458,1	15,78%	21,46%	78,5%	55%	85%
3/8"	9,50	1106,1	7,10%	28,56%	71,4%	45%	75%
Nº 4	4,75	2209,1	14,18%	42,74%	57,3%	30%	60%
Nº 10	2,00	1994,5	12,80%	55,55%	44,5%	20%	45%
Nº 40	0,43	3675,9	23,60%	79,14%	20,9%	8%	30%
Nº 200	0,075	2166,3	13,91%	93,05%	7,0%	2%	15%
FONDO		88,2	0,57%	93,61%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1277,3
Peso muestra seca + recip.	1201,6
Peso recipiente	192
% de humedad	7,5

Gravas :	42,7%
Arenas :	50,6%
Finos :	20,9%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

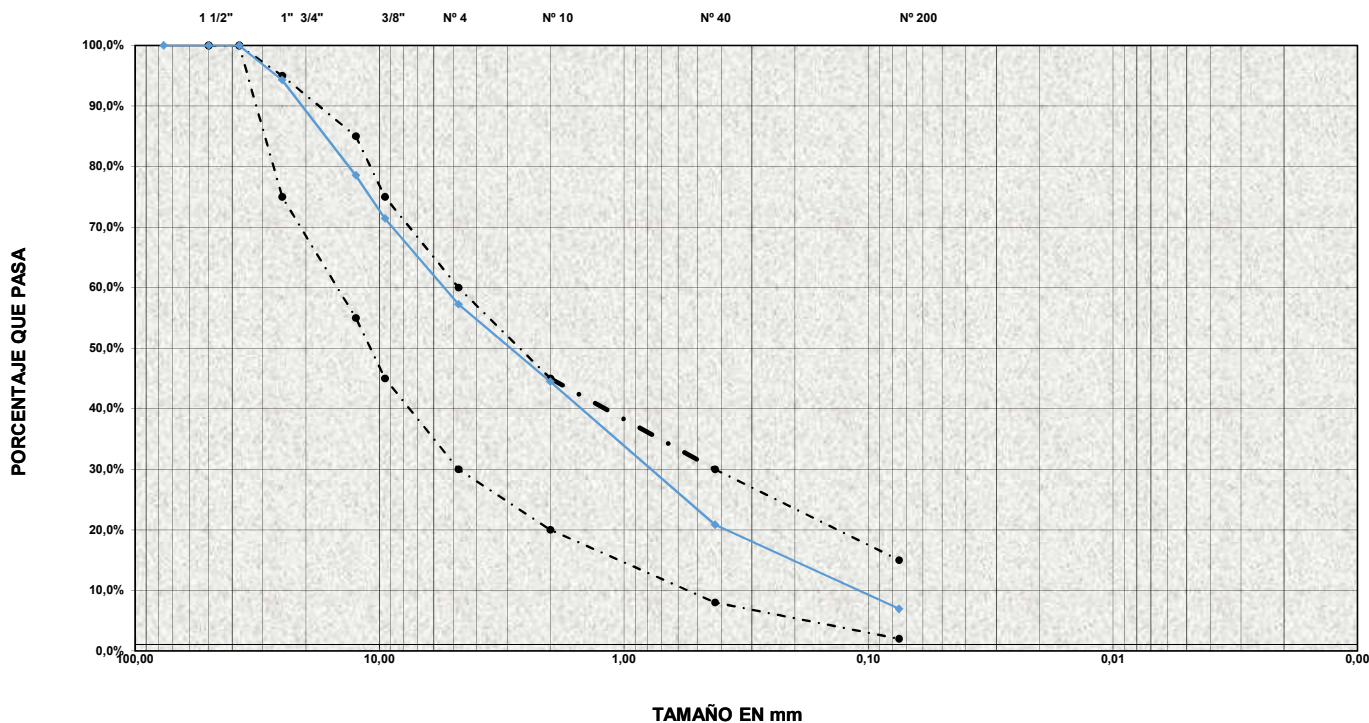

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	23 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR4+800
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	23 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15579		Peso Final	14496	
TAMIZ	PESO	% RET		% ACUM	% PASA
					100,0
1 1/2"	0,0	0,0		0,0	100,0
1"	885,8	5,7		5,7	94,3
1/2"	2458,1	15,8		21,5	78,5
3/8"	1106,1	7,1		28,6	71,4
Nº 4	2209,1	14,2		42,7	57,3
Nº 10	1994,5	12,8		55,5	44,5
Nº 40	3675,9	23,6		79,1	20,9
Nº 200	2166,3	13,9		93,0	7,0
FONDO	88,2	0,6		93,6	6,4

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR / SBG-38

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: martes, 5 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR7+010 - PR8+079 - PR8+081 - PR9+900 - PR9+920 - PR9+925 - PR9+930 - PR9+940 - PR9+950

MARGEN: Calzada Completa

FECHA DE TOMA: martes, 5 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO

Peso inicial:		15670,0	Peso final:		14995	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1560,8	9,96%	9,96%	90,0%	75%	95%
1/2"	12,50	4798,9	30,62%	40,59%	59,4%	55%	85%
3/8"	9,50	1072,5	6,84%	47,43%	52,6%	45%	75%
Nº 4	4,75	2057,4	13,13%	60,56%	39,4%	30%	60%
Nº 10	2,00	1610,1	10,28%	70,83%	29,2%	20%	45%
Nº 40	0,43	2542,6	16,23%	87,06%	12,9%	8%	30%
Nº 200	0,075	1352,9	8,63%	95,69%	4,3%	2%	15%
FONDO		38,3	0,24%	95,94%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1428,6
Peso muestra seca + recip.	1377,8
Peso recipiente	196,1
% de humedad	4,3

Gravas :	60,6%
Arenas :	39,6%
Finos :	12,9%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

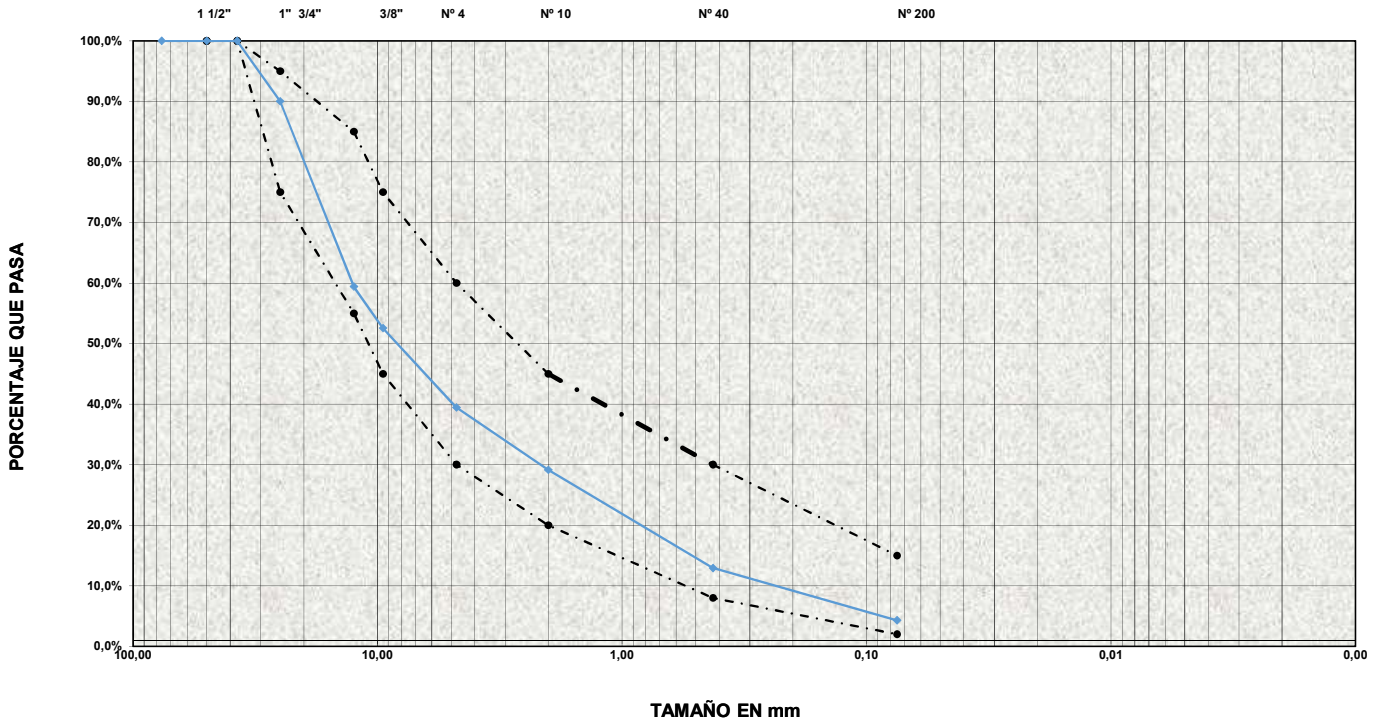

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	5 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR7+010 - PR8+079 - PR8+081 - PR9+900 - PR9+920 - PR9+925 - PR9+930 - PR9+940 - PR9+950
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	5 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15670	Peso Final	14995	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	1560,8	10,0	10,0	90,0
1/2"	4798,9	30,6	40,6	59,4
3/8"	1072,5	6,8	47,4	52,6
Nº 4	2057,4	13,1	60,6	39,4
Nº 10	1610,1	10,3	70,8	29,2
Nº 40	2542,6	16,2	87,1	12,9
Nº 200	1352,9	8,6	95,7	4,3
FONDO	38,3	0,2	95,9	4,1

LIMITE LIQUIDO

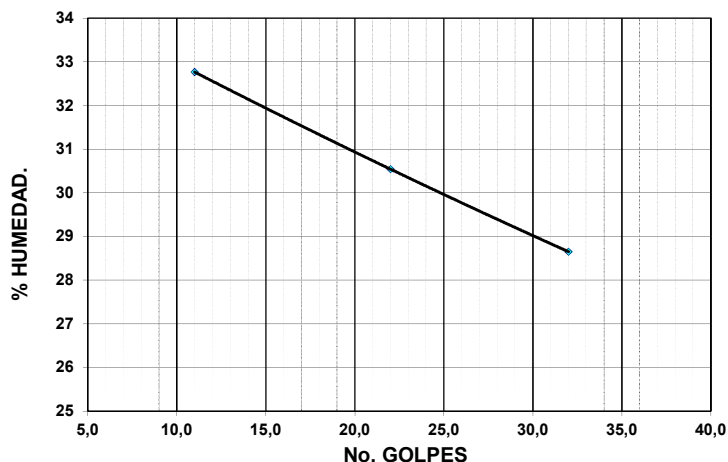

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1


PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	miércoles, 27 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR4+800 - PR5+300
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	miércoles, 27 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO							
Peso inicial:		15987,0	Peso final:		15124	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1909,8	11,95%	11,95%	88,1%	75%	95%
1/2"	12,50	3270,7	20,46%	32,40%	67,6%	55%	85%
3/8"	9,50	737,6	4,61%	37,02%	63,0%	45%	75%
Nº 4	4,75	1908,5	11,94%	48,96%	51,0%	30%	60%
Nº 10	2,00	1744,7	10,91%	59,87%	40,1%	20%	45%
Nº 40	0,43	3602,7	22,54%	82,40%	17,6%	8%	30%
Nº 200	0,075	1949,8	12,20%	94,60%	5,4%	2%	15%
FONDO		83,0	0,52%	95,12%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1252,0
Peso muestra seca + recip.	1186,3
Peso recipiente	192
% de humedad	6,6

Gravas :	49,0%
Arenas :	45,4%
Finos :	17,6%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

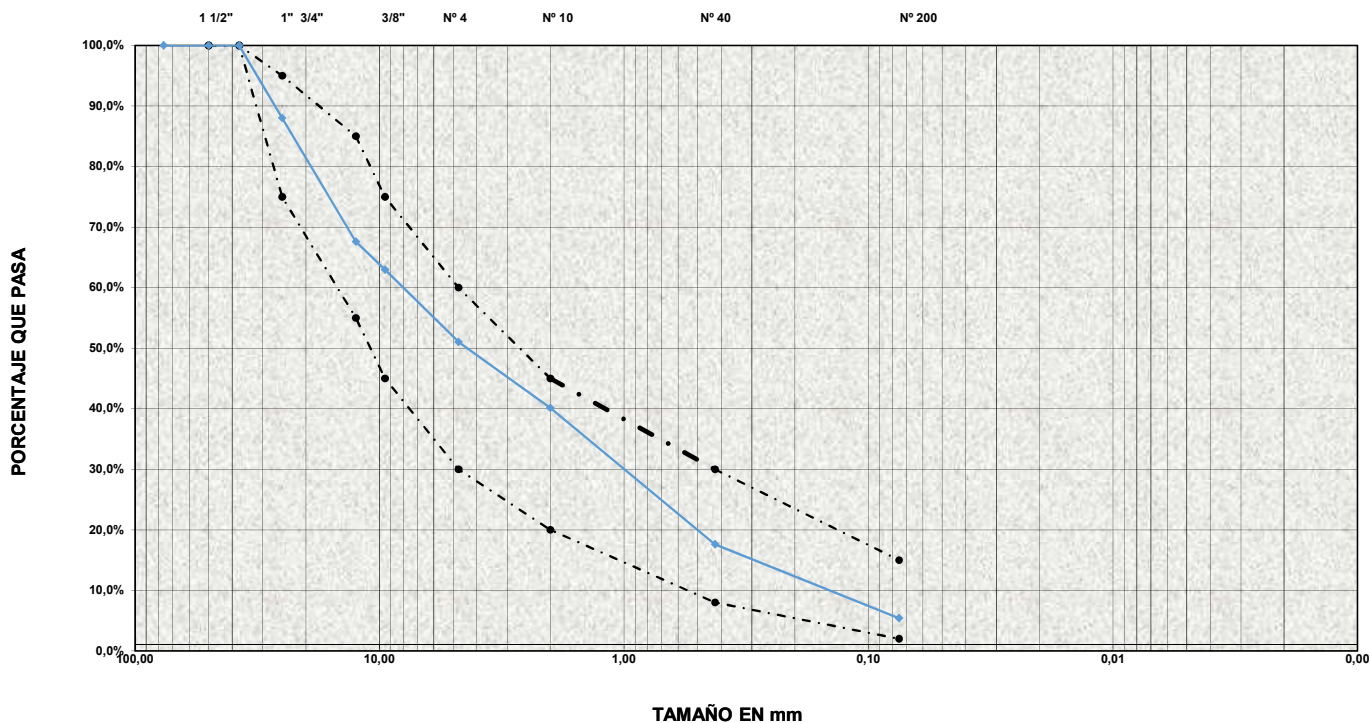

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	27 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR4+800 - PR5+300
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	27 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15987	Peso Final	15124	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	1909,8	11,9	11,9	88,1
1/2"	3270,7	20,5	32,4	67,6
3/8"	737,6	4,6	37,0	63,0
Nº 4	1908,5	11,9	49,0	51,0
Nº 10	1744,7	10,9	59,9	40,1
Nº 40	3602,7	22,5	82,4	17,6
Nº 200	1949,8	12,2	94,6	5,4
FONDO	83	0,5	95,1	4,9

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

FECHA ENSAYO: jueves, 7 de mayo de 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

OBRA: CTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

LOCALIZACION: RT6504 PR8+000-PR9+900-PR9+910-PR9+930-PR9+940-PR9+660-PR9+730

TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR / SBG-38

MARGEN: Calzada Completa

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA

FECHA DE TOMA: jueves, 7 de mayo de 2026

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO

Peso inicial:		15382,6	Peso final:		14440	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1060,5	6,89%	6,89%	93,1%	75%	95%
1/2"	12,50	3863,7	25,12%	32,01%	68,0%	55%	85%
3/8"	9,50	1153,4	7,50%	39,51%	60,5%	45%	75%
Nº 4	4,75	1973,9	12,83%	52,34%	47,7%	30%	60%
Nº 10	2,00	1723,9	11,21%	63,55%	36,5%	20%	45%
Nº 40	0,43	2945,7	19,15%	82,70%	17,3%	8%	30%
Nº 200	0,075	1719,2	11,18%	93,87%	6,1%	2%	15%
FONDO		68,9	0,45%	94,32%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1032,2
Peso muestra seca + recip.	990,7
Peso recipiente	191,5
% de humedad	5,2

Gravas :	52,3%
Arenas :	43,2%
Finos :	17,3%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

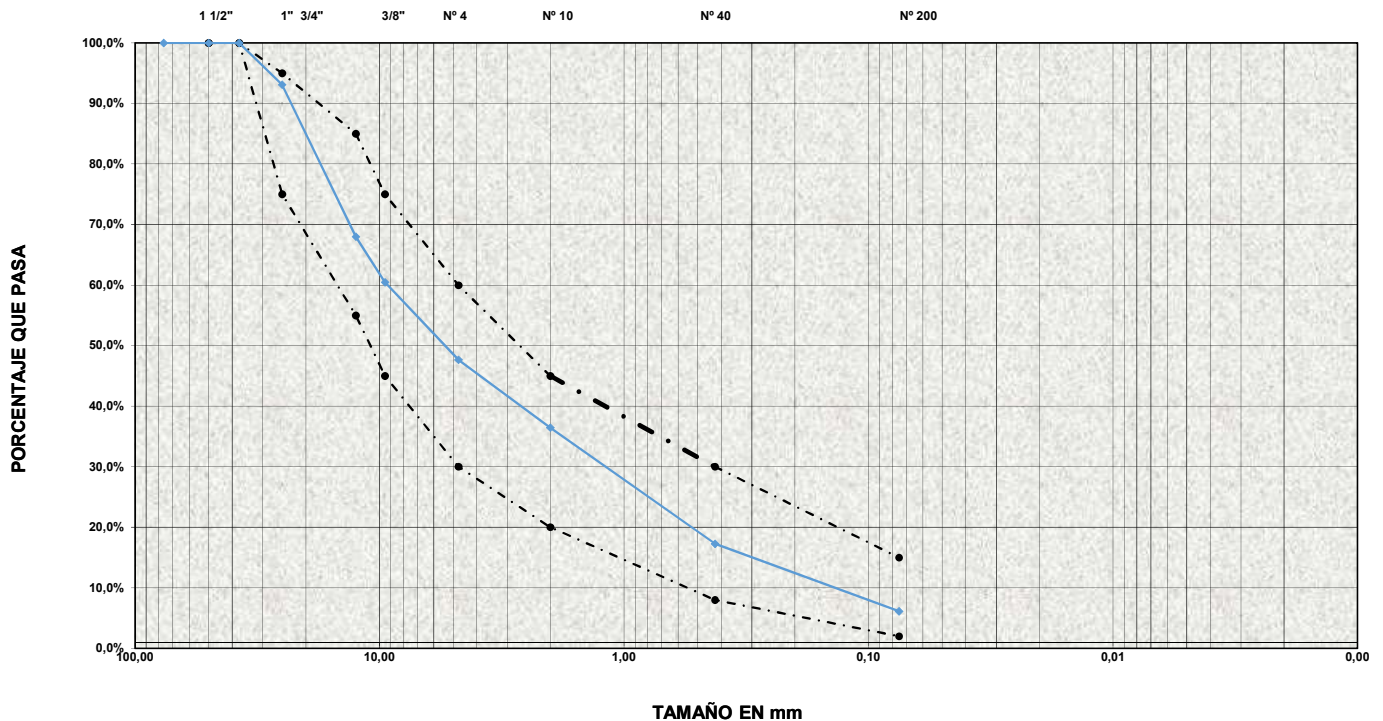

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	7 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR8+000-PR9+900-PR9+910-PR9+930-PR9+940-PR9+660-PR9+730
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	7 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15383	Peso Final	14440	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	1060,5	6,9	6,9	93,1
1/2"	3863,7	25,1	32,0	68,0
3/8"	1153,4	7,5	39,5	60,5
Nº 4	1973,9	12,8	52,3	47,7
Nº 10	1723,9	11,2	63,5	36,5
Nº 40	2945,7	19,1	82,7	17,3
Nº 200	1719,2	11,2	93,9	6,1
FONDO	68,9	0,4	94,3	5,7

LIMITE LIQUIDO

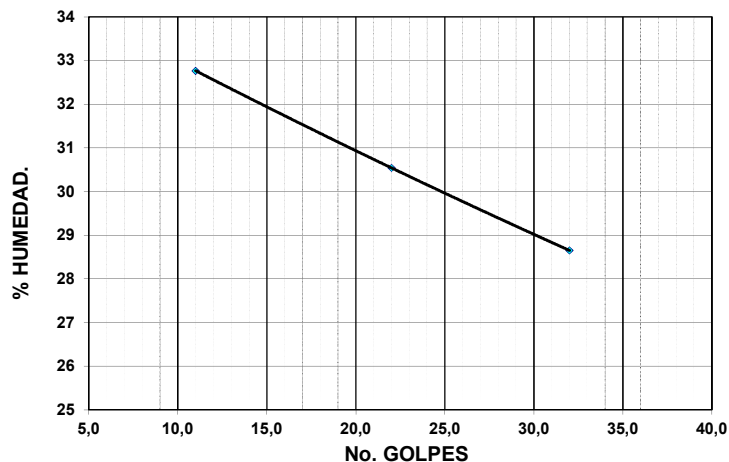

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR / SBG-38

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: miércoles, 6 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR8+000-PR8+001-PR8+810-PR8+020-PR8+030-PR8+050-PR8+860-PR8+065-PR8+750-PR8+930

MARGEN: Calzada Completa

FECHA DE TOMA: miércoles, 6 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO

Peso inicial:		15275,3	Peso final:		14721	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	2764	18,09%	18,09%	81,9%	75%	95%
1/2"	12,50	4069,4	26,64%	44,73%	55,3%	55%	85%
3/8"	9,50	945,8	6,19%	50,93%	49,1%	45%	75%
Nº 4	4,75	1489,4	9,75%	60,68%	39,3%	30%	60%
Nº 10	2,00	1821	11,92%	72,60%	27,4%	20%	45%
Nº 40	0,43	2313,7	15,15%	87,74%	12,3%	8%	30%
Nº 200	0,075	1317,3	8,62%	96,37%	3,6%	2%	15%
FONDO		51,8	0,34%	96,71%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1260,4
Peso muestra seca + recip.	1203,2
Peso recipiente	195,7
% de humedad	5,7

Gravas :	60,7%
Arenas :	36,8%
Finos :	12,3%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

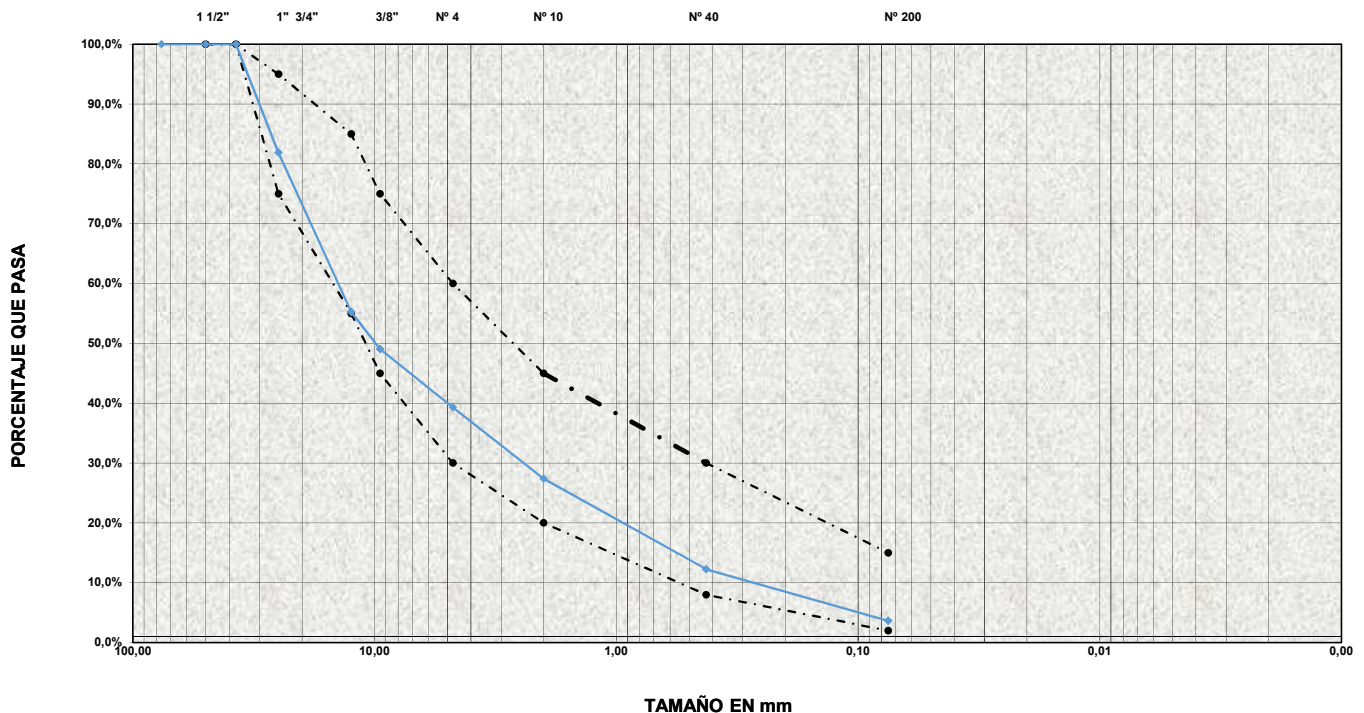

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	6 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR8+000-PR8+001-PR8+810-PR8+020-PR8+030-PR8+050-PR8+860-PR8+065-PR8+750-PR8+830
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	6 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15275		Peso Final	14721	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA	
				100,0	
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0	
1"	2764,0	18,1	18,1	81,9	
1/2"	4069,4	26,6	44,7	55,3	
3/8"	945,8	6,2	50,9	49,1	
Nº 4	1489,4	9,8	60,7	39,3	
Nº 10	1821,0	11,9	72,6	27,4	
Nº 40	2313,7	15,1	87,7	12,3	
Nº 200	1317,3	8,6	96,4	3,6	
FONDO	51,8	0,3	96,7	3,3	

LIMITE LIQUIDO

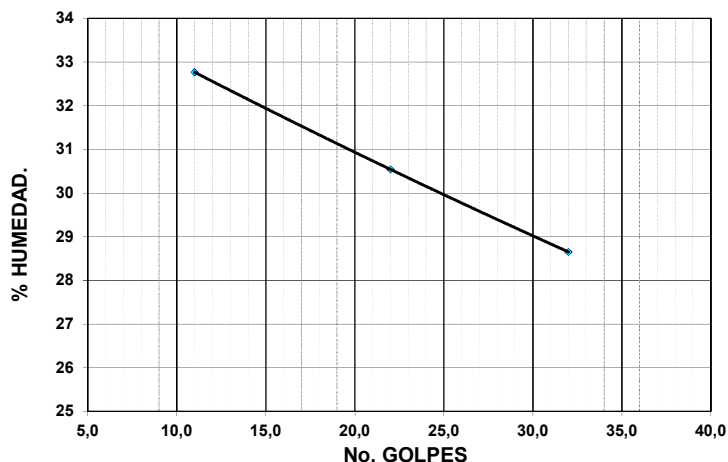

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:

CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,
EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA:

CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL:

SUB BASE GRANULAR / SBG-38

FUENTE:

UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA

DESCRIPCION:

MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO

viernes, 8 de mayo de 2026

TRAMO:

Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION:

RT6504 PR9+900-PR9+920-PR9+940-PR9+950-
PR9+960-PR9+970-PR9+980-PR9+985-PR9+990

MARGEN:

Calzada Completa

FECHA DE TOMA:

viernes, 8 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO

Peso inicial:		15589,5	Peso final:		15160	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	2421,6	15,53%	15,53%	84,5%	75%	95%
1/2"	12,50	4007,1	25,70%	41,24%	58,8%	55%	85%
3/8"	9,50	999,7	6,41%	47,65%	52,3%	45%	75%
Nº 4	4,75	2032,5	13,04%	60,69%	39,3%	30%	60%
Nº 10	2,00	1571,2	10,08%	70,77%	29,2%	20%	45%
Nº 40	0,43	2570,4	16,49%	87,25%	12,7%	8%	30%
Nº 200	0,075	1557,5	9,99%	97,24%	2,8%	2%	15%
FONDO		23,4	0,15%	97,40%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1231,4
Peso muestra seca + recip.	1168,3
Peso recipiente	191,6
% de humedad	6,5

Gravas :	60,7%
Arenas :	39,6%
Finos :	12,7%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

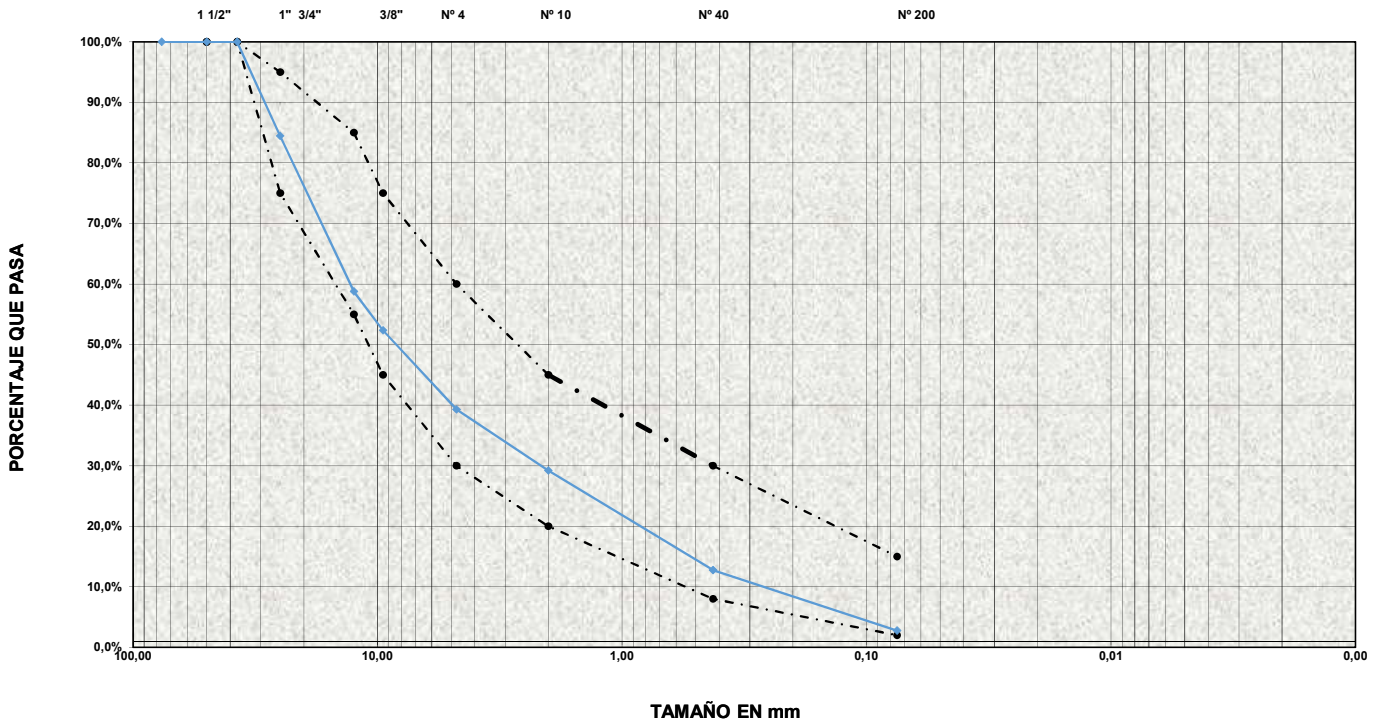

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	8 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+900-PR9+920-PR9+940-PR9+950-PR9+960-PR9+970-PR9+980-PR9+985-PR9+990
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	8 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15590		Peso Final	15160
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	2421,6	15,5	15,5	84,5
1/2"	4007,1	25,7	41,2	58,8
3/8"	999,7	6,4	47,7	52,3
Nº 4	2032,5	13,0	60,7	39,3
Nº 10	1571,2	10,1	70,8	29,2
Nº 40	2570,4	16,5	87,3	12,7
Nº 200	1557,5	10,0	97,2	2,8
FONDO	23,4	0,2	97,4	2,6

LIMITE LIQUIDO

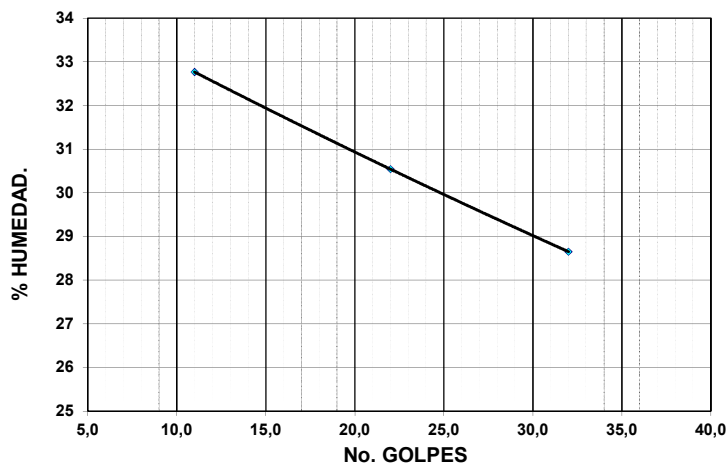

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1


PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	sábado, 9 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+935 AL PR10+020
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Costado Izquierdo
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	sábado, 9 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO							
Peso inicial:		15412,8	Peso final:		14365	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1170,2	7,59%	7,59%	92,4%	75%	95%
1/2"	12,50	2669,8	17,32%	24,91%	75,1%	55%	85%
3/8"	9,50	792,1	5,14%	30,05%	69,9%	45%	75%
Nº 4	4,75	2220,4	14,41%	44,46%	55,5%	30%	60%
Nº 10	2,00	1943	12,61%	57,07%	42,9%	20%	45%
Nº 40	0,43	3513	22,79%	79,86%	20,1%	8%	30%
Nº 200	0,075	2056,2	13,34%	93,20%	6,8%	2%	15%
FONDO		116,4	0,76%	93,96%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1651,9
Peso muestra seca + recip.	1551,2
Peso recipiente	202
% de humedad	7,5

Gravas :	44,5%
Arenas :	49,8%
Finos :	20,1%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

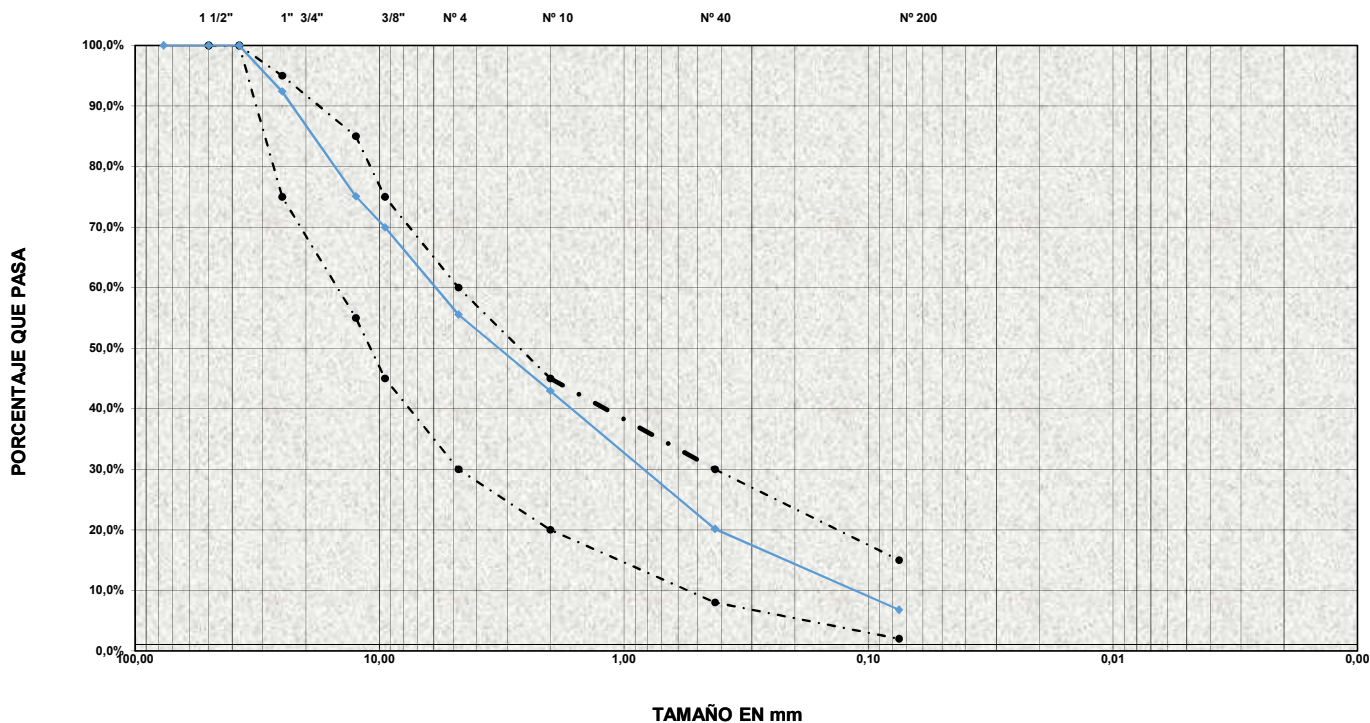

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	9 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR5+935 AL PR5+940
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	9 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO


Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15413	Peso Final	14365	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	1170,2	7,6	7,6	92,4
1/2"	2669,8	17,3	24,9	75,1
3/8"	792,1	5,1	30,1	69,9
Nº 4	2220,4	14,4	44,5	55,5
Nº 10	1943,0	12,6	57,1	42,9
Nº 40	3513,0	22,8	79,9	20,1
Nº 200	2056,2	13,3	93,2	6,8
FONDO	116,4	0,8	94,0	6,0

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

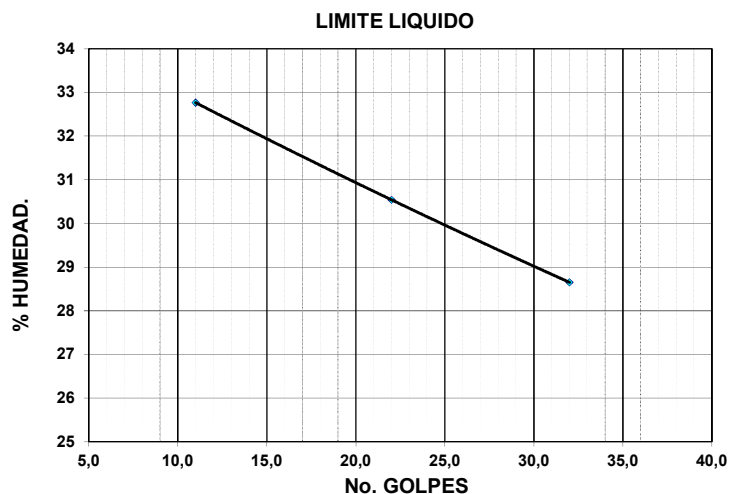

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1


PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	lunes, 11 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+920-PR9+960-PR9+970-PR9+980
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	lunes, 11 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO							
Peso inicial:		15010,9	Peso final:		13998	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	962,7	6,41%	6,41%	93,6%	75%	95%
1/2"	12,50	2617,9	17,44%	23,85%	76,1%	55%	85%
3/8"	9,50	1014,5	6,76%	30,61%	69,4%	45%	75%
Nº 4	4,75	2048,2	13,64%	44,26%	55,7%	30%	60%
Nº 10	2,00	1868,6	12,45%	56,70%	43,3%	20%	45%
Nº 40	0,43	3520,5	23,45%	80,16%	19,8%	8%	30%
Nº 200	0,075	1965,3	13,09%	93,25%	6,7%	2%	15%
FONDO		86,1	0,57%	93,82%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1153,9
Peso muestra seca + recip.	1087,3
Peso recipiente	194,8
% de humedad	7,5

Gravas :	44,3%
Arenas :	49,5%
Finos :	19,8%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

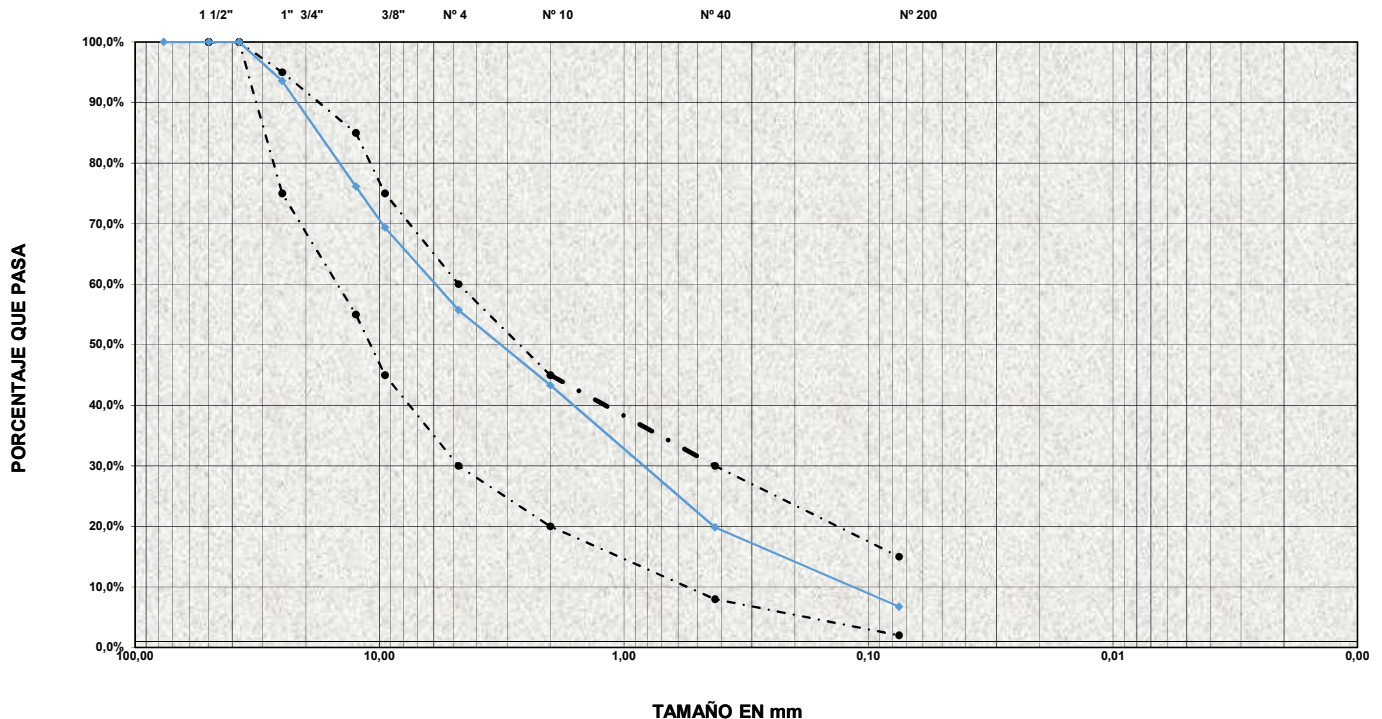

OBSERVACIONES:

EJECUTO: SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)
Firma (Laboratorista)

APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero
Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	11 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+920-PR9+960-PR9+970-PR9+980
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	11 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15011	Peso Final	13998	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	962,7	6,4	6,4	93,6
1/2"	2617,9	17,4	23,9	76,1
3/8"	1014,5	6,8	30,6	69,4
Nº 4	2048,2	13,6	44,3	55,7
Nº 10	1868,6	12,4	56,7	43,3
Nº 40	3520,5	23,5	80,2	19,8
Nº 200	1965,3	13,1	93,3	6,7
FONDO	86,1	0,6	93,8	6,2

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1


PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	jueves, 28 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6503 PR38+200
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	jueves, 28 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO							
Peso inicial:		15688,0	Peso final:		15013	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1395,4	8,89%	8,89%	91,1%	75%	95%
1/2"	12,50	4674	29,79%	38,69%	61,3%	55%	85%
3/8"	9,50	1810,3	11,54%	50,23%	49,8%	45%	75%
Nº 4	4,75	2033,8	12,96%	63,19%	36,8%	30%	60%
Nº 10	2,00	1377,1	8,78%	71,97%	28,0%	20%	45%
Nº 40	0,43	2302,8	14,68%	86,65%	13,4%	8%	30%
Nº 200	0,075	1420	9,05%	95,70%	4,3%	2%	15%
FONDO		88,9	0,57%	96,27%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1292,3
Peso muestra seca + recip.	1239,2
Peso recipiente	195,8
% de humedad	5,1

Gravas :	63,2%
Arenas :	36,4%
Finos :	13,4%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

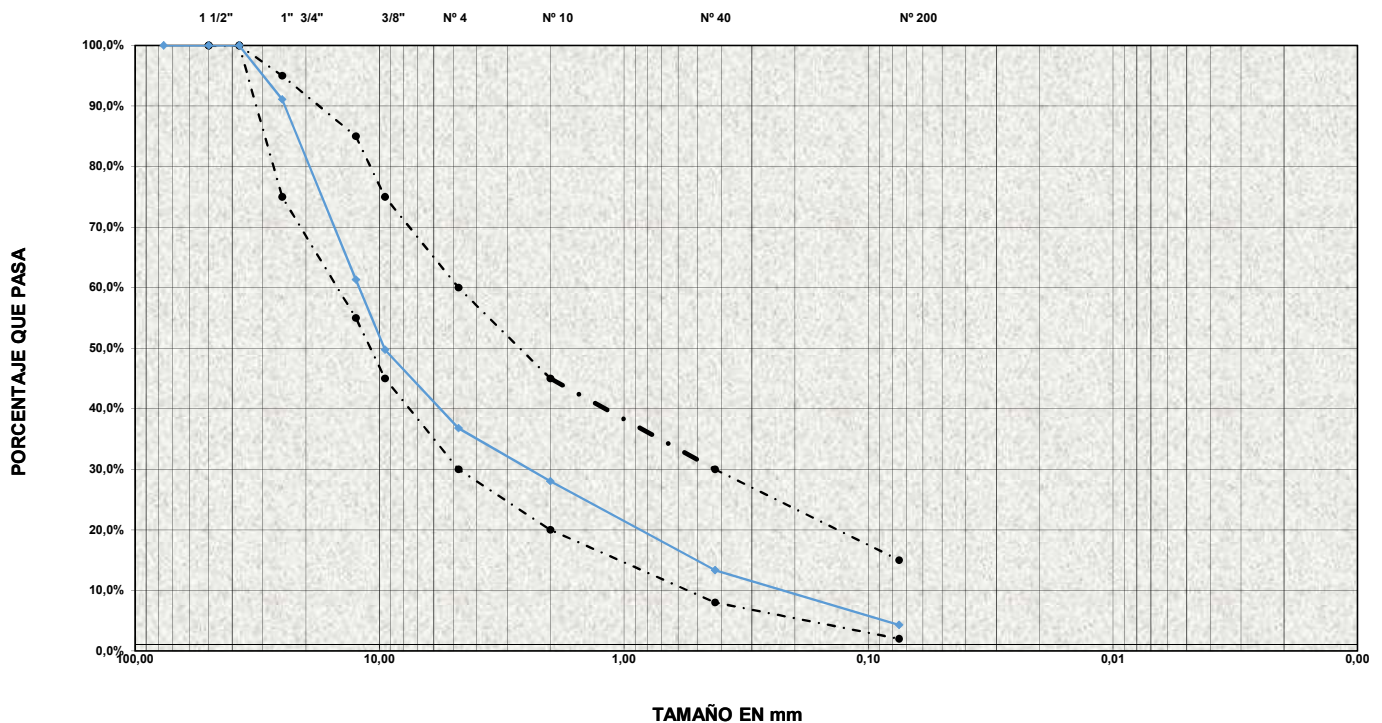

OBSERVACIONES: Se despacho sub base para ruta 6503 - pr 38+200 puente las delicias.

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	28 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6503 PR38+200
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	28 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15688	Peso Final	15013	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	1395,4	8,9	8,9	91,1
1/2"	4674,0	29,8	38,7	61,3
3/8"	1810,3	11,5	50,2	49,8
Nº 4	2033,8	13,0	63,2	36,8
Nº 10	1377,1	8,8	72,0	28,0
Nº 40	2302,8	14,7	86,6	13,4
Nº 200	1420,0	9,1	95,7	4,3
FONDO	88,9	0,6	96,3	3,7

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991 - 2021 "NEIVA - FLORENCIA"

TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR / SBG-38

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO: viernes, 29 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6503 PR38+200
RT6504 PR4+800 - PR4+820 - PR6+090 - PR6+580 - PR06+875 ALCANTARILLA C.D.

MARGEN: Calzada Completa

FECHA DE TOMA: viernes, 29 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL TRITURADO

Peso inicial:		15799,0	Peso final:		15230	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 320 - 22 - SBG - 38	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,00	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	2452,7	15,52%	15,52%	84,5%	75%	95%
1/2"	12,50	4490,2	28,42%	43,95%	56,1%	55%	85%
3/8"	9,50	1003,1	6,35%	50,29%	49,7%	45%	75%
Nº 4	4,75	1813,4	11,48%	61,77%	38,2%	30%	60%
Nº 10	2,00	1315,5	8,33%	70,10%	29,9%	20%	45%
Nº 40	0,43	2537,7	16,06%	86,16%	13,8%	8%	30%
Nº 200	0,075	1617,2	10,24%	96,40%	3,6%	2%	15%
FONDO		61,2	0,39%	96,78%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1131,8
Peso muestra seca + recip.	1080,3
Peso recipiente	188,7
% de humedad	5,8

Gravas :	61,8%
Arenas :	35,9%
Finos :	13,8%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

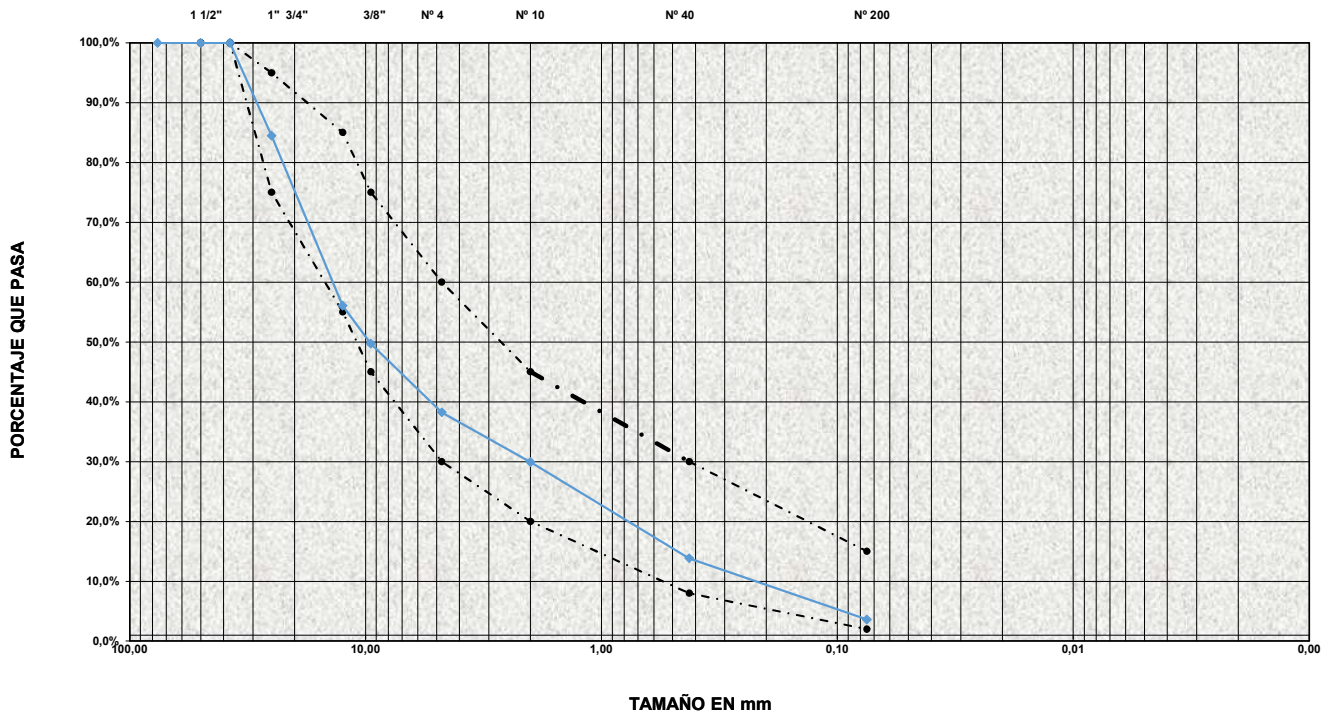

OBSERVACIONES: Se despacho sub base para ruta 6503 - pr 38+200 puente las delicias.

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

EJECUTO:

Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

APROBO:

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

NORMA I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	29 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	RT6503 PR38+200 RT6504 PR4+800 - PR4+820 - PR6+090 - PR6+580 - PR06+875 ALCANTARILLA C.D.
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG-38	MARGEN:	Calzada Completa
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	FECHA DE TOMA:	29 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.	NL	NL	NL
Peso de la muestra húmeda + recipiente			
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15799		Peso Final	15230	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA	
				100,0	
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0	
1"	2452,7	15,5	15,5	84,5	
1/2"	4490,2	28,4	43,9	56,1	
3/8"	1003,1	6,3	50,3	49,7	
Nº 4	1813,4	11,5	61,8	38,2	
Nº 10	1315,5	8,3	70,1	29,9	
Nº 40	2537,7	16,1	86,2	13,8	
Nº 200	1617,2	10,2	96,4	3,6	
FONDO	61,2	0,4	96,8	3,2	

LIMITE LIQUIDO

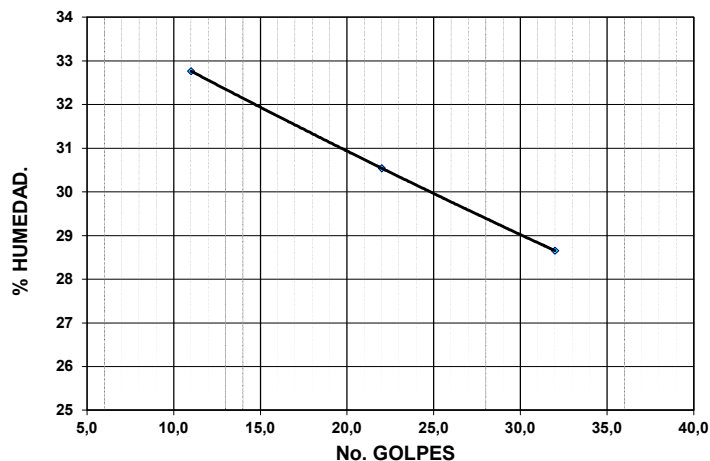

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>NL</u>
Limite Plástico	<u>NP</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	25,0
Índice de Plasticidad	≤	6,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDURADO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA

NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-048

VERSION: 003

FECHA: 30/04/2025

PÁGINA 1 DE 2

PROYECTO: CORREDORES VIALES NEIVA FLORENCIA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
MATERIAL: SUB BASE GRANULAR
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA
DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO LOS CUERVOS



FECHA ENSAYO: miércoles, 6 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto rico - San vicente. Ruta 6504
LOCALIZACION: Unidad Industrial
MARGEN: Acopio
FECHA MUESTRA: miércoles, 6 de mayo de 2026
No DE ENSAYO: -

DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
No. de Golpes	56	56	56	56
Molde No.	1	1	1	1
No. de Capas	5	5	5	5
Masa muestra húmeda + molde, (g).	7698,00	7842,00	7979,00	8002,00
Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00
Masa muestra húmeda, (g).	4738,00	4882,00	5019,00	5042
Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,239	2,307	2,372	2,383
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,140	2,172	2,192	2,169

HUMEDAD				
Recipiente No.	33	7	17	15
	1250,30	1250,40	1264,70	1261,00
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1203,80	1188,50	1183,40	1165,40
Masa Recipiente (g).	203,70	191,10	191,40	195,00
Contenido de Humedad (%)	4,6	6,2	8,2	9,9

PRUEBA			
	1	2	3
No. de Golpes	56	25	10
Molde No.	4	5	6
No. de Capas	5	5	5
Masa muestra húmeda + molde, (g).	9018,00	8756,00	8505,00
Masa molde, (g).	3999,00	3967,00	3966,00
Masa muestra húmeda, (g).	5019,00	4789,00	4539,00
Volumen molde, cm3	2125,00	2125,00	2125,00
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,362	2,254	2,136
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,183	2,083	1,974

HUMEDAD			
Recipiente No.	30	25	35
	812,00	908,90	750,10
Masa rec. + Muestra Hum. (g).	765,10	854,70	707,70
Masa Recipiente (g).	192,80	193,10	192,40
Contenido de Humedad (%)	8,2	8,2	8,2

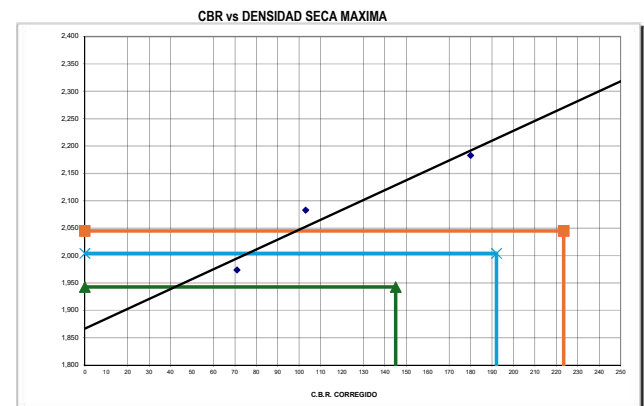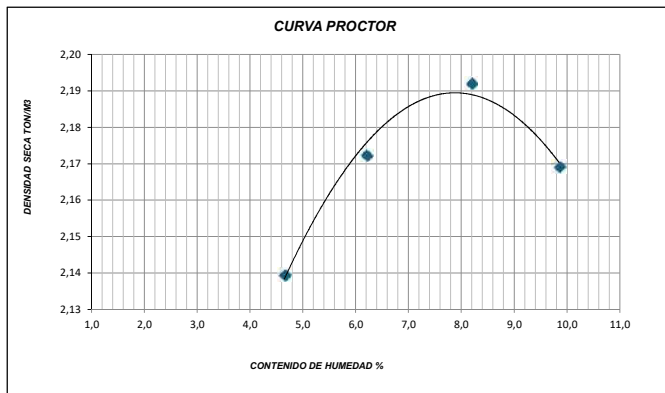

RESULTADOS DEL ENSAYO

DENSIDAD MAX.	2,192	gr/cm3
HUMEDAD OPTIMA	8,20	%
% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%

	56	25	10
CBR CORREG. A 01	121	62	40
CBR CORREG. A 02	180	103	71

ELABORA:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

**CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA**

NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-048

VERSION: 003

FECHA: 30/04/2025

PAGINA 2 DE 2


PROYECTO:
CONTRATISTA:
OBRA:
MATERIAL:
FUENTE:
DESCRIPCION:

CORREDORES VIALES
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
SUB BASE GRANULAR
UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA
MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO :
TRAMO
LOCALIZACIÓN
MARGEN
FECHA MUESTRA:
N° ENSAYO:

lunes, 11 de mayo de 2026
Puerto rico - San vicente. Ruta 6504
Calzada
jueves, 7 de mayo de 2026

No. DE GOLPES	10	25	56			
Molde.	6	5	4			
Masa sobrecarga utilizada (g)	4542	4542	4542			
Días de inmersión	4	4	4			
Lectura inicial (mm)	0	0	0			
Lectura Final (mm)	0	0	0			
% Expansión total	0	0	0			
Humedad de penetración.	9,5	9,2	8,8			
Penetración en milímetros	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,640	0,73	0,38	0,83	0,43	1,34	0,69
1,270	1,48	0,77	2,34	1,21	2,98	1,54
1,910	3,63	1,88	4,41	2,28	5,00	2,59
2,540	5,25	2,72	6,34	3,28	7,52	3,89
3,180	7,54	3,91	9,12	4,72	10,68	5,53
3,810	9,27	4,80	11,86	6,14	14,44	7,47
4,450	11,97	6,20	14,61	7,56	18,05	9,34
5,080	13,99	7,25	17,28	8,94	21,58	11,17
7,620	21,47	11,12	27,51	14,24	37,28	19,30
				0,00		0,00

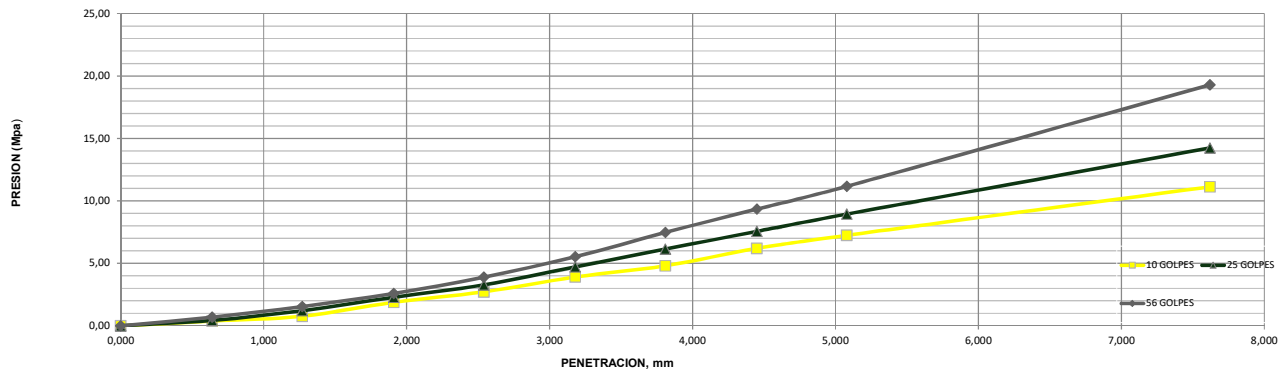

CBR AL 100%	180
CBR AL 98%	156
CBR AL 95%	120

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022: Art. 320 ≥

95%

ELABORA:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)




DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO
NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022

CÓDIGO: F-EO-057
VERSIÓN: 003
FECHA: 30/04/2025
PÁGINA 1 DE 1




PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,	FECHA:	sábado, 23 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Florencia - San Vicente del caguan
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6503 - 6504
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG - 38	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	No ENSAYO:	

DETERMINACION	1	2	3	4	
Peso Molde + material húmedo (g)	7524	7704	7857	7910	
Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960	
Peso material húmedo (g)	4564	4744	4897	4950	
Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,157	2,242	2,314	2,339	
CALCULO DE HUMEDADES					
Cápsula + material húmedo (g)	1265,0	1288,0	1255,4	1272,1	
Cápsula + material seco (g)	1227,1	1230,2	1180,3	1175,8	
Peso del agua (g)	37,9	57,8	75,1	96,3	
Peso de la cápsula (g)	202,0	198,0	192,0	193,0	
Peso material seco (g)	1025,1	1032,2	988,3	982,8	
Contenido de agua %	3,7	5,6	7,6	9,8	
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,080	2,123	2,151	2,131	

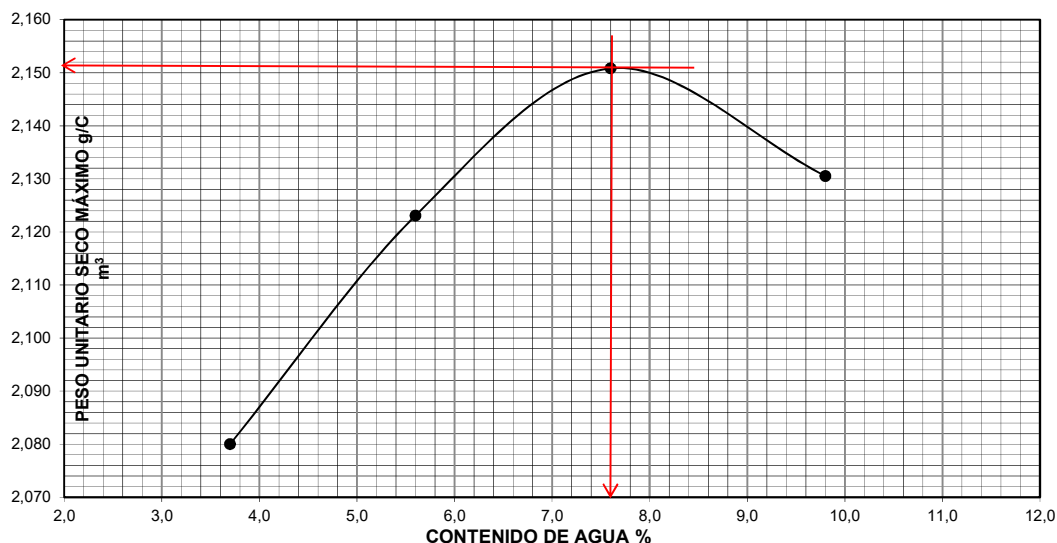

Método empleado	C
% Pasa Tamiz No 200	
Límite líquido	
Índice de plasticidad	
CLASIFICACIÓN	
U.S.C.	
AASHTO	
DENSIDAD MÁXIMA (g/cm ³)	2,151
HUMEDAD ÓPTIMA %	7,6

OBSERVACIONES	Cbr # 2	
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	EJECUTO	APROBÓ
INV E - 142	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA	FERNEY EDUARDO ARIAS
	LABORATORISTA	VoBo INGENIERO

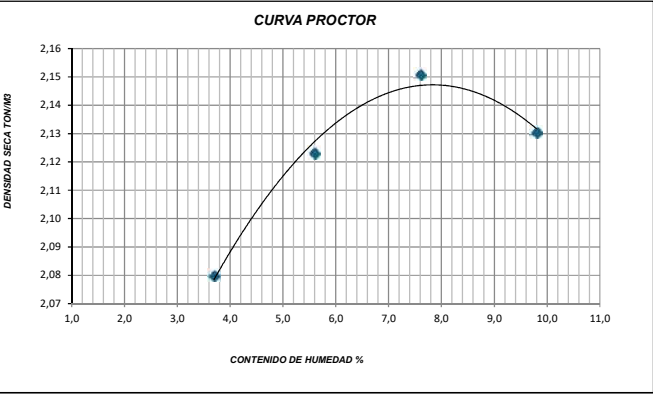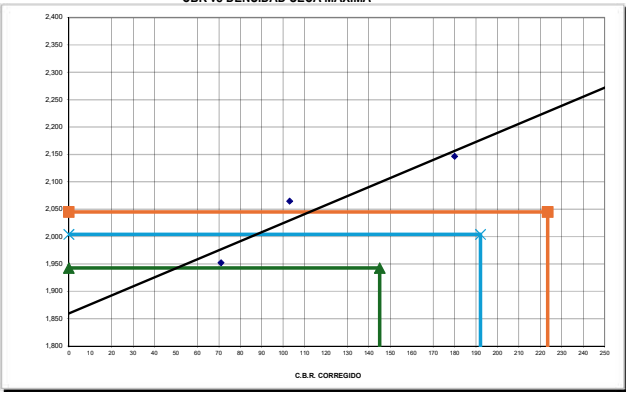 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022	CODIGO: F-EO-048																																																																																																																																							
		VERSION: 003																																																																																																																																							
		FECHA: 30/04/2025																																																																																																																																							
		PÁGINA 1 DE 2																																																																																																																																							
PROYECTO: CORREDORES VIALES NEIVA FLORENCIA	FECHA ENSAYO: sábado, 23 de mayo de 2026																																																																																																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO: Puerto rico - San vicente. Ruta 6504																																																																																																																																								
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION: Unidad Industrial																																																																																																																																								
MATERIAL: SUB BASE GRANULAR	MARGEN: Acopio																																																																																																																																								
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA	FECHA MUESTRA: sábado, 23 de mayo de 2026																																																																																																																																								
DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO LOS CUERVOS	No DE ENSAYO: -																																																																																																																																								
DENSIDAD SECA <table><tr><th>PRUEBA</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>No. de Golpes</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td></tr><tr><td>Molde No.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>No. de Capas</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Masa muestra húmeda + molde, (g).</td><td>7524,00</td><td>7704,00</td><td>7857,00</td><td>7910,00</td></tr><tr><td>Masa molde, (g).</td><td>2960,00</td><td>2960,00</td><td>2960,00</td><td>2960,00</td></tr><tr><td>Masa muestra húmeda, (g).</td><td>4564,00</td><td>4744,00</td><td>4897,00</td><td>4950</td></tr><tr><td>Volumen molde, cm3.</td><td>2116,00</td><td>2116,00</td><td>2116,00</td><td>2116,00</td></tr><tr><td>Densidad muestra húmeda, gr/cm3</td><td>2,157</td><td>2,242</td><td>2,314</td><td>2,339</td></tr><tr><td>Densidad muestra seca, gr/cm3</td><td>2,080</td><td>2,123</td><td>2,151</td><td>2,131</td></tr></table> HUMEDAD <table><tr><th>Recipiente No.</th><th>20</th><th>60</th><th>27</th><th>17</th></tr><tr><td></td><td>1265,00</td><td>1288,00</td><td>1255,40</td><td>1272,10</td></tr><tr><td>Masa rec. + Muestra Seca (g).</td><td>1227,10</td><td>1230,20</td><td>1180,30</td><td>1175,80</td></tr><tr><td>Masa Recipiente (g).</td><td>202,00</td><td>198,00</td><td>192,00</td><td>193,00</td></tr><tr><td>Contenido de Humedad (%)</td><td>3,7</td><td>5,6</td><td>7,6</td><td>9,8</td></tr></table> PRUEBA <table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>No. de Golpes</td><td>56</td><td>25</td><td>10</td></tr><tr><td>Molde No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>No. de Capas</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Masa muestra húmeda + molde, (g).</td><td>8915,00</td><td>8681,00</td><td>8454,00</td></tr><tr><td>Masa molde, (g).</td><td>4008,00</td><td>3962,00</td><td>3989,00</td></tr><tr><td>Masa muestra húmeda, (g).</td><td>4907,00</td><td>4719,00</td><td>4465,00</td></tr><tr><td>Volumen molde, cm3</td><td>2125,00</td><td>2125,00</td><td>2125,00</td></tr><tr><td>Densidad muestra húmeda, gr/cm3</td><td>2,309</td><td>2,221</td><td>2,101</td></tr><tr><td>Densidad muestra seca, gr/cm3</td><td>2,146</td><td>2,065</td><td>1,952</td></tr></table> HUMEDAD <table><tr><th>Recipiente No.</th><th>27</th><th>20</th><th>8</th></tr><tr><td>Masa rec. + Muestra Hum. (g).</td><td>1216,60</td><td>1282,00</td><td>1250,10</td></tr><tr><td>Masa rec. + Muestra Seca (g).</td><td>1144,30</td><td>1206,10</td><td>1175,10</td></tr><tr><td>Masa Recipiente (g).</td><td>191,10</td><td>202,10</td><td>192,10</td></tr><tr><td>Contenido de Humedad (%)</td><td>7,6</td><td>7,6</td><td>7,6</td></tr></table>			PRUEBA	1	2	3	4	No. de Golpes	56	56	56	56	Molde No.	1	1	1	1	No. de Capas	5	5	5	5	Masa muestra húmeda + molde, (g).	7524,00	7704,00	7857,00	7910,00	Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	Masa muestra húmeda, (g).	4564,00	4744,00	4897,00	4950	Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00	Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,157	2,242	2,314	2,339	Densidad muestra seca, gr/cm3	2,080	2,123	2,151	2,131	Recipiente No.	20	60	27	17		1265,00	1288,00	1255,40	1272,10	Masa rec. + Muestra Seca (g).	1227,10	1230,20	1180,30	1175,80	Masa Recipiente (g).	202,00	198,00	192,00	193,00	Contenido de Humedad (%)	3,7	5,6	7,6	9,8		1	2	3	No. de Golpes	56	25	10	Molde No.	1	2	3	No. de Capas	5	5	5	Masa muestra húmeda + molde, (g).	8915,00	8681,00	8454,00	Masa molde, (g).	4008,00	3962,00	3989,00	Masa muestra húmeda, (g).	4907,00	4719,00	4465,00	Volumen molde, cm3	2125,00	2125,00	2125,00	Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,309	2,221	2,101	Densidad muestra seca, gr/cm3	2,146	2,065	1,952	Recipiente No.	27	20	8	Masa rec. + Muestra Hum. (g).	1216,60	1282,00	1250,10	Masa rec. + Muestra Seca (g).	1144,30	1206,10	1175,10	Masa Recipiente (g).	191,10	202,10	192,10	Contenido de Humedad (%)	7,6	7,6	7,6
PRUEBA	1	2	3	4																																																																																																																																					
No. de Golpes	56	56	56	56																																																																																																																																					
Molde No.	1	1	1	1																																																																																																																																					
No. de Capas	5	5	5	5																																																																																																																																					
Masa muestra húmeda + molde, (g).	7524,00	7704,00	7857,00	7910,00																																																																																																																																					
Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00																																																																																																																																					
Masa muestra húmeda, (g).	4564,00	4744,00	4897,00	4950																																																																																																																																					
Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00																																																																																																																																					
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,157	2,242	2,314	2,339																																																																																																																																					
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,080	2,123	2,151	2,131																																																																																																																																					
Recipiente No.	20	60	27	17																																																																																																																																					
	1265,00	1288,00	1255,40	1272,10																																																																																																																																					
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1227,10	1230,20	1180,30	1175,80																																																																																																																																					
Masa Recipiente (g).	202,00	198,00	192,00	193,00																																																																																																																																					
Contenido de Humedad (%)	3,7	5,6	7,6	9,8																																																																																																																																					
	1	2	3																																																																																																																																						
No. de Golpes	56	25	10																																																																																																																																						
Molde No.	1	2	3																																																																																																																																						
No. de Capas	5	5	5																																																																																																																																						
Masa muestra húmeda + molde, (g).	8915,00	8681,00	8454,00																																																																																																																																						
Masa molde, (g).	4008,00	3962,00	3989,00																																																																																																																																						
Masa muestra húmeda, (g).	4907,00	4719,00	4465,00																																																																																																																																						
Volumen molde, cm3	2125,00	2125,00	2125,00																																																																																																																																						
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,309	2,221	2,101																																																																																																																																						
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,146	2,065	1,952																																																																																																																																						
Recipiente No.	27	20	8																																																																																																																																						
Masa rec. + Muestra Hum. (g).	1216,60	1282,00	1250,10																																																																																																																																						
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1144,30	1206,10	1175,10																																																																																																																																						
Masa Recipiente (g).	191,10	202,10	192,10																																																																																																																																						
Contenido de Humedad (%)	7,6	7,6	7,6																																																																																																																																						
CURVA PROCTOR  RESULTADOS DEL ENSAYO <table><tr><td>DENSIDAD MAX.</td><td>2,151</td><td>gr/cm3</td></tr><tr><td>HUMEDAD OPTIMA</td><td>7,60</td><td>%</td></tr><tr><td>% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".</td><td>35%</td><td>%</td></tr></table> CBR vs DENSIDAD SECA MAXIMA  <table><tr><td></td><td>56</td><td>25</td><td>10</td></tr><tr><td>CBR CORREG. A 01</td><td>121</td><td>62</td><td>40</td></tr><tr><td>CBR CORREG. A 02</td><td>180</td><td>103</td><td>71</td></tr></table>			DENSIDAD MAX.	2,151	gr/cm3	HUMEDAD OPTIMA	7,60	%	% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%		56	25	10	CBR CORREG. A 01	121	62	40	CBR CORREG. A 02	180	103	71																																																																																																																		
DENSIDAD MAX.	2,151	gr/cm3																																																																																																																																							
HUMEDAD OPTIMA	7,60	%																																																																																																																																							
% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%																																																																																																																																							
	56	25	10																																																																																																																																						
CBR CORREG. A 01	121	62	40																																																																																																																																						
CBR CORREG. A 02	180	103	71																																																																																																																																						
ELABORA:	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista)	REVISO / APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo)																																																																																																																																							

**CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA**

NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-048

VERSION: 003

FECHA: 30/04/2025

PAGINA 2 DE 2


PROYECTO:
CONTRATISTA:
OBRA:
MATERIAL:
FUENTE:
DESCRIPCION:

CORREDORES VIALES
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
SUB BASE GRANULAR
UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA
MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO

FECHA ENSAYO :
TRAMO
LOCALIZACIÓN
MARGEN
FECHA MUESTRA:
N° ENSAYO:

viernes, 29 de mayo de 2026
Puerto rico - San vicente. Ruta 6504
Calzada
lunes, 25 de mayo de 2026

No. DE GOLPES	10	25	56			
Molde.	3	2	1			
Masa sobrecarga utilizada (g)	4542	4542	4542			
Días de inmersión	4	4	4			
Lectura inicial (mm)	0	0	0			
Lectura Final (mm)	0	0	0			
% Expansión total	0	0	0			
Humedad de penetración.	8,9	8,6	8,2			
Penetración en milímetros	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,640	0,46	0,24	0,97	0,50	1,54	0,80
1,270	2,18	1,13	2,98	1,54	4,10	2,12
1,910	4,08	2,11	4,99	2,58	7,96	4,12
2,540	6,02	3,12	7,09	3,67	12,72	6,58
3,180	7,62	3,95	9,49	4,91	17,52	9,07
3,810	9,28	4,81	11,66	6,04	21,91	11,34
4,450	10,58	5,48	14,04	7,27	26,55	13,74
5,080	11,83	6,13	16,29	8,43	30,85	15,97
7,620	15,51	8,04	23,75	12,29	44,83	23,20
				0,00		0,00

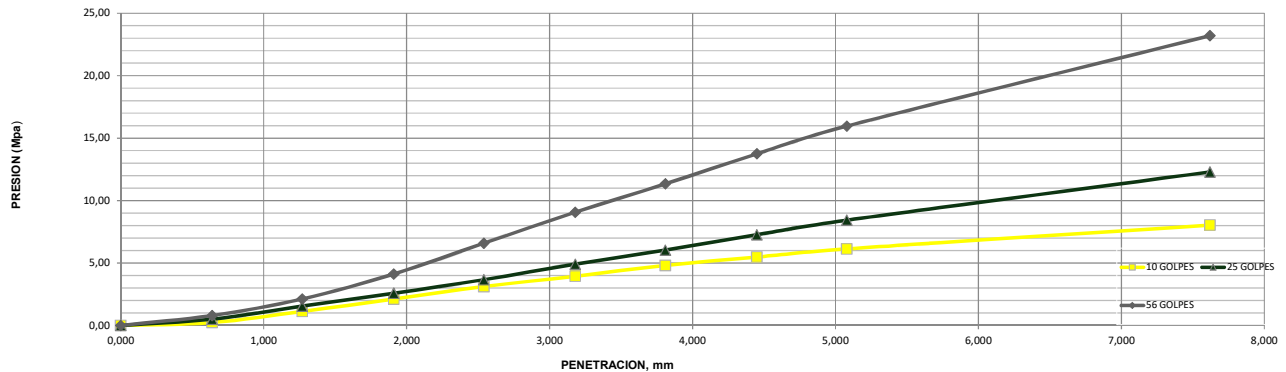

CBR AL 100%	176
CBR AL 98%	150
CBR AL 95%	111

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022: Art. 320 ≥

95%

ELABORA:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

**RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 37.5 mm
(1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES**
NORMA I.N.V. E - 218 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-052
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA DE TOMA:	4 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA	FECHA DE ENSAYO:	4 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIA DE RIO	No ENSAYO:	

TABLA 1 Y 2 INVIAS 218 - 219 DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
TAMAÑOS		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA, (g)						
PASA	RETENIDO	A	B	C	D	E	F	G
3 "	2 1/2 "					2500 ± 50		
2 1/2 "	2 "					2500 ± 50		
2 "	1 1/2 "					5000 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2 "	1 "	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
1 "	3/4 "	1250 ± 25						5000 ± 25
3/4 "	1/2 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
1/2 "	3/8 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
3/8 "	1/4 "			2500 ± 10				
1/4 "	No. 4			2500 ± 10				
No. 4	No. 8				5000 ± 10			
No. DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
No. DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000

Prueba en:	Seco	Seco	Húmedo	Rel: Hum/Sec
Gradación utilizada	A			
Numero de esferas a ser utilizadas	12			
Numero de revoluciones	500			
Peso de la muestra antes del ensayo, grs	5008,9			
Peso de la muestra después del ensayo, grs	2715,4			
Perdida por desgaste, grs	2293,5			
% DE DESGASTE	45,8			
ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: Art. 320	≤ 50%			

OBSERVACIONES: _____

EJECUTO:  SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA LABORATORISTA	APROBO:  FERNEY EDUARDO ARIAS VoBo INGENIERO
---	--

**RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 37.5 mm
(1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES**
NORMA I.N.V. E - 218 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-052
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA DE TOMA:	28 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA	FECHA DE ENSAYO:	28 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIA DE RIO	No ENSAYO:	

TABLA 1 Y 2 INVIAS 218 - 219 DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
TAMAÑOS		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA, (g)						
PASA	RETENIDO	A	B	C	D	E	F	G
3 "	2 1/2 "					2500 ± 50		
2 1/2 "	2 "					2500 ± 50		
2 "	1 1/2 "					5000 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2 "	1 "	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
1 "	3/4 "	1250 ± 25						5000 ± 25
3/4 "	1/2 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
1/2 "	3/8 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
3/8 "	1/4 "			2500 ± 10				
1/4 "	No. 4			2500 ± 10				
No. 4	No. 8				5000 ± 10			
No. DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
No. DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000

Prueba en:	Seco	Seco	Húmedo	Rel: Hum/Sec
Gradación utilizada	A			
Numero de esferas a ser utilizadas	12			
Numero de revoluciones	500			
Peso de la muestra antes del ensayo, grs	5004,8			
Peso de la muestra después del ensayo, grs	2652,6			
Perdida por desgaste, grs	2352,2			
% DE DESGASTE	47,0			
ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: Art. 320	≤ 50%			

OBSERVACIONES: _____

EJECUTO:  SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA LABORATORISTA	APROBO:  FERNEY EDUARDO ARIAS VoBo INGENIERO
---	--



EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS

NORMA I.N.V. E - 133- 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F- EO-053
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	6 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto rico - San vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	PR 05 + 300 - Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR DE RIO / SBG-38	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO AGUILA	FECHA DE TOMA:	6 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

DATOS DEL LABORATORIO

Probeta de ensayo numero	1	2	3	PROMEDIO
Lectura de Arena = a	3,4	3,4	3,5	<u>3</u>
Lectura de Arcilla = b	6,9	7	7,1	<u>7</u>
Equivalente de Arena =	49,3%	48,6%	49,3%	<u>49,0%</u>

% EQUIVALENTE DE ARENA =

49%

ESPECIFICACIONES DEL INVIAS 2022

1. Agregado fino para Mezclas Asfálticas en caliente	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 450 TABLA 450-3 NT1- NT2 - NT3	≥ 50%
2. Concreto Hidráulico y Estructural.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 500 TABLA 500-2 ART.630 TABLA 630 - 1	≥ 60%
3. Capas de base Granular.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 330 TABLA 330-2 CLASE C-B-A	≥ 30%
4. Capas de sub - base granular	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 320 TABLA 320-2 CLASE C-B-A	≥ 25%
5. Capas de Base estabilizada con cemento	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 351 TABLA 351-2 CLASE -B-A	≥ 30%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

NOMBRE (Laboratorista)

FIRMA (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

NOMBRE INGENIERO

FIRMA INGENIERO VoBo



EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS

NORMA I.N.V. E - 133- 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F- EO-053
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	27 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto rico - San vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	PR 05 + 300 - Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR DE RIO / SBG-38	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO AGUILA	FECHA DE TOMA:	27 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

DATOS DEL LABORATORIO

Probeta de ensayo numero	1	2	3	PROMEDIO
Lectura de Arena = a	3,6	3,3	3,4	<u>3</u>
Lectura de Arcilla = b	7,4	6,8	7,1	<u>7</u>
Equivalente de Arena =	48,6%	48,5%	47,9%	<u>48,4%</u>

% EQUIVALENTE DE ARENA =

48%

ESPECIFICACIONES DEL INVIAS 2022

1. Agregado fino para Mezclas Asfálticas en caliente	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 450 TABLA 450-3 NT1- NT2 - NT3	≥ 50%
2. Concreto Hidráulico y Estructural.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 500 TABLA 500-2 ART.630 TABLA 630 - 1	≥ 60%
3. Capas de base Granular.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 330 TABLA 330-2 CLASE C-B-A	≥ 30%
4. Capas de sub - base granular	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 320 TABLA 320-2 CLASE C-B-A	≥ 25%
5. Capas de Base estabilizada con cemento	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 351 TABLA 351-2 CLASE -B-A	≥ 30%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

NOMBRE (Laboratorista)

FIRMA (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

NOMBRE INGENIERO

FIRMA INGENIERO VoBo




DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO
NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022

CÓDIGO: F-EO-057
VERSIÓN: 003
FECHA: 30/04/2025
PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,	FECHA:	miércoles, 6 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	SUB BASE GRANULAR / SBG - 38	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO EL AGUILA	No ENSAYO:	

DETERMINACION	1	2	3	4	
Peso Molde + material húmedo (g)	7698	7842	7979	8002	
Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960	
Peso material húmedo (g)	4738	4882	5019	5042	
Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,239	2,307	2,372	2,383	
CALCULO DE HUMEDADES					
Cápsula + material húmedo (g)	1250,3	1250,4	1264,7	1261,0	
Cápsula + material seco (g)	1203,8	1188,5	1183,4	1165,4	
Peso del agua (g)	46,5	61,9	81,3	95,6	
Peso de la cápsula (g)	203,7	191,1	191,4	195,0	
Peso material seco (g)	1000,1	997,4	992,0	970,4	
Contenido de agua %	4,6	6,2	8,2	9,9	
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,140	2,172	2,192	2,169	

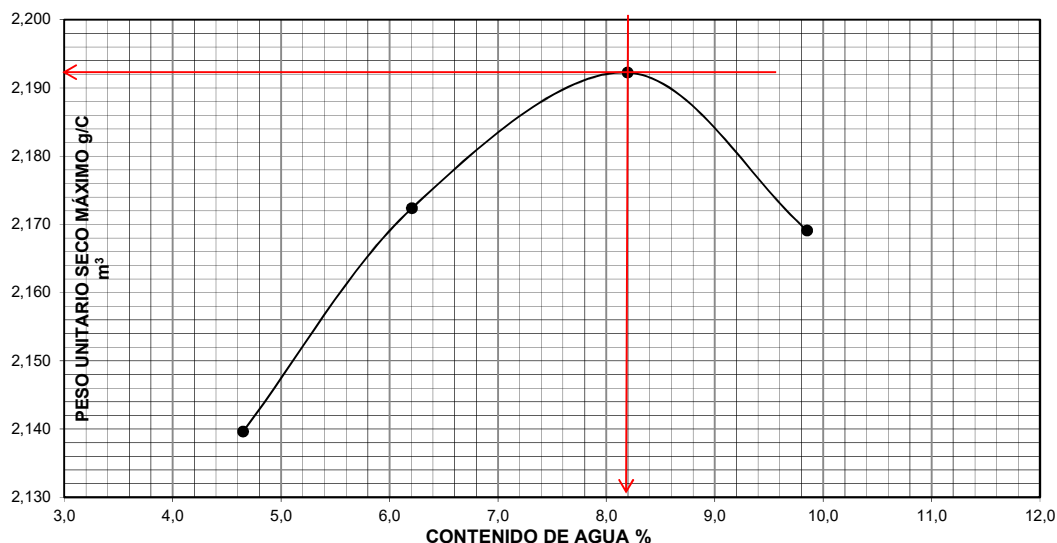

Método empleado	C
% Pasa Tamiz No 200	
Límite líquido	
Índice de plasticidad	
CLASIFICACIÓN	
U.S.C.	
AASHTO	
DENSIDAD MÁXIMA (g/cm ³)	2,192
HUMEDAD ÓPTIMA %	8,2

OBSERVACIONES	Cbr # 1
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	EJECUTO
INV E - 142	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
	LABORATORISTA
	APROBÓ
	FERNEY EDUARDO ARIAS
	VoBo INGENIERO



INFORME DE RESULTADOS DE
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE
POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO MICRO DEVAL.
NORMA I.N.V. E - 238 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-058

VERSION: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: NEIVA - FLORENCIA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA

FECHA MUESTREO: 11 de mayo de 2026
FECHA ENSAYO: 11 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: Ruta 6504
MARGEN: Acopio
No ENSAYO:

MUESTRA N°	1	
GRADACION USADA	A	
MASA DE ESFERAS	5000	
N° REVOLUCIONES (RPM)	100	
Pa: PESO DE LA MUESTRA SECA INICIAL (g)	1502	
Pb: PESO DE LA MUESTRA SECA FINAL (g)	1254,1	
PERDIDA MICRO - DEVAL INDIVIDUAL %	16,5%	

PERDIDA MICRO - DEVAL PROMEDIO % 17%

Tamices		Masa y gradación de la muestra en gramos		
PASA	RETIENE	Tamaño nominal maximo		
		A= > 3/4"	B= 1/2"	C= < 3/8"
3/4"	5/8"	375		
5/8"	1/2"	375		
1/2"	3/8"	750	750	
3/8"	1/4"		375	750
1/4"	N°4		375	750
N°4	N°8			
Carga Abrasiva - esferas (g)		5000 +/-5	5000 +/-5	5000 +/-5
Tiempo de ensayo en minutos		120 +/-1	105 +/-1	95 +/-1
R.P.M.		100 +/-5	100 +/-5	100 +/-5

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: Art. 320 ≤

30%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)


Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS NORMA I.N.V. E - 211 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022	CODIGO: F-EO-059 VERSIÓN: 003 Fecha: 30/04/2025 PAGINA 1 DE 1																																																										
PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA DESCRIPCION: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO		FECHA DE TOMA: 11 de mayo de 2026 TRAMO: Puerto Rico - San Vicente LOCALIZACION: Ruta 6504 MARGEN: Acopio FECHA ENSAYO: 12 de mayo de 2026 No DE ENSAYO:																																																										
FRACCION DEL AGREGADO GRUESO <table><thead><tr><th colspan="2">TAMIZ</th><th rowspan="2">PESO INICIAL, grs</th><th rowspan="2">PESO FINAL, grs</th><th rowspan="2">RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)</th><th rowspan="2">PERDIDA TOTAL (%)</th><th rowspan="2">PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)</th></tr><tr><th>PASA</th><th>RETENIDO</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Mayores a 1 1/2"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>>1 1/2"</td><td>1 1/2 "</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 1/2 "</td><td>3/4 "</td><td>2845,2</td><td>2835,8</td><td>43,9</td><td>0,33</td><td>0,22</td></tr><tr><td>3/4 "</td><td>3/8 "</td><td>1965,7</td><td>1944,1</td><td>12,7</td><td>1,10</td><td>0,21</td></tr><tr><td>3/8 "</td><td>No. 4</td><td>1056,3</td><td>1019</td><td>9,9</td><td>3,53</td><td>0,52</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES :</td><td>5867</td><td>5798,90</td><td>66,5</td><td>4,96</td><td>0,95</td></tr></tbody></table> NOTA 1: Si el agregado contiene menos del 00,5% de cualquiera de los tamaños especificados no se debiera ensayar dicho tamaño y se tomara como % de partículas deleznable de acuerdo al tamiz siguiente mayor o menor. <table><tr><td rowspan="3">COLORACIÓN DEL AGUA:</td><td>ALGO TURBIA</td><td>X</td></tr><tr><td>TURBIA</td><td></td></tr><tr><td>MUY TURBIA</td><td></td></tr></table>			TAMIZ		PESO INICIAL, grs	PESO FINAL, grs	RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)	PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)	PASA	RETENIDO	Mayores a 1 1/2"							>1 1/2"	1 1/2 "						1 1/2 "	3/4 "	2845,2	2835,8	43,9	0,33	0,22	3/4 "	3/8 "	1965,7	1944,1	12,7	1,10	0,21	3/8 "	No. 4	1056,3	1019	9,9	3,53	0,52	TOTALES :		5867	5798,90	66,5	4,96	0,95	COLORACIÓN DEL AGUA:	ALGO TURBIA	X	TURBIA		MUY TURBIA	
TAMIZ		PESO INICIAL, grs	PESO FINAL, grs	RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)						PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)																																																	
PASA	RETENIDO																																																											
Mayores a 1 1/2"																																																												
>1 1/2"	1 1/2 "																																																											
1 1/2 "	3/4 "	2845,2	2835,8	43,9	0,33	0,22																																																						
3/4 "	3/8 "	1965,7	1944,1	12,7	1,10	0,21																																																						
3/8 "	No. 4	1056,3	1019	9,9	3,53	0,52																																																						
TOTALES :		5867	5798,90	66,5	4,96	0,95																																																						
COLORACIÓN DEL AGUA:	ALGO TURBIA	X																																																										
	TURBIA																																																											
	MUY TURBIA																																																											
FRACCION DEL AGREGADO FINO <table><thead><tr><th colspan="2">TAMIZ</th><th rowspan="2">PESO INICIAL (grs)</th><th rowspan="2">PESO FINAL, grs</th><th rowspan="2">RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)</th><th rowspan="2">PERDIDA TOTAL (%)</th><th rowspan="2">PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)</th></tr><tr><th>PASA</th><th>RETENIDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>No. 4</td><td>No. 16</td><td>100</td><td>97,3</td><td>19,2</td><td>2,70</td><td>0,78</td></tr></tbody></table> <table><tr><td rowspan="3">COLORACIÓN DEL AGUA:</td><td>ALGO TURBIA</td><td>X</td></tr><tr><td>TURBIA</td><td></td></tr><tr><td>MUY TURBIA</td><td></td></tr></table> ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: Art. 320 ≤ 2% MAX. AG. GRUESO ≤2% MAX. AG. FINO			TAMIZ		PESO INICIAL (grs)	PESO FINAL, grs	RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)	PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)	PASA	RETENIDO	No. 4	No. 16	100	97,3	19,2	2,70	0,78	COLORACIÓN DEL AGUA:	ALGO TURBIA	X	TURBIA		MUY TURBIA																																				
TAMIZ		PESO INICIAL (grs)	PESO FINAL, grs	RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)						PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)																																																	
PASA	RETENIDO																																																											
No. 4	No. 16	100	97,3	19,2	2,70	0,78																																																						
COLORACIÓN DEL AGUA:	ALGO TURBIA	X																																																										
	TURBIA																																																											
	MUY TURBIA																																																											
OBSERVACIONES:																																																												
EJECUTO: SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA NOMBRE (Laboratorista)  FIRMA (Laboratorista)	REVISO / APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS NOMBRE INGENIERO (VoBo)  FIRMA INGENIERO (VoBo)																																																											

	SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO NORMA I.N.V. E - 220 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022	Código: F-EO-061 Versión: 003 Fecha: 30/04/2025 Página 1 de 1								
PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA		FECHA ENSAYO: sábado, 30 de mayo de 2026								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		TRAMO: Puerto Rico - San Vicente								
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA		LOCALIZACIÓN: Ruta 6504								
TIPO DE MATERIAL: SUB BASE GRANULAR		MARGEN: Acopio								
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO AGUILA		FECHA DE TOMA: lunes, 25 de mayo de 2026								
DESCRIPCIÓN: MATERIAL DE RIO COLOR CAFÉ CLARO		No ENSAYO: -								
Numero de ciclos : 5		Solución utilizada SODIO	Densidad de la solución (g/cm3) 1.168.0							
Agregado Grueso										
Fracción		Peso de la fracción recomendada, grs	Peso de las fracciones, grs		Cantidad de partículas del ensayo		Gradación original, %	Fracción perdida, %		
Pasa	Retenido		Inicial	Final	Antes	Después		% que pasa el tamiz designado	perdida ponderada en %	
2"	1 1/2"	2000 ± 200							0,0%	
1 1/2"	1"	1000 ± 50	956,3	947,1	79	79	21,62	0,96%	0,21%	
1"	3/4"	500 ± 30	500,5	481,2	55	55	17,41	3,86%	0,67%	
3/4"	1/2"	670 ± 10	684,2	664,3			25,35	2,91%	0,74%	
1/2"	3/8"	330 ± 5	342,1	313,8			13,64	8,27%	1,13%	
3/8"	Nº 4	300 ± 5	300,6	276,4			21,97	8,05%	1,77%	
TOTALES			2783.70	2682.80	134.00	134.00	100.00		4.51%	
Perdida total : %								4.51%		
Nota: el % retenido en gradación original de los tamices individuales deben tener mas del 5%, si no se toma el % de perdida del tamaño mayor mas proximo.										
EXAMEN CUALITATIVO DE LAS PARTICULAS GRUESAS										
TAMANO TAMIZ		PARTICULAS QUE EXHIBEN ALTERACIONES								
		R		D		A		E		No TOTAL DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO
		No	%	No	%	No	%	No	%	
DE 2 1/2" A 1 1/2"		0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	79
DE 1 1/2" A 3/4"		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	55
Agregado Fino										
Fracción		Peso de la fracción recomendada, grs	Peso de las fracciones, grs		Cantidad de partículas del ensayo		Gradación original, %	Fracción perdida, %		
Pasa	Retenido		Inicial	Final	Antes	Después		% que pasa el tamiz designado	perdida ponderada en %	
3/8"	Nº 4	100	100,0	97,7			25,83	2,30%	0,59%	
Nº 4	Nº 8	100	100,0	92,9			15,66	7,10%	1,11%	
Nº 8	Nº 16	100	100,0	92,1			13,21	7,90%	1,04%	
Nº 16	Nº 30	100	100,0	84,2			17,27	15,80%	2,73%	
Nº 30	Nº 50	100	100,0	84,5			18,05	15,50%	2,80%	
Nº 50	Nº 100	100	100,0	84,7			9,98	15,30%	1,53%	
MENORES DE Nº 100		-	-	-				-	-	
TOTALES							100.00			
Perdida total : %								9,8%		
ESPECIFICACIÓN DEL INVIAS 2022: Art. 320					Sulfato de Sodio	X	≤ 12 %			
					Sulfato de Magnesio		≤ 18%			
OBSERVACIONES:										
SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA Nombre  Firma (Laboratorista) FERNEY EDUARDO ARIAS Nombre  Firma Ingeniero (VoBo)										
EJECUTO:		APROBO:								

		DENSIDAD EN EL TERRENO (Metodo cono - arena) I.N.V. E- 161 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022		CÓDIGO F-EQ-036			
				VERSIÓN 004			
				FECHA 30/04/2025			
				PÁGINA 1 DE 1			
PROYECTO: CONTRATISTA: OBRA: TIPO DE MATERIAL: TRAMO A EVALUAR: FUENTE:		CTTO 991"NEIVA - FLORENCIA" CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE PTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN SUB BASE PR 6+805 - LLENO ALCANTARILLA RIO EL AGUILA		TRAMO: LOCALIZACION: COSTADO / CARRIL FECHA DE TOMA: REGISTRO:			
		METODO DE COMPACTACION MUESTRA EN EL LABORATORIO: TAMIZADO POR EL CUAL SE SEPARARON LOS SOBRETAMAÑOS:		A 4 No B 3/8" C 3/4" X X			
DENSIDAD N°		formula	1	2	3	4	5
CAPA No			1				
COSTADO / MARGEN			IZQUIERDO				
UBICACIÓN / ABCISADO			6+875				
PROFUNDIDAD ENSAYO cms.			14,0				
A	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)		6414				
B	PESO FRASCO Y ARENA FINAL (g)		1859				
C	PESO ARENA TOTAL USADA (g)	(A-B)	4555				
D	CONSTANTE DEL CONO (g)		1612				
E	MASA ARENA EN EL HUECO (g)	(C-D)	2943				
F	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm³)		1,378				
G	VOLUMEN DEL HUECO (cm³)	(E/F)	2136				
H	MASA MATERIAL TOTAL EXTRAIDO HUMEDO (g)		5097				
I	HUMEDAD DEL MATERIAL (%)		8,40				
J	MASA DE MATERIAL SECO EXTRAIDO (g)	H / (1+(I/100)	4702				
K	MASA HUMEDA MATERIAL SOBRE TAMAÑO (g)		953				
L	GRAVEDAD ESPECIFICA FRACCION GRUESA (g/cm³)		2,600				
M	% RETENIDO GRUESO 3/4"	(K/H)	20,3				
N	% PARTICULAS DE PARTICULAS FINAS	100-M	79,7				
O	Densidad Seca de Campo de la Muestra (g/cm³)	J/G	2,202				
P	Densidad seca Maxima (gr/cm³) (laboratorio)		2,151				
Q	Densidad Seca Corregida dde la muestra en campo(gr/cm³)	(O*L*N)/((100*L)-(O*M)	2,119				
R	COMPACTACION DEL TERRENO (%) (GCi), %	N/P	98,5%				
				N/P			
		Gcm: S= GCI (90),%	99% 0,00 99%	SE ACEPTA EL LOTE		Grado de compactacion minimo % 90%	
ESPECIFICACIONES DEL INVIAS							
Capa de Base granular		Min 98%	Capa de terraplen	Clasificados como A-1, A-2-4 o A-3	CIMIENTO	Min 90%	
Capa de Subbase Granular		Min 95%			CORONA	Min 95%	
Capa de afirmado		Min 95%		Otras clasificaciones	CIMIENTO	Min 95%	
Capa de relleno de estructuras		Clasificados en A-1, A-2-4 o A-3 SBG o BG			CORONA	Min 100%	
		Otras clasificaciones					
OBSERVACIONES:							
EJECUTO:		NOMBRE CARGO FIRMA	HUGO GORDILLO AUXILIAR LABORATORIO 		APROBO: NOMBRE CARGO FIRMA		
					FERNEY EDUARDO ARIAS 		

Ensayos
Base Granular
Zona Industrial
Proyecto 132



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025


Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	sábado, 2 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+916 - PR9+920 - PR9+923
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	Costado Izquierdo
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	sábado, 2 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO							
Peso inicial:		16975,6	Peso final:		16147	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	2956,2	17,41%	17,41%	82,6%	75%	100%
3/4"	19,00	2415	14,23%	31,64%	68,4%	65%	90%
3/8"	9,50	2944,2	17,34%	48,98%	51,0%	45%	68%
Nº 4	4,75	1708,2	10,06%	59,05%	41,0%	30%	50%
Nº 10	2,00	1540,9	9,08%	68,12%	31,9%	15%	32%
Nº 40	0,43	3046,9	17,95%	86,07%	13,9%	7%	20%
Nº 200	0,075	1535,1	9,04%	95,12%	4,9%	0%	9%
FONDO		55,6	0,33%	95,44%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1118,40
Peso muestra seca + recip.	1064,8
Peso recipiente	191,4
% de humedad	6,1
Gravas :	49,0%
Arenas :	37,1%
Finos :	13,9%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

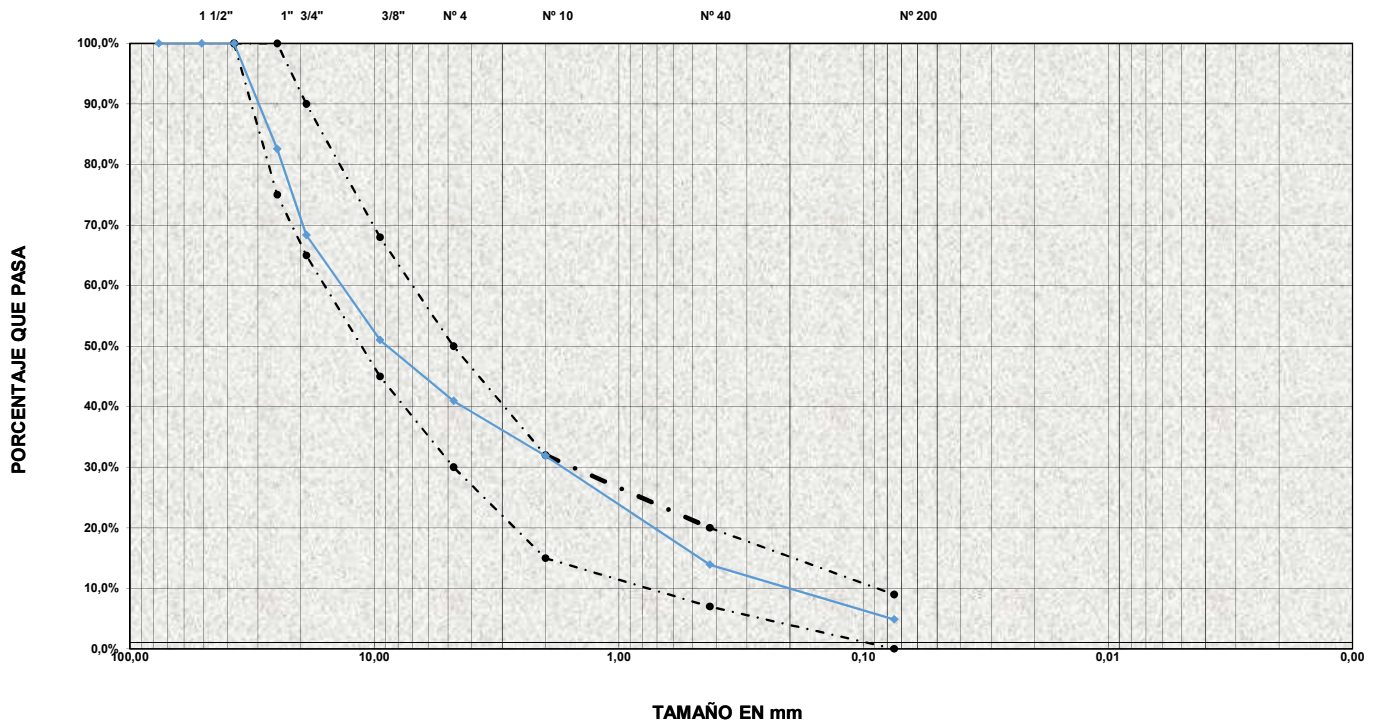

OBSERVACIONES:

EJECUTO: SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)
Firma (Laboratorista)

APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero
Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	2 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+916 - PR9+920 - PR9+923
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	Costado Izquierdo
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	2 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	16975,6		Peso Final	15987	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA	
				100,0	
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0	
1"	2956,2	17,4	17,4	82,6	
3/4"	2415	14,2	31,6	68,4	
3/8"	2944,2	17,3	49,0	51,0	
Nº 4	1708,2	10,1	59,0	41,0	
Nº 10	1380,9	8,1	67,2	32,8	
Nº 40	3046,9	17,9	85,1	14,9	
Nº 200	1535,1	9,0	94,2	5,8	
FONDO	55,6	0,3	94,5	5,5	

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA

TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: viernes, 8 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR5+630 - PR5+640 - PR5+650 - PR5+670 - PR5+730 - PR5+780 - PR5+840 - PR5+890 - PR5+910 - PR5+920 - PR5+970 - PR5+980

MARGEN:

FECHA DE TOMA: viernes, 8 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO

Peso inicial:		15780,2	Peso final:		15026	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	2768,1	17,54%	17,54%	82,5%	75%	100%
3/4"	19,00	2100,8	13,31%	30,85%	69,1%	65%	90%
3/8"	9,50	2835	17,97%	48,82%	51,2%	45%	68%
Nº 4	4,75	1591,3	10,08%	58,90%	41,1%	30%	50%
Nº 10	2,00	1435,9	9,10%	68,00%	32,0%	15%	32%
Nº 40	0,43	2905,3	18,41%	86,41%	13,6%	7%	20%
Nº 200	0,075	1389,5	8,81%	95,22%	4,8%	0%	9%
FONDO		51,6	0,33%	95,55%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1074,40
Peso muestra seca + recip.	1023,9
Peso recipiente	191,5
% de humedad	6,1

Gravas :	48,8%
Arenas :	37,6%
Finos :	13,6%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

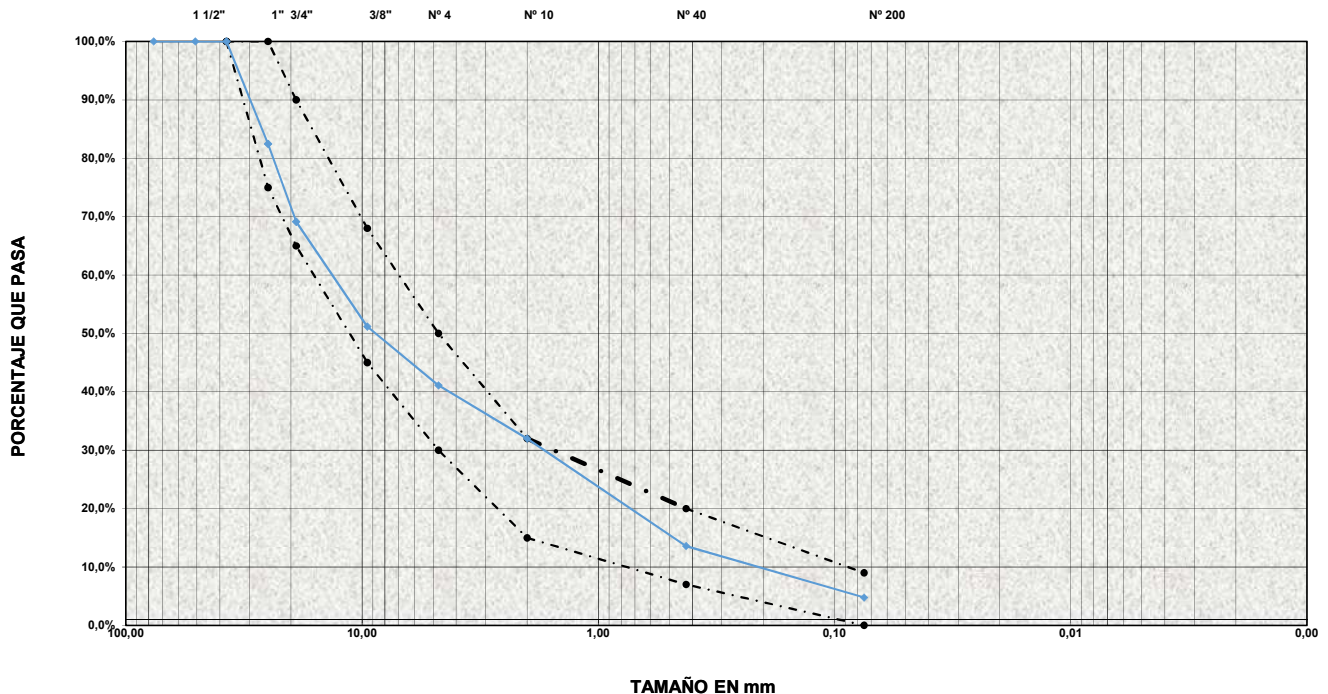

OBSERVACIONES:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

EJECUTO:

Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

APROBO:

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	8 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR5+630 - PR5+640 - PR5+650 -PR5+670 - PR5+730 - PR5+780 - PR5+840 - PR5+890 - PR5+910 - PR5+920 - PR5+970 - PR5+980
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	8 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15780,2	Peso Final		14901
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	2758,1	17,5	17,5	82,5
3/4"	2100,8	13,3	30,8	69,2
3/8"	2835	18,0	48,8	51,2
N° 4	1591,3	10,1	58,8	41,2
N° 10	1321,2	8,4	67,2	32,8
N° 40	2905,3	18,4	85,6	14,4
N° 200	1389,5	8,8	94,4	5,6
FONDO	51,6	0,3	94,8	5,2

LIMITE LIQUIDO

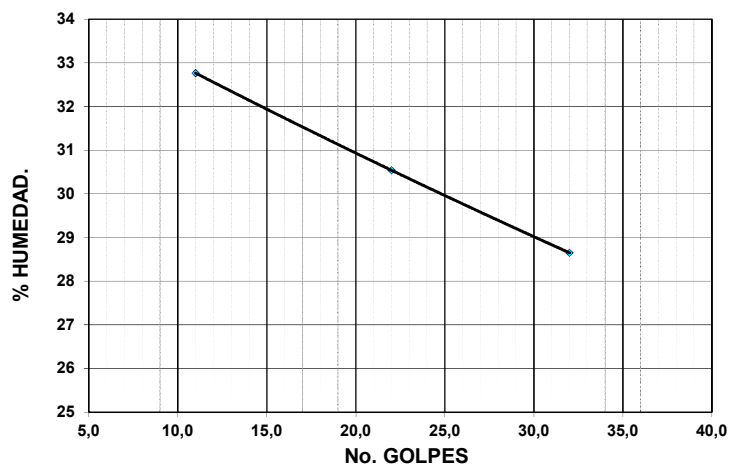

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025


Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	lunes, 25 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR6+090
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	lunes, 25 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO							
Peso inicial:		17000,0	Peso final:		15874	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1898	11,16%	11,16%	88,8%	75%	100%
3/4"	19,00	1861,7	10,95%	22,12%	77,9%	65%	90%
3/8"	9,50	3392,9	19,96%	42,07%	57,9%	45%	68%
Nº 4	4,75	2734,2	16,08%	58,16%	41,8%	30%	50%
Nº 10	2,00	1730,6	10,18%	68,34%	31,7%	15%	32%
Nº 40	0,43	2600,1	15,29%	83,63%	16,4%	7%	20%
Nº 200	0,075	1656,6	9,74%	93,38%	6,6%	0%	9%
FONDO		97,4	0,57%	93,95%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1264,00
Peso muestra seca + recip.	1192,8
Peso recipiente	204
% de humedad	7,2
Gravas :	42,1%
Arenas :	41,6%
Finos :	16,4%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

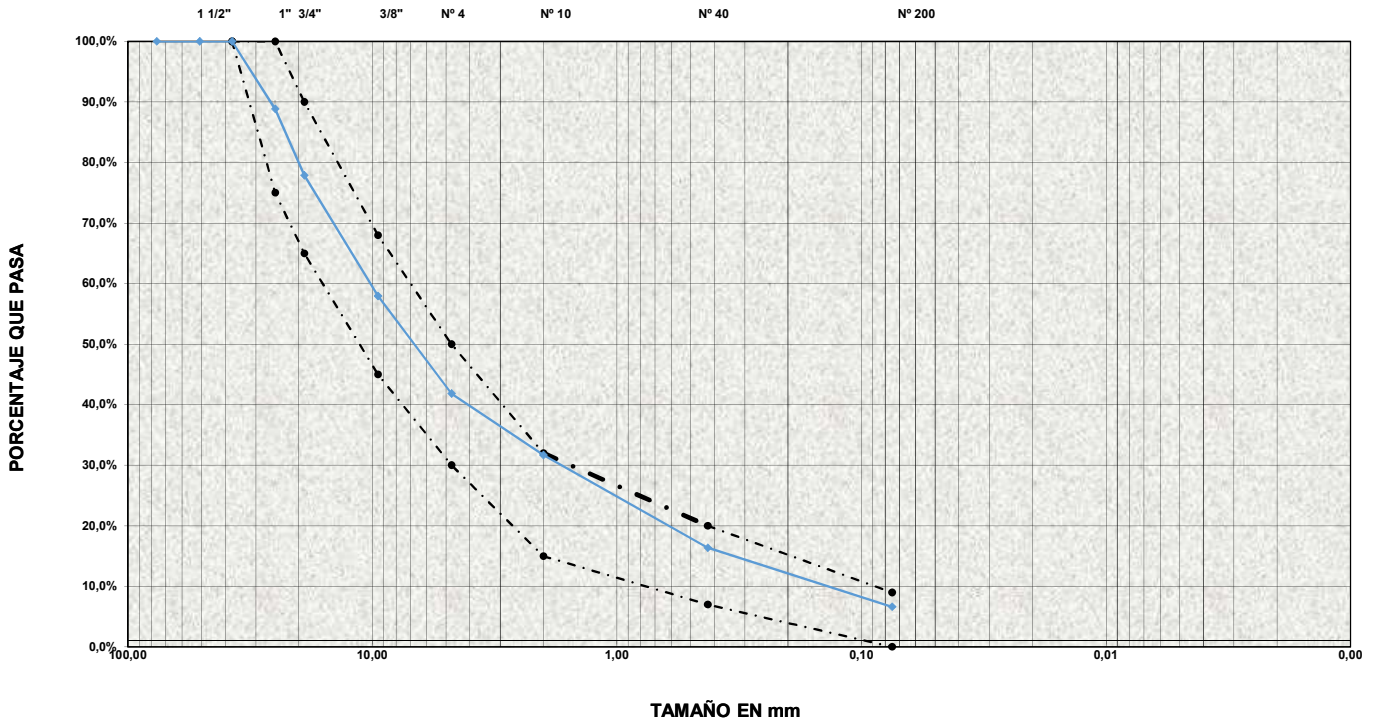

OBSERVACIONES:

EJECUTO: SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)
Firma (Laboratorista)

APROBO: FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero
Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: 25 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: RT6504 PR6+090
MARGEN:
FECHA DE TOMA: 25 de mayo de 2026
No ENSAYO:

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	17000,0	Peso Final	15874	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	1898	11,2	11,2	88,8
3/4"	1861,7	11,0	22,1	77,9
3/8"	3392,9	20,0	42,1	57,9
Nº 4	2734,2	16,1	58,2	41,8
Nº 10	1730,6	10,2	68,3	31,7
Nº 40	2600,1	15,3	83,6	16,4
Nº 200	1656,6	9,7	93,4	6,6
FONDO	97,4	0,6	94,0	6,1

LIMITE LIQUIDO

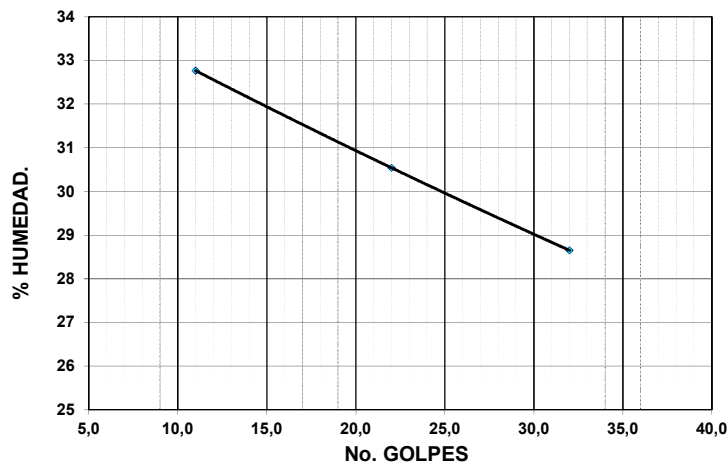

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA

TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: sábado, 9 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR5+840 - PR5+900 - PR5+930 - PR5+941 - PR5+942 - PR5+943 - PR5+944 - PR5+945 - PR5+946 - PR5+950 - PR5+990

MARGEN:

FECHA DE TOMA: sábado, 9 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO

Peso inicial:		15169,0	Peso final:		14139	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1779,8	11,73%	11,73%	88,3%	75%	100%
3/4"	19,00	1847,2	12,18%	23,91%	76,1%	65%	90%
3/8"	9,50	3190,8	21,04%	44,95%	55,1%	45%	68%
Nº 4	4,75	1614,6	10,64%	55,59%	44,4%	30%	50%
Nº 10	2,00	1919,2	12,65%	68,24%	31,8%	15%	32%
Nº 40	0,43	2384,7	15,72%	83,96%	16,0%	7%	20%
Nº 200	0,075	1403	9,25%	93,21%	6,8%	0%	9%
FONDO		60,8	0,40%	93,61%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1255,80
Peso muestra seca + recip.	1162,6
Peso recipiente	196,3
% de humedad	9,6

Gravas :	44,9%
Arenas :	39,0%
Finos :	16,0%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

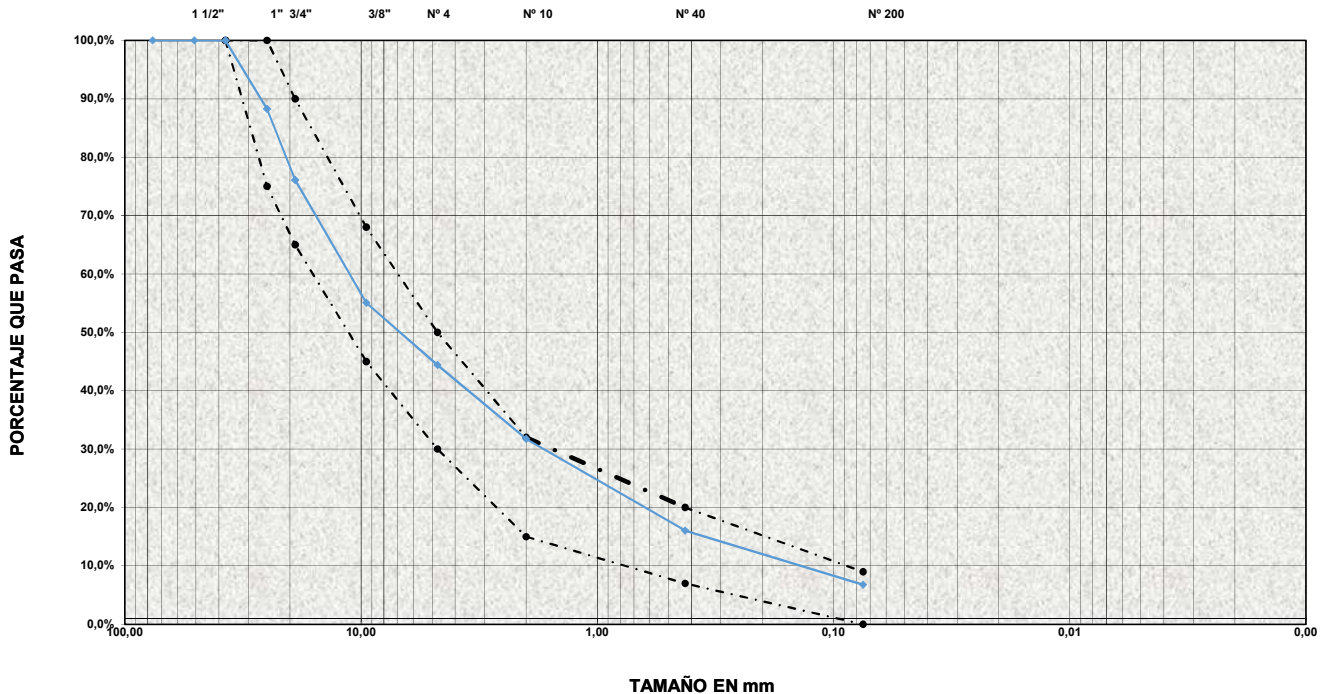

OBSERVACIONES:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

EJECUTO:

Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

APROBO:

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	9 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR5+840 - PR5+900 - PR5+930 - PR5+941 - PR5+942 - PR5+943 - PR5+944 - PR5+945 - PR5+946 - PR5+950 - PR5+990
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	9 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15169,0	Peso Final	14139	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	1779,8	11,7	11,7	88,3
3/4"	1847,2	12,2	23,9	76,1
3/8"	3190,8	21,0	44,9	55,1
Nº 4	1614,6	10,6	55,6	44,4
Nº 10	1919,2	12,7	68,2	31,8
Nº 40	2384,7	15,7	84,0	16,0
Nº 200	1403	9,2	93,2	6,8
FONDO	60,8	0,4	93,6	6,4

LIMITE LIQUIDO

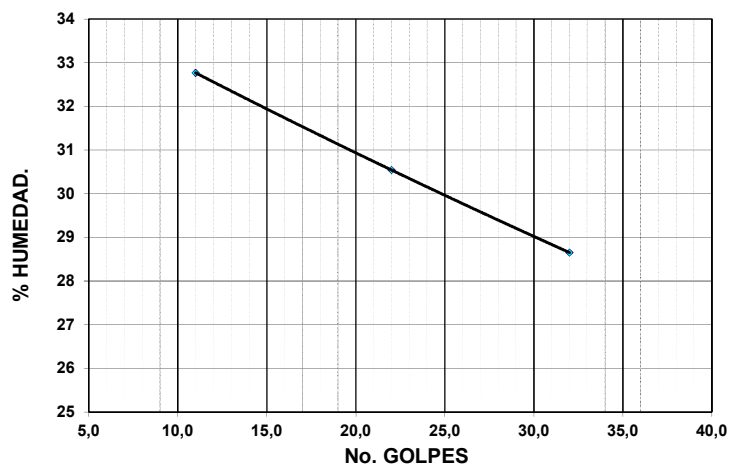

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025


Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	lunes, 11 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+965 - PR9+966 - PR9+967 - PR9+968 - PR9+969 - PR9+970 - PR9+971 - PR9+995
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	Costado Derecho
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	lunes, 11 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO							
Peso inicial:		15273,0	Peso final:		14175	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1752	11,47%	11,47%	88,5%	75%	100%
3/4"	19,00	1293,6	8,47%	19,94%	80,1%	65%	90%
3/8"	9,50	3393,4	22,22%	42,16%	57,8%	45%	68%
Nº 4	4,75	1815,9	11,89%	54,05%	46,0%	30%	50%
Nº 10	2,00	2180,5	14,28%	68,33%	31,7%	15%	32%
Nº 40	0,43	2319	15,18%	83,51%	16,5%	7%	20%
Nº 200	0,075	1420,5	9,30%	92,81%	7,2%	0%	9%
FONDO		59,1	0,39%	93,20%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1265,00
Peso muestra seca + recip.	1166,6
Peso recipiente	191,3
% de humedad	10,1
Gravas :	42,2%
Arenas :	41,4%
Finos :	16,5%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

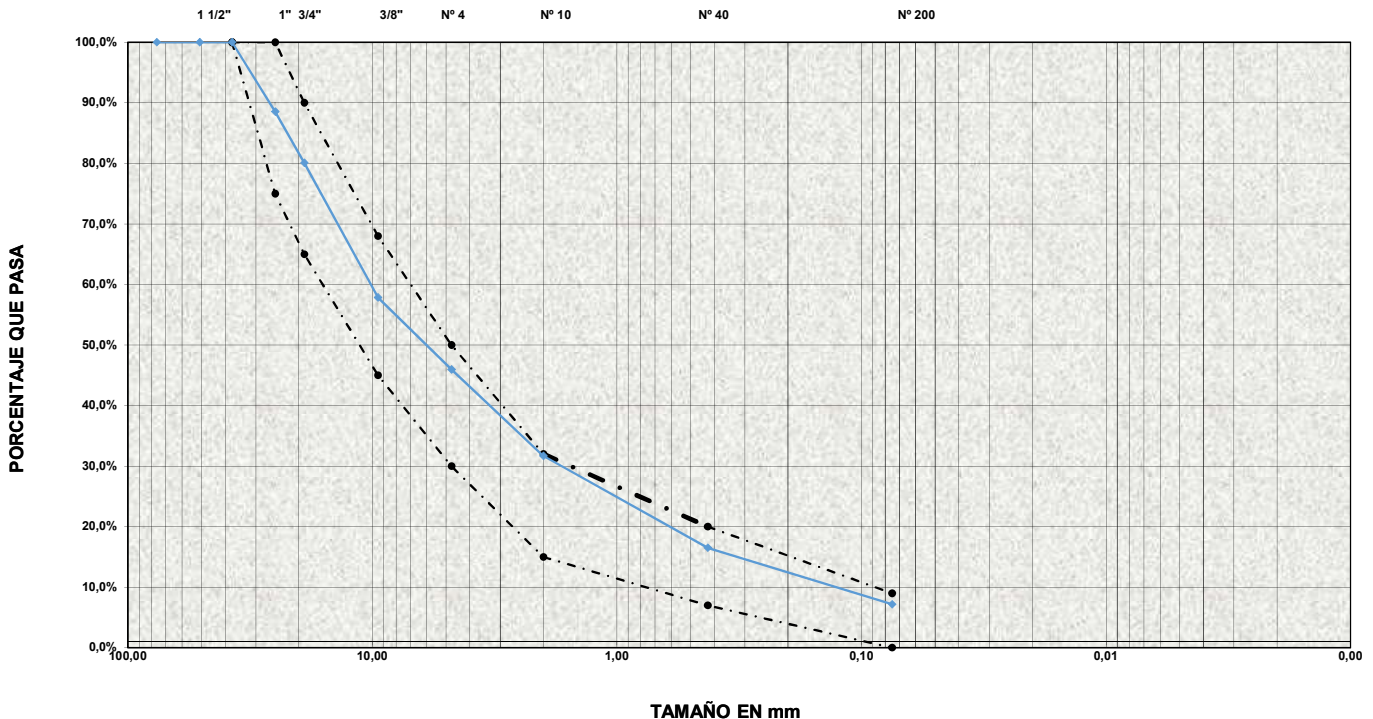

OBSERVACIONES:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)
EJECUTO:
Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero
APROBO:
Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	11 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR9+965 - PR9+966 - PR9+967 - PR9+968 - PR9+969 - PR9+970 - PR9+971 - PR9+995
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	Costado Derecho
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	11 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15273,0	Peso Final	14175	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	1752	11,5	11,5	88,5
3/4"	1293,6	8,5	19,9	80,1
3/8"	3393,4	22,2	42,2	57,8
Nº 4	1815,9	11,9	54,0	46,0
Nº 10	2180,5	14,3	68,3	31,7
Nº 40	2319	15,2	83,5	16,5
Nº 200	1420,5	9,3	92,8	7,2
FONDO	59,1	0,4	93,2	6,8

LIMITE LIQUIDO

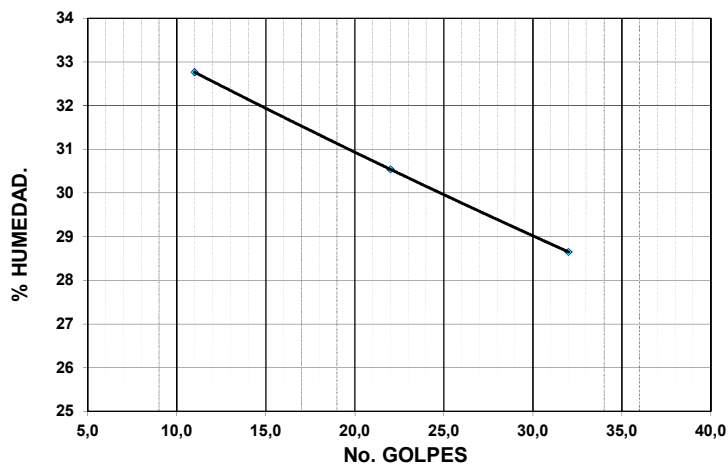

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA

TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: sábado, 16 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR6+300 - PR6+320 - PR6+330 - PR6+350 - PR6+360 - PR6+370 - PR6+390 - PR6+395 - PR6+400 - PR6+500 - PR6+510 - PR6+520

MARGEN:

FECHA DE TOMA: sábado, 16 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO

Peso inicial:		15780,0	Peso final:		14508	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1136	7,20%	7,20%	92,8%	75%	100%
3/4"	19,00	2033,3	12,89%	20,08%	79,9%	65%	90%
3/8"	9,50	3983,4	25,24%	45,33%	54,7%	45%	68%
Nº 4	4,75	1661	10,53%	55,85%	44,1%	30%	50%
Nº 10	2,00	1982,7	12,56%	68,42%	31,6%	15%	32%
Nº 40	0,43	2163,5	13,71%	82,13%	17,9%	7%	20%
Nº 200	0,075	1547,7	9,81%	91,94%	8,1%	0%	9%
FONDO		82,4	0,52%	92,46%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1280,70
Peso muestra seca + recip.	1234,1
Peso recipiente	194,8
% de humedad	4,5

Gravas :	45,3%
Arenas :	36,8%
Finos :	17,9%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

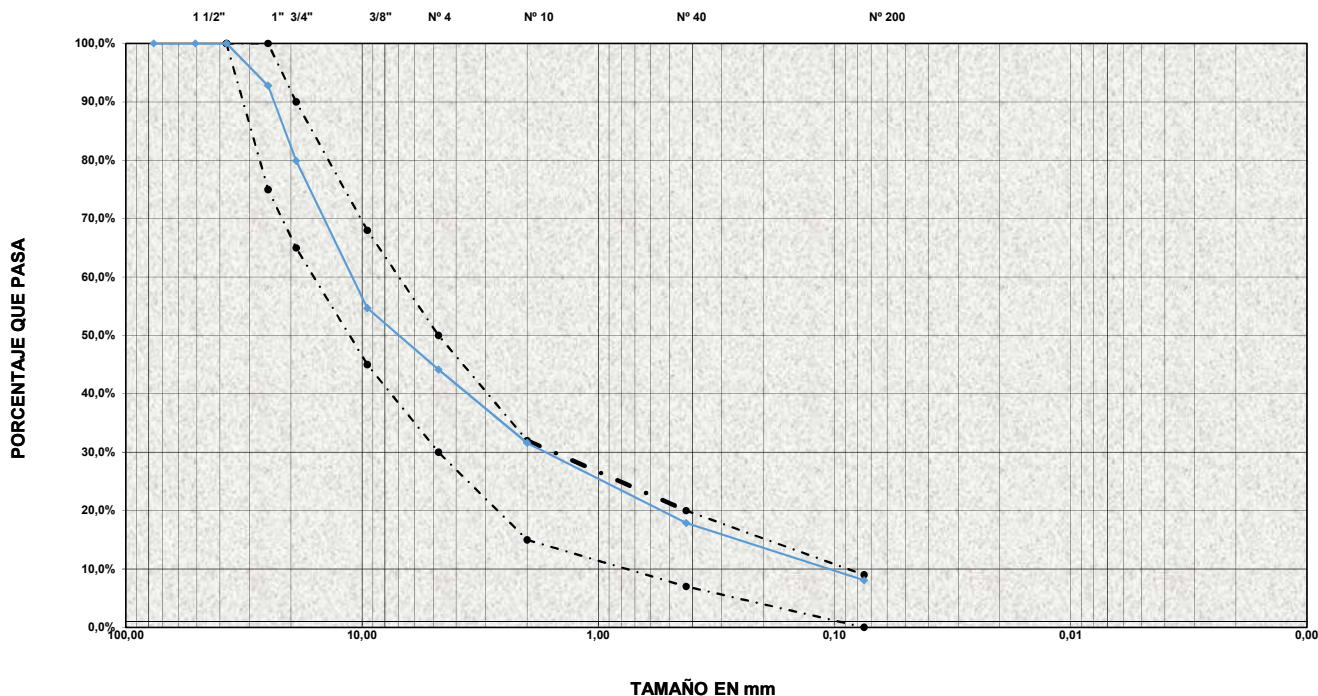

OBSERVACIONES:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

EJECUTO:

Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

APROBO:

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	16 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR6+300 - PR6+320 - PR6+330 - PR6+350 - PR6+360 - PR6+370 - PR6+390 - PR6+395 - PR6+400 - PR6+500 - PR6+510 - PR6+520
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	16 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15780,0		Peso Final	14508
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	1136	7,2	7,2	92,8
3/4"	2033,3	12,9	20,1	79,9
3/8"	3983,4	25,2	45,3	54,7
Nº 4	1661,0	10,5	55,9	44,1
Nº 10	1982,7	12,6	68,4	31,6
Nº 40	2163,5	13,7	82,1	17,9
Nº 200	1547,7	9,8	91,9	8,1
FONDO	82,4	0,5	92,5	7,5

LIMITE LIQUIDO

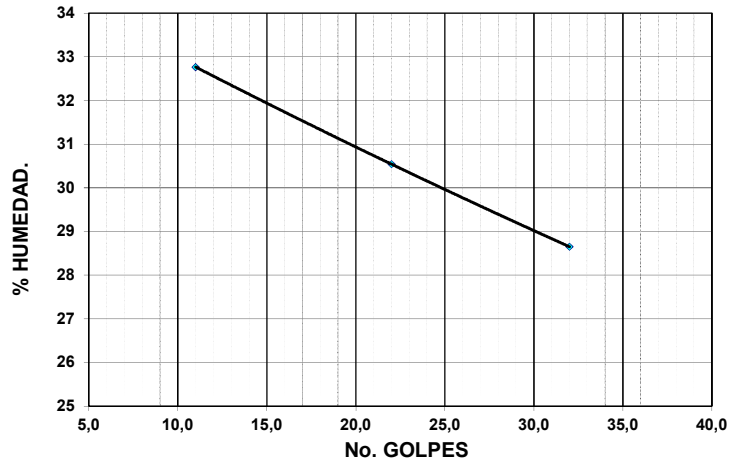

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0.0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025


Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO	jueves, 14 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR6+080 - PR6+085 - PR9+872
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	jueves, 14 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO							
Peso inicial:		15195,0	Peso final:		14068	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1214,1	7,99%	7,99%	92,0%	75%	100%
3/4"	19,00	1425	9,38%	17,37%	82,6%	65%	90%
3/8"	9,50	3525	23,20%	40,57%	59,4%	45%	68%
Nº 4	4,75	2579,8	16,98%	57,54%	42,5%	30%	50%
Nº 10	2,00	1607,6	10,58%	68,12%	31,9%	15%	32%
Nº 40	0,43	2177,3	14,33%	82,45%	17,5%	7%	20%
Nº 200	0,075	1538,9	10,13%	92,58%	7,4%	0%	9%
FONDO		82,1	0,54%	93,12%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1227,70
Peso muestra seca + recip.	1167,2
Peso recipiente	191,1
% de humedad	6,2
Gravas :	40,6%
Arenas :	41,9%
Finos :	17,5%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

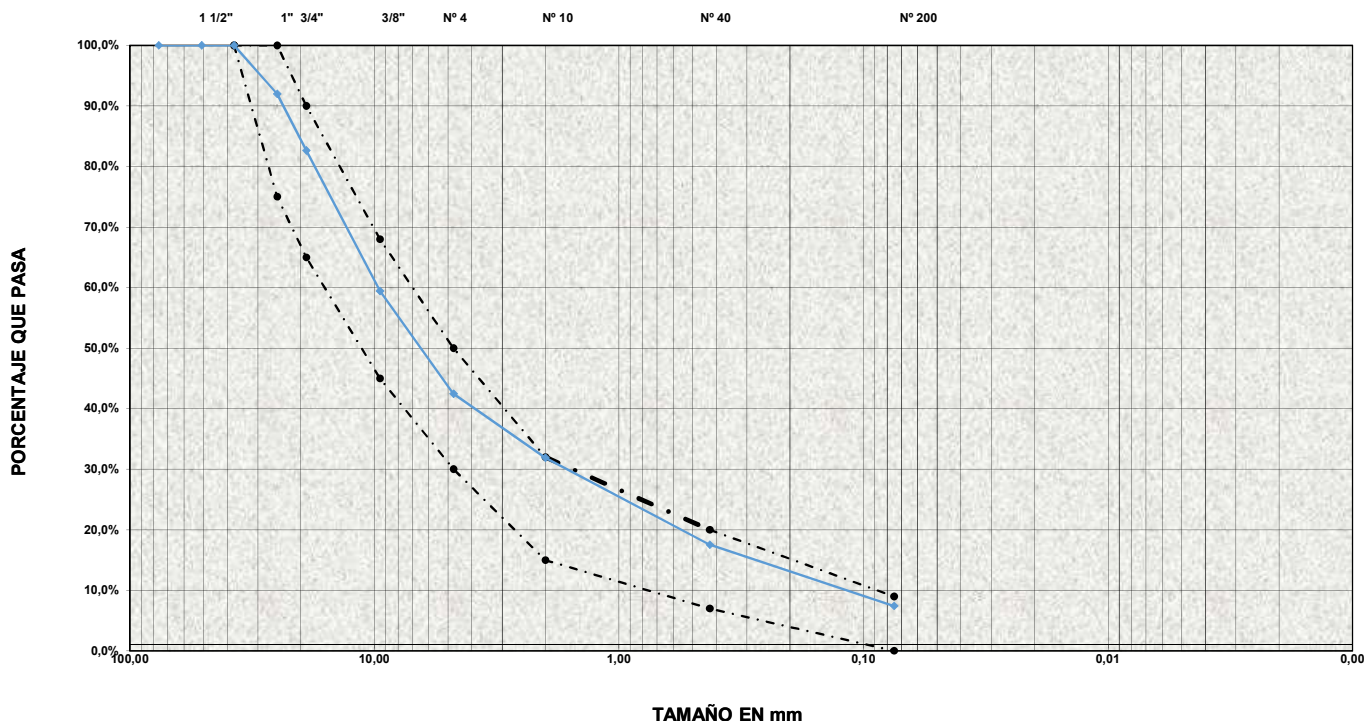

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

[Signature]

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

[Signature]

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	14 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR6+080 - PR6+085 - PR9+872
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	14 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15195,0		Peso Final	14068	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA	
				100,0	
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0	
1"	1214,1	8,0	8,0	92,0	
3/4"	1425	9,4	17,4	82,6	
3/8"	3525	23,2	40,6	59,4	
Nº 4	2579,8	17,0	57,5	42,5	
Nº 10	1607,6	10,6	68,1	31,9	
Nº 40	2177,3	14,3	82,5	17,5	
Nº 200	1538,9	10,1	92,6	7,4	
FONDO	82,1	0,5	93,1	6,9	

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA

TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: martes, 19 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR6+080 - PR6+090

MARGEN:


FECHA DE TOMA: martes, 19 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO							
Peso inicial:		15387,2	Peso final:		14366	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1781,3	11,58%	11,58%	88,4%	75%	100%
3/4"	19,00	2026,7	13,17%	24,75%	75,3%	65%	90%
3/8"	9,50	3060,1	19,89%	44,64%	55,4%	45%	68%
Nº 4	4,75	1846,2	12,00%	56,63%	43,4%	30%	50%
Nº 10	2,00	1794,8	11,66%	68,30%	31,7%	15%	32%
Nº 40	0,43	2490,5	16,19%	84,48%	15,5%	7%	20%
Nº 200	0,075	1366,2	8,88%	93,36%	6,6%	0%	9%
FONDO		74,6	0,48%	93,85%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1607,40
Peso muestra seca + recip.	1519,5
Peso recipiente	195,9
% de humedad	6,6
Gravas :	44,6%
Arenas :	39,8%
Finos :	15,5%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

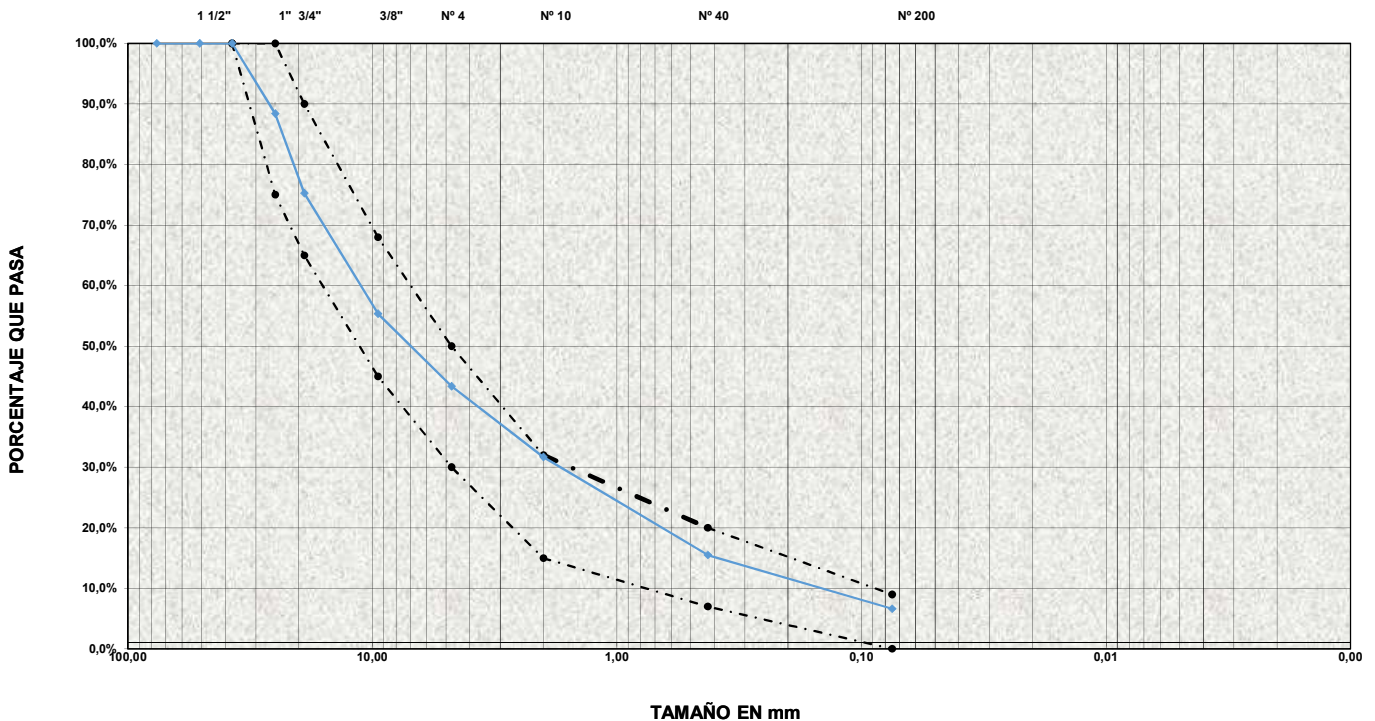

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EQ-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: 19 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: RT6504 PR6+080 - PR6+090
MARGEN:
FECHA DE TOMA: 19 de mayo de 2026
No ENSAYO:

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15387,2	Peso Final	14366	
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	1781,3	11,6	11,6	88,4
3/4"	2026,7	13,2	24,7	75,3
3/8"	3060,1	19,9	44,6	55,4
Nº 4	1846,2	12,0	56,6	43,4
Nº 10	1794,8	11,7	68,3	31,7
Nº 40	2490,5	16,2	84,5	15,5
Nº 200	1366,2	8,9	93,4	6,6
FONDO	74,6	0,5	93,8	6,2

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA

TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40

FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO

DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: viernes, 15 de mayo de 2026

TRAMO: Puerto Rico - San Vicente

LOCALIZACION: RT6504 PR6+100 - PR6+110 - PR6+120 - PR6+140 - PR6+150 - PR6+160 - PR6+170 - PR6+190 - PR6+200 - PR6+210 - PR6+220 - PR6+250 - PR6+290 - PR6+300 - PR6+310

MARGEN: n/e

FECHA DE TOMA: viernes, 15 de mayo de 2026

No ENSAYO:

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO

Peso inicial:		15497,0	Peso final:		15055	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1841,5	11,88%	11,88%	88,1%	75%	100%
3/4"	19,00	1808	11,67%	23,55%	76,5%	65%	90%
3/8"	9,50	3812,7	24,60%	48,15%	51,8%	45%	68%
Nº 4	4,75	1773,3	11,44%	59,60%	40,4%	30%	50%
Nº 10	2,00	1391,8	8,98%	68,58%	31,4%	15%	32%
Nº 40	0,43	2830,1	18,26%	86,84%	13,2%	7%	20%
Nº 200	0,075	1597,1	10,31%	97,14%	2,9%	0%	9%
FONDO		53,8	0,35%	97,49%			


CONTENIDO DE HUMEDAD

INVIAS E - 122 - 13

Peso muestra húmeda + recip.	1623,80
Peso muestra seca + recip.	1542,5
Peso recipiente	192,2
% de humedad	6,0

Gravas :	48,2%
Arenas :	38,7%
Finos :	13,2%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Limite Líquido :	NL
Limite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

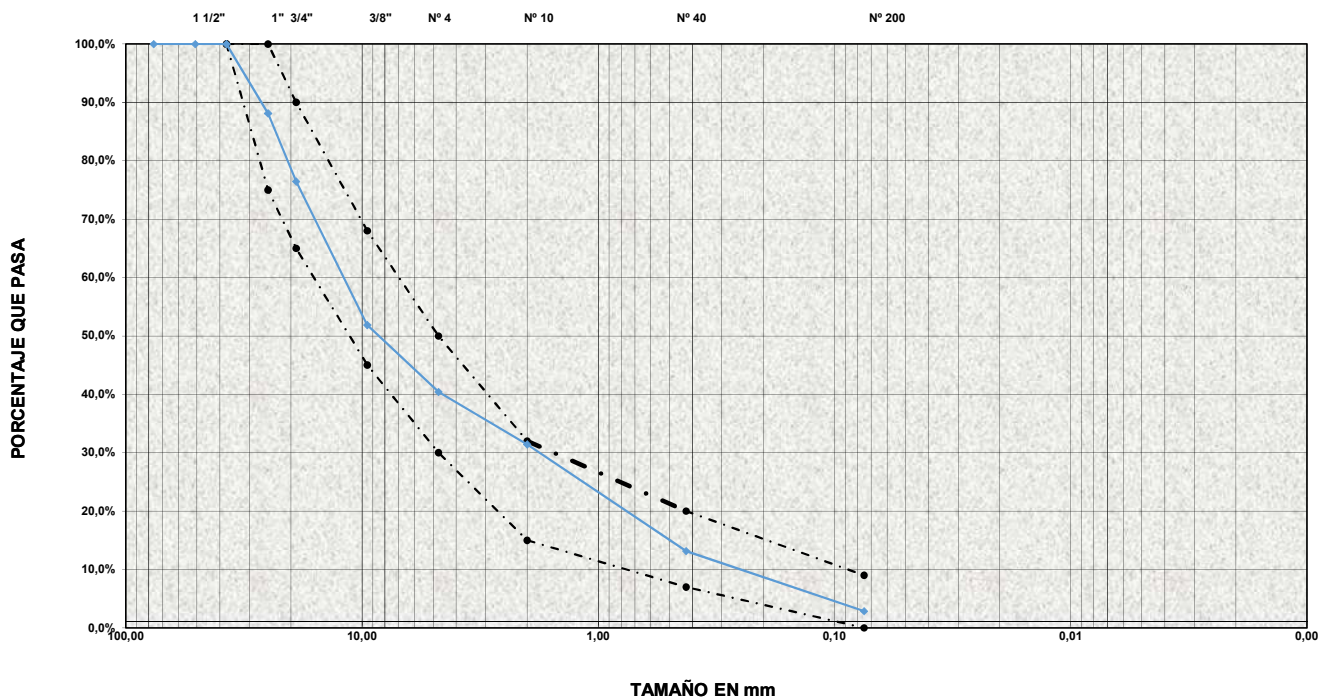

OBSERVACIONES:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

EJECUTO:

Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

APROBO:

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: 15 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: RT6504 PR6+100 - PR6+110 - PR6+120 - PR6+140 - PR6+150 - PR6+160 - PR6+170 - PR6+190 - PR6+200 - PR6+210 - PR6+220 - PR6+250 - PR6+290 - PR6+300 - PR6+310
MARGEN:
FECHA DE TOMA: 15 de mayo de 2026
No ENSAYO:

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			


LIMITE PLASTICO

Recipiente N°.	NP	NP
Peso de la muestra húmeda + recipiente		
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15497,0	Peso Final		15055
TAMIZ	PESO	% RET	% ACUM	% PASA
				100,0
1 1/2"	0	0,0	0,0	100,0
1"	1841,5	11,9	11,9	88,1
3/4"	1808	11,7	23,5	76,5
3/8"	3812,7	24,6	48,2	51,8
Nº 4	1773,3	11,4	59,6	40,4
Nº 10	1391,8	9,0	68,6	31,4
Nº 40	2830,1	18,3	86,8	13,2
Nº 200	1597,1	10,3	97,1	2,9
FONDO	53,8	0,3	97,5	2,5

LIMITE LIQUIDO

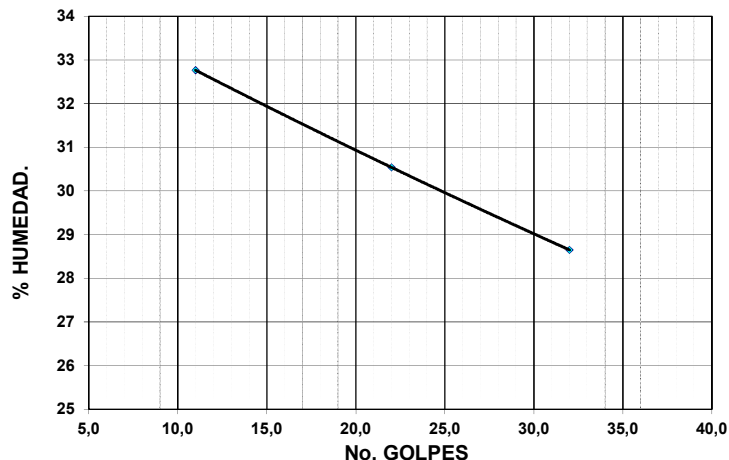

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA I.N.V. E-213-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-055

Versión: 002

Fecha: 30/04/2025


Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	viernes, 29 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RT6504 PR6+090 - PR6+540 - PR6+550 - PR6+580
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	viernes, 29 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	No ENSAYO:	

GRADACIÓN MATERIAL DE RIO							
Peso inicial:		15273,5	Peso final:		14564	ESPEC. INVIAS	
TAMIZ	ABERT.	PESO	% RETENIDO	% RET. ACUMU.	% QUE PASA	Artículo 330 - BG-40	
						Mínimo	Máximo
3"	76,20	0	0,00%	0,00%	100,0%		
2"	50,80	0	0,00%	0,00%	100,0%		
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,0%	100%	100%
1"	25,00	1673,4	10,96%	10,96%	89,0%	75%	100%
3/4"	19,00	1687,9	11,05%	22,01%	78,0%	65%	90%
3/8"	9,50	3347,3	21,92%	43,92%	56,1%	45%	68%
Nº 4	4,75	1875,4	12,28%	56,20%	43,8%	30%	50%
Nº 10	2,00	1853,6	12,14%	68,34%	31,7%	15%	32%
Nº 40	0,43	2630	17,22%	85,56%	14,4%	7%	20%
Nº 200	0,075	1496,4	9,80%	95,35%	4,6%	0%	9%
FONDO		90,8	0,59%	95,95%			

CONTENIDO DE HUMEDAD	
INVIAS E - 122 - 13	
Peso muestra húmeda + recip.	1255,80
Peso muestra seca + recip.	1200,2
Peso recipiente	201,9
% de humedad	5,6
Gravas :	43,9%
Arenas :	41,6%
Finos :	14,4%
A.A.S.H.T.O. :	A - 1b
Índice de Grupo	0
U.S.C.	GP
Límite Líquido :	NL
Límite Plástico :	NP
Índice de Plasticidad :	0

CURVA GRANULOMETRICA

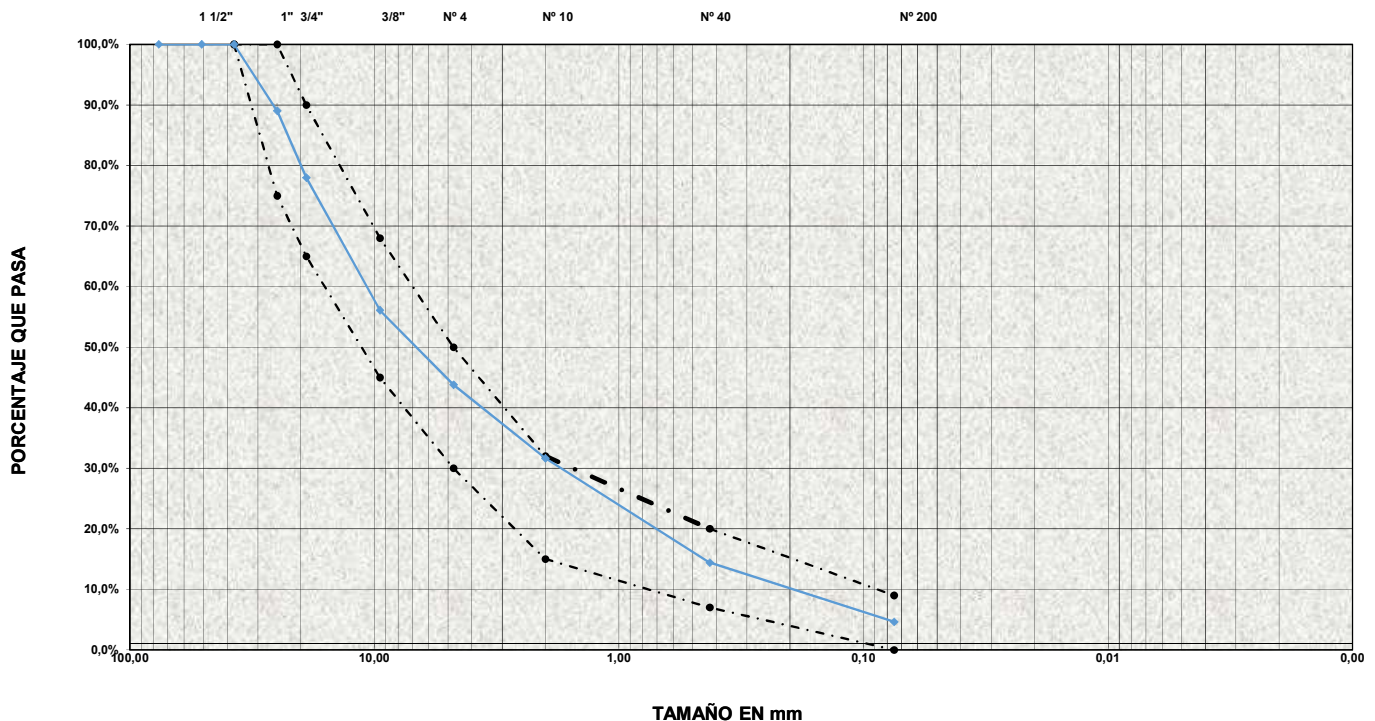

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD

I.N.V. E-125 Y E 126 -13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-056

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA ENSAYO: 29 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: RT6504 PR6+090 - PR6+540 - PR6+550 - PR6+580
MARGEN:
FECHA DE TOMA: 29 de mayo de 2026
No ENSAYO:

LIMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES			
Recipiente N°.			
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NL	NL	NL
Peso de la muestra seca + recipiente			
Peso recipiente			
% DE HUMEDAD			

LIMITE PLASTICO


Recipiente N°.		
Peso de la muestra húmeda + recipiente	NP	NP
Peso de la muestra seca + recipiente		
Peso recipiente		
% DE HUMEDAD		

GRANULOMETRIA

Peso inicial:	15273,5		Peso Final	14564	
TAMIZ	PESO	% RET		% ACUM	% PASA
					100,0
1 1/2"	0	0,0		0,0	100,0
1"	1673,4	11,0		11,0	89,0
3/4"	1687,9	11,1		22,0	78,0
3/8"	3347,3	21,9		43,9	56,1
Nº 4	1875,4	12,3		56,2	43,8
Nº 10	1853,6	12,1		68,3	31,7
Nº 40	2630	17,2		85,6	14,4
Nº 200	1496,4	9,8		95,4	4,6
FONDO	90,8	0,6		95,9	4,1

RESULTADOS

Limite Liquido	<u>N.L.</u>
Limite Plástico	<u>N.P.</u>
Índ. de Plasticidad	<u>0,0</u>
A.A.S.H.O.	
Índice de Grupo	
U.S.C	GP-GC

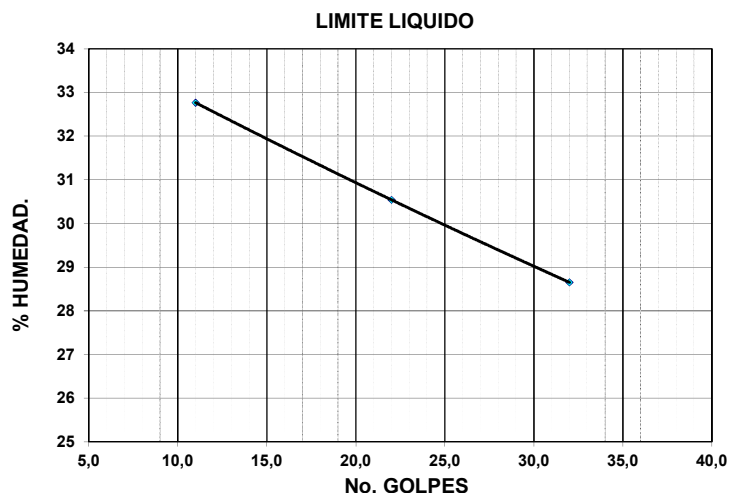

ESPECIFICACION INVIAS 2022

Limite Liquido	≤	NL
Índice de Plasticidad	≤	0,0

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)


	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022	CODIGO: F-EO-048	
		VERSION: 003	
		FECHA: 30/04/2025	
		PÁGINA 1 DE 2	
PROYECTO:	CORREDORES VIALES NEIVA FLORENCIA	FECHA ENSAYO:	lunes, 11 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto rico - San vicente. Ruta 6504
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	Unidad Industrial
MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA MUESTRA:	lunes, 11 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	AGREGADO PETREO TRITURADO	No DE ENSAYO:	-

DENSIDAD SECA				
PRUEBA	1	2	3	4
No. de Golpes	56	56	56	56
Molde No.	1	1	1	1
No. de Capas	5	5	5	5
Masa muestra húmeda + molde, (g).	7578,00	7745,00	7916,00	7922,00
Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00
Masa muestra húmeda, (g).	4618,00	4785,00	4956,00	4962
Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,182	2,261	2,342	2,345
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,088	2,127	2,162	2,123


HUMEDAD				
Recipiente No.	40	8	60	33
	1276,00	1305,60	1328,70	1256,00
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1229,00	1239,60	1241,80	1156,60
Masa Recipiente (g).	193,00	192,10	196,20	204,10
Contenido de Humedad (%)	4,5	6,3	8,3	10,4

HUMEDAD				
Recipiente No.	40	30	70	
Masa rec. + Muestra Hum. (g).	1267,90	1247,80		1278,70
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1185,60	1167,20		1195,30
Masa Recipiente (g).	192,00	192,50		188,80
Contenido de Humedad (%)	8,3	8,3		8,3

CURVA PROCTOR

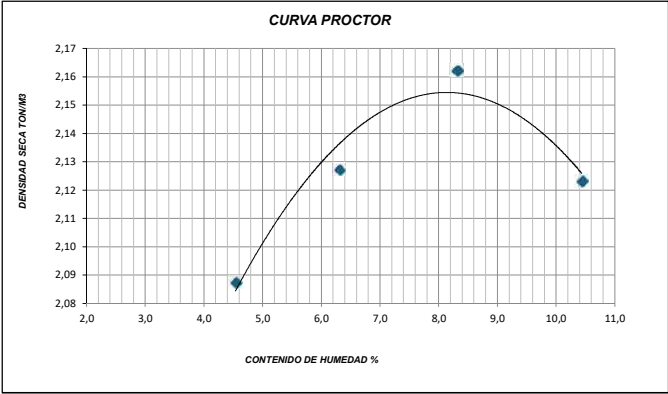

CBR vs DENSIDAD SECA MAXIMA

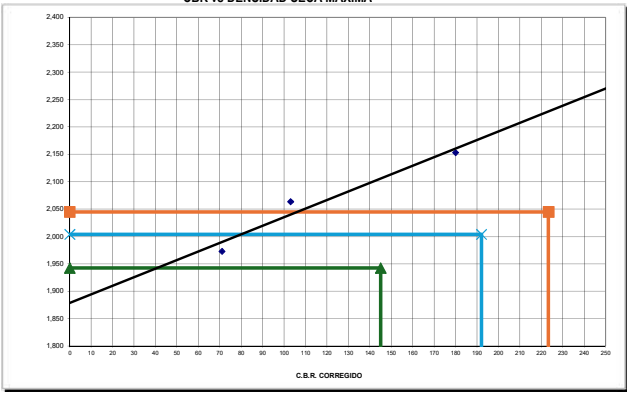


RESULTADOS DEL ENSAYO			
DENSIDAD MAX.	2,162	gr/cm3	
HUMEDAD OPTIMA	8,31	%	
% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%	

CBR CORREG. A 01	56	25	10
CBR CORREG. A 02	121	62	40
	180	103	71

ELABORA:


SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)



Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero



Firma Ingeniero (VoBo)



CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA

NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-048

VERSION: 003

FECHA: 30/04/2025

PAGINA 2 DE 2


PROYECTO:
CONTRATISTA:
OBRA:
MATERIAL:
FUENTE:
DESCRIPCION:

CORREDORES VIALES
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
BASE GRANULAR - BG - 40
UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
AGREGADO PETREO TRITURADO

FECHA ENSAYO :
TRAMO
LOCALIZACIÓN
MARGEN
FECHA MUESTRA:
N° ENSAYO:

sábado, 16 de mayo de 2026
Puerto rico - San vicente. Ruta 6504
Calzada
martes, 12 de mayo de 2026

No. DE GOLPES	10	25	56			
Molde.	3	2	1			
Masa sobrecarga utilizada (g)	4542	4542	4542			
Días de inmersión	4	4	4			
Lectura inicial (mm)	0	0	0			
Lectura Final (mm)	0	0	0			
% Expansión total	0	0	0			
Humedad de penetración.	9,8	9,5	8,9			
Penetración en milímetros	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,640	0,88	0,46	0,90	0,47	1,38	0,71
1,270	1,20	0,62	2,31	1,20	3,09	1,60
1,910	2,37	1,23	3,47	1,80	5,80	3,00
2,540	3,07	1,59	4,95	2,56	8,96	4,64
3,180	4,58	2,37	6,97	3,61	12,77	6,61
3,810	7,01	3,63	9,62	4,98	16,54	8,56
4,450	8,95	4,64	12,94	6,70	20,50	10,61
5,080	10,56	5,47	16,40	8,49	24,18	12,52
7,620	17,60	9,12	25,40	13,15	38,03	19,68
				0,00		0,00

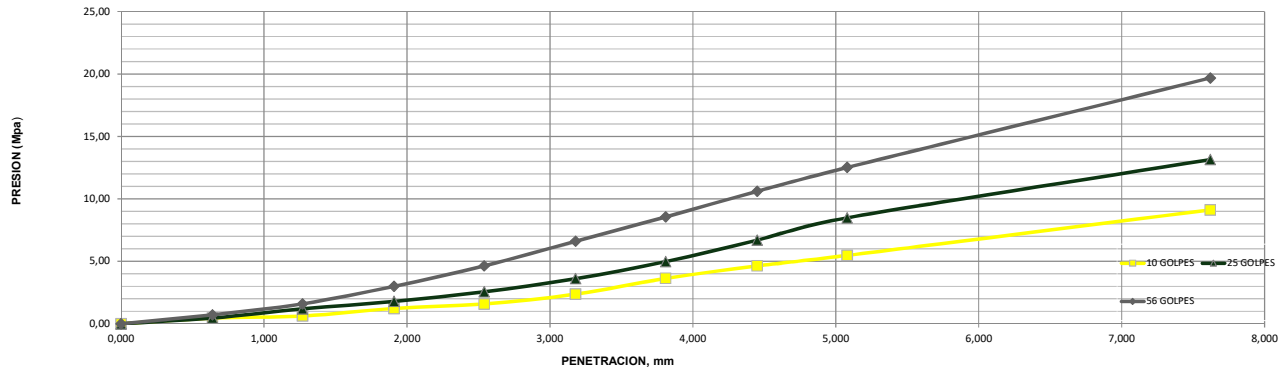

CBR AL 100%	181
CBR AL 98%	154
CBR AL 95%	112

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022: Art. 330 ≥

95%

ELABORA:




SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

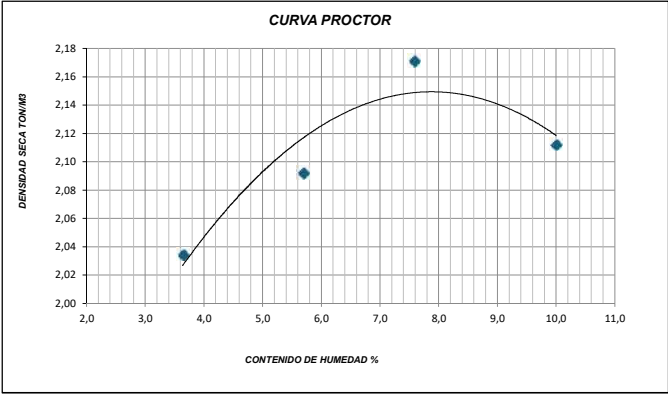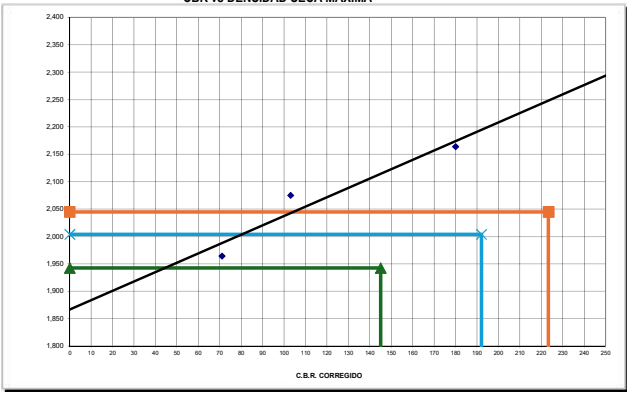	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022	CODIGO: F-EO-048																																																																																																																		
		VERSION: 003																																																																																																																		
		FECHA: 30/04/2025																																																																																																																		
		PÁGINA 1 DE 2																																																																																																																		
PROYECTO: CORREDORES VIALES NEIVA FLORENCIA	FECHA ENSAYO: martes, 19 de mayo de 2026																																																																																																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO: Puerto rico - San vicente. Ruta 6504																																																																																																																			
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION: Unidad Industrial																																																																																																																			
MATERIAL: BASE GRANULAR	MARGEN: Acopio																																																																																																																			
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA MUESTRA: martes, 19 de mayo de 2026																																																																																																																			
DESCRIPCION: AGREGADO PETREO TRITURADO	No DE ENSAYO: -																																																																																																																			
<table><tr><th colspan="5">DENSIDAD SECA</th></tr><tr><th>PRUEBA</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>No. de Golpes</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td><td>56</td></tr><tr><td>Molde No.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>No. de Capas</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Masa muestra húmeda + molde, (g).</td><td>7422,00</td><td>7640,00</td><td>7903,00</td><td>7877,00</td></tr><tr><td>Masa molde, (g).</td><td>2960,00</td><td>2960,00</td><td>2960,00</td><td>2960,00</td></tr><tr><td>Masa muestra húmeda, (g).</td><td>4462,00</td><td>4680,00</td><td>4943,00</td><td>4917</td></tr><tr><td>Volumen molde, cm3.</td><td>2116,00</td><td>2116,00</td><td>2116,00</td><td>2116,00</td></tr><tr><td>Densidad muestra húmeda, gr/cm3</td><td>2,109</td><td>2,212</td><td>2,336</td><td>2,324</td></tr><tr><td>Densidad muestra seca, gr/cm3</td><td>2,035</td><td>2,093</td><td>2,171</td><td>2,112</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">HUMEDAD</th></tr><tr><th>Recipiente No.</th><th>80</th><th>17</th><th>40</th><th>25</th></tr><tr><td></td><td>1260,10</td><td>1256,70</td><td>1253,50</td><td>1262,70</td></tr><tr><td>Masa rec. + Muestra Seca (g).</td><td>1222,70</td><td>1199,30</td><td>1178,70</td><td>1165,50</td></tr><tr><td>Masa Recipiente (g).</td><td>194,80</td><td>191,20</td><td>191,90</td><td>193,40</td></tr><tr><td>Contenido de Humedad (%)</td><td>3,6</td><td>5,7</td><td>7,6</td><td>10,0</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">HUMEDAD</th></tr><tr><th>Recipiente No.</th><th>40</th><th>70</th><th>60</th><th></th></tr><tr><td></td><td>846,10</td><td>1179,60</td><td></td><td>1071,30</td></tr><tr><td>Masa rec. + Muestra Hum. (g).</td><td>799,70</td><td>1109,20</td><td></td><td>1009,60</td></tr><tr><td>Masa Recipiente (g).</td><td>192,10</td><td>188,70</td><td></td><td>195,90</td></tr><tr><td>Contenido de Humedad (%)</td><td>7,6</td><td>7,6</td><td></td><td>7,6</td></tr></table>			DENSIDAD SECA					PRUEBA	1	2	3	4	No. de Golpes	56	56	56	56	Molde No.	1	1	1	1	No. de Capas	5	5	5	5	Masa muestra húmeda + molde, (g).	7422,00	7640,00	7903,00	7877,00	Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	Masa muestra húmeda, (g).	4462,00	4680,00	4943,00	4917	Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00	Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,109	2,212	2,336	2,324	Densidad muestra seca, gr/cm3	2,035	2,093	2,171	2,112	HUMEDAD					Recipiente No.	80	17	40	25		1260,10	1256,70	1253,50	1262,70	Masa rec. + Muestra Seca (g).	1222,70	1199,30	1178,70	1165,50	Masa Recipiente (g).	194,80	191,20	191,90	193,40	Contenido de Humedad (%)	3,6	5,7	7,6	10,0	HUMEDAD				Recipiente No.	40	70	60			846,10	1179,60		1071,30	Masa rec. + Muestra Hum. (g).	799,70	1109,20		1009,60	Masa Recipiente (g).	192,10	188,70		195,90	Contenido de Humedad (%)	7,6	7,6		7,6
DENSIDAD SECA																																																																																																																				
PRUEBA	1	2	3	4																																																																																																																
No. de Golpes	56	56	56	56																																																																																																																
Molde No.	1	1	1	1																																																																																																																
No. de Capas	5	5	5	5																																																																																																																
Masa muestra húmeda + molde, (g).	7422,00	7640,00	7903,00	7877,00																																																																																																																
Masa molde, (g).	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00																																																																																																																
Masa muestra húmeda, (g).	4462,00	4680,00	4943,00	4917																																																																																																																
Volumen molde, cm3.	2116,00	2116,00	2116,00	2116,00																																																																																																																
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,109	2,212	2,336	2,324																																																																																																																
Densidad muestra seca, gr/cm3	2,035	2,093	2,171	2,112																																																																																																																
HUMEDAD																																																																																																																				
Recipiente No.	80	17	40	25																																																																																																																
	1260,10	1256,70	1253,50	1262,70																																																																																																																
Masa rec. + Muestra Seca (g).	1222,70	1199,30	1178,70	1165,50																																																																																																																
Masa Recipiente (g).	194,80	191,20	191,90	193,40																																																																																																																
Contenido de Humedad (%)	3,6	5,7	7,6	10,0																																																																																																																
HUMEDAD																																																																																																																				
Recipiente No.	40	70	60																																																																																																																	
	846,10	1179,60		1071,30																																																																																																																
Masa rec. + Muestra Hum. (g).	799,70	1109,20		1009,60																																																																																																																
Masa Recipiente (g).	192,10	188,70		195,90																																																																																																																
Contenido de Humedad (%)	7,6	7,6		7,6																																																																																																																
  <table><tr><th colspan="4">RESULTADOS DEL ENSAYO</th></tr><tr><td>DENSIDAD MAX.</td><td>2,171</td><td>gr/cm3</td><td></td></tr><tr><td>HUMEDAD OPTIMA</td><td>7,58</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".</td><td>35%</td><td>%</td><td></td></tr></table> SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista) REVISO / APROBO:  Firma Ingeniero (VoBo) <table><tr><td>56</td><td>25</td><td>10</td></tr><tr><td>121</td><td>62</td><td>40</td></tr><tr><td>180</td><td>103</td><td>71</td></tr></table> CBR CORREG. A 01 CBR CORREG. A 02			RESULTADOS DEL ENSAYO				DENSIDAD MAX.	2,171	gr/cm3		HUMEDAD OPTIMA	7,58	%		% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%		56	25	10	121	62	40	180	103	71																																																																																									
RESULTADOS DEL ENSAYO																																																																																																																				
DENSIDAD MAX.	2,171	gr/cm3																																																																																																																		
HUMEDAD OPTIMA	7,58	%																																																																																																																		
% RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4".	35%	%																																																																																																																		
56	25	10																																																																																																																		
121	62	40																																																																																																																		
180	103	71																																																																																																																		



CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA

NORMA I.N.V. E -148-13/ ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-048

VERSION: 003

FECHA: 30/04/2025

PAGINA 2 DE 2


PROYECTO:
CONTRATISTA:
OBRA:
MATERIAL:
FUENTE:
DESCRIPCION:

CORREDORES VIALES
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
BASE GRANULAR
UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
AGREGADO PETREO TRITURADO

FECHA ENSAYO :
TRAMO
LOCALIZACIÓN
MARGEN
FECHA MUESTRA:
N° ENSAYO:

sábado, 23 de mayo de 2026
Puerto rico - San vicente. Ruta 6504
Calzada
martes, 19 de mayo de 2026

No. DE GOLPES	10	25	56			
Molde.	3	2	1			
Masa sobrecarga utilizada (g)	4542	4542	4542			
Días de inmersión	4	4	4			
Lectura inicial (mm)	0	0	0			
Lectura Final (mm)	0	0	0			
% Expansión total	0	0	0			
Humedad de penetración.	9,1	8,8	8,4			
Penetración en milímetros	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa	FUERZA (KN)	PRESIÓN Mpa
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,640	0,79	0,41	0,90	0,46	1,41	0,73
1,270	1,19	0,62	2,42	1,25	3,01	1,56
1,910	2,52	1,31	3,82	1,98	6,05	3,13
2,540	3,12	1,62	5,11	2,64	9,01	4,66
3,180	4,98	2,58	7,09	3,67	13,17	6,82
3,810	7,00	3,63	10,30	5,33	17,01	8,80
4,450	8,72	4,52	13,13	6,79	21,10	10,92
5,080	11,12	5,76	17,09	8,85	24,98	12,93
7,620	20,30	10,52	26,70	13,82	40,10	20,76
				0,00		0,00

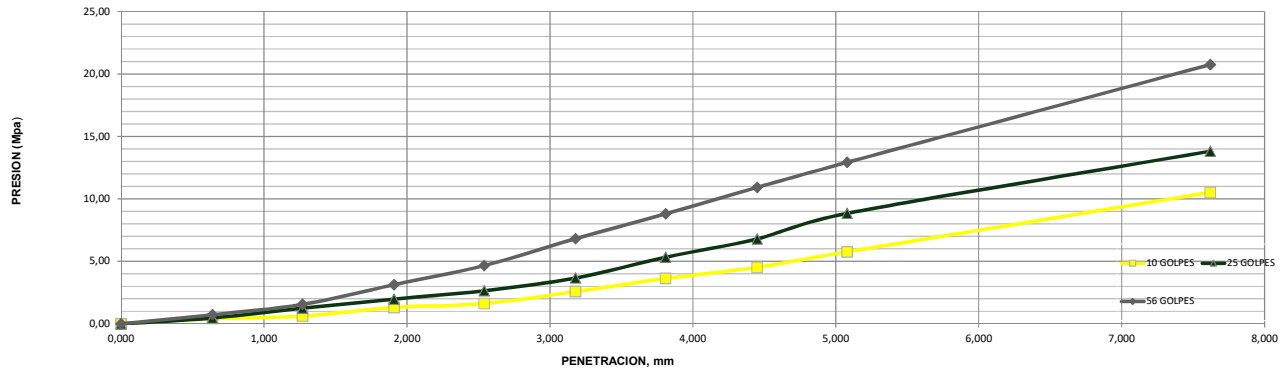

CBR AL 100%	179
CBR AL 98%	153
CBR AL 95%	115

ESPECIFICACIONES INVIAS 2022: Art. 330 ≥

95%

ELABORA:


SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)

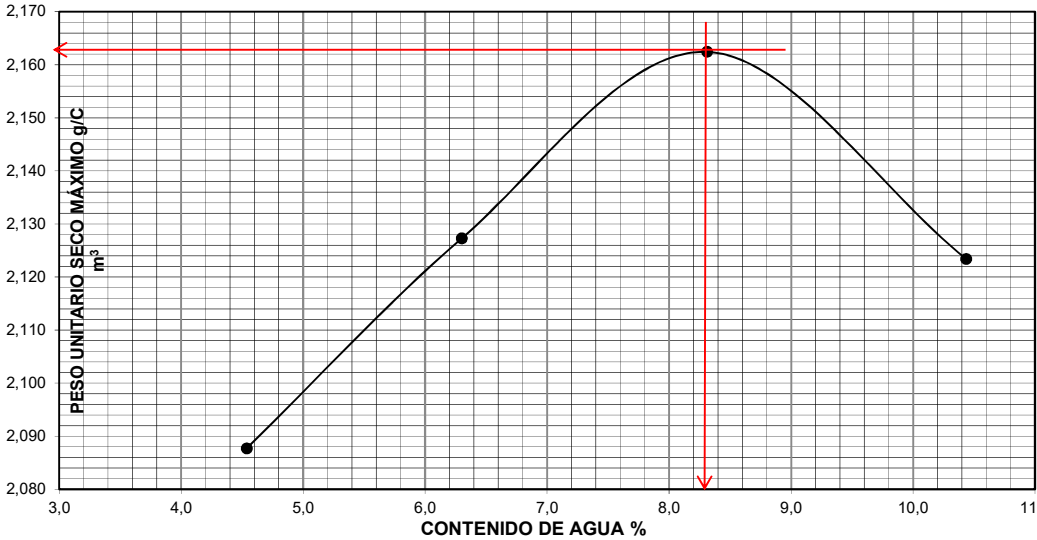		DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022		CÓDIGO: F-EO-057 VERSIÓN: 003 FECHA: 30/04/2025 PÁGINA 1 DE 1	
PROYECTO: CONTRATISTA: OBRA: TIPO DE MATERIAL: FUENTE:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,		FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026	
	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente	
	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"		LOCALIZACION:	Ruta 6504	
	BASE GRANULAR / BG - 40		MARGEN:	Acopio	
	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO		No ENSAYO:		
DETERMINACION					
Peso Molde + material húmedo (g)		1	2	3	4
Peso del molde (g)		2960	2960	2960	2960
Peso material húmedo (g)		4618	4785	4956	4962
Volumen del molde (g/cm³)		2116	2116	2116	2116
Densidad húmeda (g/cm³)		2,182	2,261	2,342	2,345
CALCULO DE HUMIDADES					
Cápsula + material húmedo (g)		1276,0	1305,6	1328,7	1256,0
Cápsula + material seco (g)		1229,0	1239,6	1241,8	1156,6
Peso del agua (g)		47,0	66,0	86,9	99,4
Peso de la cápsula (g)		193,0	192,1	196,2	204,1
Peso material seco (g)		1036,0	1047,5	1045,6	952,5
Contenido de agua %		4,5	6,3	8,3	10,4
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm³)		2,088	2,127	2,162	2,123
				Método empleado C % Pasa Tamiz No 200 Límite líquido Índice de plasticidad CLASIFICACIÓN U.S.C. AASHTO DENSIDAD MÁXIMA (g/cm3) 2,162 HUMEDAD ÓPTIMA % 8,3	
OBSERVACIONES		c.b.r. # 1 Base tomada en acopio el 8 mayo del 2026			
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO		EJECUTO		APROBÓ	
INV E - 142		SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA		FERNEY EDUARDO ARIAS	
		LABORATORISTA		VoBo INGENIERO	



EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS

NORMA I.N.V. E - 133- 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F- EO-053
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	8 de mayo de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto rico - San vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	PR 05 + 300 - Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR / BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	8 de mayo de 2025
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

DATOS DEL LABORATORIO

Probeta de ensayo numero	1	2	3	PROMEDIO
Lectura de Arena = a	3,1	3,0	3,1	<u>3,1</u>
Lectura de Arcilla = b	8,9	9,0	9,0	<u>9,0</u>
Equivalente de Arena =	34,8%	33,3%	34,4%	<u>34,2%</u>

% EQUIVALENTE DE ARENA =

34%

ESPECIFICACIONES DEL INVIAS 2022

1. Agregado fino para Mezclas Asfálticas en caliente	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 450 TABLA 450-3 NT1- NT2 - NT3	≥ 50%
2. Concreto Hidráulico y Estructural.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 500 TABLA 500-2 ART.630 TABLA 630 - 1	≥ 60%
3. Capas de base Granular.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 330 TABLA 330-2 CLASE C-B-A	≥ 30%
4. Capas de sub - base granular	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 320 TABLA 320-2 CLASE C-B-A	≥ 25%
5. Capas de Base estabilizada con cemento	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 351 TABLA 351-2 CLASE -B-A	≥ 30%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

NOMBRE (Laboratorista)

FIRMA (Laboratorista)

APROBO:

JORGE MAURICIO RODRIGUEZ

NOMBRE INGENIERO

FIRMA INGENIERO VoBo



EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS

NORMA I.N.V. E - 133- 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F- EO-053
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA ENSAYO:	19 de mayo de 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto rico - San vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	PR 05 + 300 - Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR / BG-40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	19 de mayo de 2025
DESCRIPCION:	MATERIAL COLOR CAFÉ CLARO	No ENSAYO:	

DATOS DEL LABORATORIO

Probeta de ensayo numero	1	2	3	PROMEDIO
Lectura de Arena = a	3,0	3,2	3,1	3
Lectura de Arcilla = b	8,9	9,1	9	9
Equivalente de Arena =	33,7%	35,2%	34,4%	34,4%

% EQUIVALENTE DE ARENA =

34%

ESPECIFICACIONES DEL INVIAS 2022

1. Agregado fino para Mezclas Asfálticas en caliente	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 450 TABLA 450-3 NT1- NT2 - NT3	≥ 50%
2. Concreto Hidráulico y Estructural.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 500 TABLA 500-2 ART.630 TABLA 630 - 1	≥ 60%
3. Capas de base Granular.	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 330 TABLA 330-2 CLASE C-B-A	≥ 30%
4. Capas de sub - base granular	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 320 TABLA 320-2 CLASE C-B-A	≥ 25%
5. Capas de Base estabilizada con cemento	ESPECIFICACION INV - 2022	ART. 351 TABLA 351-2 CLASE -B-A	≥ 30%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
NOMBRE (Laboratorista)

FIRMA (Laboratorista)

APROBO:

JORGE MAURICIO RODRIGUEZ
NOMBRE INGENIERO

FIRMA INGENIERO VoBo



DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO
NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022

CÓDIGO: F-EO-057
VERSIÓN: 003
FECHA: 30/04/2025
PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,	FECHA:	miércoles, 27 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR	MARGEN:	Pr 6+205
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO	No ENSAYO:	

DETERMINACION	1	2	3	4	
Peso Molde + material húmedo (g)	7484	7621	7773	7810	
Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960	
Peso material húmedo (g)	4524	4661	4813	4850	
Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,138	2,203	2,275	2,292	
CALCULO DE HUMIDADES					
Cápsula + material húmedo (g)	1114,3	1103,8	1072,9	1097,5	
Cápsula + material seco (g)	1085,7	1059,6	1016,8	1021,3	
Peso del agua (g)	28,6	44,2	56,1	76,2	
Peso de la cápsula (g)	191,1	192,3	191,4	192,9	
Peso material seco (g)	894,6	867,3	825,4	828,4	
Contenido de agua %	3,2	5,1	6,8	9,2	
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,072	2,096	2,130	2,099	



Método empleado	C
% Pasa Tamiz No 200	
Límite líquido	
Índice de plasticidad	
CLASIFICACIÓN	
U.S.C.	
AASHTO	
DENSIDAD MÁXIMA (g/cm ³)	2,130
HUMEDAD ÓPTIMA %	6,8

OBSERVACIONES	Material recolectado en ruta 6504 (pr 6+205) el día 25 de mayo del 2026.		
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	EJECUTO	APROBÓ	
INV E - 142	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA	FERNEY EDUARDO ARIAS	
	LABORATORISTA	VoBo INGENIERO	




DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO
NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022

CÓDIGO: F-EO-057
VERSIÓN: 003
FECHA: 30/04/2025
PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,	FECHA:	miércoles, 20 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6504 - PR5+625 - PR5+720
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR / BG - 27	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO	No ENSAYO:	

DETERMINACION	1	2	3	4	
Peso Molde + material húmedo (g)	7457	7727	7953	7886	
Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960	
Peso material húmedo (g)	4497	4767	4993	4926	
Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,125	2,253	2,360	2,328	
CALCULO DE HUMEDADES					
Cápsula + material húmedo (g)	1272,4	1281,3	1268,4	1255,0	
Cápsula + material seco (g)	1240,8	1229,3	1198,0	1166,6	
Peso del agua (g)	31,6	52,0	70,4	88,4	
Peso de la cápsula (g)	191,1	192,4	191,9	191,1	
Peso material seco (g)	1049,7	1036,9	1006,1	975,5	
Contenido de agua %	3,0	5,0	7,0	9,1	
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,063	2,145	2,205	2,135	

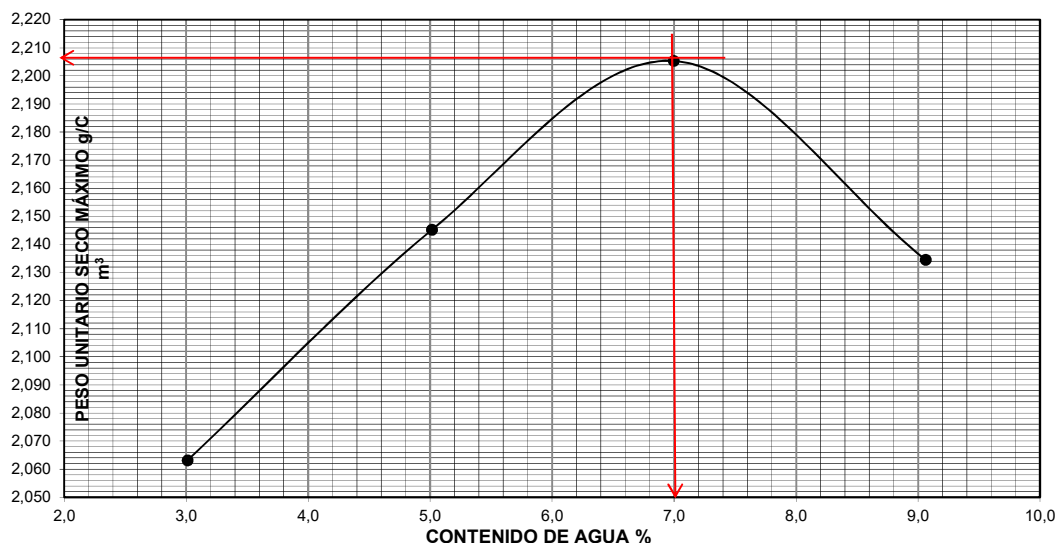

Método empleado	C
% Pasa Tamiz No 200	
Límite líquido	
Índice de plasticidad	
CLASIFICACIÓN	
U.S.C.	
AASHTO	
DENSIDAD MÁXIMA (g/cm ³)	2,205
HUMEDAD ÓPTIMA %	7,0

OBSERVACIONES	Material recolectado en costado de via	
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	EJECUTO	APROBÓ
INV E - 142	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA	FERNEY EDUARDO ARIAS
	LABORATORISTA	VoBo INGENIERO




DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO
NORMA I.N.V. E-142 - ESPEC. INVIAS 2022

CÓDIGO: F-EO-057
VERSIÓN: 003
FECHA: 30/04/2025
PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991 -2021 "NEIVA - FLORENCIA"	LOCALIZACION:	Ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR / BG - 40	MARGEN:	Acopio
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO	No ENSAYO:	

DETERMINACION	1	2	3	4	
Peso Molde + material húmedo (g)	7422	7640	7903	7877	
Peso del molde (g)	2960	2960	2960	2960	
Peso material húmedo (g)	4462	4680	4943	4917	
Volúmen del molde (g/cm ³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad húmeda (g/cm ³)	2,109	2,212	2,336	2,324	
CALCULO DE HUMEDADES					
Cápsula + material húmedo (g)	1260,1	1256,7	1253,5	1262,7	
Cápsula + material seco (g)	1222,7	1199,3	1178,7	1165,5	
Peso del agua (g)	37,4	57,4	74,8	97,2	
Peso de la cápsula (g)	194,8	191,2	191,9	193,4	
Peso material seco (g)	1027,9	1008,1	986,8	972,1	
Contenido de agua %	3,6	5,7	7,6	10,0	
Densidad seca de la muestra seca (gr/cm ³)	2,035	2,093	2,171	2,112	

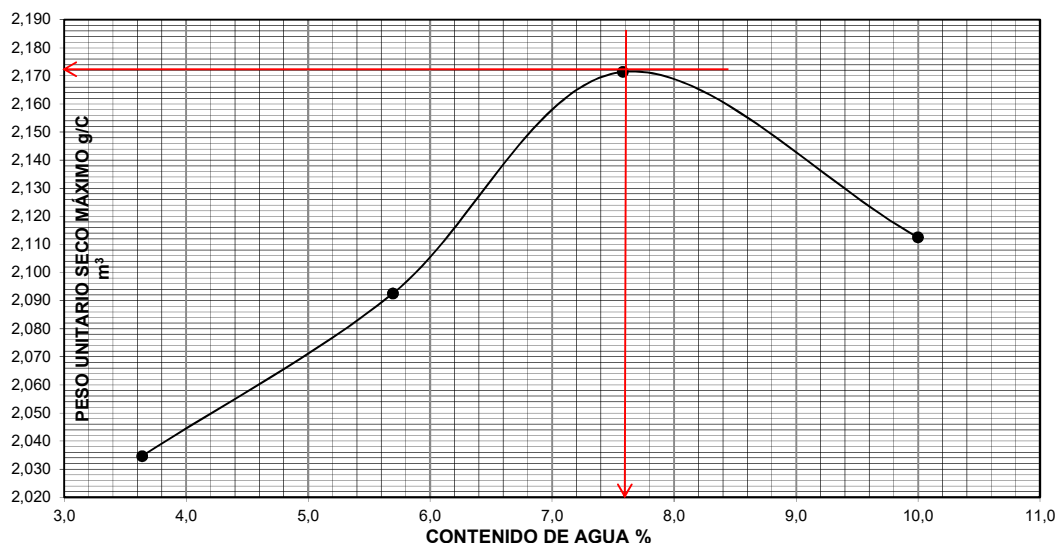

Método empleado	C
% Pasa Tamiz No 200	
Límite líquido	
Índice de plasticidad	
CLASIFICACIÓN	
U.S.C.	
AASHTO	
DENSIDAD MÁXIMA (g/cm ³)	2,172
HUMEDAD ÓPTIMA %	7,6

OBSERVACIONES		c.b.r. # 2
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	EJECUTO	APROBO
INV E - 142	SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA 	FERNEY EDUARDO ARIAS 
	LABORATORISTA	VoBo INGENIERO



**RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm
(1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES**
NORMA I.N.V. 218 - 13 7 ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-052
Versión: 003
Fecha: 30/04/2025
Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA DE TOMA:	8 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE ENSAYO:	8 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	AGREGADO PETREO DE TRITURACION	No ENSAYO:	

TABLA 1 Y 2 INVIAS 218 - 219 DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES								
TAMAÑOS		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA, (g)						
PASA	RETENIDO	A	B	C	D	E	F	G
3 "	2 1/2 "					2500 ± 50		
2 1/2 "	2 "					2500 ± 50		
2 "	1 1/2 "					5000 ± 50	5000 ± 50	
1 1/2 "	1 "	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25
1 "	3/4 "	1250 ± 25						5000 ± 25
3/4 "	1/2 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
1/2 "	3/8 "	1250 ± 25	2500 ± 10					
3/8 "	1/4 "			2500 ± 10				
1/4 "	No. 4			2500 ± 10				
No. 4	No. 8				5000 ± 10			
No. DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
No. DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000

Prueba en:	Seco	Seco	Húmedo	Rel: Hum/Sec
Gradación utilizada	B	B		
Numero de esferas a ser utilizadas	11	11		
Numero de revoluciones	100	500		
Peso de la muestra antes del ensayo, grs	5003,9	5003,9		
Peso de la muestra después del ensayo, grs	4414,9	2594,2		
Perdida por desgaste, grs	589	2409,7		
% DE DESGASTE	11,8	48,2		
ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: ART. 330	≤ 7%	≤ 35%		

OBSERVACIONES: No cumple

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
LABORATORISTA

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS
VoBo INGENIERO



INFORME DE RESULTADOS DE
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR
ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO MICRO DEVAL.
NORMA I.N.V. E - 238 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-058

VERSION: 003

Fecha:30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: NEIVA - FLORENCIA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO

FECHA MUESTREO: 14 de mayo de 2026
FECHA ENSAYO: 14 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: Ruta 6504
MARGEN: Acopio
No ENSAYO:

MUESTRA N°	1	
GRADACION USADA	A	
MASA DE ESFERAS	5000	
N° REVOLUCIONES (RPM)	100	
Pa: PESO DE LA MUESTRA SECA INICIAL (g)	1503,9	
Pb: PESO DE LA MUESTRA SECA FINAL (g)	1277,1	
PERDIDA MICRO - DEVAL INDIVIDUAL %	15,08%	

PERDIDA MICRO - DEVAL PROMEDIO % 15%

Tamices		Masa y gradación de la muestra en gramos		
PASA	RETIENE	Tamaño nominal maximo		
		A= > 3/4"	B= 1/2"	C= < 3/8"
3/4"	5/8"	375		
5/8"	1/2"	375		
1/2"	3/8"	750	750	
3/8"	1/4"		375	750
1/4"	N°4		375	750
N°4	N°8			
Carga Abrasiva - esferas (g)		5000 +/-5	5000 +/-5	5000 +/-5
Tiempo de ensayo en minutos		120 +/-1	105 +/-1	95 +/-1
R.P.M.		100 +/-5	100 +/-5	100 +/-5

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: Art. 330 ≤

25%

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

Firma Ingeniero (VoBo)



EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR EL METODO DE 10% DE FINOS

NORMA DEL ENSAYO I.N.V. E- 224 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

F-EO-045
Versión 003
Fecha: 30/04/2025
Pagina 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	PAGINA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RUTA 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE ENSAYO:	15 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	AGREGADO PETREO DE TRITURACION	REGISTRO:	

Naturaleza del material	Penetración
Redondeado y parcialmente redondeado; por ejemplo, grava natural	15 mm
Agregados triturados normales.	20 mm
Agregados veciculares; por ejemplo escoria	24 mm

Estado de la muestra de ensayo	Seco	Húmedo
Peso de la platina + molde pequeño	17530	17530
Peso de la platina + molde pequeño + muestra	20247,5	20276,8
Peso de la muestra	2717,5	2746,8
Penetración del pistón en, mm	20	20
Carga en Kn	145,47	132,28
Peso del material retenido en el tamiz N°. 8	2428,4	2419,5
% de Finos Producidos:	10,6	11,9
NOTA: El porcentaje de finos producidos por la carga en Kn, debe estar comprendido entre 7,5 % y el 12 %		

<u>Carga necesaria para producir un 10% de Finos</u>	139,1	116,4
--	-------	-------

Perdida del 10% de finos en seco	139,1
Perdida del 10% de finos en la Relación Húmedo / Seco	84%

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: ART. 330	En seco (KN) ≥	90KN
	Rel: Hum/Seco %	≥ 75%

OBSERVACIONES: _____

EJECUTO
SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Firma laboratorista

APROBO:
FERNEY EDUARDO ARIAS

Firma ingeniero (VoBo)



DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS

NORMA INV E- 239-13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-047

Versión:003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,
EN LOS DPTOS DE HIJIL A Y CAOLIETA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
OBRA: CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR - BG - 40
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO
DESCRIPCION: MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO

FECHA : 16 de mayo de 2026
TRAMO: Puerto Rico - San Vicente
LOCALIZACION: Ruta 6504
MARGEN:
FECHA DE TOMA: 16 de mayo de 2026
NO MUESTRA:

MUESTRA PARA ENSAYO

MÉTODO DE PRUEBA	PASA RETIENE	Nº 4	Nº 8	Nº 16	Nº 30	Nº 50
		-	Nº 16	Nº 30	Nº 50	Nº 100
A		-	-	-	-	-
B		-	-	-	-	-
C	X	-	-	-	-	-
MASA TOTAL (g)		190,0				
valor de las gravedades especificas G:		2,7				

CÁLCULO DEL ENSAYO

METODO DE PRUEBA A Us=	Us	Us				
METODO DE PRUEBA B Um=			U ₁	U ₂	U ₃	
METODO DE PRUEBA C Ur=						U _R
M ₁ (g)	235,1	235,1				
V (cm ³)	107,5	107,5				
M ₂ (g)	393,1	394,7				
F (g)	158,0	159,6				
%U	45,6%	45,0%				

RESULTADOS.

METODO DE PRUEBA A Us=	45,3%
METODO DE PRUEBA B Um=	
METODO DE PRUEBA C Ur=	

M ₁ (g)	PESO DEL CILINDRO
V (cm ³)	VOLUMEN DEL CILINDRO
M ₂ (g)	PESO DE LA MUESTRA MAS EL CILINDRO
F	PESO NETO DEL AGREGADO FINO EN EL MEDIDOR
G	GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA MUESTRA
%U	PORCENTAJE DE VACÍOS DEL AGREGADO FINO
U (%)	PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE VACÍOS

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022:ART.330 MIN. 35 %

OBSERVACIONES:

ELABORÓ

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)

Firma (Laboratorista)

REVISÓ

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero

VoBo Ingeniero



DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS

NORMA INVIAS E-211 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

CODIGO: F-EO-059

VERSIÓN: 003

FECHA: 30/04/2025

PAGINA 1 DE 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA DE ENSAYO	26 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RUTA 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA TOMA:	25 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	AGREGADO PETREO DE TRITURACION	No DE ENSAYO:	

FRACCION DEL AGREGADO GRUESO

TAMIZ		PESO INICIAL, grs	PESO FINAL, grs	RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)	PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)
PASA	RETENIDO					
Mayores a 1 1/2"						
>1 1/2"	1 "	3256,4	3247,8	11,5	0,26	0,06
1 "	3/4 "	2546,8	2533,6	8,5	0,52	0,08
3/4 "	3/8 "	1789,3	1777,5	22,2	0,66	0,27
3/8 "	No. 4	1023,4	1009,1	11,9	1,40	0,31
TOTALES :		8616	8568,00	54,1	2,84	0,72

NOTA 1: Si el agregado contiene menos del 00,5% de cualquiera de los tamaños especificados no se debera ensayar dicho tamaño y se tomara como % de particulas deleznable de acuerdo al tamiz siguiente mayor o menor.

COLORACIÓN DEL AGUA:

ALGO TURBIA

TURBIA

MUY TURBIA

FRACCION DEL AGREGADO FINO

TAMIZ		PESO INICIAL (grs)	PESO FINAL, grs	RETENODO GRADACION ORIGINAL (%)	PERDIDA TOTAL (%)	PERDIDA TOTAL CORREGIDA (%)
PASA	RETENIDO					
No. 4	No. 16	100	98,3	25,6	1,70	0,81

COLORACIÓN DEL AGUA:

ALGO TURBIA

TURBIA

MUY TURBIA

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: ART 330

≤ 2% MAX. AG. GRUESO
MAX. AG. FINO

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

NOMBRE (Laboratorista)

FIRMA (Laboratorista)

REVISO / APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

NOMBRE INGENIERO (VoBo)

FIRMA INGENIERO (VoBo)



SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO
NORMA I.N.V. E-220 - 13 / ESPEC. INVIAS 2022

Código: F-EO-061

Versión: 003

Fecha: 30/04/2025

Página 1 de 1

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA,	FECHA ENSAYO	sábado, 30 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACIÓN:	ruta 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	lunes, 25 de mayo de 2026
DESCRIPCIÓN:	AGREGADO PETREO DE TRITURACION	No ENSAYO:	

Numero de ciclos :	Solución utilizada	Densidad de la solución (g/cm3)
5	SODIO	1.168.0

Agregado Grueso									
Fracción		Peso de la fracción recomendada, grs	Peso de las fracciones, grs		Cantidad de partículas del ensayo		Gradación original, %	Fracción perdida, %	
Pasa	Retenido		Inicial	Final	Antes	Después		% que pasa el tamiz designado	perdida ponderada en %
2"	1 1/2"	2000 ± 200							
1 1/2"	1"	1000 ± 50	1045,8	1039,8	47	47	17,84	0,57%	0,10%
1"	3/4"	500 ± 30	498,6	489,7	33	33	21,12	1,78%	0,38%
3/4"	1/2"	670 ± 10	664,3	657,5			29,83	1,02%	0,31%
1/2"	3/8"	330 ± 5	329,1	317,2			12,66	3,62%	0,46%
3/8"	Nº 4	300 ± 5	296,4	286,3			18,55	3,41%	0,63%
TOTALES			2834,20	2790,50	80,00	80,00	100,00		1,77%
Pérdida total : %								1,77%	

Nota: el % retenido en gradacion original de los tamices individuales deben tener mas del 5%, si no se toma el % de perdida del tamaño mayor mas proximo.

EXAMEN CUALITATIVO DE LAS PARTÍCULAS GRUESAS										
TAMANO TAMIZ		PARTICULAS QUE EXHIBEN ALTERACIONES								
		R		D		A		E		No TOTAL DE PARTICULAS ANTES DEL ENSAYO
		No	%	No	%	No	%	No	%	
DE 2 1/2" A 1 1/2"		0	0%	0	0%	25	53%	9	19%	47
DE 1 1/2" A 3/4"		0	0%	0	0%	37	112%	8	24%	33

R	ROTURA
D	DESINTEGRACIÓN
A	AGRIETAMIENTO
E	EXFOLIACIÓN

Agregado Fino									
Fracción		Peso de la fracción recomendada, grs	Peso de las fracciones, grs		Cantidad de partículas del ensayo		Gradación original, %	Fracción perdida, %	
Pasa	Retenido		Inicial	Final	Antes	Después		% que pasa el tamiz designado	perdida ponderada en %
3/8"	Nº 4	100	100,0	96,9			21,44	3,10%	0,66%
Nº 4	Nº 8	100	100,0	94,1			16,18	5,90%	0,95%
Nº 8	Nº 16	100	100,0	95,3			15,82	4,70%	0,74%
Nº 16	Nº 30	100	100,0	96,9			18,81	3,10%	0,58%
Nº 30	Nº 50	100	100,0	92,6			18,69	7,40%	1,38%
Nº 50	Nº 100	100	100,0	89,7			9,07	10,30%	0,93%
MENORES DE Nº 100		-	-	-				-	-
TOTALES							100,00		0
Pérdida total : %								4,3%	

ESPECIFICACIÓN DEL INVIAS 2022: ART 330	Sulfato de Sodio	X	≤ 12 %
	Sulfato de Magnesio		≤ 18%

OBSERVACIONES:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA
Nombre
EJECUTO:
Firma (Laboratorista)

FERNEY EDUARDO ARIAS
APROBO:
Firma Ingeniero (VoBo)

 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	INFORME DE RESULTADOS DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS NORMA I.N.V. E-227-13 / ESPEC. INVIAS 2022	CODIGO: F-EO-049 VERSION: 003 FECHA: 30/04/2025 PÁGINA 1 DE 1																																																																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> PROYECTO: CONTRATISTA: OBRA: TIPO DE MATERIAL: FUENTE: DESCRIPCION: </td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: top;"> CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA BASE GRANULAR - BG - 40 UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> FECHA: TRAMO: LOCALIZACION: MARGEN: FECHA DE TOMA: REGISTRO: </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; vertical-align: top;"> jueves, 14 de mayo de 2026 Puerto Rico - San Vicente Ruta 6504 jueves, 14 de mayo de 2026 </td> <td></td> </tr> </table>			PROYECTO: CONTRATISTA: OBRA: TIPO DE MATERIAL: FUENTE: DESCRIPCION:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA BASE GRANULAR - BG - 40 UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	FECHA: TRAMO: LOCALIZACION: MARGEN: FECHA DE TOMA: REGISTRO:		jueves, 14 de mayo de 2026 Puerto Rico - San Vicente Ruta 6504 jueves, 14 de mayo de 2026 																																																																			
PROYECTO: CONTRATISTA: OBRA: TIPO DE MATERIAL: FUENTE: DESCRIPCION:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA BASE GRANULAR - BG - 40 UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO MATERIAL COLOR CAFÉ OSCURO	FECHA: TRAMO: LOCALIZACION: MARGEN: FECHA DE TOMA: REGISTRO:																																																																								
	jueves, 14 de mayo de 2026 Puerto Rico - San Vicente Ruta 6504 jueves, 14 de mayo de 2026 																																																																									
PARTICULAS CON UNA (1) CARA FRACTURADA																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">TAMAÑO DEL AGREGADO</th> <th>F + Q + N</th> <th>F</th> <th>Q</th> <th>N</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> <tr> <th>PASA TAMIZ</th> <th>RETIENE TAMIZ</th> <th>gr</th> <th>gr</th> <th>gr</th> <th>gr</th> <th>%</th> <th>%</th> <th>P x D</th> </tr> <tr> <td>2"</td> <td>1 1/2"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 1/2"</td> <td>1"</td> <td>1664,3</td> <td>1590,3</td> <td>74,0</td> <td>74,0</td> <td>97,8</td> <td>39,1</td> <td>3826</td> </tr> <tr> <td>1"</td> <td>3/4"</td> <td>1343,3</td> <td>1274,3</td> <td>69,0</td> <td>69,0</td> <td>97,4</td> <td>31,6</td> <td>3077</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>1/2"</td> <td>743,2</td> <td>684,4</td> <td>58,8</td> <td>58,8</td> <td>96,0</td> <td>17,5</td> <td>1678</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>3/8"</td> <td>502,6</td> <td>497,7</td> <td>4,9</td> <td>4,9</td> <td>99,5</td> <td>11,8</td> <td>1176</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>4253,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,0</td> <td>9757</td> </tr> </table>			TAMAÑO DEL AGREGADO		F + Q + N	F	Q	N	P	D	E	PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ	gr	gr	gr	gr	%	%	P x D	2"	1 1/2"								1 1/2"	1"	1664,3	1590,3	74,0	74,0	97,8	39,1	3826	1"	3/4"	1343,3	1274,3	69,0	69,0	97,4	31,6	3077	3/4"	1/2"	743,2	684,4	58,8	58,8	96,0	17,5	1678	1/2"	3/8"	502,6	497,7	4,9	4,9	99,5	11,8	1176	TOTAL		4253,4					100,0	9757
TAMAÑO DEL AGREGADO		F + Q + N	F	Q	N	P	D	E																																																																		
PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ	gr	gr	gr	gr	%	%	P x D																																																																		
2"	1 1/2"																																																																									
1 1/2"	1"	1664,3	1590,3	74,0	74,0	97,8	39,1	3826																																																																		
1"	3/4"	1343,3	1274,3	69,0	69,0	97,4	31,6	3077																																																																		
3/4"	1/2"	743,2	684,4	58,8	58,8	96,0	17,5	1678																																																																		
1/2"	3/8"	502,6	497,7	4,9	4,9	99,5	11,8	1176																																																																		
TOTAL		4253,4					100,0	9757																																																																		
PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS = $\frac{\text{TOTAL E}}{\text{TOTAL D}}$ = 97,6																																																																										
PARTICULAS CON DOS (2) O MAS CARAS FRACTURADAS																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">TAMAÑO DEL AGREGADO</th> <th>F + Q + N</th> <th>F</th> <th>Q</th> <th>N</th> <th>P</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> <tr> <th>PASA TAMIZ</th> <th>RETIENE TAMIZ</th> <th>gr</th> <th>gr</th> <th>gr</th> <th>gr</th> <th>%</th> <th>%</th> <th>P x D</th> </tr> <tr> <td>2"</td> <td>1 1/2"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 1/2"</td> <td>1"</td> <td>1664,3</td> <td>1530,7</td> <td>74,0</td> <td>133,6</td> <td>94,2</td> <td>39,1</td> <td>3686</td> </tr> <tr> <td>1"</td> <td>3/4"</td> <td>1343,3</td> <td>1133,7</td> <td>69,0</td> <td>209,6</td> <td>87,0</td> <td>31,6</td> <td>2747</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>1/2"</td> <td>743,2</td> <td>617,7</td> <td>58,8</td> <td>125,5</td> <td>87,1</td> <td>17,5</td> <td>1521</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>3/8"</td> <td>502,6</td> <td>481,3</td> <td>4,9</td> <td>21,3</td> <td>96,2</td> <td>11,8</td> <td>1137</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>4253,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,0</td> <td>9091</td> </tr> </table>			TAMAÑO DEL AGREGADO		F + Q + N	F	Q	N	P	D	E	PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ	gr	gr	gr	gr	%	%	P x D	2"	1 1/2"								1 1/2"	1"	1664,3	1530,7	74,0	133,6	94,2	39,1	3686	1"	3/4"	1343,3	1133,7	69,0	209,6	87,0	31,6	2747	3/4"	1/2"	743,2	617,7	58,8	125,5	87,1	17,5	1521	1/2"	3/8"	502,6	481,3	4,9	21,3	96,2	11,8	1137	TOTAL		4253,4					100,0	9091
TAMAÑO DEL AGREGADO		F + Q + N	F	Q	N	P	D	E																																																																		
PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ	gr	gr	gr	gr	%	%	P x D																																																																		
2"	1 1/2"																																																																									
1 1/2"	1"	1664,3	1530,7	74,0	133,6	94,2	39,1	3686																																																																		
1"	3/4"	1343,3	1133,7	69,0	209,6	87,0	31,6	2747																																																																		
3/4"	1/2"	743,2	617,7	58,8	125,5	87,1	17,5	1521																																																																		
1/2"	3/8"	502,6	481,3	4,9	21,3	96,2	11,8	1137																																																																		
TOTAL		4253,4					100,0	9091																																																																		
PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS = $\frac{\text{TOTAL E}}{\text{TOTAL D}}$ = 90,9																																																																										
F + Q + N = PESO MUESTRA F = PESO DE MATERIAL CON CARA(S) FRACTURADAS Q = PARTICULAS EN LA CATEGORIA CUESTIONABLE N = PARTICULAS NO FRACTURADAS P = PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS POR FRACCION D = GRADACION ORIGINAL E = PROMEDIO DE CARAS FRACTURADAS $P = \left[\frac{F + \frac{Q}{2}}{F + Q + N} \right] * 100$																																																																										
ESPECIFICACIONES INVIAS 2022: ART. 330. UNA CARA 90% MIN, DOS O MAS CARAS 85% MIN.																																																																										
OBSERVACIONES: TODAS LAS PARTICULAS CLASIFICAN COMO FRACTURADAS PRESENTAN DOS O MAS CARAS FRACTURADAS																																																																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> EJECUTO: <u>SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA</u> Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> APROBO: <u>FERNEY EDUARDO ARIAS</u> Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo) </td> </tr> </table>			EJECUTO: <u>SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA</u> Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista)	APROBO: <u>FERNEY EDUARDO ARIAS</u> Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo)																																																																						
EJECUTO: <u>SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA</u> Nombre (Laboratorista)  Firma (Laboratorista)	APROBO: <u>FERNEY EDUARDO ARIAS</u> Nombre Ingeniero  Firma Ingeniero (VoBo)																																																																									

	INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS NORMA I.N.V. E-230-13 / ESPEC. INVIAS 2022	Código: F-EO-046 Versión: 003 Fecha:30/04/2025 Página 1 de 1
---	---	---

PROYECTO:	CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DPTOS DE HUILA Y CAQUETA	FECHA REPORTE:	martes, 19 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	TRAMO:	Puerto Rico - San Vicente
OBRA:	CTTO 991-2021 NEIVA - FLORENCIA	LOCALIZACION:	RUUTA 6504
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR - BG - 40	MARGEN:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA / RIO MONTECRISTO	FECHA DE TOMA:	martes, 19 de mayo de 2026
DESCRIPCION:	MATERIAL DE RIO MONTECRISTO	REGISTRO N°:	

INDICE DE ALARGAMIENTO

TOMA DEL AGREGADO		masa inicial de cada fraccion. Ri	granulometria (fraccion entre tamices).	granulometria corregida Nota 1	Masa de las particulas alargadas (ni)	indice de alargamiento por fraccion. (ni / Ri*100)	
Pasa	Retenido						
> 2"	2"						
2"	1 1/2"						
1 1/2"	1"	1664,3	36,3%	39,1%	168,2	10,1%	
1"	3/4"	1343,3	29,3%	31,6%	310,2	23,1%	
3/4"	1/2"	743,2	16,2%	17,5%	173,4	23,3%	
1/2"	3/8"	502,6	10,9%	11,8%	129,1	25,7%	
3/8"	1/4"	337,4	7,3%	7,9%	38,6	11,4%	
1/4"	< 1/4"		0,0%				
TOTALES		M11	4590,8	100,0%	107,9%	M13= 819,5	
		M12	4253,4				
ÍNDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL =			IL=	$\frac{M13}{M11 \text{ o } M12} \times 100 = 19\%$			

Nota 1: si hay alguna fraccion que represente menos del 5% del total se descarta este tamiz

nota 2: se deben descartar las particulas retenidas en el tamiz 50 mm (2") y que pasan el de 6,3 mm (1/4"). Para el indice de alargamiento.

INDICE DE APLANAMIENTO

TOMA DEL AGREGADO		masa inicial de cada fraccion. Ri	granulometria (fraccion entre tamices).	granulometria corregida Nota 1	Masa de las particulas alargadas (ni)	indice de alargamiento por fraccion. (ni / Ri*100)
Pasa	Retenido					
> 2 1/2"	2 1/2"					
2 1/2"	2"					
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"	1664,3	36,3%	36,3%	480,4	28,9%
1"	3/4"	1343,3	29,3%	29,3%	214,4	16,0%
3/4"	1/2"	743,2	16,2%	16,2%	89,4	12,0%
1/2"	3/8"	502,6	10,9%	10,9%	48,7	9,7%
3/8"	1/4"	337,4	7,3%	7,3%	32,3	9,6%
1/4"	< 1/4"					
TOTALES		M1	100%	100%	M3= 865,2	
		M2				
ÍNDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL =			IA=	$\frac{M3}{M1 \text{ o } M2} \times 100 = 19\%$		

nota 3: Se deben descartar las particulas retenidas en el tamiz 63 mm (2 1/2") y que pasan el de 6,3 mm (1/4"), en el indice de aplanamiento.

ESPECIFICACION DEL INVIAS 2022: ≤ %35

OBSERVACIONES:

EJECUTO:

SEGUNDO RAFAEL ESPAÑA

Nombre (Laboratorista)



Firma (Laboratorista)

APROBO:

FERNEY EDUARDO ARIAS

Nombre Ingeniero



Firma Ingeniero (VoBo)

	DENSIDAD EN EL TERRENO (Metodo cono - arena) I.N.V. E- 161 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022				CÓDIGO	F-EQ-036									
					VERSIÓN	004									
					FECHA	30/04/2025									
					PÁGINA	1 DE 1									
PROYECTO:	CTTO 991"NEIVA - FLORENCIA"				TRAMO:	PTO RICO - SAN VICENTE									
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				LOCALIZACION:	UTA 6504									
OBRA:	PTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN				COSTADO / CARRIL	CALZADA COMPLETA									
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR				FECHA DE TOMA:	26 de mayo de 2026									
TRAMO A EVALUAR:	PR 6+180 - PR 6+430				REGISTRO:										
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO														
METODO DE COMPACTACION MUESTRA EN EL LABORATORIO: A No B C															
TAMIZADO POR EL CUAL SE SEPARARON LOS SOBRETAMAÑOS: 4 3/8" 3/4" X X															
DENSIDAD N°		formula	1	2	3	5									
CAPA No			1	1	1	1									
COSTADO / MARGEN			IZQUIERDO	EJE	DERECHO	IZQUIERDO									
UBICACIÓN / ABCISADO			6+205	6+255	6+305	6+405									
PROFUNDIDAD ENSAYO cms.			14,0	14,0	14,0	14,0									
A	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)		6464	6507	6419	6339									
B	PESO FRASCO Y ARENA FINAL (g)		2106	1783	1765	2115									
C	PESO ARENA TOTAL USADA (g)	(A-B)	4358	4724	4654	4224									
D	CONSTANTE DEL CONO (g)		1603	1603	1603	1603									
E	MASA ARENA EN EL HUECO (g)	(C-D)	2755	3121	3051	2621									
F	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm³)		1,378	1,378	1,378	1,378									
G	VOLUMEN DEL HUECO (cm³)	(E/F)	1999	2265	2214	1902									
H	MASA MATERIAL TOTAL EXTRAIDO HUMEDO (g)		4721	5045	4972	4472									
I	HUMEDAD DEL MATERIAL (%)		5,8	5,0	5,1	5,4									
J	MASA DE MATERIAL SECO EXTRAIDO (g)	H / (1+(I/100))	4464	4805	4731	4245									
K	MASA HUMEDA MATERIAL SOBRE TAMAÑO (g)		447	360	350	730									
L	GRAVEDAD ESPECIFICA FRACCION GRUESA (g/cm³)		2,600	2,600	2,600	2,600									
M	% RETENIDO GRUESO 3/4"	(K/H)	10,0	7,5	7,4	17,2									
N	% PARTICULAS DE PARTICULAS FINAS	100-M	90,0	92,5	92,6	82,8									
O	Densidad Seca de Campo de la Muestra (g/cm³)	J/G	2,233	2,121	2,137	2,232									
P	Densidad seca Maxima (gr/cm³) (laboratorio)		2,130												
Q	Densidad Seca Corregida dde la muestra en campo(gr/cm³)	(O*L*N)/((100*L)-(O*M))	2,198	2,090	2,107	2,168									
R	COMPACTACION DEL TERRENO (%) (GCI), %	N/P	103,2%	98,1%	99%	102%									
N/P															
<table><tr><td>Gcm:</td><td>100%</td><td rowspan="3">SE ACEPTA EL LOTE</td><td rowspan="3">Grado de compactacion minimo %</td><td rowspan="3">98%</td></tr><tr><td>S=</td><td>0,02</td></tr><tr><td>GCI (90),%</td><td>99%</td></tr></table>							Gcm:	100%	SE ACEPTA EL LOTE	Grado de compactacion minimo %	98%	S=	0,02	GCI (90),%	99%
Gcm:	100%	SE ACEPTA EL LOTE	Grado de compactacion minimo %	98%											
S=	0,02														
GCI (90),%	99%														
ESPECIFICACIONES DEL INVIAS															
Capa de Base granular		Min 98%	Capa de terraplen	Clasificados como A-1, A-2-4 o A-3	CIMIENTO	Min 90%									
Capa de Subbase Granular		Min 95%			CORONA	Min 95%									
Capa de afirmado		Min 95%			CIMIENTO	Min 95%									
Capa de relleno de estructuras	Clasificados en A-1, A-2-4 o A-3 SBG o BG	Min 90%			CORONA	Min 100%									
	Otras clasificaciones	Min 95%													
OBSERVACIONES: Proctor realizado con material recolectado en via el 25 de mayo del 2026 en el pr 6+250															
EJECUTO:	NOMBRE	HUGO GORDILLO		APROBO:	NOMBRE	FERNEY EDUARDO ARIAS									
	CARGO	AUXILIAR LABORATORIO			CARGO										
	FIRMA				FIRMA										

	DENSIDAD EN EL TERRENO (Metodo cono - arena) I.N.V. E- 161 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022				CÓDIGO	F-EQ-036	
					VERSIÓN	004	
					FECHA	30/04/2025	
					PÁGINA	1 DE 1	
PROYECTO:	CTTO 991"NEIVA - FLORENCIA"				TRAMO:	PTO RICO - SAN VICENTE	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				LOCALIZACION:	RUTA 6504	
OBRA:	PTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN				COSTADO / CARRIL	CALZADA COMPLETA	
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR				FECHA DE TOMA:	21 de mayo de 2026	
TRAMO A EVALUAR:	PR 5+625 - PR 5+720				REGISTRO:		
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO						
METODO DE COMPACTACION MUESTRA EN EL LABORATORIO: A No B C							
TAMIZADO POR EL CUAL SE SEPARARON LOS SOBRETAMAÑOS: 4 3/8" 3/4" X X							
DENSIDAD N°		formula	1	2	3	4	5
CAPA No			1	1			
COSTADO / MARGEN			DERECHO	IZQUIERDO			
UBICACIÓN / ABCISADO			5+648	5+695			
PROFUNDIDAD ENSAYO cms.			14,0	14,0			
A	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)		6451	6630			
B	PESO FRASCO Y ARENA FINAL (g)		2596	2777			
C	PESO ARENA TOTAL USADA (g)	(A-B)	3855	3853			
D	CONSTANTE DEL CONO (g)		1603	1603			
E	MASA ARENA EN EL HUECO (g)	(C-D)	2252	2250			
F	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm³)		1,378	1,378			
G	VOLUMEN DEL HUECO (cm³)	(E/F)	1634	1633			
H	MASA MATERIAL TOTAL EXTRAIDO HUMEDO (g)		3889	4020			
I	HUMEDAD DEL MATERIAL (%)		3,2	3,6			
J	MASA DE MATERIAL SECO EXTRAIDO (g)	H / (1+(I/100))	3768	3880			
K	MASA HUMEDA MATERIAL SOBRE TAMAÑO (g)		479	239			
L	GRAVEDAD ESPECIFICA FRACCION GRUESA (g/cm³)		2,600	2,600			
M	% RETENIDO GRUESO 3/4"	(K/H)	12,7	6,2			
N	% PARTICULAS DE PARTICULAS FINAS	100-M	87,3	93,8			
O	Densidad Seca de Campo de la Muestra (g/cm³)	J/G	2,306	2,376			
P	Densidad seca Maxima (gr/cm³) (laboratorio)		2,205				
Q	Densidad Seca Corregida dde la muestra en campo(gr/cm³)	(O*L*N)/((100*L)-(O*M))	2,269	2,363			
R	COMPACTACION DEL TERRENO (%) (GCI), %	N/P	102,9%	107,2%			
N/P							
Gcm:		105%	SE ACEPTA EL LOTE		Grado de compactacion minimo %		98%
S=		0,03					
GCI (90),%		104%					
ESPECIFICACIONES DEL INVIAS							
Capa de Base granular		Min 98%	Capa de terraplen	Clasificados como A-1, A-2-4 o A-3	CIMIENTO	Min 90%	
Capa de Subbase Granular		Min 95%			CORONA	Min 95%	
Capa de afirmado		Min 95%		Otras clasificaciones	CIMIENTO	Min 95%	
Capa de relleno de estructuras	Clasificados en A-1, A-2-4 o A-3 SBG o BG	Min 90%			CORONA	Min 100%	
	Otras clasificaciones		Min 95%				
OBSERVACIONES:							
EJECUTO:	NOMBRE	HUGO GORDILLO		APROBO:	NOMBRE	FERNEY EDUARDO ARIAS	
	CARGO	AUXILIAR LABORATORIO			CARGO		
	FIRMA				FIRMA		

	DENSIDAD EN EL TERRENO (Metodo cono - arena) I.N.V. E- 161 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022				CÓDIGO	F-EQ-036	
					VERSIÓN	004	
					FECHA	30/04/2025	
					PÁGINA	1 DE 1	
PROYECTO:	CTTO 991"NEIVA - FLORENCIA"				TRAMO:	PTO RICO - SAN VICENTE	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				LOCALIZACION:	UTA 6504	
OBRA:	PTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN				COSTADO / CARRIL	CALZADA COMPLETA	
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR				FECHA DE TOMA:	29 de mayo de 2026	
TRAMO A EVALUAR:	PR 6+530 - PR 6+790				REGISTRO:		
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO						
METODO DE COMPACTACION MUESTRA EN EL LABORATORIO: A No B C							
TAMIZADO POR EL CUAL SE SEPARARON LOS SOBRETAMAÑOS: 4 3/8" 3/4" X X							
DENSIDAD N°		formula	1	2	3	5	
CAPA No			1	1	1	1	
COSTADO / MARGEN			IZQUIERDO	EJE	DERECHO	IZQUIERDO	
UBICACIÓN / ABCISADO			6+555	6+605	6+655	6+705	
PROFUNDIDAD ENSAYO cms.			14,0	14,0	14,0	14,0	
A	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)		6314	6150	6066	5972	
B	PESO FRASCO Y ARENA FINAL (g)		1827	1852	1794	1825	
C	PESO ARENA TOTAL USADA (g)	(A-B)	4487	4298	4272	4147	
D	CONSTANTE DEL CONO (g)		1603	1603	1603	1603	
E	MASA ARENA EN EL HUECO (g)	(C-D)	2884	2695	2669	2544	
F	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm³)		1,378	1,378	1,378	1,378	
G	VOLUMEN DEL HUECO (cm³)	(E/F)	2093	1956	1937	1846	
H	MASA MATERIAL TOTAL EXTRAIDO HUMEDO (g)		4751	4424	4397	4277	
I	HUMEDAD DEL MATERIAL (%)		5,05	5,6	5,6	5,9	
J	MASA DE MATERIAL SECO EXTRAIDO (g)	H / (1+(I/100))	4523	4189	4164	4039	
K	MASA HUMEDA MATERIAL SOBRE TAMAÑO (g)		170	550	225	194	
L	GRAVEDAD ESPECIFICA FRACCION GRUESA (g/cm³)		2,600	2,600	2,600	2,600	
M	% RETENIDO GRUESO 3/4"	(K/H)	3,8	13,1	5,4	4,8	
N	% PARTICULAS DE PARTICULAS FINAS	100-M	96,2	86,9	94,6	95,2	
O	Densidad Seca de Campo de la Muestra (g/cm³)	J/G	2,161	2,142	2,150	2,188	
P	Densidad seca Maxima (gr/cm³) (laboratorio)		2,130				
Q	Densidad Seca Corregida dde la muestra en campo(gr/cm³)	(O*L*N)/((100*L)-(O*M))	2,147	2,087	2,129	2,170	
R	COMPACTACION DEL TERRENO (%) (GCI), %	N/P	100,8%	98,0%	100%	102%	
N/P							
Gcm:		101%	SE ACEPTA EL LOTE		Grado de compactacion minimo %		
S=		0,03			98%		
GCI (90),%		100%					
ESPECIFICACIONES DEL INVIAS							
Capa de Base granular		Min 98%	Capa de terraplen	Clasificados como A-1, A-2-4 o A-3	CIMIENTO	Min 90%	
Capa de Subbase Granular		Min 95%			CORONA	Min 95%	
Capa de afirmado		Min 95%		Otras clasificaciones	CIMIENTO	Min 95%	
Clasificados en A-1, A-2-4 o A-3 SBG o BG		Min 90%			CORONA	Min 100%	
Otras clasificaciones		Min 95%					
OBSERVACIONES: Proctor realizado con material recolectado en via el 25 de mayo del 2026 en el pr 6+250							
EJECUTO:	NOMBRE	HUGO GORDILLO			APROBO:	NOMBRE	FERNEY EDUARDO ARIAS
	CARGO	AUXILIAR LABORATORIO				CARGO	
	FIRMA					FIRMA	

		DENSIDAD EN EL TERRENO (Metodo cono - arena) I.N.V. E- 161 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022		CÓDIGO F-EQ-036		
				VERSIÓN 004		
				FECHA 30/04/2025		
				PÁGINA 1 DE 1		
PROYECTO: CTTO 991"NEIVA - FLORENCIA"		TRAMO: PTO RICO - SAN VICENTE				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		LOCALIZACION: RUTA 6504				
OBRA: PTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN		COSTADO / CARRIL: CALZADA COMPLETA				
TIPO DE MATERIAL: BASE GRANULAR		FECHA DE TOMA: 26 de mayo de 2026				
TRAMO A EVALUAR: PR 3+300 - PR 3+330		REGISTRO:				
FUENTE: UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO						
METODO DE COMPACTACION MUESTRA EN EL LABORATORIO: TAMIZADO POR EL CUAL SE SEPARARON LOS SOBRETAMAÑOS:		A 4	No []	B 3/8"		
				C 3/4"		
				X []		
				X []		
DENSIDAD N°		formula	1	2		
CAPA No			3	4		
COSTADO / MARGEN			5			
UBICACIÓN / ABCISADO		DERECHO				
PROFUNDIDAD ENSAYO cms.		3+325				
		14,0				
A	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	(A-B)				
B	PESO FRASCO Y ARENA FINAL (g)					
C	PESO ARENA TOTAL USADA (g)					
D	CONSTANTE DEL CONO (g)					
E	MASA ARENA EN EL HUECO (g)	(C-D)				
F	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm³)					
G	VOLUMEN DEL HUECO (cm³)	(E/F)				
H	MASA MATERIAL TOTAL EXTRAIDO HUMEDO (g)					
I	HUMEDAD DEL MATERIAL (%)					
J	MASA DE MATERIAL SECO EXTRAIDO (g)	H / (1+(I/100))				
K	MASA HUMEDA MATERIAL SOBRE TAMAÑO (g)					
L	GRAVEDAD ESPECIFICA FRACCION GRUESA (g/cm³)					
M	% RETENIDO GRUESO 3/4"	(K/H)				
N	% PARTICULAS DE PARTICULAS FINAS	100-M				
O	Densidad Seca de Campo de la Muestra (g/cm³)	J/G				
P	Densidad seca Maxima (gr/cm³) (laboratorio)		2,205			
Q	Densidad Seca Corregida dde la muestra en campo(gr/cm³)	(O*L*N)/((100*L)-(O*M))	2,207			
R	COMPACTACION DEL TERRENO (%) (GCI), %	N/P	100,1%			
Gcm: 100% S= 0,00 GCI (90),% 100% SE ACEPTA EL LOTE Grado de compactacion minimo % 98% N/P						
ESPECIFICACIONES DEL INVIAS						
Capa de Base granular		Min 98%	Capa de terraplen	Clasificados como A-1, A-2-4 o A-3	CIMIENTO	Min 90%
Capa de Subbase Granular		Min 95%		Otras clasificaciones	CORONA	Min 95%
Capa de afirmado		Min 95%			CIMIENTO	Min 95%
Capa de relleno de estructuras	Clasificados en A-1, A-2-4 o A-3 SBG o BG	Min 90%		CORONA	Min 100%	
	Otras clasificaciones	Min 95%				
OBSERVACIONES: Tramo que estaba pendiente por instalar capa de rodadura.						
EJECUTO:	NOMBRE	HUGO GORDILLO		APROBO:	NOMBRE	FERNEY EDUARDO ARIAS
	CARGO	AUXILIAR LABORATORIO			CARGO	
	FIRMA				FIRMA	

	DENSIDAD EN EL TERRENO (Metodo cono - arena) I.N.V. E- 161 - 13 - ESPEC. INVIAS 2022				CÓDIGO	F-EQ-036
					VERSIÓN	004
					FECHA	30/04/2025
					PÁGINA	1 DE 1
PROYECTO:	CTTO 991"NEIVA - FLORENCIA"				TRAMO:	PTO RICO - SAN VICENTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				LOCALIZACION:	UTA 6504
OBRA:	PTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN				COSTADO / CARRIL	CALZADA COMPLETA
TIPO DE MATERIAL:	BASE GRANULAR				FECHA DE TOMA:	27 de mayo de 2026
TRAMO A EVALUAR:	PR 6+430 - PR 6+530				REGISTRO:	
FUENTE:	UNIDAD INDUSTRIAL KMA - RIO MONTECRISTO					
METODO DE COMPACTACION MUESTRA EN EL LABORATORIO: A No B C						
TAMIZADO POR EL CUAL SE SEPARARON LOS SOBRETAMAÑOS: 4 3/8" 3/4" X X						
DENSIDAD N°	formula	1	2	3	4	5
CAPA No		1	1			
COSTADO / MARGEN		EJE	DERECHO			
UBICACIÓN / ABCISADO		6+455	6+505			
PROFUNDIDAD ENSAYO cms.		14,0	14,0			
A	PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	6640	6552			
B	PESO FRASCO Y ARENA FINAL (g)	2408	2359			
C	PESO ARENA TOTAL USADA (g)	(A-B)	4232	4193		
D	CONSTANTE DEL CONO (g)	1603	1603			
E	MASA ARENA EN EL HUECO (g)	(C-D)	2629	2590		
F	DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm³)	1,378	1,378			
G	VOLUMEN DEL HUECO (cm³)	(E/F)	1908	1880		
H	MASA MATERIAL TOTAL EXTRAIDO HUMEDO (g)		4412	4337		
I	HUMEDAD DEL MATERIAL (%)		5,85	5,65		
J	MASA DE MATERIAL SECO EXTRAIDO (g)	H / (1+(I/100))	4168	4105		
K	MASA HUMEDA MATERIAL SOBRE TAMAÑO (g)		388	221		
L	GRAVEDAD ESPECIFICA FRACCION GRUESA (g/cm³)		2,600	2,600		
M	% RETENIDO GRUESO 3/4"	(K/H)	9,3	5,4		
N	% PARTICULAS DE PARTICULAS FINAS	100-M	90,7	94,6		
O	Densidad Seca de Campo de la Muestra (g/cm³)	J/G	2,185	2,184		
P	Densidad seca Maxima (gr/cm³) (laboratorio)		2,130			
Q	Densidad Seca Corregida dde la muestra en campo(gr/cm³)	(O*L*N)/((100*L)-(O*M))	2,150	2,164		
R	COMPACTACION DEL TERRENO (%) (GCI), %	N/P	100,9%	101,6%		
N/P						
Gcm: 101%		SE ACEPTA EL LOTE		Grado de compactacion minimo %		98%
S= 0,00						
GCI (90),% 101%						
ESPECIFICACIONES DEL INVIAS						
Capa de Base granular		Min 98%	Capa de terraplen	Clasificados como A-1, A-2-4 o A-3	CIMIENTO	Min 90%
Capa de Subbase Granular		Min 95%			CORONA	Min 95%
Capa de afirmado		Min 95%		Otras clasificaciones	CIMIENTO	Min 95%
Capa de relleno de estructuras	Clasificados en A-1, A-2-4 o A-3 SBG o BG	Min 90%			CORONA	Min 100%
	Otras clasificaciones		Min 95%			
OBSERVACIONES: Proctor realizado con material recolectado en via el 25 de mayo del 2026 en el pr 6+250						
EJECUTO:	NOMBRE	HUGO GORDILLO		APROBO:	NOMBRE	FERNEY EDUARDO ARIAS
	CARGO	AUXILIAR LABORATORIO			CARGO	
	FIRMA				FIRMA	
