

SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026
CRONOGRAMA
GRUPO No 1

CRONOGRAMA -FLUJO DE CAJA - GRUPO 1


Estrategia: actividades de 3–10 días, ejecución intercalada, cuadrillas paralelas y cierre máximo 19/12/2026.

Frete	Escenario	Cap.	Actividad	Costo	Dur. (días)	Inicio	Fin	Cuadrilla	19-nov	20-nov	21-nov	23-nov	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	30-nov	01-dic	02-dic	03-dic	04-dic	05-dic	07-dic	09-dic	10-dic	11-dic	12-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	18-dic	19-dic
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEGOS INFANT PRECONSTRUCCIÓN				7	2026-11-10	2026-11-18	C0																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	1	PRELIMINARES	254.314.935,18	26	19/11/2026	19/12/2026	C1																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	2	CANCHA MULTIPLE	221.862.732,05	24	21/11/2026	19/12/2026	C2																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	3	CANCHA MULTIPLE DRENAJES	23.228.906,47	9	24/11/2026	03/12/2026	C3																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	4	ELEMENTOS DE LA CANCHA	20.860.714,00	9	25/11/2026	04/12/2026	C4																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	5	PINTURA	22.729.952,00	9	27/11/2026	07/12/2026	C5																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	6	ATRAQUES BORDILLO	1.312.977,89	4	30/11/2026	03/12/2026	C6																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	7	ESTRUCTURA JUEGOS INFANTILES	80.166.685,54	15	02/12/2026	19/12/2026	C7																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	8	ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES	14.243.914,37	8	03/12/2026	12/12/2026	C8																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	9	DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIK	36.192.042,36	11	05/12/2026	18/12/2026	C4																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	10	ATRAQUES BORDILLO	4.230.173,00	5	09/12/2026	14/12/2026	C5																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	11	CARCAMO EN CONCRETO (FUENTE TRANSITABL	11.298.748,44	7	11/12/2026	18/12/2026	C9																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	12	FUENTES TRANSITABLES	20.729.556,12	9	10/12/2026	19/12/2026	C6																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	13	MANTENIMIENTO TANQUE	1.508.183,20	4	15/12/2026	18/12/2026	C5																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	14	COMPONENTE ELECTRICO	17.366.696,00	8	11/12/2026	19/12/2026	C10																										
1	REALIZAR ADECUACIONES DE CANCHA MULTIPLE Y JUEG	15	VARIOS	55.241.144,00	13	04/12/2026	19/12/2026	C3																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIVO PASOAN PRECONSTRUCCIÓN				7	2026-11-10	2026-11-18	C0																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	1	OBRA VIAL EXTERIOR	9.931.190,97	16	19/11/2026	07/12/2026	C1																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	2	PRELIMINARES BAÑOS	2.104.927,88	9	21/11/2026	01/12/2026	C3																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	3	HIDROSANITARIO	2.763.718,10	10	24/11/2026	04/12/2026	C5																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	4	ADECUACION DE MURO	4.429.444,20	12	26/11/2026	10/12/2026	C6																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	5	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.066.199,00	7	28/11/2026	05/12/2026	C7																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	6	PISOS Y ENCHAPES	2.395.578,02	9	01/12/2026	11/12/2026	C8																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	7	ACABADO DE MUROS Y CIELOS	5.465.163,41	13	03/12/2026	18/12/2026	C10																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	8	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	1.005.962,50	7	04/12/2026	12/12/2026	C12																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	9	DOTACION BAÑOS	7.831.016,47	15	02/12/2026	19/12/2026	C3																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	10	CARPINTERIA METALICA	1.096.061,00	7	10/12/2026	17/12/2026	C1																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	11	ADECUACION ACCESO	8.130.132,92	15	02/12/2026	19/12/2026	C9																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	12	ADECUACION ANDEN	19.959.998,40	23	23/11/2026	19/12/2026	C4																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	13	ADECUACION ACCESO	26.408.389,70	26	19/11/2026	19/12/2026	C2																										
5	ADECUACION BATERIAS DE BAÑO ESCENARIO DEPORTIV	14	VARIOS	6.733.026,00	14	03/12/2026	19/12/2026	C11																										

FLUJO DE CAJA SEMANAL – GRUPO 1 – PROGRAMACIÓN FINAL

Distribución proporcional del costo según días laborables de cada actividad.

Semana	Inicio	Fin	Valor semanal	Acumulado	%
1	16/11/2026	22/11/2026	43.731.412,56	43.731.412,56	4,94%
2	23/11/2026	29/11/2026	160.451.437,89	204.182.850,45	18,14%
3	30/11/2026	06/12/2026	219.623.550,22	423.806.400,67	24,83%
4	07/12/2026	13/12/2026	212.065.481,17	635.871.881,84	23,97%
5	14/12/2026	20/12/2026	248.736.287,34	884.608.169,18	28,12%
TOTAL			884.608.169,18		100,00%

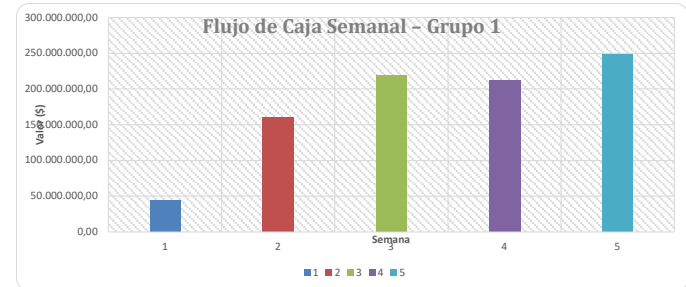

PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA	PRESUPUESTADOR	FIRMA
JENNYFFER CASTELLANOS	<i>Jennyffer Castellanos</i>	JOSE D. MONTEALEGRE	<i>Jose D. Montealegre</i>	NELSON ALONSO USURRIAGA	<i>Nelson Usurriaga</i>	FRANCIS GOMEZ	<i>Francis Gomez</i>
MILENA VELASQUEZ OCAMPO	<i>Milena Velasquez</i>	JUAN GUILLERMO GONZALES	<i>Juan Guillermo Gonzales</i>	CARLOS ANDRES BEDOYA	<i>Carlos Andres Bedoya</i>	MARIA C. PENAGO	<i>Maria C. Penago</i>
