

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Comité Semanal 8, semana del 06 al 12 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA 16/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Juliana Cristina Ardila Arévalo	SDM-SS
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM-DIT
Magda Fabiola Rojas Ramírez	TPD

2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de generalidades del contrato 2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila 3. Recomendaciones y conclusiones 4. Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación de generalidades del contrato <p>El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 2025 de 2022 • Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. • Acta de inicio del 16 de enero de 2023 • Duración: 10 meses
2. Informe de seguimiento de avance semanal <p>El director del proyecto informa que se recibieron observaciones a la versión 0 del informe de etapa 2 del tramo 11_16 Calle 170 entre carrera 90 y carrera 92, así mismo se recibieron los tramos 3_23 Vía Choachí kilómetro 14+300, 3_24 Vía Choachí kilómetro 14+0 y 3_25 Vía Choachí kilómetro 13+550 para empezar la ejecución de la etapa 1.</p> <p>Se presenta el avance por metas</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 8, semana del 06 al 12 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA	16/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

 <p>Etapa 1 Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 7</p>	 <p>Etapa 2 Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular</p> <p>Versión 0: 7 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 0</p>	 <p>Etapa 3 Diseño de sistemas de contención vehicular</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 0</p>	 <p>Etapa 4 Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular</p> <p>Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0</p> <p>Aprobados: 0</p>
<p>Total tramos en proceso: 10 tramos en proceso de diseño</p> <p>Completos en las 4 Etapas de diseño: 0 tramos finalizados</p>			

Total tramos en proceso: 10

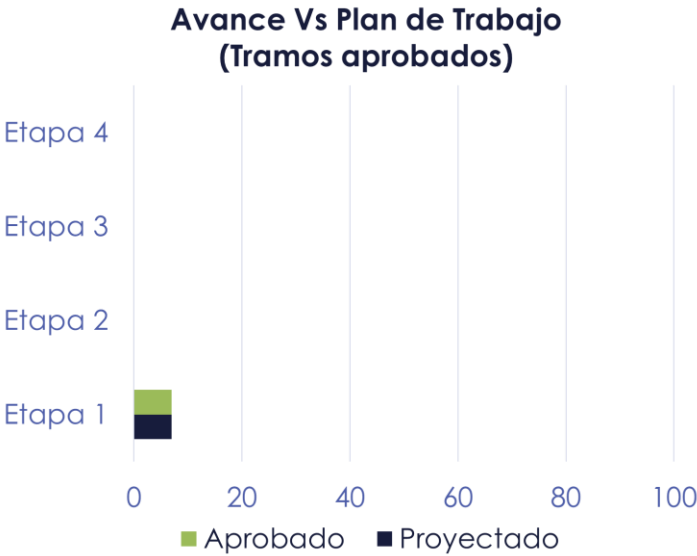

Avance ejecución financiera

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Comité Semanal 8, semana del 06 al 12 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA 16/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



3. Recomendaciones y conclusiones

- Durante la semana reportada se recibieron observaciones a la versión 0 del informe de la etapa 2 del tramo 11_16.
- Se recibió la asignación de 3 tramos nuevos para empezar la ejecución de la etapa 1, los cuales corresponden a los tramos 3_23, 3_24 y 3_25.
- Se esperan observaciones de los informes de la etapa 2 de los tramos 3_32, 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20.
- Se tiene programado entregar la versión 1 del informe de etapa 2 del tramo 11_16.
- Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 3_23, 3_24, 3_25.

4. Temas de la SDM

La consultoría solicita una nueva mesa de trabajo para socializar las observaciones a los informes de etapa 2 del tramo 11_16 la cual se programará el día 17/03/2023 a las 14:30.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Agendar la mesa de trabajo solicitada	TPD	16/03/2023

APROBADO


JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
 SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025


CAMILO ARDILA
 DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
