

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA Comité Semanal 7, semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA 09/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Jose Fernando Sánchez Chaves	TPD
Lilian Joanna Forero Suárez	SDM/DIT
Magda Fabiola Ramírez	TPD
Camilo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de generalidades del contrato 2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila 3. Recomendaciones y conclusiones 4. Temas de la SDM – Ingeniera Juliana Ardila

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación de generalidades del contrato <p>El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato 2025 de 2022 • Contratista: TPD Ingeniería S.A.S. • Acta de inicio del 16 de enero de 2023 • Duración: 10 meses
2. Informe de seguimiento de avance semanal <p>El director del proyecto informa que se entregó la versión 0 del informe de la etapa 2 de los tramos 5_6 Calle 84 sur entre carrera 14 y carrera 9A, 4_12 Avenida carrera 10 entre calle 35A sur y calle 37 sur, 2_73 Calle 59 con transversal 1A, 18_6 Carrera 9A entre calle 48 B Bis B sur y carrera 51 y 19_20 Carrera 17A entre calle 81F Bis sur y acceso a GEM.</p> <p>Se presenta el avance por metas</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 7, semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2023; 2022-2025		
FECHA	09/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



Etapa 1
Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos

Versión 0: 0
Versión 1: 0
Versión 2: 0

Aprobados: 7



Etapa 2
Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular

Versión 0: 7
Versión 1: 0
Versión 2: 0

Aprobados: 0



Etapa 3
Diseño de sistemas de contención vehicular

Versión 0: 0
Versión 1: 0
Versión 2: 0

Aprobados: 0



Etapa 4
Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular

Versión 0: 0
Versión 1: 0
Versión 2: 0

Aprobados: 0


Total tramos en proceso: 7 tramos en proceso de diseño

Completos en las 4 Etapas de diseño: 0 tramos finalizados



Total tramos en proceso: 7

Avance Vs Plan de Trabajo
(Tramos aprobados)

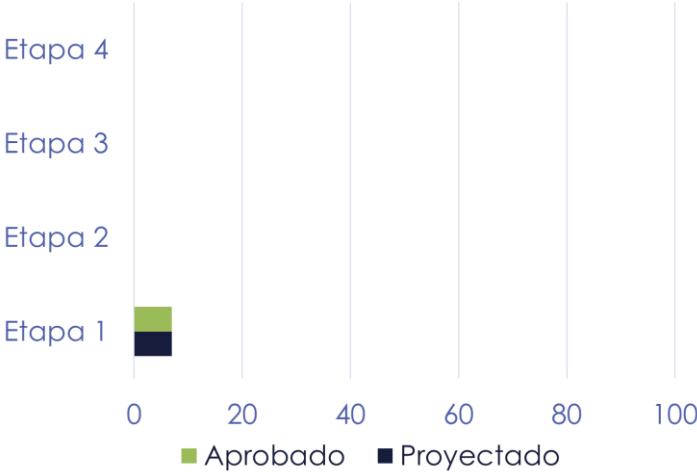

Etapa	Aprobado	Proyectado
Etapa 4	0	0
Etapa 3	0	0
Etapa 2	0	0
Etapa 1	7	0

Avance ejecución financiera

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 7, semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2023; 2022-2025	
FECHA 09/03/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq



3. Recomendaciones y conclusiones

- Se presentó la V0 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20 de la etapa 2.
- Se esperan observaciones a la V0 de la etapa 2 de los tramos 11_16, 3_32, 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20 para continuar con la elaboración de los informes de la etapa 2 en V1.

4. Temas de la SDM

Se reitera que de ser necesaria una mesa de trabajo la supervisión está presta a realizarla.

La supervisión del contrato se encuentra haciendo las observaciones a las versiones 0 de los informes de etapa 2 de los tramos 11_16, 3_32, 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 y 19_20.

Se solicita que se radique el PAC durante la semana en curso.

Se realizará la solicitud para el posible acompañamiento por parte de la policía para uno de los tramos nuevos a ejecutar.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Radicar el PAC	TPD	10/03/2023
Realizar la solicitud de acompañamiento por parte de la policía	SDM	15/03/2023

APROBADO


JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
 SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025


CAMILO ARDILA
 DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
