

CODIGO TRD: 232

ACTA No. INTV-COMCEL-0078	LUGAR: Virtual/TEAMS	FECHA: 01 de marzo 2022	HORA DE INICIO: 09:00 a.m.	HORA FINAL: 10:30 a.m.
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a compromisos
2. Avance Estudios de Campo Grupo 3
3. Avance de Instalación y puesta en servicio de Centros Digitales por Grupo
4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los CD que se encuentran en Fase de Operación
5. Estado de PQRSD.
6. Estado de los Aspectos Financieros.
7. Varios

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	En proceso MinTIC.
2	Radicación de transferencia de bienes	Pendiente. Interventoría remitió observaciones.
3	Seguimiento de avance de modificación contrato de Aporte 1042 (Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic)	En proceso. Aún no hay retroalimentación de Mintic
4	Radicaciones informes de legalización de recursos 3,4,5	Cumplido.
5	Presentar avance del inventario con ID beneficiario y seriales disponibles del Grupo 1A y Grupo 1B. (Técnico y Financiero).	En proceso.
6	Radicación informe de legalización de recursos 6 y 7 ajustado	Continúa con observaciones
7	Reunión entre la supervisión, la interventoría y COMCEL para definir los lineamientos sobre la asignación de ID_Beneficiarios	Pendiente
8	Entrega del consolidado de 351 estudios de campo del grupo 2	Pendiente

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

9	Presentar observaciones al primer avance del inventario con ID beneficiario y seriales disponibles del Grupo 1A y Grupo 1B. (Técnico y Financiero).	Cumplido Se envió correo el 28/02/2022 a COMCEL con las observaciones.
---	---	--



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para el desarrollo del acta de la reunión, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. se denominará en adelante COMCEL, así mismo, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES se nombrará en adelante la Interventoría y la presentación realizada por el contratista ejecutor (COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A), hará parte integral de la presente acta.

2. AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

El contratista reporta que el corte del reporte de Estudios de Campo al 28 de febrero de 2022 es:

ESTADO ESTUDIOS DE CAMPO G3	TOTAL
Aprobados Interventoría	1537
EC sobrantes del G2	351
Total	1888
Radicados	
EC heredados grupos anteriores	887
EC presentados	1107
Total EC Radicados	1994

Radicado 25-02
• Radicado 28-02
• + 132 CD proceso

Comcel					
Cons. Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Símbolos reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0504-22	Solicitud Inclusión 887 Estudios de Campo del Grupo 3 – Meta 5	221014578	25/02/2022	887	2799
CD-COMCEL-INTV-0508-22	Estudios de Campo del Grupo 3 – Meta 5	221015160	28/02/22	1107	3096

La interventoría da a conocer en la siguiente tabla el consolidado con el estado de revisiones con corte al 23 de febrero de 2022:

INTERVENTORÍA						
Aprobados	Rechazados	En revisión	En iteración	Fecha	Comunicado	MINTIC
1537	456	11	2004	23/02/2022	CD-INTV-COMCEL-0417-22	221011387, 221011398

El contratista manifiesta que desde el 14 hasta el 28 de febrero se han presentado situaciones de orden público en Norte de Santander y Cesar que interfirieron en la realización de las visitas. La interventoría solicita al contratista que presente a la entidad contratante y a la interventoría las respectivas evidencias que demuestren la situación reportada y la identificación de los CD afectados.

NOTA: Para interventoría una vez definidos los 2919 Centros Digitales en Estudios de Campo para el grupo 2, el excedente que corresponde a 351 estudios de campo aprobados pasará a ser parte del grupo 3.

Causales de rechazo de los 456 Centros Digitales


TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE FALLA
1	¿ Se Anexa y Cumple el Formato Estudio de Campo de forma General?	398	87%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	160	35%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	103	23%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	79	17%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	66	14%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	29	6%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	27	6%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		456	

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

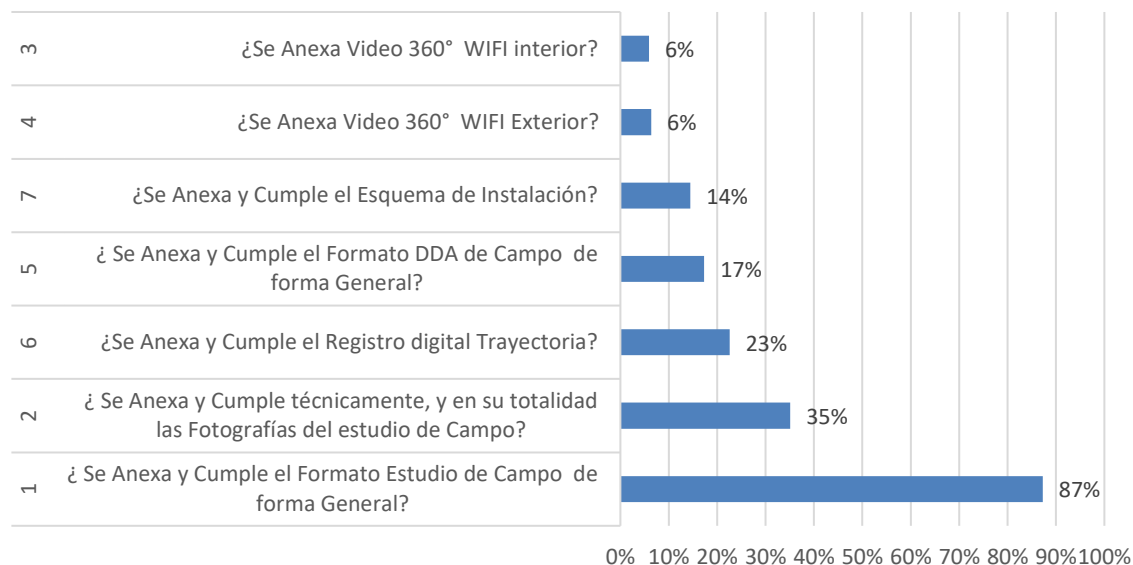

Fecha de corte 24-02-2022

3. AVANCE DE INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTROS DIGITALES POR GRUPOS

A) Grupo 2.

El contratista realiza la presentación del avance de la Instalación del Grupo 2 y reporta con fecha de corte 28/02/2022:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 El futuro digital es de todos MinTIC	AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		
	GRUPO 1A	GRUPO 1B	GRUPO 2
Meta	● 758	● 757	● 2919
Sitios instalados	● 758	● 757	● 2816 Integrados 103 FM
Reportes instalación	● 758	● 757	● 2816 Reportados 103 FM 1926 Aprobados
Pruebas remotas	● 758	● 757	● 1911 Aprobados 27 En interventoría 1 Rechazados 371 Listas para enviar 106 En curso
Visitas Interventoría	● 758	● 757	● 159 Aprobados 77 En interventoría 971 Rechazados 183 Visitas Programadas 401 Pendiente Programar

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		 El futuro digital es de todos MinTIC
--	--	--

Radicados Comcel					
#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0486-22	Decimosexta Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 10	221011400	14/02/2022	62	2200
CD-COMCEL-INTV-0507-22	Decimoséptima Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 10	221015191	28/02/2022	741	2941
CD-COMCEL-INTV-0507-22	Decimooctava Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 10	221015196	28/02/2022	90	3031

Aprobados Interventoría						
Aprobados INTV	Rechazados INTV	En revisión INTV	En iteración INTV	Fecha	Comunicado	MINTIC
1852	286	0	2138	14/02/2022	CD-INTV-COMCEL-0399-22	221011418
1926	274	0	2200	21/02/2022	CD-INTV-COMCEL-0412-22	221012861

A continuación, la interventoría da a conocer los consolidados de los reportes y revisiones de la de aprobación de los Centros Digitales:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”




- Reporte de Instalación:

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
1.926	274	0	2200	2.919

Causales de rechazo de los 274 CD

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
2	Acta de socialización	255	93%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	250	91%
1	Acta de instalación	249	91%
6	Dispositivo movil conectado a la wifi exterior	246	90%
7	Video 360 interior	232	85%
3	Coordenadas geograficas	230	84%
8	Video 360 exterior	230	84%
4	Fotografias de equipos AP interior y exterior	222	81%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		274	

TITIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2

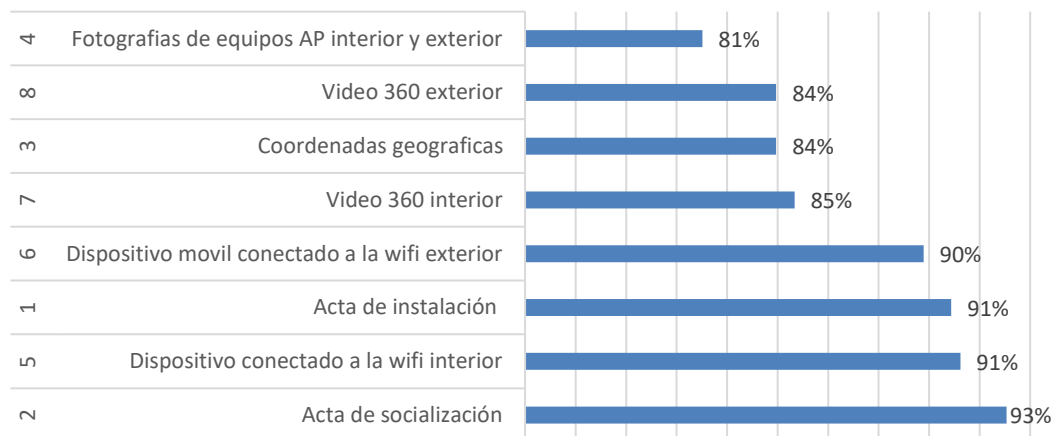

Fecha de corte 28-02-2022


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

• **Pruebas remotas**

CONSOLIDADO PRUEBA REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
1.911	1	27	1.939	2.919

Causales de rechazo de los 1 CD

TIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO PRUEBAS REMOTAS G2			
PRUEBA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
5	Verificación del funcionamiento y estabilidad de la zona en el Sistema de Gestión	1	100%
1	Pruebas de Conectividad	0	0%
4	Pruebas de inventario de equipos	0	0%
6	Tráfico generado en los puntos de acceso inalámbrico WIFI	0	0%
2	Pruebas Portal Cautivo	0	0%
3	Pruebas de filtraje y control a páginas WEB	0	0%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		1	

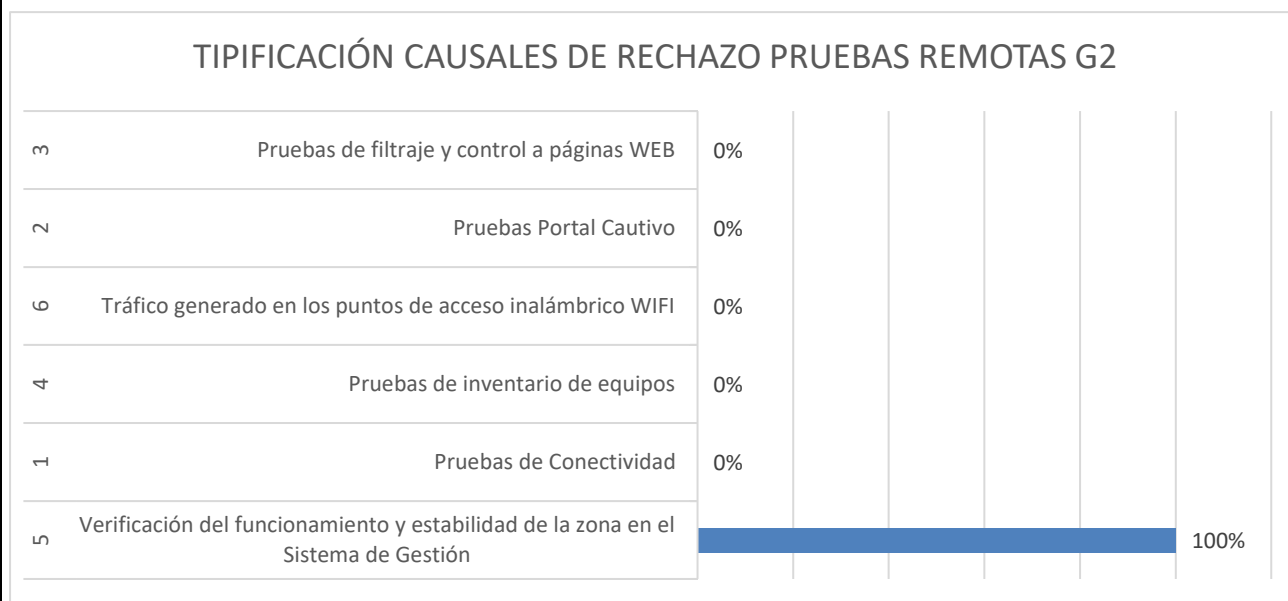

Fecha de corte 24-02-2022

Estado de Aprobación de Centros Digitales.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
 Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
 V4.0



La Interventoría relaciona el estado de aprobación de los Centros Digitales del grupo 2, con corte al 24 de febrero de 2022.

ESTADO DE APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS GRUPO 2				
APROBADAS	RECHAZADOS	FALLIDAS	VISITAS ADICIONALES (a programar)	META GRUPO 2
120	881	127	241	2919

Causales de rechazo de 881 Centros Digitales.




4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los centros digitales

- Grupo 1A



El contratista manifiesta que se encuentran 102 CD con parada de reloj, con corte al 25/02/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1A

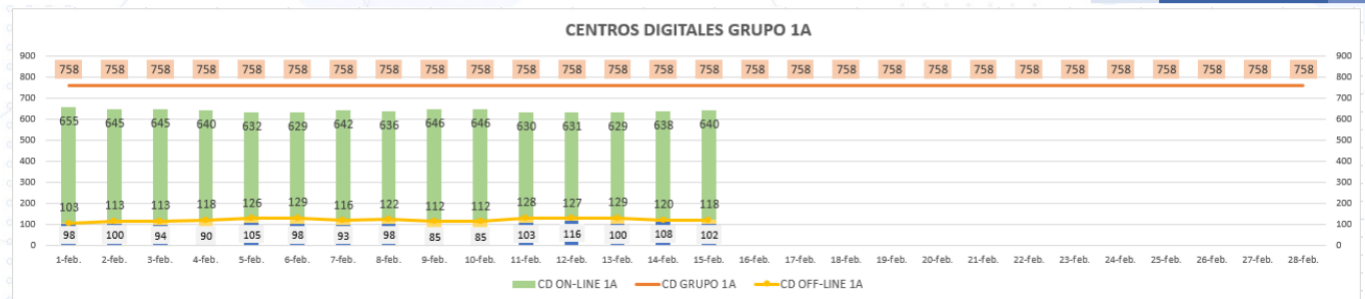


ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1A	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	44	44
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	19	19
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	9	9
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	9	9
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	6	6
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	4	4
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	2	2
FUERZA MAYOR - FENOMENO NATURAL	2	2
FUERZA MAYOR - HURTO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	1	1
CASO FORTUITO - FIBRA DANOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1	1
Total	102	102

• Grupo 1B

El contratista manifiesta que se encuentran 81 CD con parada de reloj, con corte al 25/02/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1B

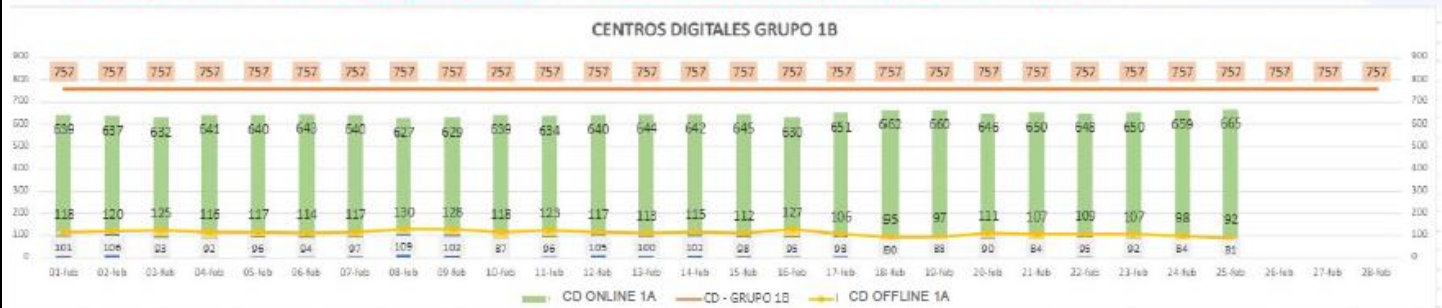

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1B	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	43	43
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	20	20
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	6	6
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	4	4
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	1	1
CASO FORTUITO - SITIO TEMPORIZADO POR SOLICITUD TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1	1
Total	81	81



Indicadores De calidad y Niveles de Servicio

Una vez realizadas las mesas de trabajo de subsanación de indicadores en lo referente al concepto preliminar, la interventoría realizó el recalcule y mitió el concepto final con los siguientes resultados:

Grupo 1A:

INDICADOR	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO		RESULTADO INTERVENTORÍA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Disponibilidad de Servicio de Conectividad por Centro Digital.	DDA Bajo: $\geq 96\%$		97,63%	NO CUMPLE
	DDA Medio: $\geq 95\%$		99,72%	CUMPLE
	DDA Alto: $\geq 93\%$		99,21%	CUMPLE
	DDA Muy Altopreliminar: $\geq 92\%$		100%	CUMPLE
Velocidad Mínima (Mbps)	Matrícula ≤ 50	Download/Mbps = 12	EXITOSOS = 15 FALLIDOS = 0	CUMPLE
		Upload/Mbps = 3		
	51 < Matrícula ≤ 150		EXITOSOS = 14	CUMPLE

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	151 < Matrícula <= 400	Upload/Mbps = 3,75	FALLIDOS = 1	CUMPLE
		Download/Mbps = 18	EXITOSOS = 14	
	Matricula > 400	Upload/Mbps = 4,5	FALLIDOS = 1	NO CUMPLE
		Download/Mbps = 21	EXITOSOS = 8	
		Upload/Mbps = 5,25	FALLIDOS = 7	
Mantenimiento Preventivo	El mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación del Centro Digital		EN EJECUCIÓN	

• *Grupo 1B*

INDICADOR	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO		RESULTADO INTERVENTORÍA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Disponibilidad de Servicio de Conectividad por Centro Digital.	DDA Bajo: >=96%		98.73%	CUMPLE
	DDA Medio: >=95%		98.74%	CUMPLE
	DDA Alto: >=93%		100.00%	CUMPLE
	DDA Muy Alto: >=92%		100.00%	CUMPLE
Velocidad Mínima (Mbps)	Matrícula <= 50	Download/Mbps = 12	EXITOSOS = 9 FALLIDOS = 6	NO CUMPLE
		Upload/Mbps = 3		
	51 < Matrícula <= 150	Download/Mbps = 15	EXITOSOS = 2 FALLIDOS = 13	NO CUMPLE
		Upload/Mbps = 3,75		
	151 < Matrícula <= 400	Download/Mbps = 18	EXITOSOS = 2 FALLIDOS = 13	NO CUMPLE
		Upload/Mbps = 4,5		
	Matricula > 400	Download/Mbps = 21	EXITOSOS = 7 FALLIDOS = 8	NO CUMPLE
		Upload/Mbps = 5,25		
Mantenimiento Preventivo	El mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación del Centro Digital		EN EJECUCIÓN	

5. Estado de PQRSD.

El contratista realiza la presentación de PQRSD y presenta el siguiente consolidado:



PQRSD



Tipo de Solicitud	Mes Respuesta				
Mes Traslado	Dic-21	Ene-22	Feb-22	En proceso	NA Total general
Cambio Sitio					
Dic-21				8	8
Ene-22				1	1
Feb-22				1	1
PQRSD					
Sep-21	2				2
Oct-21	3				3
Nov-21	6				6
Ene-22		5	3		8
Feb-22			1	1	2
Solicitud Información					
Dic-21				17	17
Ene-22		10	1	1	12
Feb-22			1		1
Total general	11	15	6	12	17

PQRSD	Mes Respuesta				
Mes Traslado	Dic-21	Ene-22	Feb-22	En proceso	Total general
PQRSD					
Sep-21		2			2
Oct-21		3			3
Nov-21		6			6
Ene-22			5	3	8
Feb-22			1	1	2
Total general	11	5	4	1	21

Remitente	Descripción de la Solicitud	Estado
Mintic	Traslado radicado Mintic 211099840 (Lorica-Cordoba)	Respondido
Mintic	Traslado Radicado 221003840 (Vereda Partidas - Villamaría - Caldas)	En proceso



La Interventoría reporta que el 25 de febrero de 2022 se realizó mesa de trabajo para verificar el estado de los PQRSD del mes de febrero y que, con corte al 28 de febrero de 2022, la interventoría ha gestionado los PQRSD que se reportan en la siguiente tabla:

MES	TOTAL PQRSD RECIBIDAS	PQRSD CERRADOS	PQRSD ABIERTOS
FEBRERO	15	10	5

Los PQRSD recibidos se clasifican en PQRSD y solicitudes de información e instalación.

6. Estado de los Aspectos Financiero.

El contratista realiza la presentación de los aspectos financieros:

Utilizaciones:

Anticipo:

- Pendiente aprobación de la entidad contratante de la modificación del plan de inversión del anticipo.

Legalizaciones

- Legalización 3, 4 y 5 - A radicar 18 de febrero ajuste
- Legalizaciones 6 y 7 - A radicar 18 de febrero ajuste



• **Transferencia de activos:** Continua Pendiente.

La Interventoría informa que se realizaron reuniones para la revisión de la certificación de retenciones, realizadas para el informe de legalización No. 3 que consolida las legalizaciones 3, 4 y 5. Sin embargo, a la fecha no ha sido radicado dicho informe.

De los informes de legalización 6 y 7 fueron respondidas algunas observaciones y remitido el certificado de retenciones, en el cual persisten observaciones.

Se reitera la solicitud de ajustar y radicar estos informes, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero de 2022, sin que se haya concluido con la obligación de radicarlos ante la Supervisión.

En cuanto a la transferencia de bienes, COMCEL remitió el borrador de los documentos para revisión de la Fiduciaria y la Interventoría. Esta última remitió las observaciones pertinentes, pero sigue pendiente la radicación de la transferencia ante la Fiduciaria.

En cuanto a las órdenes de pago que se encuentran pendientes por aprobar, la Interventoría informa que fueron devueltas para que una vez que se subsanen las observaciones y la Supervisión apruebe el ajuste del Plan de Inversión del Anticipo, sean remitidas con la fecha actualizada.

7. Varios

INVENTARIO DE BIENES:

La Interventoría remitió observaciones al inventario presentado por COMCEL el 4 de febrero de 2022. Se solicita tenerlas en cuenta, ajustar el archivo y enviarlo con el ajuste correspondientes en el informe del mes de febrero y cada mes con las actualizaciones correspondientes con lo solicitado en el correo del 28 de febrero de 2022 por la Interventoría.

Informe F051: La Interventoría solicita tener en cuenta las observaciones que se realizan al informe y se remita ajustada la versión final.

El reporte entregado por COMCEL S.A. de 290 visitas para ejecutar de las cuales la INTERVENTORIA identificó que solo faltaban programar 7, las cuales salen a recorrido para el mes de marzo. Se programó mesa de conciliación para visitas adicionales el 3 de marzo a las 3:00 pm.

CERTIFICACIÓN MENSUAL:

La interventoría solicita al contratista que en el informe mensual de febrero 2022, y desde el inicio del contrato, se incluya una certificación en la que confirme que no ha destinado recursos del contrato estatal de aporte 1042 para cumplir con obligaciones distintas a las adquiridas con Mintic, relacionadas con la adjudicación y ejecución de las asignaciones de espectro, específicamente, de la banda de 700Mhz o para desarrollar cualquier otro proyecto del Fondo Único de TIC, del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES o de cualquier otra entidad.




COMPROMISOS

ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Realizar mesa de trabajo para definir los 2919 CD del grupo 2.	COMCEL-INTERVENTORIA	2/03/2022.
2	Realizar mesa de trabajo para conciliación de visitas adicionales grupo 2.	COMCEL-INTERVENTORIA	3/03/2022
3	Subsanación de las observaciones de informe de legalización 3, 4 y 5.	COMCEL	1/03/2022
4	Radicación transferencia de bienes.	COMCEL	1/03/2022


Anexos

Evidencia de participación
Listado de asistencia
Presentación del Contratista.

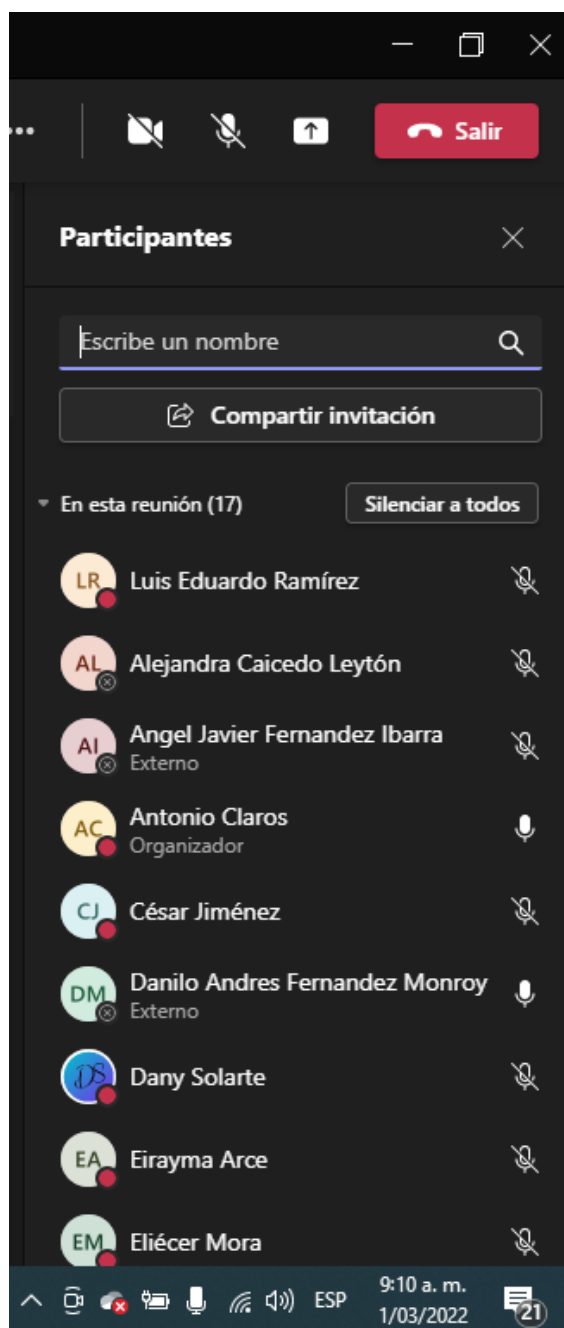

Zoom meeting interface showing the 'Participantes' (Participants) list. The list includes 17 participants in the current meeting and 1 external participant. The interface is in Spanish and shows a search bar, a 'Compartir invitación' (Share invitation) button, and a 'Silenciar a todos' (Mute all) button. The participants are listed with their names, initials, and status (e.g., 'Externo', 'Organizador').

Participante	Estado
Luis Eduardo Ramírez	En esta reunión
Alejandra Caicedo Leytón	En esta reunión
Angel Javier Fernandez Ibarra	Externo
Antonio Claros	Organizador
César Jiménez	En esta reunión
Danilo Andres Fernandez Monroy	Externo
Dany Solarte	En esta reunión
Eirayma Arce	En esta reunión
Eliécer Mora	En esta reunión



Zoom meeting interface showing the 'Participantes' (Participants) list. The list includes 10 participants in the current meeting and 1 external participant. The interface is in Spanish and shows a search bar, a 'Compartir invitación' (Share invitation) button, and a 'Silenciar a todos' (Mute all) button. The participants are listed with their names, initials, and status (e.g., 'Externo', 'Organizador').

Participante	Estado
Jorge Suárez	En esta reunión
Laura Elfeghalicely	En esta reunión
Lili Fernanda Toro	Externo
Marcos Montañez Barrios	En esta reunión
María Cecilia Sánchez	En esta reunión
Maria Luisa Escolar	Externo
Myriam Montañez	En esta reunión
Yessyd Diaz	En esta reunión
Ana María Houghton	Sin respuesta

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

LISTADO DE ASISTENCIA



OBJETIVO: (Temas a Tratar) Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

FECHA:

1 de marzo de 2022

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO:

09:00 A.M

HORA FINAL:

10:30 A.M

RESPONSABLE:

INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Elíecer Mora	76.324.298	Interventoría	Gerente de Proyecto CONSORCIO PE2020 C DIGITALES	3188480511	emora@pmoconsultoria.com	
2	Maria Alejandra Caicedo Leyton	1.087.412.170	Interventoría	Auditora interna	3103915922	acaicedo@pmoconsultoria.com	
3	María Cecilia Sánchez	41.594.455	Interventoría	Asesora Jurídica	3158474554	msanchez@pmoconsultoria.com	
4	Antonio Claros Ciceri	17.649.447	Interventoría	Profesional Técnico	3023203878	aclaros@pmoconsultoria.com	
5	Marcos Montañez Barrios	19.444.784	Interventoría	Profesional Administrativo	3013675943	mbarrios@pmoconsultoria.com	
6	Jorge Dario Suarez	71.679.601	Interventoría	Profesional Electricista	3175165115	jsuarez@pmoconsultoria.com	
7	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
8	Yessyd Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Apoyo	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
9	César Augusto Jiménez	19.458.480	Interventoría	Director Sistemas de Información	3195926513	cjimenes@pmoconsultoria.com	
10	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
11	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
12	Laura Tatiana el feghali cely	1.098.683.920	Interventoría	Profesional Técnico	3186148976	lfecely@pmoconsultoria.com	
13	Luis Eduardo Ramirez Jerez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	3202256293	lr Ramirez@pmoconsultoria.com	
14	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente integral del proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
15	Lili Fernanda Toro	1.130.635.000	COMCEL SA	Financiera	3002752820	lili.toro@claro.com.co	
16	María Luisa Escolar Sundheim	32.781.111	COMCEL SA	Directora Empresas Estratégicas y Gobierno	3112548720	marialuisa.escolar@claro.com.co	
17	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la *Política de Tratamiento de los Datos Personales* del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través del siguiente link: <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html>



El futuro digital
es de todos

MinTIC

INFORME DE AVANCE CENTROS DIGITALES

Avance semanal
01 de marzo de 2022





AGENDA

Marzo 01 de 2022

1. Avance estudios de campo grupo 3.
2. Avance instalación y puesta en servicio.
3. Estado operación y mantenimiento 1A y 1B.
4. Estado de PQRSD.
5. Aspectos financieros.



ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



El futuro digital
es de todos

MinTIC

ESTADO ESTUDIOS DE CAMPO G3	TOTAL
Aprobados Interventoría	1537
EC sobrantes del G2	351
Total	1888
Radicados	
EC heredados grupos anteriores	887
EC presentados	1107
Total EC Radicados	1994

→ Radicado 25-02

- Radicado 28-02
- + 132 CD proceso

Comcel					
Cons. Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0504-22	Solicitud Inclusión 887 Estudios de Campo del Grupo 3 – Meta 5	221014578	25/02/2022	887	2799
CD-COMCEL-INTV-0508-22	Estudios de Campo del Grupo 3 – Meta 5	221015160	28/02/22	1107	3096

INTERVENTORÍA						
Aprobados	Rechazados	En revisión	En iteración	Fecha	Comunicado	MINTIC
1537	456	11	2004	23/02/2022	CD-INTV-COMCEL-0417-22	221011387, 221011398



AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

	GRUPO 1A	GRUPO 1B	GRUPO 2
Meta	● 758	● 757	● 2919
Sitios instalados	● 758	● 757	● 2816 Integrados 103 FM
Reportes instalación	● 758	● 757	● 2816 Reportados 103 FM 1926 Aprobados
Pruebas remotas	● 758	● 757	● 1911 Aprobados 27 En interventoría 1 Rechazados 371 Listas para enviar 106 En curso
Visitas Interventoría	● 758	● 757	● 159 Aprobados 77 En interventoría 971 Rechazados 183 Visitas Programadas 401 Pendiente Programar

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Radicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0486-22	Decimosexta Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 10	221011400	14/02/2022	62	2200
CD-COMCEL-INTV-0507-22	Decimoséptima Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 10	221015191	28/02/2022	741	2941
CD-COMCEL-INTV-0507-22	Decimooctava Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 10	221015196	28/02/2022	90	3031

Aprobados Interventoría

Aprobados INTV	Rechazados INTV	En revisión INTV	En iteración INTV	Fecha	Comunicado	MINTIC
1852	286	0	2138	14/02/2022	CD-INTV-COMCEL-0399-22	221011418
1926	274	0	2200	21/02/2022	CD-INTV-COMCEL-0412-22	221012861


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1A



El futuro digital
es de todos

MinTIC

CENTROS DIGITALES GRUPO 1A

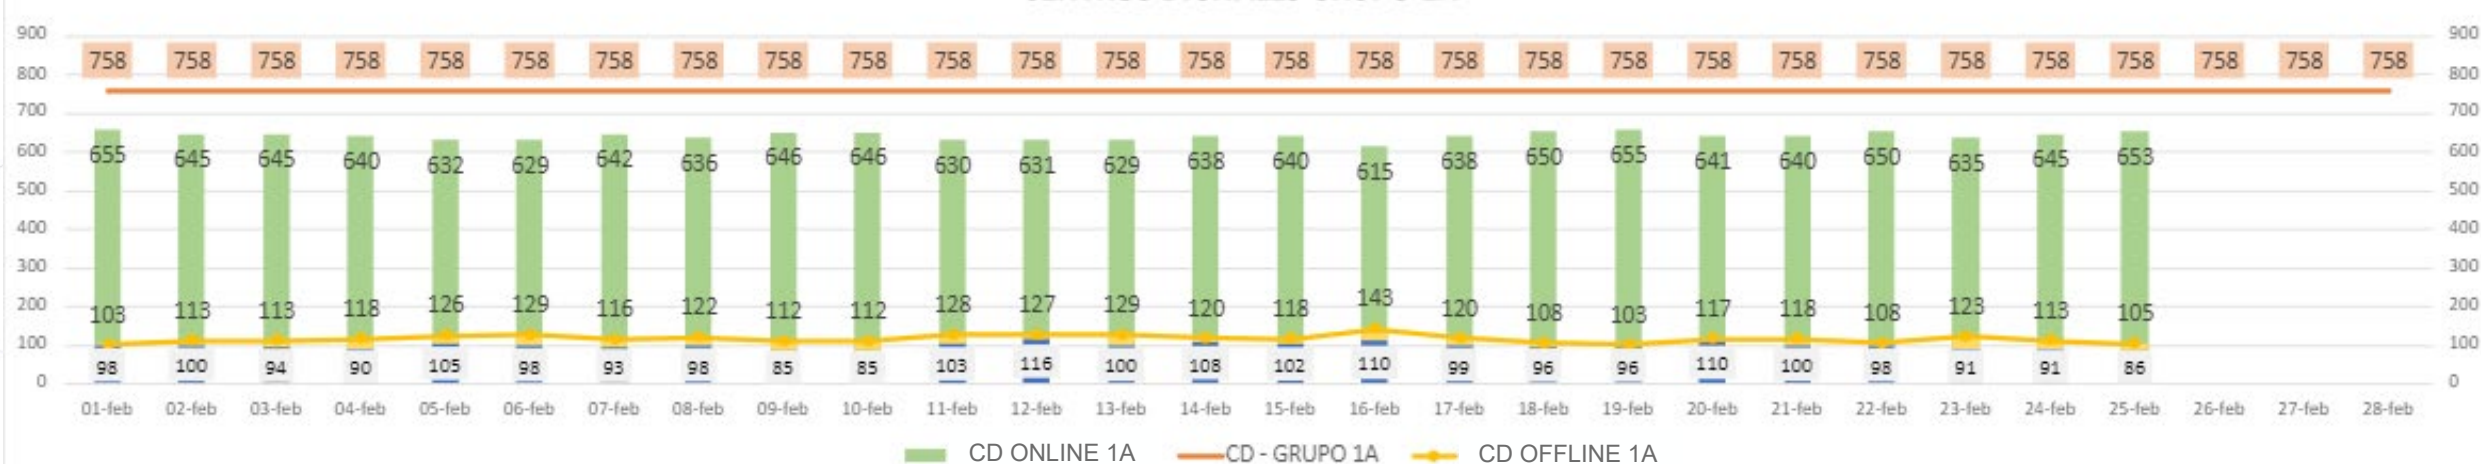

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1A	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	36	36
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	19	19
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	9	9
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	6	6
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	4	4
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	3	3
FUERZA MAYOR - HURTO	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	2	2
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	2	2
CASO FORTUITO - FIBRA DANOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1	1
CASO FORTUITO - SITIO TEMPORIZADO POR SOLICITUD TERCEROS	1	1
Total	86	86


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1B



El futuro digital
es de todos

MinTIC

CENTROS DIGITALES GRUPO 1B

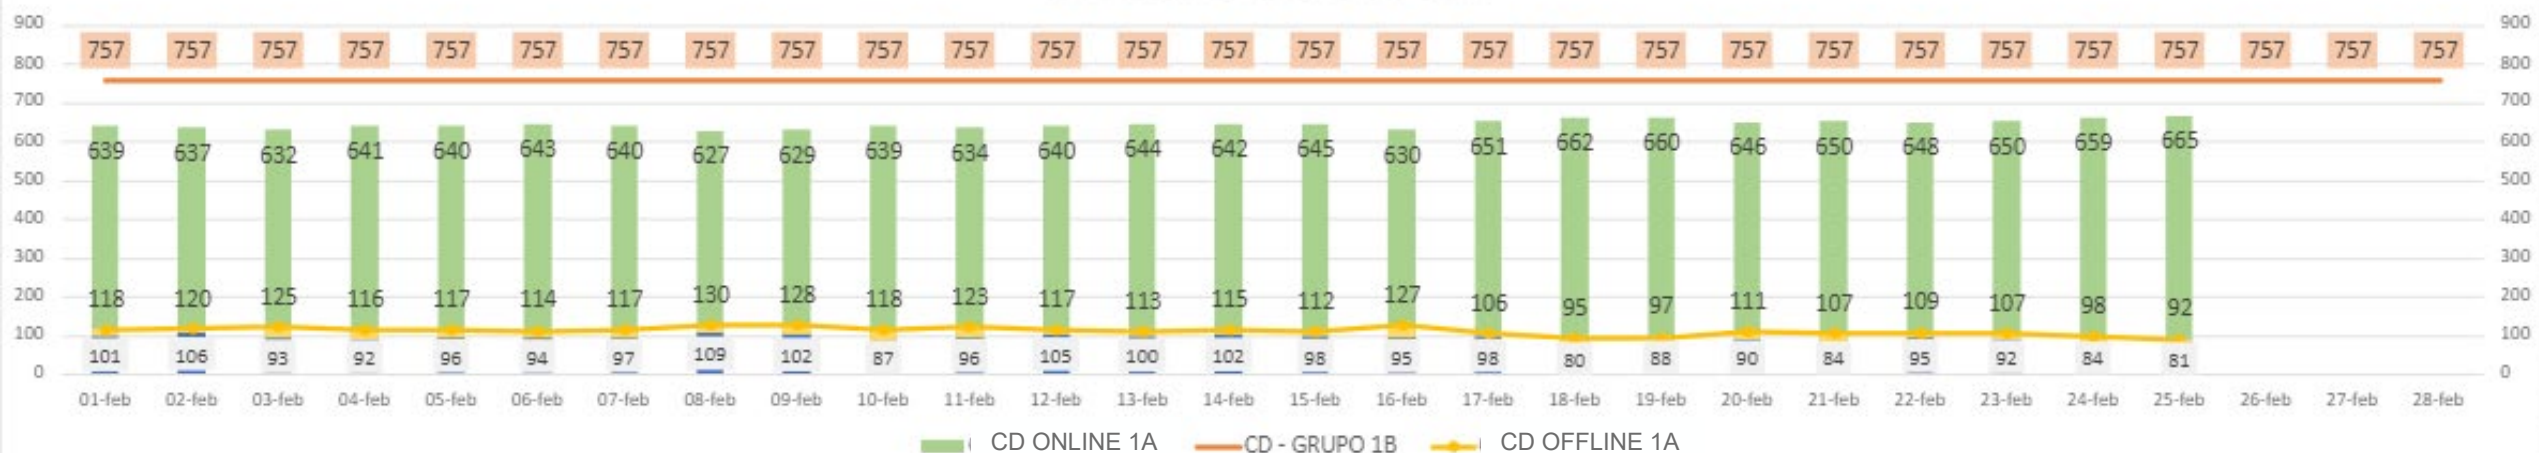

ULTIMO MOTIVO PARADA DE RELOJ	GRUPO 1B	Total
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	43	43
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	20	20
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	6	6
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	4	4
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	1	1
CASO FORTUITO - SITIO TEMPORIZADO POR SOLICITUD TERCEROS	1	1
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	1	1
Total	81	81

PQRSD



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Tipo de Solicitud	Mes Respuesta					
Mes Traslado	Dic-21	Ene-22	Feb-22	En proceso	NA	Total general
Cambio Sitio						
Dic-21				8		8
Ene-22		1				1
Feb-22		1				1
PQRSD						
Sep-21	2					2
Oct-21	3					3
Nov-21	6					6
Ene-22		5	3			8
Feb-22			1	1		2
Solicitud Información						
Dic-21					17	17
Ene-22		10	1	1		12
Feb-22			1			1
Total general	11	15	6	12	17	61

PQRSD	Mes Respuesta					
Mes Traslado	Dic-21	Ene-22	Feb-22	En proceso	Total general	
PQRSD						
Sep-21	2					2
Oct-21	3					3
Nov-21	6					6
Ene-22		5	3			8
Feb-22			1	1		2
Total general	11	5	4	1		21

Remitente	Descripción de la Solicitud	Estado
Mintic	Traslado radicado Mintic 211099840 (Lorica-Cordoba)	Respondido
Mintic	Traslado Radicado 221003840 (Vereda Partidas - Villamaría -Caldas)	En proceso

ASPECTOS FINANCIEROS



El futuro digital
es de todos

MinTIC

- **Utilizaciones:**

Anticipo:

- Pendiente aprobación de la entidad contratante de la modificación del plan de inversión del anticipo – Se envía solicitud de ampliación de información y justificación respuesta por parte de supervisión sobre el rubro 3. Revisión en conjunto interventoría y COMCEL.

Legalizaciones

- Legalización 3, 4 y 5 – En proceso de firmas COMCEL, se realizan ajustes de acuerdo a observaciones de interventoría.
 - Legalizaciones 6 y 7 - Dependencia con la aprobación de la legalización 3, 4 y 5 por parte de la supervisión.
 - Transferencia de activos: En revisión de nuevas observaciones enviadas por interventoría.
- Aprobación OP 23
