

CODIGO TRD: 232				
ACTA No. INTV-COMCEL-0106	LUGAR: Virtual/TEAMS	FECHA: 22 de abril 2022	HORA DE INICIO: 10:30 a.m.	HORA FINAL: 12:00 pm.

OBJETO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

ORDEN DEL DÍA
1. Seguimiento a compromisos 2. Avance Estudios de Campo Grupo 3 3. Avance instalación y puesta en servicio grupo 2 y grupo 3 4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los CD que se encuentran en Fase de Operación 1A y 1B 5. Estado de PQRS. 6. Estado de los Aspectos Financieros. 7. Varios

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic	En proceso MinTIC.
2	Remitir el inventario con ID beneficiario y seriales del Grupo 1A, Grupo 1B y Grupo 2. <u>Compromiso permanente</u> .	Se acordó el nuevo formato – Compromiso de entrega para el 30 de abril de 2022.
3	Radicar alcance a la transferencia de bienes con los ajustes correspondientes	Pendiente No se cumplió el compromiso el 19/04/2022
4	Dar respuesta comunicado de anticipo	Pendiente No se cumplió el compromiso el 19/04/2022
5	Seguimiento de avance de modificación contrato de Aporte 1042 (Gestión Otrosí, Indicadores Plan de Calidad-Mintic)	En proceso. Aún no hay retroalimentación de Mintic

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

6	Respuesta observaciones legalización 8	Pendiente No se cumplió el compromiso el 19/04/2022
7	Radical legalización de recursos a diciembre de 2021 y de enero y febrero de 2022	Pendiente No se cumplió el compromiso el 19/04/2022
8	Realizar mesa de trabajo avance de instalación de CD y aclaración de observaciones.	Culminado INTERVENTORÍA/C OMCEL S.A. – 21/04/2022
9	Realizar mesa de trabajo entre La Interventoría, Supervisión y COMCEL S.A sobre el Plan de Difusión.	Culminado INTERVENTORÍA/C OMCEL/SUPERVISI ÓN 21/04/2022.
10	Dar Respuesta observaciones a legalizaciones 3,4,5 y 6 presentadas por la Supervisión.	Culminado Se realizó reunión el 20/04/2022 para revisión de respuestas pendientes. Comcel envió correo con respuestas el 21/04/2022
11	Enviar informe de novedades (estudios de campo e instalaciones) en campo.	22/04/2022 COMCEL S.A.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para el desarrollo del acta de la reunión, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. se denominará en adelante COMCEL, así mismo, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES se nombrará en adelante la Interventoría y la presentación realizada por el contratista ejecutor (COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A), hará parte integral de la presente acta.

2. AVANCE ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

El contratista reporta con corte al 21 de abril de 2022 el avance de los Estudios de Campo.:

ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



ESTADO ESTUDIOS DE CAMPO G3	TOTAL
Aprobados Interventoría	2451
Rechazados	248
En revisión Interventoría	230
Aprobado Parcial	105*
Total	3034

* Pdde envío comunicación a supervisión por parte de Comcel

Comunicados Comcel

Comunicado COMCEL	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0551-22	Subsanación 37 Estudios de Campo Grupo 3	221022677	23/03/2022	37
CD-COMCEL-INTV-0569-22	Subsanación 543 Estudios de Campo Grupo 3	221024679	29/03/2022	543
CD-COMCEL-INTV-0614-22	Alcance Subsanación 51 Estudios de Campo Grupo 3	221029757	12/04/2022	51
CD-COMCEL-INTV-0628-22	Subsanación 230 Estudios de Campo Grupo 3	221030752	18/04/2022	230

Comunicados Interventoría

Aprobados	Rechazados	En revisión	Aprobado parcial	En iteración	Fecha	Comunicado	MIN TIC
2003	50	975	6	3034	15/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0460-22	221015692
2149	857	0	28	3034	23/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0473-22	221022454
2202	290	542	0	3034	31/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0496-22	221025975
2419	512	0	103	3034	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0511-22	221028491
2451	248	230	105	3034	21/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0533-22	221031823



La Interventoría da a conocer en la siguiente tabla el consolidado con el estado de revisiones con corte al 21 de abril de 2022:

CONSOLIDADO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	APROBADO PARCIAL	TOTAL PRESENTADOS
2.451	248	230	105	3.034


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



Causales de rechazo de los 248 CD

TITIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE FALLA
1	¿ Se Anexa y Cumple el Formato Estudio de Campo de forma General?	229	92%
2	¿ Se Anexa y Cumple técnicamente, y en su totalidad las Fotografías del estudio de Campo?	147	59%
5	¿ Se Anexa y Cumple el Formato DDA de Campo de forma General?	145	58%
6	¿Se Anexa y Cumple el Registro digital Trayectoria?	144	58%
7	¿Se Anexa y Cumple el Esquema de Instalación?	142	57%
3	¿Se Anexa Video 360° WIFI interior?	127	51%
4	¿Se Anexa Video 360° WIFI Exterior?	127	51%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		248	

TITIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3

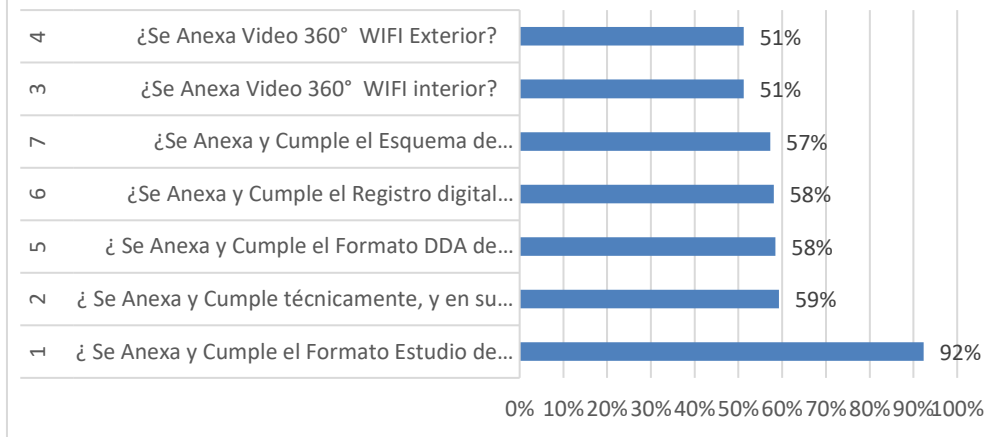

3. AVANCE DE INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTROS DIGITALES POR GRUPOS - GRUPO 2 Y GRUPO 3

El contratista realiza la presentación del avance de la Instalación del Grupo 2 y grupo 3, reporta con fecha de corte 21/04/2022



AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G2 y G3

	GRUPO 2	GRUPO 3
Meta	 2919	 3034
Sitios instalados	 2919 Instalados*	 340 Instalados
Reportes instalación	 2507 Aprobados 45 En Interventoría 347 Rechazados	 340 En Interventoría 0 Aprobados
Pruebas remotas	 2594 Aprobados 117 En interventoría 20 Por Enviar 2748 En iteración	
Visitas Interventoría	 185 Aprobados 134 Revisión RETIE 720 Rechazadas* 220 Fallidas 134 En revisión interv. 442 Programadas	

* Pde envío
comunicación alcan
sitios FM



A) COMUNICADOS INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO GRUPO 2

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G2



Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0546-22	Alcance CD-COMCEL-INTV-0523-22- Reporte de cumplimiento Meta 10.	221021097	17/03/2022	16
CD-COMCEL-INTV-0561-22	Subsanación 281 Reporte de Instalaciones Grupo 2- Meta 10	221023648	25/03/2022	281
CD-COMCEL-INTV-0580-22	Subsanación 163 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221026855	04/04/2022	163
CD-COMCEL-INTV-0595-22	Subsanación 31 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221027896	06/04/2022	31
CD-COMCEL-INTV-0608-22	Subsanación 21 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221028871	08/04/2022	21
CD-COMCEL-INTV-0617-22	Subsanación 65 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221029877	12/04/2022	65

Comunicados Interventoría

Aprobados INTV	Rechazados INTV	En revisión INTV	En iteración INTV	Fecha	Comunicado	MIN TIC
2057	846	16	0	22/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0470-22	221022403
2069	850	0	0	24/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0481-22	221023423
2309	447	163	0	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0508-22	221023648
2507	347	65	2919	21/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0532-22	221031817



B) COMUNICADOS INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO GRUPO 3

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G3



Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0547-22	Primera Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12 - Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020	221021100	17-03-22	23	23
CD-COMCEL-INTV-0571-22	Segunda Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12	221025681	31/03/2022	102	125
CD-COMCEL-INTV-0579-22	Tercera Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12	221026850	04/04/2022	58	183
CD-COMCEL-INTV-0594-22	Cuarta Entrega Reporte de Cumplimiento 61 CD - Meta 12	221027893	06/04/2022	61	244
CD-COMCEL-INTV-0606-22	Quinta Entrega Reporte de Cumplimiento 26 CD - Meta 12	221028864	08/04/2022	26	270
CD-COMCEL-INTV-0607-22	Sexta Entrega Reporte de Cumplimiento 10 CD - Meta 12	221028868	08/04/2022	10	280
CD-COMCEL-INTV-0616-22	Septima Entrega Reporte de Cumplimiento 60 CD - Meta 12	221029873	12/04/2022	60	340



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



A continuación, la interventoría da a conocer los consolidados de los reportes y revisiones de la de aprobación de los Centros Digitales:

- Reporte de Instalación Grupo 2

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
2.507	309	103	2.919	2.919


Causales de rechazo de los 309 CD

TITIPIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2			
EVIDENCIA No.	TIPO DE OBSERVACIÓN	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE FALLA
2	Acta de socialización	290	94%
1	Acta de instalación	290	94%
4	Fotografías de equipos AP interior y exterior	286	93%
6	Dispositivo movil conectado a la wifi exterior	284	92%
5	Dispositivo conectado a la wifi interior	283	92%
7	Video 360 interior	280	91%
3	Coordenadas geograficas	280	91%
8	Video 360 exterior	280	91%
CANTIDAD DE CD EVALUADOS		309	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



TITIPIACIÓN CAUSALES DE RECHAZO REPORTES DE INSTALACIÓN G2

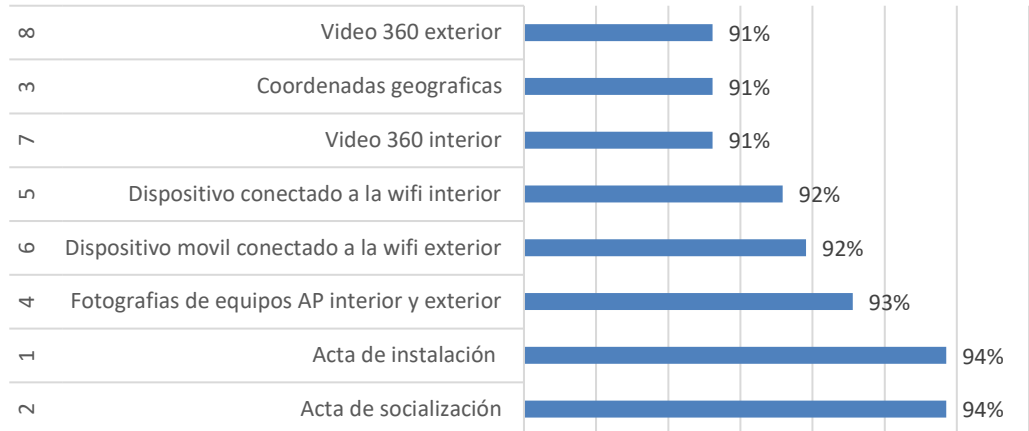

Fecha de corte 21-04-2022

• Pruebas de verificación remotas Grupo 2

CONSOLIDADO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
2.594	0	117	2.711	2.919

No se registran Causales de rechazo. Fecha de corte 21-04-2022

Estado de Aprobación de Centros Digitales.

La Interventoría relaciona el estado de aprobación de los Centros Digitales del grupo 2, con corte al 21 de abril de 2022.

ESTADO DE APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS GRUPO 2				
APROBADAS	RECHAZADOS	FALLIDAS	VISITAS ADICIONALES (a programar)	META GRUPO 2
180	1381	185	167	2.919

Causales de rechazo de 1381 Centros Digitales.



Fecha de corte 21-04-2022


4. Estado de la Operación y Mantenimiento de los centros digitales

- Grupo 1A

El contratista manifiesta que se encuentran 116 CD con parada de reloj, con corte al 21/04/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1A

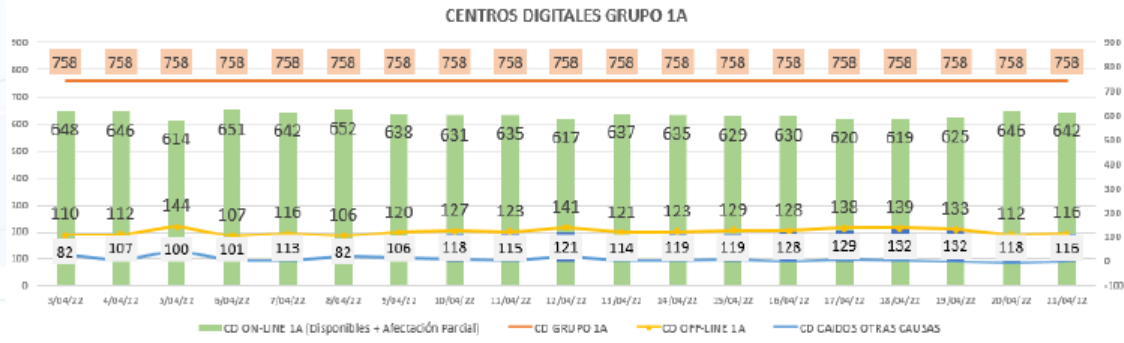


ULTIMO MOTIVO PARADA RELOJ	GRUPO 1A	TOTAL
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	59	59
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	27	27
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	8	8
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	5	5
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	4	4
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	4	4
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	3	3
CASO FORTUITO - FIBRA DAÑOS ANIMALES Y/O HUMANOS	2	2
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - FENOMENO NATURAL	1	1
FUERZA MAYOR - HURTO	1	1
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	1	1
TOTAL	116	116



Grupo 1B

El contratista manifiesta que se encuentran 133 CD con parada de reloj, con corte al 21/04/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1B

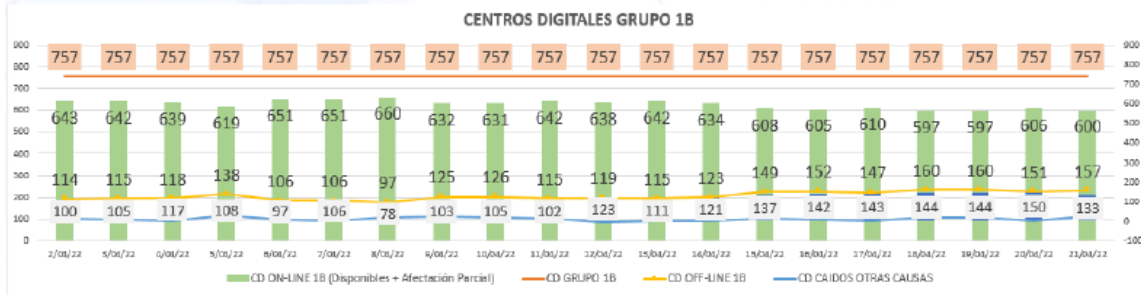

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ULTIMO MOTIVO PARADA RELOJ	GRUPO 1B	TOTAL
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	78	78
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	33	33
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	5	5
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	3	3
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	3	3
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	1	1
CASO FORTUITO - FIBRA DAÑOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1	1
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - HURTO	1	1
TOTAL	133	133



Grupo 2

El contratista manifiesta que se encuentran 419 CD con parada de reloj, con corte al 21/04/2022, y se encuentran a la espera de la solución para poder realizar los mantenimientos a que haya lugar, la siguiente tabla describe las causas que generan las paradas de reloj.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO G2




La Interventoría da a conocer que el reporte anterior del Grupo 2 corresponde al seguimiento interno por parte del contratista y confirma que al 21 de abril del 2022 aún no se ha aprobado la meta 16 correspondiente a la entrada en operación del Grupo 2.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



5. Estado de PQRSD.

El contratista realiza la presentación de PQRSD y presenta el siguiente consolidado:

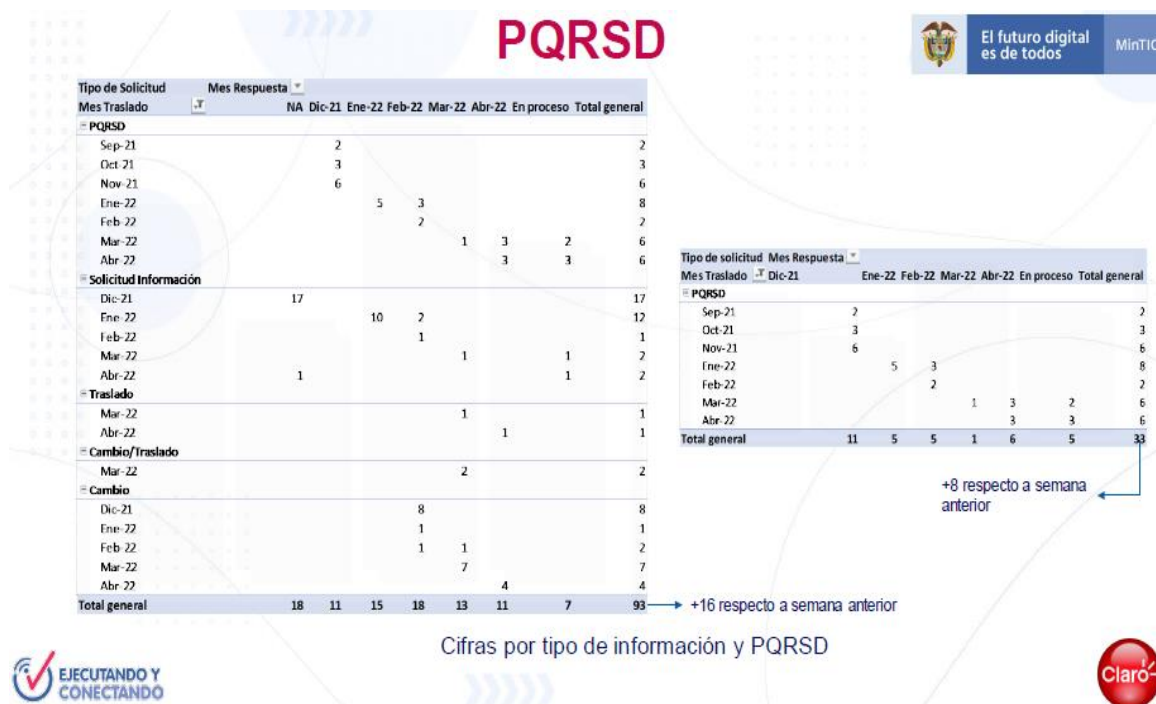

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



PQRSD

Remitente	Descripción de la Solicitud	Radicado MinTIC	Fecha Traslado Operador	Mes Recepción	Fecha del comunicado adjunto	Mes Traslado Operador	Respuesta dada por el Operador	Estado (Abierto / Cerrado)	Tipo de información
Mintic	Traslado radicado 221003347- Santander	221003347	1/03/2022	Mar-22	18/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado de Radicados 221004588 y 221004592 (Gob. Antioquia)	221004588 221004592	3/03/2022	Mar-22	17/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221006039	221006039	4/03/2022	Mar-22		Mar-22	7/03/2022	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221009414 (NO forma parte de contrato - Florian Santader)	221009414	11/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	11/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado 221009416	221009416	14/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221008643	221008643	15/03/2022	Mar-22	1/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado Mintic 221008661- La Jagua de Ibirico - Cesar	221008661	17/03/2022	Mar-22	2/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado Radicado 221011474- Centro Educativo Buenos Aires de Campana	221011474	18/03/2022	Mar-22	14/02/2022	Mar-22	29/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado Mintic 221014617- Florencia Caqueta	221014617	22/03/2022	Mar-22	25/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Radicado # 222026447 - La Jagua de Ibirico - Cesar	222026447	23/03/2022	Mar-22	03/02/2022 07/02/2022 08/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado de Radicado 221018488- Girón - Santander	221018488	23/03/2022	Mar-22	9/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221013908- Florian Santander	221013908	30/03/2022	Mar-22	17/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	Traslado
Mintic	Traslado radicado 221012951- Caldas - Aránzazu	221012951	30/03/2022	Mar-22	21/02/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221020697 - Meta - villavicencio	221020697	28/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221012246 (Huila - cumplimiento cronograma)	221012246	30/03/2022	Mar-22	16/02/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021368- SANTANDER - GIRON - ID 45593	221021368	25/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Interventoria	OFICIO SOLICITUD INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE NEIRA CALDAS	NA	31/03/2022	Mar-22	19/03/2022	Mar-22	31/03/2022	Cerrado	Cambio
Interventoria	I. E. de Leña	NA	31/03/2022	Mar-22	1/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221022069-Neira Caldas	221022069	6/04/2022	Abr-22	19/03/2022	Abr-22	6/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic/intv	TRASLADO RADICADO 221020391 - Yolombo Antioquia	221020391	1/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	20/04/2022	Cerrado	Cambio

Mintic	TRASLADO RAD 221026121 - Alcaldía Municipal de Valledupar	221026121	7/04/2022	Abr-22	31/03/2022	Abr-22	NA	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	traslado radicado 221016515 - Roncesvalles Tolima	221016515	7/04/2022	Abr-22	2/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021045 - Solita Caquetá	221021045	7/04/2022	Abr-22	16/03/2022	Abr-22	11/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado rad. 221025465 -	221025465	7/04/2022	Abr-22	9/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221020655	221020655	8/04/2022	Abr-22	10/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	ID 10001121 BEN 68347 Comunidad Indígena de las Delicias Defensoría del Pueblo 211105722 - Inclusión centros poblados en próximos proyectos		8/04/2022	Abr-22	3/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Solicitud insumos PQRS 221020615 Y 221020625 (vereda Guayabal, del municipio de Barichara)	221020615 221020625	11/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RADICADO 221022163 (Municipio del carmen norte de santander C.E.R Santa Ines sede principal)	221022163	12/04/2022	Abr-22	20/03/2022	Abr-22	19/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD No. 221024135 (Institución Villa de San Andrés del corregimiento de Villa de San Andrés del Municipio de Aguachica)	221024135	13/04/2022	Abr-22	28/03/2022	Abr-22	20/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221025482 (CENTRO EDUCATIVO LOS ENCANTOS GUAIMARAL)	221025482	13/04/2022	Abr-22	30/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	Traslado
Interventoria	TRASLADO RADICADO 221025161 - Barrancabermeja	221025161	13/04/2022	Abr-22	29/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD



Tabla de seguimiento de
Marzo - Abril

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 - Bogotá, Colombia

GDO-TIC-FM-007
V4.0



Mes/Tipo solicitud	Estado		
Etiquetas de fila	Cerrado	En proceso	Total general
Mar-22	15	3	18
Cambio	7		7
Cambio/Traslado	2		2
PQRSD	4	2	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Abr-22	9	4	13
Cambio	4		4
PQRSD	3	3	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Total general	24	7	31

+5 cerrados

COMCEL S.A da a conocer que a corte del 21 de abril de 2022 ha atendido todas y cada una de las solicitudes realizadas, a la fecha se encuentra tan solo 7 en estado “Abierto”.

La Interventoría está validando el cierre de los PQRSD de los meses de febrero y marzo y reporta el estado de las PQRSD con corte al 30 de marzo de 2022 en la siguiente tabla resumen:

MES	TOTAL PQRSD RECIBIDAS	PQRSD CERRADOS	PQRSD ABIERTOS
FEBRERO	14	7	7
MARZO	19	11	8

6. Estado de los Aspectos Financieros.

El contratista realiza la presentación de los aspectos financieros:



ASPECTOS FINANCIEROS



- **Utilizaciones:**

Anticipo:

- Aprobación ajuste Plan de Inversión de Anticipo (PIA V.2) Contrato N° 1042 de 2020 – Comcel S.A. 01-04-22 - Radicado # 222031384.

- **Legalizaciones**

- Legalización 3, 4, 5 y 6 – En revisión de las observaciones de la entidad contratante.
- Legalización 6: Radicada 221023854
- Legalización 7: Respuesta a observaciones 13 de abril radicado 221030386.
- Legalización 8: En revisión de las observaciones de interventoría.
- Transferencia de activos: Envío de información 19 de abril.

- **Órdenes de pago**

- Respuesta a las observaciones del las ordenes de pago 18 de abril radicado 221030912.



La Interventoría informa lo siguiente:

- **Legalización de recursos:**

COMCEL radicó el 13 de abril de 2022 la legalización 7 ajustada y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. A la fecha no se ha recibido respuesta a las observaciones de la legalización 8. Se reitera la solicitud de que a la mayor brevedad se respondan y se remita el informe corregido.

El 20 de abril se realizó reunión con COMCEL para dar respuesta a las observaciones de la Supervisión del 12 de abril de 2022. COMCEL remitió respuesta por correo electrónico el 21 de abril de 2022.

Sobre los informes de legalización de recursos de los meses de enero y febrero de 2022 continúan pendientes de radicación y el informe del mes de marzo de 2022 tiene fecha de vencimiento el lunes 25 de abril de 2022 para ser radicado ante la Supervisión, por lo que en las dos reuniones de seguimiento anteriores se le solicitó a COMCEL la radicación de los informes pendientes a más tardar



el 19 de abril de 2022 para subsanar la obligación y el informe del mes de marzo a más tardar el 22 de abril de 2022, sin que se haya dado cumplimiento.

- **Transferencia de bienes:**

En cuanto a la transferencia de bienes, continúa pendiente la radicación con los ajustes correspondientes. Se reitera al Contratista COMCEL concluir el proceso para dar cumplimiento a la obligación.

- **Órdenes de pago:**

De las órdenes de pago sobre las cuales COMCEL remitió respuesta a observaciones el 18 de abril de 2022 se encuentra en proceso de aprobación.

- **Plan de Difusión**

El 21 de abril de 2022 se realizaron dos reuniones en la que participaron la Supervisión, COMCEL y la Interventoría, para definir temas sobre la ejecución del cronograma del plan de difusión, en las cuales MinTIC aprobó las actividades a realizar en lo que resta de abril y también las piezas con las que debe salir COMCEL.

COMCEL quedó encargado de elaborar la parrilla de contenido digital, y remitirla a MinTIC para aprobación final.

La Interventoría realizará la citación a las dos reuniones mensuales, acordadas para el segundo martes y el último jueves de cada mes, a las 9a.m.

MinTIC enviará el nuevo manual de imagen.

7. Varios

- Sigue pendiente de respuesta el requerimiento sobre ejecución del anticipo, radicado 221017846 del 7 de marzo de 2022. **Tiene más de 30 días de remitido** y no ha sido atendido por parte de COMCEL.

- **Actualización Inventario:**

Pendiente la remisión del inventario actualizado de acuerdo con el compromiso de la reunión del 1 de abril de 2022 con MINTIC e interventoría debió realizarse el 15 de abril de 2022. COMCEL S.A manifiesta que se entregará la actualización del inventario el 22-04-2022.

COMCEL presentará el inventario de lo presentado en el formato anterior (Grupo 1A, Grupo 1B y Grupo 2) en el formato ajustado el 30 de abril de 2022, el cual fue enviado por la Interventoría el 8 de abril de 2022.



- **Traslado de Centros Digitales:**

A la fecha no se tiene solicitudes de Traslado de Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B por parte de Comcel.

- **Reubicaciones**

Actualmente se encuentra en revisión 10 solicitudes de reubicaciones, pendiente por definir con Supervisión – Interventoría – COMCEL el tema de los tiempos y los costos.

- **Medición de Indicadores**



Se realizó reunión el 13-04-2022 en las instalaciones del MinTic entre Interventoría, Supervisión y COMCEL S.A, en la cual se acordó la metodología a implementar para la medición de los indicadores y el cálculo de las utilidades, la propuesta será presentada en el próximo comité operativo.

COMPROMISOS

ítem	ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1	Radicación transferencia de bienes ajustada, reprogramada	COMCEL	26/04/2022
2	Respuesta observaciones legalización 8, reprogramado	COMCEL	26/04/2022
3	Respuesta comunicado sobre ejecución del anticipo, reprogramado	COMCEL	26/04/2022
4	Raditaciones informes de legalización enero, febrero y marzo de 2022, reprogramado	COMCEL	26/04/2022
5	Realizar mesa de trabajo para verificación de proceso de traslado 3:00 pm	COMCEL S.A - INTERVENTORÍA	22/04/2022
6	Realizar mesa de trabajo para revisar solicitudes de cambios	COMCEL S.A.- INTERVENTORÍA	26/04/2022
7	Realizar mesa de trabajo aclaración energía ID 43650	COMCEL S.A.- INTERVENTORÍA	25/04/2022

ANEXOS

- 1.Evidencia de participación
- 2.Listado de asistencia
- 3.Presentación del Contratista.

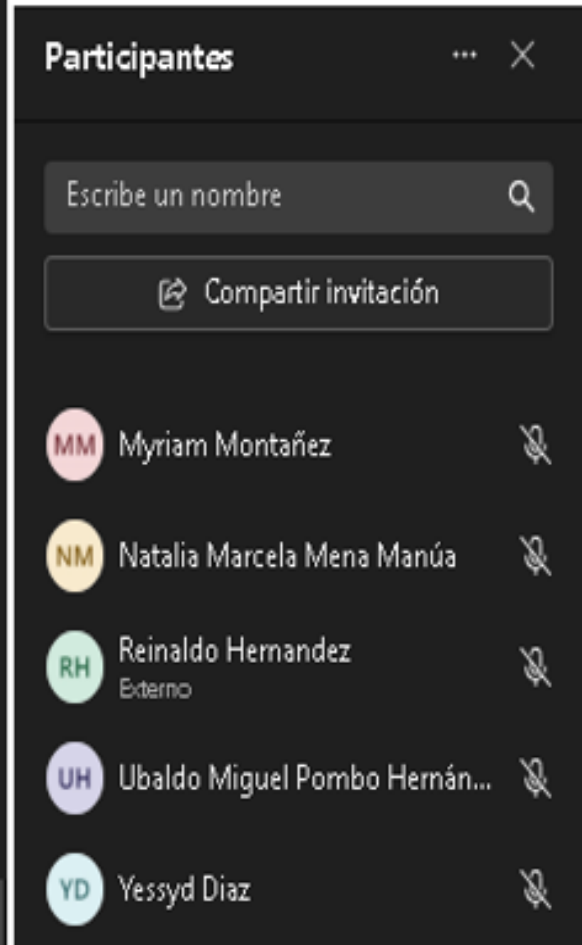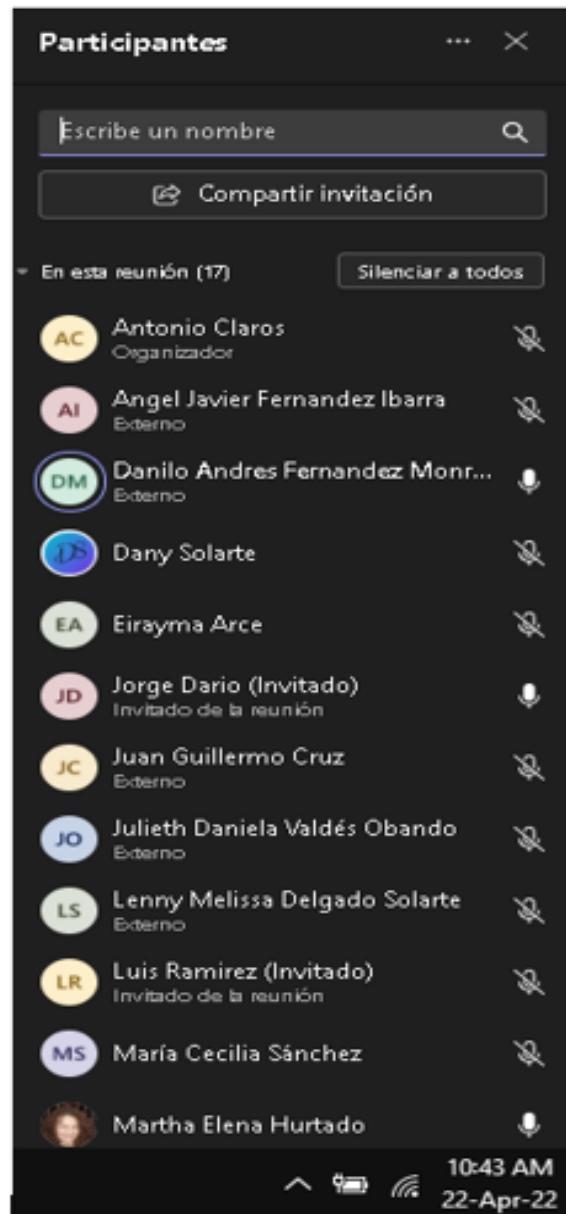

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

LISTADO DE ASISTENCIA



OBJETIVO: (Temas a Tratar) Seguimiento a la ejecución Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020 – COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

FECHA: 22 de Abril de 2022

LUGAR: Virtual (Teams)

HORA INICIO: 10:30 A.M

HORA FINAL: 12:00 P.M

RESPONSABLE: INTERVENTORÍA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Antonio Claros Ciceri	17.649.447	Interventoría	Profesional Técnico	3023203878	aclaros@pmoconsultoria.com	
2	Natalia Marcela Mena Manúa	1.085.305.445	Interventoría	Auxiliar Jurídica	3123313525	nmena@pmoconsultoria.com	
3	Reinaldo Henández	91.107.846	Interventoría	Profesional Administrativo y Financiero	3212308646	rhernandez@pmoconsultoria.com	
4	Dany Solarte	15.817.010	Interventoría	Profesional Técnico	3106713721	dsolarte@pmoconsultoria.com	
5	Myriam Julieta Montañez Rodríguez	39.536.305	Interventoría	Asesor Administrativo y Financiero	3219005247	mmontanez@pmoconsultoria.com	
6	Maria Cecilia Sanchez	41.594.455	Interventoría	Asesora Jurídica	3158474554	msanchez@pmoconsultoria.com	
7	Yesid Diaz	91.244.929	Interventoría	Director Técnico de Apoyo	3167442306	ydiaz@pmoconsultoria.com	
8	Martha Elena Hurtado	25.682.674	Interventoría	Profesional Técnico	3113298594	mhurtado@solycom.co	
9	Ubaldo Pombo	92.533.658	Interventoría	Apoyo Técnico	3015015646	upombo@pmoconsultoria.com	
10	Luis Eduardo Ramirez	1.014.184.238	Interventoría	Profesional Técnico	320 2256293	lramirez@pmoconsultoria.com	
11	Jorge Suárez	71.679.601	Interventoría	Profesional Técnico	3175165115	jsuarez@pmoconsultoria.com	
12	Juan Guillermo Cruz	9.774.416	Interventoría	Profesional Técnico	3103713639	iquillermo@pmoconsultoria.com	
13	Eirayma Arce Betancourt	1.110.503.111	Interventoría	Profesional Técnico	3116603585	earce@pmoconsultoria.com	
14	Angel Javier Fernandez Ibarra	79.599.643	COMCEL SA	Gerente integral del proyecto	3002242860	angel.fernandez@claro.com.co	
15	Julieth Daniela Valdés Obando	1.018.503.004	COMCEL SA	Gestor de proyecto	3152409420	valdeso@claro.com.co	
16	Lenny Melissa Delgado Solarte			SIN DATOS			
17	Danilo Andrés Fernández Monroy	80.038.331	COMCEL SA	Administrador de proyectos	3103004055	danilo.fernandez@claro.com.co	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la *Política de Tratamiento de los Datos Personales* del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través del siguiente link: <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html>



El futuro digital
es de todos

MinTIC

INFORME DE AVANCE CENTROS DIGITALES

Avance semanal
22 de abril de 2022





AGENDA

Abril 22 de 2022

1. Avance instalación y puesta en servicio grupo 2 y grupo 3.
2. Avance estudios de campo grupo 3.
3. Estado operación y mantenimiento 1A y 1B.
4. Estado de PQRSD.
5. Aspectos financieros.





AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G2 y G3

	GRUPO 2	GRUPO 3
Meta	 2919	 3034
Sitios instalados	 2919 Instalados*	 340 Instalados
Reportes instalación	 2507 Aprobados 65 En Interventoría 347 Rechazados	 340 En Interventoría 0 Aprobados
Pruebas remotas	 2594 Aprobados 117 En interventoría 20 Por Enviar 2748 En iteración	
Visitas Interventoría	 185 Aprobados 136 Revisión RETIE 720 Rechazadas* 220 Fallidas 136 En revisión interv. 442 Programadas	

* Pdte envío
comunicación alcance
sitios FM

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G2



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0546-22	Alcance CD-COMCEL-INTV-0523-22- Reporte de cumplimiento Meta 10.	221021097	17/03/2022	16
CD-COMCEL-INTV-0561-22	Subsanación 281 Reporte de Instalaciones Grupo 2- Meta 10	221023648	25/03/2022	281
CD-COMCEL-INTV-0580-22	Subsanación 163 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221026855	04/04/2022	163
CD-COMCEL-INTV-0595-22	Subsanación 31 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221027896	06/04/2022	31
CD-COMCEL-INTV-0608-22	Subsanación 21 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221028871	08/04/2022	21
CD-COMCEL-INTV-0617-22	Subsanación 65 Reportes de Instalación Grupo 2- Meta 10	221029877	12/04/2022	65

Comunicados Interventoría

Aprobados INTV	Rechazados INTV	En revisión INTV	En iteración INTV	Fecha	Comunicado	MINTIC
2057	846	16	0	22/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0470-22	221022403
2069	850	0	0	24/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0481-22	221023423
2309	447	163	0	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0508-22	221023648
2507	347	65	2919	21/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0532-22	221031817

AVANCE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO G3



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Comunicados Comcel

#Comunicado	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados	Acumulado
CD-COMCEL-INTV-0547-22	Primera Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12 - Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020	221021100	17-03-22	23	23
CD-COMCEL-INTV-0571-22	Segunda Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12	221025681	31/03/2022	102	125
CD-COMCEL-INTV-0579-22	Tercera Entrega Reporte de Cumplimiento Meta 12	221026850	04/04/2022	58	183
CD-COMCEL-INTV-0594-22	Cuarta Entrega Reporte de Cumplimiento 61 CD - Meta 12	221027893	06/04/2021	61	244
CD-COMCEL-INTV-0606-22	Quinta Entrega Reporte de Cumplimiento 26 CD - Meta 12	221028864	08/04/2022	26	270
CD-COMCEL-INTV-0607-22	Sexta Entrega Reporte de Cumplimiento 10 CD - Meta 12	221028868	08/04/2022	10	280
CD-COMCEL-INTV-0616-22	Septima Entrega Reporte de Cumplimiento 60 CD - Meta 12	221029873	12/04/2022	60	340

ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3



El futuro digital
es de todos

MinTIC

ESTADO ESTUDIOS DE CAMPO G3	TOTAL
Aprobados Interventoría	2451
Rechazados	248
En revisión Interventoría	230
Aprobado Parcial	105*
Total	3034

* Pdte envío comunicación a supervisión por parte de Comcel

Comunicados Comcel

Comunicado COMCEL	Entrega	Radicado MinTic	Fecha	Sitios reportados
CD-COMCEL-INTV-0551-22	Subsanación 37 Estudios de Campo Grupo 3	221022677	23/03/2022	37
CD-COMCEL-INTV-0569-22	Subsanación 543 Estudios de Campo Grupo 3	221024679	29/03/2022	543
CD-COMCEL-INTV-0614-22	Alcance Subsanación 51 Estudios de Campo Grupo 3	221029757	12/04/2022	51
CD-COMCEL-INTV-0628-22	Subsanación 230 Estudios de Campo Grupo 3	221030752	18/04/2022	230

Comunicados Interventoría


Aprobados	Rechazados	En revisión	Aprobado parcial	En iteración	Fecha	Comunicado	MINTIC
2003	50	975	6	3034	15/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0460-22	221015692
2149	857	0	28	3034	23/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0473-22	221022454
2202	290	542	0	3034	31/03/2022	CD-INTV-COMCEL-0496-22	221025975
2419	512	0	103	3034	7/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0511-22	221028491
2451	248	230	105	3034	21/04/2022	CD-INTV-COMCEL-0533-22	221031823

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1A



El futuro digital
es de todos

MinTIC

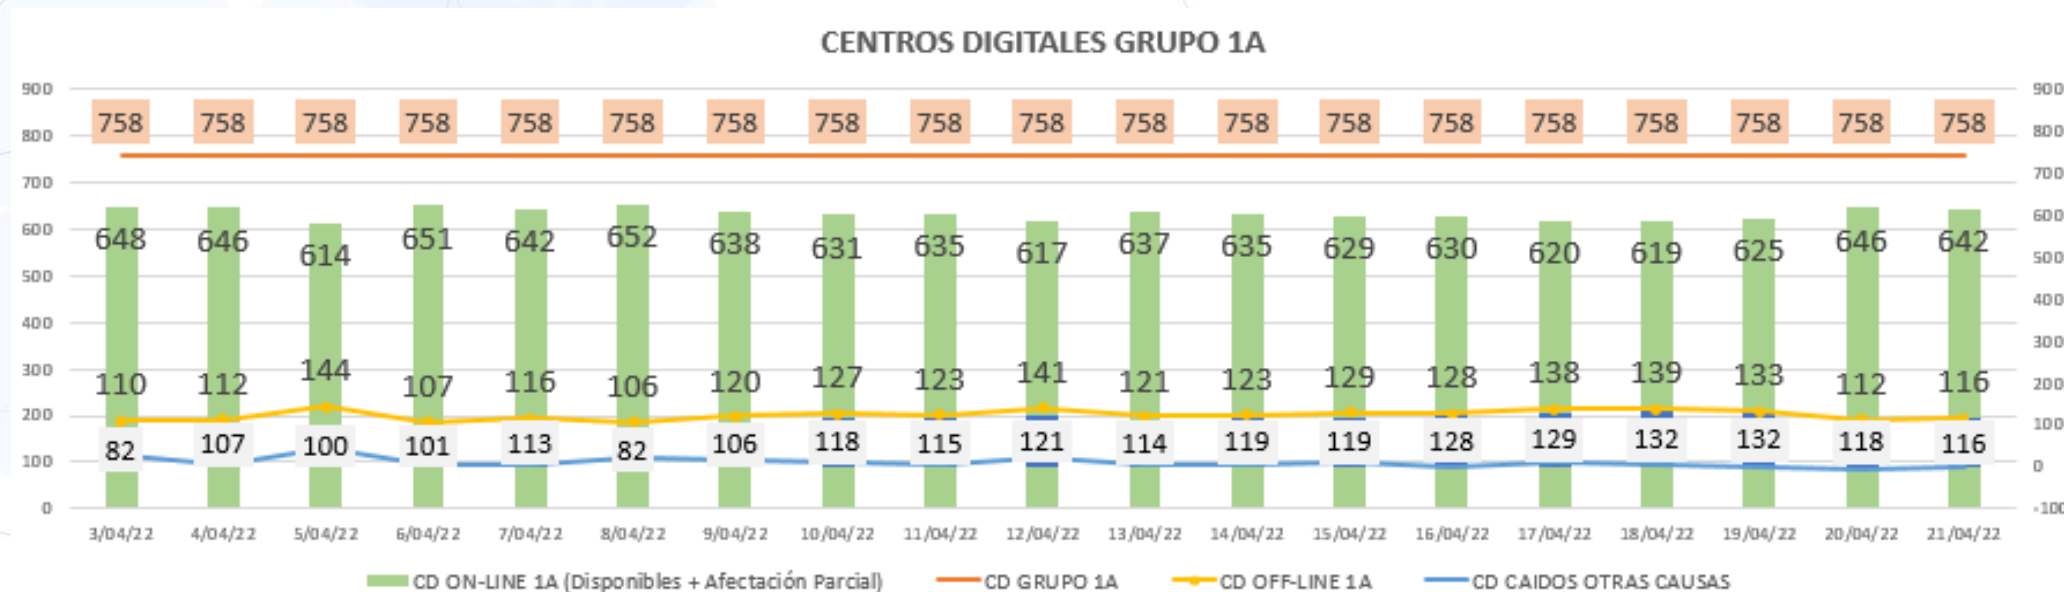


ULTIMO MOTIVO PARADA RELOJ	GRUPO 1A	TOTAL
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	59	59
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	27	27
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACESSOS AL CD	8	8
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	5	5
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	4	4
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	4	4
CONTINUIDAD SERVICIO - TRABAJO PROGRAMADO	3	3
CASO FORTUITO - FIBRA DAÑOS ANIMALES Y/O HUMANOS	2	2
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - FENOMENO NATURAL	1	1
FUERZA MAYOR - HURTO	1	1
FUERZA MAYOR - ORDEN PUBLICO	1	1
TOTAL	116	116

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1B



El futuro digital
es de todos

MinTIC

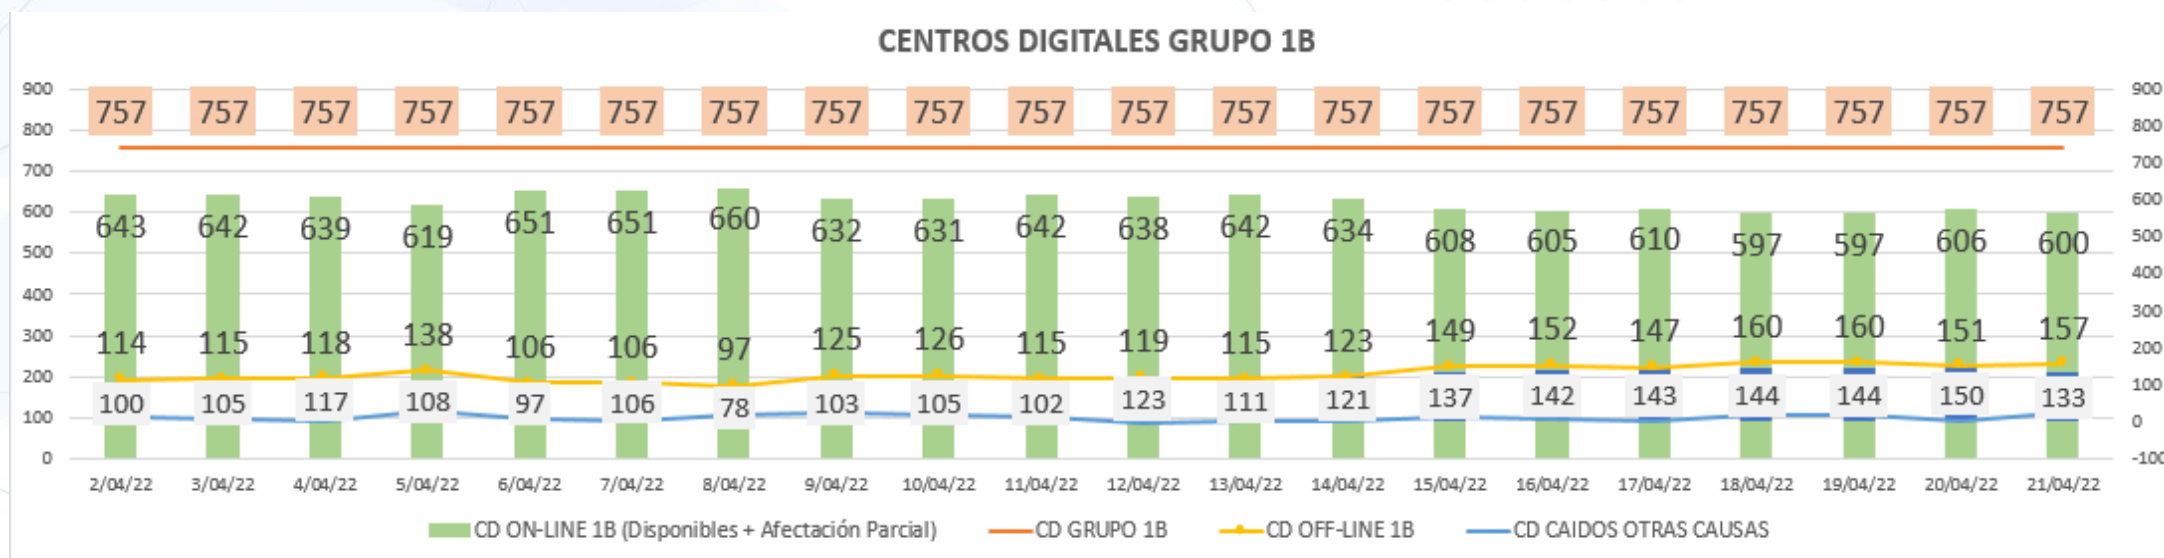


ULTIMO MOTIVO PARADA RELOJ	GRUPO 1B	TOTAL
ATRIBUIBLE TERCEROS - SIN CONTACTO CON CD	78	78
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD PROGRAMAR ACTIVIDAD	33	33
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA ELECTRICA EN CD	5	5
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA ENERGIA COMERCIAL ZONA	3	3
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS BTS (TERCEROS, BASES MILITARES)	3	3
CONTINUIDAD SERVICIO - INSTALACIONES NO DISPONIBLES - FUERA DE HORARIO	3	3
FUERZA MAYOR - FENOMENO ATMOSFERICO	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - FALLA INFRAESTRUCTURA FISICA CD	2	2
ATRIBUIBLE TERCEROS - IMPOSIBILIDAD ACCESOS AL CD	1	1
CASO FORTUITO - FIBRA DAÑOS ANIMALES Y/O HUMANOS	1	1
FUERZA MAYOR - ENERGIA ALTERNATIVA	1	1
FUERZA MAYOR - HURTO	1	1
TOTAL	133	133

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO G2



El futuro digital
es de todos

MinTIC

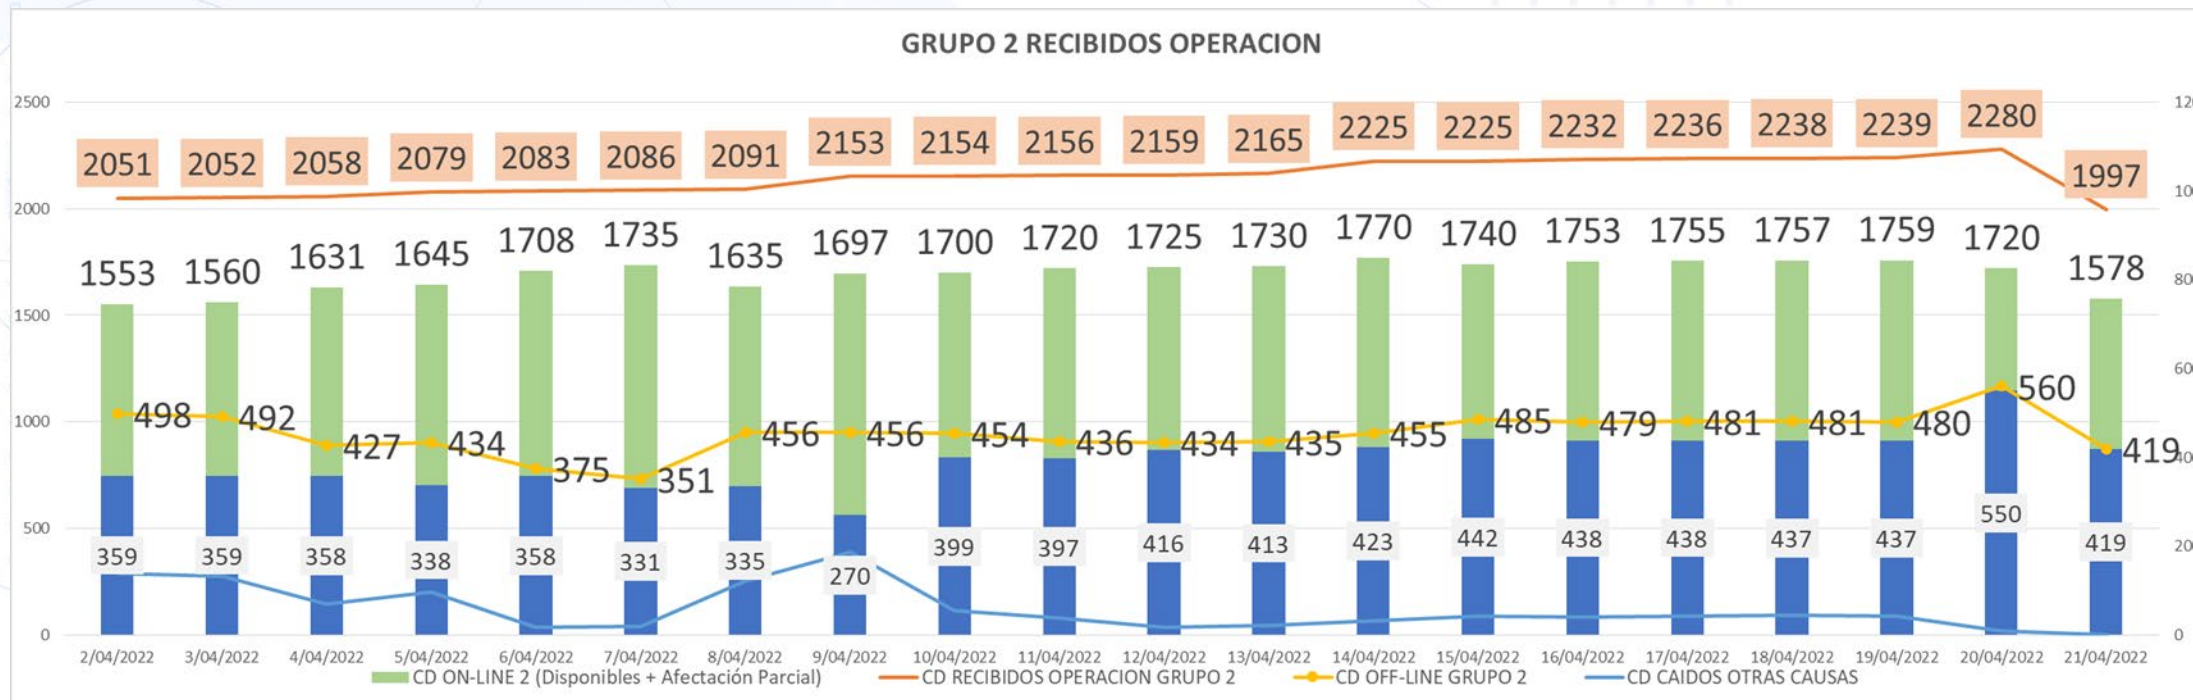

PQRSD



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Tipo de Solicitud	Mes Respuesta							
Mes Traslado	NA	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	En proceso	Total general
PQRSD								
Sep-21		2						2
Oct-21		3						3
Nov-21		6						6
Ene-22			5	3				8
Feb-22				2				2
Mar-22					1	3	2	6
Abr-22						3	3	6
Solicitud Información								
Dic-21	17							17
Ene-22			10	2				12
Feb-22				1				1
Mar-22					1		1	2
Abr-22	1						1	2
Traslado								
Mar-22					1			1
Abr-22						1		1
Cambio/Traslado								
Mar-22					2			2
Cambio								
Dic-21				8				8
Ene-22				1				1
Feb-22				1	1			2
Mar-22					7			7
Abr-22						4		4
Total general	18	11	15	18	13	11	7	93

Tipo de solicitud	Mes Respuesta						
Mes Traslado	Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	En proceso	Total general
PQRSD							
Sep-21		2					2
Oct-21		3					3
Nov-21		6					6
Ene-22			5	3			8
Feb-22				2			2
Mar-22					1	3	6
Abr-22					3	3	6
Total general	11	5	5	1	6	5	33

+8 respecto a semana anterior

+16 respecto a semana anterior

Cifras por tipo de información y PQRSD

PQRSD



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Remitente	Descripción de la Solicitud	Radicado MinTIC	Fecha Traslado Operador	Mes Recepción	Fecha del comunicado adjunto	Mes Traslado Operador	Respuesta dada por el Operador	Estado (Abierto / Cerrado)	Tipo de información
Mintic	Traslado radicado 221003347- Santander	221003347	1/03/2022	Mar-22	18/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado de Radicados 221004588 y 221004592 (Gob. Antioquia)	221004588 221004592	3/03/2022	Mar-22	17/01/2022	Mar-22	9/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221006039	221006039	4/03/2022	Mar-22		Mar-22	7/03/2022	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221009414 (NO forma parte de contrato - Florian Santnader)	221009414	11/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	11/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado 221009416	221009416	14/03/2022	Mar-22	8/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado 221008643	221008643	15/03/2022	Mar-22	1/02/2022	Mar-22	15/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado radicado Mintic 221008661- La Jagua de Ibirico - Cesar	221008661	17/03/2022	Mar-22	2/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado Radicado 221011474 - Centro Educativo Buenos Aires de Campana	221011474	18/03/2022	Mar-22	14/02/2022	Mar-22	29/03/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado Radicado Mintic 221014617 - Florencia Caqueta	221014617	22/03/2022	Mar-22	25/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Radicado # 222026447 - La Jagua de Ibirico - Cesar	222026447	23/03/2022	Mar-22	07/02/2022 08/02/2022	Mar-22	23/03/2022	Cerrado	Cambio/Traslado
Mintic	Traslado de Radicado 221018488 - Girón - Santander	221018488	23/03/2022	Mar-22	9/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221013908 - Florián Santander	221013908	30/03/2022	Mar-22	17/02/2022	Mar-22	30/03/2022	Cerrado	Traslado
Mintic	Traslado radicado 221012951 - Caldas - Aránzazu	221012951	30/03/2022	Mar-22	21/02/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221020697 - Meta - villavicencio	221020697	28/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221012246 (Huila - cumplimiento cronograma)	221012246	30/03/2022	Mar-22	16/02/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021368 - SANTANDER - GIRON - ID 45593	221021368	25/03/2022	Mar-22	16/03/2022	Mar-22	5/04/2022	Cerrado	PQRSD
Interventoria	OFICIO SOLICITUD INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS DE NEIRA CALDAS	NA	31/03/2022	Mar-22	19/03/2022	Mar-22	31/03/2022	Cerrado	Cambio
Interventoria	I. E. de Leña	NA	31/03/2022	Mar-22	1/03/2022	Mar-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221022069 - Neira Caldas	221022069	6/04/2022	Abr-22	19/03/2022	Abr-22	6/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic/Intv	TRASLADO RADICADO 221020391 - Yolombo Antioquia	221020391	1/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	20/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	TRASLADO RAD 221026121 - Alcaldía Municipal de Valledupar	221026121	7/04/2022	Abr-22	31/03/2022	Abr-22	NA	Cerrado	Solicitud Información
Mintic	traslado radicado 221016515 - Roncesvalles Tolima	221016515	7/04/2022	Abr-22	2/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	Solicitud Información
Mintic	Traslado Radicado 221021045 - Solita Caquetá	221021045	7/04/2022	Abr-22	16/03/2022	Abr-22	11/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Traslado rad. 221025465 -	221025465	7/04/2022	Abr-22	9/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	Traslado Radicado 221020655	221020655	8/04/2022	Abr-22	10/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD
Mintic	ID 10001121 BEN 68347 Comunidad Indígena de las Delicias Defensoría del Pueblo 211105722 - Inclusión centros poblados en próximos proyectos		8/04/2022	Abr-22	3/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	Cambio
Mintic	Solicitud insumos PQRS 221020615 Y 221020625 (vereda Guayabal, del municipio de Barichara)	221020615 221020625	11/04/2022	Abr-22	15/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RADICADO 221022163 (Municipio del carmen norte de santander C.E.R Santa ines sede principal)	221022163	12/04/2022	Abr-22	20/03/2022	Abr-22	19/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD No. 221024135 (Institución Villa de San Andrés del corregimiento de Villa de San Andrés del Municipio de Aguachica)	221024135	13/04/2022	Abr-22	28/03/2022	Abr-22	20/04/2022	Cerrado	PQRSD
Mintic	TRASLADO RAD 221025482 (CENTRO EDUCATIVO LOS ENCANTOS GUAIMARAL)	221025482	13/04/2022	Abr-22	30/03/2022	Abr-22	18/04/2022	Cerrado	Traslado
Interventoria	TRASLADO RADICADO 221025161 - Barrancabermeja	221025161	13/04/2022	Abr-22	29/03/2022	Abr-22	En proceso	En proceso	PQRSD

Mes/Tipo solicitud	Estado ▼		
Etiquetas de fila	▼ Cerrado	En proceso	Total general
Mar-22	15	3	18
Cambio	7		7
Cambio/Traslado	2		2
PQRSD	4	2	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Abr-22	9	4	13
Cambio	4		4
PQRSD	3	3	6
Solicitud Información	1	1	2
Traslado	1		1
Total general	24	7	31

+5 cerrados

ASPECTOS FINANCIEROS



El futuro digital
es de todos

MinTIC

- **Utilizaciones:**

Anticipo:

- Aprobación ajuste Plan de Inversión de Anticipo (PIA V.2) Contrato N° 1042 de 2020 – Comcel S.A. 01-04-22 - Radicado # 222031384.

Legalizaciones

- Legalización 3, 4, 5 y 6 – En revisión de las observaciones de la entidad contratante.
- Legalización 6: Radicada 221023854
- Legalización 7: Respuesta a observaciones 13 de abril radicado 221030386.
- Legalización 8: En revisión de las observaciones de interventoría.
- Transferencia de activos: Envío de información 19 de abril.

- **Órdenes de pago**

- Respuesta a las observaciones de las ordenes de pago 18 de abril radicado 221030912.
