

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.1. ANEXO 1 ACTA DE REUNION

Acta de reunión N° 06

Asunto / tema:	Reunión virtual componente SST
Fecha de la reunión:	Lugar de la reunión:
once (11) de agosto de 2023	Recorrido parques
Hora de inicio:	Hora de Finalización:
02:20 pm	05:00 pm
Nombre y cargo de quien convoca la reunión:	Interventoría y Contratista

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Entidad
Ingrid Báez	Contratista	COP-827-2022	CONSORCIO PARQUES EDC 2023
Leidy Cardona Cáceres	Interventoría	CIN-819-2022	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S

Objetivo de la reunión/comité

Reunión de seguimiento componente SST reunión # 06

Agenda / orden del día

1. Verificación de compromisos anteriores- cumplidos y 7 pendientes
2. Información de parques uno por uno
3. Evidenciar estado general del contrato
4. Aspectos SST

Documentos Integrales de la reunión

1. Evidencia de asistentes a la reunión

Desarrollo

Se realiza recorrido por parte del componente SST del contratista e interventoría.

2. Estado general del contrato.

***PARQUE BERTHA HERNANDEZ:** 1 oficial Carlos Narváez, 3 ayudantes Luis González, Luis Perales, Santiago Urrego, el personal cuenta con dotación, se evidencia cerramiento adecuado al igual que la señalización, se evidencia punto de hidratación, botiquín, camilla todo adecuadamente señalado, se evidencia baño móvil el aseo fue el día jueves 10 de agosto, se evidencia soporte

***PARQUE UNIR ETAPA1Y 2:** 1 maestro Pablo Florian , 3 ayudantes Nilson Diaz, Eudin Barliza, Giovanny Perilla, se evidencia cerramiento , el contratista realiza instalación de señalización de punto de encuentro , no se evidencia señalización de ruta de evacuación, el campamento se evidencia en riveras a 1 cuadra, lo mismo para el uso del baño; no se evidencia cerramiento en poli sombra completo , por que la comunidad solicito la no adecuación de la misma hacia el costado de

las viviendas, por seguridad, se evidencia punto de hidratación, falta guante de caucho para el ayudante Giovanni por actividades con concreto.

***PARQUE RIVERAS DEL OCCIDENTE:** se evidencia 3 personas instalado caucho sin hacer uso del casco, se evidencia 1 oficial José Palmar, 1 ayudante Cristian Carreño haciendo uso de EPP, se evidencia cerramiento, se evidencia punto ecológico, extintor, camilla y botiquín en el campamento del salón comunal.

***PARQUE SANTA CATALINA:** 3 ayudantes Ángel Nieto, Luis Rincón, Johar López, 1 oficial Yeferson Ruidiaz, se evidencia personal haciendo uso de EPP, cerramiento en optimas condiciones, de la obra retiran la maquinaria (vibro), se evidencia baño portátil el aseo lo realizaron el día miércoles 9 de agosto pendiente el aseo del 11 de agosto.

***PARQUE MANZANA 8:** 1 ayudante Yesid Yepes, 1 oficial José Davis Ruidiaz, 1 soldador Jesús Rivera, 1 pintor Miguel González, Boal Leidy Duque, se evidencia orden y aseo, se debe adecuar cerramiento, se evidencia punto de hidratación.

Compromisos Generados				
No.	Compromiso Establecido	Nombre y Dependencia del responsable	Fecha de Compromiso	OBSERVACIONES
2	Guantes de caucho para actividades de concreto unir 1 y 2	CONSORCIO PARQUES EDC 2023/PROF. INGRID BAEZ		a los ayudantes no se les hace entrega de guantes de caucho solo al oficial y al maestro, se le indica al maestro de unir que debe hacer cambio para ejecutar la actividad.
3	Aseo baño portátil Santa Catalina	CONSORCIO PARQUES EDC 2023/PROF. INGRID BAEZ	12-08-2023	
4	Dotación para el personal de obra	CONSORCIO PARQUES EDC 2023/PROF. INGRID BAEZ		no se da fecha de entrega al personal ya que la demora está en la entrega

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	 BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO
---	------------------------	--

Compromisos Generados				
No.	Compromiso Establecido	Nombre y Dependencia del responsable	Fecha de Compromiso	OBSERVACIONES
				de la persona que se le compro. Se entrega el día lunes soporte que ya se compró.
5	Soporte de llamado de atención, personal que, instalada el caucho, parque Rivera de Occidente	CONSORCIO PARQUES EDC 2023/PROF. INGRID BAEZ	22-08-2023	

Decisiones / Conclusiones

¿Se requiere una nueva reunión?	SI	X	NO		Fecha:	
---------------------------------	----	---	----	--	--------	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	 SECRETARÍA DE GOBIERNO
---	-----------------	--

EVIDENCIA DE ASISTENCIA
SE ADJUNTA ASISTENCIA FIRMADA POR LAS PARTES INTERESADAS



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 11 de Agosto 2023 Virtual: Presencial: X (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: Recomiendo Chica

HORA DE INICIO: 02:20 pm. HORA DE FINALIZACIÓN: 5 pm.

ASISTENTES: Ingrid Baez Contratista / Lady Cardenas Interventora.

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA			
Lady Cardenas Ceros.			X							Porquesst@gmail.com	312061060	Lady
Ingrid Baez			X						X	controlistc	residentes58@gmail.com	Ingrid Baez

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.2. ANEXO 2 LISTADO DE PERSONAL TOTAL

REPORTE DE PERSONAL															
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO										15/08/2023					
CONTRATO OBRA No.										827-2022					
CONTRATO INTERVENTORIA No.										819-2022					
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR			ARL			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NOMBRE	FECHA AFILIACION A LA ARL	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	
PERSONAL NUEVO															
1	L Y D PROYECTOS S.A.S	Jorge Andres Pulido Ospina	79.792.527	Coordinador de Proyectos	Colpatria	N.A	3/03/2023	Aliansalud	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023		N.A	N.A	Ninguna
2	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S	Ivan Pardo	79.952.890	Gerente de Proyectos	Colmena	N.A	9/03/2023	Compensar	9/03/2023	Proteccion	9/03/2023	24/06/2022	N.A	N.A	Ninguna
3	L Y D PROYECTOS S.A.S	Luis Alfredo Granados	85.462.425	Director de Obra	Colpatria	N.A	3/03/2023	sanitas	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	29/08/2023	N.A	N.A	Valoracion por optometria
4	L Y D PROYECTOS S.A.S	Jose Orlando Peña	3.056.320	Residente Tecnico	Colpatria	N.A	3/03/2023	Salud Total	3/03/2023	Colfondos	3/03/2023	N.A	14/03/2023	N.A	Ninguna
5	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S	Sandra Liliana Galindo	52.381.164	Residente Transito	Colmena	N.A	9/03/2023	Compensar	9/03/2023	Colpensiones	9/03/2023	25/08/2023	N.A	N.A	Ninguna
6	L Y D PROYECTOS S.A.S	Yesica Agudelo Gonzales	52.288.949	Residente Social	Colpatria	N.A	3/03/2023	Sanitas	3/03/2023	Proteccion	3/03/2023	15/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
7	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Ingrid Baez	1.010.208.893	Residente SST	Sura	N.A	8/03/2023	Compensar	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	30/01/2023	N.A	N.A	Ninguna
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Diana Segura Santamaria	1.023.926.179	Residente Ambiental	Sura	N.A	8/03/2023	Sanitas	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	25/08/2023	N.A	N.A	Ninguna
9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yimy Milley Letrado	1.056.506.106	Inspector de Obra	Sura	N.A	8/03/2023	Nueva EPS	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	9/08/2022	N.A	N.A	Ninguna
10	L Y D PROYECTOS S.A.S	Nicolas Barrios	80.048.644	Auxiliar Administrativo	Colpatria	N.A	3/03/2023	Famisanar	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	15/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
11	LYD PROYECTOS S.A.S	NATALIA URREA CESPEDES	1.024.464.466	Auxiliar adminitrativa	Colpatria	N.A	3/03/2023	Sanitas	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	22/09/2022	N.A	N.A	
12	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Sebastian Salamanca	1.022.425.234	Auxilair Tecnico y de Diseño	Sura	N.A	8/03/2023	Compensar	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	25/08/2022	N.A	N.A	Valoracion por optometria
13	DEMOLICIONES VIAS INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS	Giovavanny Ospina Beltran	80.932.731	Topografo	Sua	N.A	22/02/2023	Famisanar	22/02/2023	Porvenir	22/02/2023	14/02/2023	N.A	N.A	Ninguna
14	DEMOLICIONES VIAS INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS	Felipe Ospina Beltran	1.022.397.761	Cadenero	Sura	N.A	22/02/2023	Famisanar	22/02/2023	Colfondos	22/02/2023	1/01/2023	N.A	N.A	Ninguna
PERSONAL ROTATIVO															
1	L Y D PROYECTOS S.A.S	Luz Hernandez Rozo	1.069.714.887	Auxiliar SST	Colpatria	N.A	3/03/2023	Compensar	3/03/2023	Proteccion	3/03/2023	17/11/2022	N.A	N.A	Ninguna
2	L Y D PROYECTOS S.A.S	Erika Lorena Pasachoa Sanchez	1.026.299.093	Auxiliar SST	Colpatria	N.A	3/03/2023	Famisanar	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	2/11/2023	N.A	N.A	N.A
3	L Y D PROYECTOS S.A.S	Eliana Mendieta Luz	1.026.580.374	Auxiliar Social	Colpatria	N.A	3/03/2023	Alian Salud EPS	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	14/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yamile Merchan Contreras	53.117.481	Auxiliar Social	Colpatria	N.A	8/03/2023	Compensar	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	15/03/2023	N.A	N.A	Uso Lentes
5	L Y D PROYECTOS S.A.S	Viviana Segura Santamaria	531.177.481	Auxiliar Ambiental	Colpatria	N.A	3/03/2023	Compensar	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	21/07/2022	N.A	N.A	Ninguna
6	L Y D PROYECTOS S.A.S	Luis Carlos Bidueñez	79051651	Conductor	Colpatria	N.A	3/03/2023	Aliansalud	3/03/2023	Colpensiones	3/03/2023	21/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
7	L Y D PROYECTOS S.A.S	Carlos Eduardo Bermudez	79627785	Conductor	Colpatria	N.A	3/03/2023	Sanitas	3/03/2023	Colpensiones	3/03/2023	8/02/2023	N.A	N.A	Ninguna

PARQUES KENNEDY

N°	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE RETIRO	CARGO	ARL	EPS	PENSION	EXAMEN DE INGRESO
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florian	85168405		Maestro	colpatria	salud total	colfondos	25/03/2023
2	LYD PROYECTOS	Carlos Narvaez	1085165683		Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	16/03/2023
3	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Nafer Segundo Pinilla	7959676		Ayudante	sura	salud total	porvenir	20/05/2022
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Nilson Diaz	1193135198		Ayudante	sura	nueva eps	porvenir	19/08/2022
5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Rene Tovar Real	79703479		Operador	Sura	famisanar	Colpensiones	26/11/2022
6	LYD PROYECTOS	Alfonzo Martinez Camargo	77182444		ayudante	colpatria	salud total	colfondos	14/05/2022
7	LYD PROYECTOS	Cristian Ruidiaz Florian	1085164669		ayudante	colpatria	salud total	porvenir	12/11/2022
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Daniel Chirinos Gonzales	6934999		ayudante	Sura	Compensar	porvenir	13/01/2023
9	LYD PROYECTOS	Mauricio Sanchez Rangel	1004319038		ayudante	colpatria	Cajacopi	porvenir	7/02/2023
10	LYD PROYECTOS	Juan David Ospina	1000929869		ayudante	colpatria	salud total	proteccion	11/04/2023
11	LYD PROYECTOS	Jairo Arrieta	1066515350		Operador	colpatria	famisanar	porvenir	7/05/2022
12	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luz Zora Orosco Vargas	65.814.592	RETIRADA 27-04-2023	Boal	sura	famisanar	porvenir	13/04/2023
13	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Ramiro Sanchez Mosquera	11636490	RETIRADA 27-04-2023	Oficial	sura	sanitas	porvenir	13/04/2023
14	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	keynner Navarro	1085182926		ayudante	sura	sanitas	porvenir	20/01/2023
15	LYD PROYECTOS	Oscar Julian Gonza Lopez	1090498505		Pintura	colpatria	nueva eps	porvenir	5/11/2022
16	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jesus Alberto Rivera	6626855		Soldador	Sura	Compensar	porvenir	23/12/2022
17	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Lady Jhohanna Duque Ramirez	1033716570		boal	sura	famisanar	porvenir	14/09/2022
18	LYD PROYECTOS	Yefferson Ruidiaz Florian	1085164671		Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	26/10/2022
19	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Benito Palmera Lopez	85168221		Oficial	sura	sanitas	porvenir	5/07/2022
20	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzales Barliza	6319051		ayudante	sura	sanitas	proteccion	13/01/2023
21	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Eudin Enrique Gonzales Barliza	7228448		ayudante	sura	famisanar	porvenir	13/01/2023
22	LYD PROYECTOS	Jose David Ruidiz Florian	85165453		Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	30/03/2023
23	LYD PROYECTOS	Nilo Diaz Moreno	1127656321	NO INGRESO	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	22/04/2023
24	LYD PROYECTOS	Andi Jose Julio Cortez	1127656321		ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	20/10/2022
25	LYD PROYECTOS	Yeison Andres Mosquera	1041086009	RETIRADO 04-07-2023	ayudante	colpatria	salud total	porvenir	3/09/2022
26	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Daniel Nieto	1000136424		ayudante	sura	salud total	Colpensiones	4/08/2022
27	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Irvin Jose Lopez Figueroa	6101406	RETIRADO 11-06-2023	ayudante	sura	nueva eps	porvenir	16/05/2023
28	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Andres David Caro Fragozo	1065982014	RETIRADO 27-05-2023	ayudante	sura	nueva eps	proteccion	16/05/2023
29	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yesid Peñaloza Mora	85435488		ayudante	sura	famisanar	Porvenir	18/05/2023
30	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Cristian Camilo Careño Duarte	100752755		ayudante	sura	famisanar	Porvenir	18/05/2023
31	LYD PROYECTOS	Walmer Enrique Merlano Baez	1016078871		Auxiliar Tecnico	colpatria	Sanitas	porvenir	30/09/2022
32	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jaison Lobato Perales	1.004.319.118		ayudante	sura	Nueva eps	porvenir	17/05/2023
33	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Augusto Rincon Prieto	79278688		ayudante	Sura	Capital Salud	Colpensiones	23/06/2023
34	LYD PROYECTOS	Leonardo de Jesus florian pedrozo	1085176946	NO INGRESO	instalador	colpatria	famisanar	porvenir	16/11/2022
35	LYD PROYECTOS	Cesar Augusto Ortiz	1022924741		instalador	colpatria	Compensar	porvenir	24/05/2023
36	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yoster Alejandro Franco	5175520	NO INGRESO	instalador	sura	salud total	porvenir	24/05/2023
37	LYD PROYECTOS	Yamid Patron	1003190894		instalador	colpatria	salud total	Colpensiones	3/09/2022
38	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Santiago Urrego Urrego	1074808436		ayudante	sura	Sura	porvenir	1/06/2023
39	LYD PROYECTOS	Pablo Florian Camargo	85166971		Maestro	colpatria	sanitas	colpensiones	12/10/2022
40	LYD PROYECTOS	Deibis Seballes	1.126.252.040		instalador	colpatria	Nueva eps	colpatria	16/11/2022
41	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Camilo Villamil	1.024.539.852	NO INGRESO	instalador	Sura	Capital Salud	Colfondos	25/05/2023
42	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jesus Pinto	1044826070	NO INGRESO	instalador	Sura	Coosalud	Proteccion	6/09/2022

PARQUES KENNEDY

N°	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE RETIRO	CARGO	ARL	EPS	PENSION	EXAMEN DE INGRESO
43	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Cristian Neva	1.031.160.772	NO INGRESO	instalador	sura	sura	Colpensiones	25/05/2023
44	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Eder Ramos	1.085.165.558	NO INGRESO	instalador	Sura	Cajacopi	Porvenir	20/01/2023
45	LYD PROYECTOS	Felix Martinez	85.166.379		instalador	colpatria	Nueva eps	colpensiones	14/02/2023
46	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Miguel Gonzales	1.085.165.558		Pintor	Sura	Nueva eps	Porvenir	1/02/2023
47	LYD PROYECTOS	Luis Diego Narvaez	1.004.506.950		instalador	colpatria	famisanar	Porvenir	1/03/2023
48	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Henry Narvaez	1.085.165.731		instalador	Sura	Mutuar Sur	Porvenir	10/06/2023
49	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Perales	6.552.714		Ayudante	Sura	Nueva Eps	Porvenir	10/06/2023
50	LYD PROYECTOS	Jhojar Guzman	1.048.436.596		instalador	colpatria	Coosalud	Proteccion	22/06/2023
51	LYD PROYECTOS	Jhonatan Sanchez	10.044.506.726		instalador	colpatria	salud total	Porvenir	24/05/2023
52	LYD PROYECTOS	Daniel Cantillo	1.004.506.112		instalador	colpatria	famisanar	Porvenir	10/06/2023
53	LYD PROYECTOS	Carlos Ardila	80.725.973		Operador	colpatria	sanitas	Porvenir	27/08/2022
54	LYD PROYECTOS	Duban Triana	1.020.818.457		instalador	colpatria	Salud Total	Porvenir	11/05/2023
55	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Camilo Silva	1.004.505.822		instalador	Sura	Famisanar	Porvenir	24/08/2022
56	LYD PROYECTOS	Dairo Quintero	1.004.506.112		instalador	colpatria	Coosalud	Porvenir	25/02/2023
57	CYTY PLAS	Edilberto Padilla	93.089.837		Soldador	Positiva	Salud Total	Porvenir	7/07/2023
58	CYTY PLAS	Juan Carlos Gomez	74.081.153		Soldador	Positiva	Salud Total	Proteccion	23/09/2022
59	CYTY PLAS	Pablo Emigio Barahona	1.072.651.515		instalador	Positiva	Salud Total	Colfondos	7/07/2023

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.3. ANEXO 3 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ		CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69553802	\$884.500
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	362.500	0		0		0	0	0	0	362.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	464.000	0	0	0	0	0	0		464.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.000	0	0	58.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	362.500	362.500
Pensión	1	464.000	464.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	58.000	58.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	884.500	884.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ		CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-07	2023-07	I	25/07/2023	69553802	\$884.500
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIL	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52453159	RUBIO RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	3	0		N																	231001	2.900.000	464.000	0	0		0	0	EPS008	2.900.000	362.500		0		0	CCF24	2.900.000	58.000	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ		CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-08	2023-08	I	22/08/2023	70242964	\$884.500
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	362.500	0		0		0	0	0	0	362.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	464.000	0	0	0	0	0	0		464.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.000	0	0	58.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	362.500	362.500
Pensión	1	464.000	464.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	58.000	58.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	884.500	884.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ		CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-08	2023-08	I	22/08/2023	70242964	\$884.500
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52453159	RUBIO RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	3	0		N																		231001	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	362.500		0		0	CCF24	2.900.000	58.000	0	0	0	0	0	

PAGADA

**CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA**

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **52.453.159** expedida en Bogotá, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** con dedicación del **25%**, cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciaran:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. EI CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **SEIS MILLONES DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$6.750.000)**, Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.250.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**, hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, **(3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE**, cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El **CONTRATISTA**, es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO.** - Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396
BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I** - También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** - **PARÁGRAFO II** - En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS**. Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396

BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. B.) Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. C.) Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.


DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutir las conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente



ANDREA DEL PILAR RUBIO R.
C.C. No. 52.453.159 de Bogotá

TESTIGOS



ANGÉLICA GUERRERO
C. C. No.



DIANA PATRICIA RAMÍREZ Z.
C. C. No.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	101205977		9453717015	I	2023/08/02	2023/08/14	BANCOLOMBIA	\$534,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte									
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000		\$0	\$0									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000		\$0	\$0									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000		\$0	\$0									
1	CC	1014212007	ORTIZ DIANA	230301	30	\$1,600,000		\$256,000	EPS017	30		\$1,600,000		\$200,000	CCF22	30		\$1,600,000		\$32,000	14-11	30		\$1,600,000		\$39,000	30		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000		\$0	\$0									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	101205977	9453717015	I	2023/08/02	2023/08/14	BANCOLOMBIA	12	\$534,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$3,500	\$0	\$259,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$3,500	\$0	\$259,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$600	\$0	\$39,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$39,000	\$600	\$0	\$39,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$500	\$0	\$32,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$32,000	\$500	\$0	\$32,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$2,700	\$0	\$202,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$200,000	\$2,700	\$0	\$202,700	
TOTAL				1	\$527,000	\$7,300	\$0	\$534,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	146085906	9455070900	I	2023/09/04	2023/09/07	BANCOLOMBIA	\$529,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000	\$0
1	CC 1014212007	ORTIZ DIANA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS017	30	\$1,600,000	\$200,000	CCF22	30	\$1,600,000	\$32,000	14-11	30	\$1,600,000	\$39,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,600,000	\$256,000			\$1,600,000	\$200,000			\$1,600,000	\$32,000			\$1,600,000	\$39,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	146085906	9455070900	I	2023/09/04	2023/09/07	BANCOLOMBIA	3	\$529,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$900	\$0	\$256,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$256,000	\$900	\$0	\$256,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$200	\$0	\$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$39,000	\$200	\$0	\$39,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$700	\$0	\$200,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$200,000	\$700	\$0	\$200,700
TOTAL				1	\$527,000	\$2,000	\$0	\$529,000

**CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA**

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **DIANA MARCELA ORTIZ DOMINGUEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **1.014.212.007** expedida en Bogotá, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **PROFESIONAL SOCIAL** con dedicación del **30%**, cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciarán:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. EI CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$3.450.000)**, Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$1.150.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15) de FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**, hasta el día **CATORCE (14) de MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, (3) meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE**, cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El **CONTRATISTA**, es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO.** - Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396
BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I** - También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** - **PARÁGRAFO II** - En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS**. Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396

BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. B.) Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. C.) Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.


DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutir las conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente



DIANA MARCELA ORTIZ DOMINGUEZ
C.C. No. 1.014.212.007 DE BOGOTA

TESTIGOS



ANGÉLICA GUERRERO
C. C. No.



DIANA PATRICIA RAMÍREZ Z.
C. C. No.

PAGADA 12/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JULIETH CARDONA CACERES											
Documento	CC1030559044						Dirección	CLL 59 48 G 63				
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE						Teléfono	3112061060				
Tipo Persona	NATURAL						Forma Presentación	UNICA				
Ciudad	BOGOTA D.C.						Departamento	BOGOTA D.C.				
Representante Legal							Identificación					
Total Afiliados	1						ARP	NINGUNA ARP				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030559044	LEIDY JULIETH CARDONACACERES	3	0																	0	30	30	0	0	PORVENIR	\$1.160.000	\$185.600	FAMISANAR EPS	\$1.160.000	\$145.000	0.00000	\$0	\$0	NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$330.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licen- cias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.160.000	\$1.160.000	\$0	\$0	\$185.600	\$145.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$330.600	\$0	\$330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

788

**CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA**

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **LEIDY JULIETH CARDONA CACERES**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **1.030.559.044** expedida en Bogotá, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **PROFESIONAL SST** con dedicación del **25%**, cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciaran:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. EI CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.400.000)**, Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$800.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**, hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, **(3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE**, cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El **CONTRATISTA**, es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO.** - Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396
BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I** - También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** - **PARÁGRAFO II** - En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS**. Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396

BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. B.) Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. C.) Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.


DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutir las conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente



LEIDY JULIETH CARDONA CACERES
C.C. No. 1.030.559.044 DE BOGOTA

TESTIGOS



ANGÉLICA GUERRERO
C. C. No.



DIANA PATRICIA RAMÍREZ Z.
C. C. No.

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	52438078	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL		Av calle 80 no 62-84 unidad 4 apto 518	6016612788	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-07	2023-07	I	15/08/2023	70149206	\$343.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF21	Cafam				860013570-3	7.000	0

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	7.000	7.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	343.700	343.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52438078	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL		Av calle 80 no 62-84 unidad 4 apto 518	6016612788	LILISPU@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-07	2023-07	I	15/08/2023	70149206	\$343.700

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	APP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52438078	RUBIO CARVAJAL NOHORA LILIANA	59	0		N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0	

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79652627		PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 147 No 21 - 75 torre f apto 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2106993	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	80378240	9454560935	I	2023/08/08	2023/08/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	79652627	PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI																	230201	30	\$2,600,000	\$416,000	EP5010	30	\$2,600,000	\$325,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,600,000	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$754,600	
Total Afiliados(1)																							\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600	\$0	\$0			\$754,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79652627		PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 147 No 21 - 75 torre f apto 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2106993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	80378240	9454560935	I	2023/08/08	2023/08/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
TOTAL				1	\$754,600	\$0	\$0	\$754,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79652627		PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 147 No 21 - 75 torre f apto 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2106993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	144662144	9456033222	I	2023/09/07	2023/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0
1	CC 79652627	PARDO ANDRES	230201	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS010	30	\$2,600,000	\$325,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,600,000	\$13,600	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$13,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79652627		PARDO CARVAJAL ANDRÉS GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 147 No 21 - 75 torre f apto 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2106993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	144662144	9456033222	I	2023/09/07	2023/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
TOTAL				1	\$754,600	\$0	\$0	\$754,600

**CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA**

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **ANDRES GIOVANNY PARDO CARVAJAL**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° **79.652.627** expedida en Anolaima, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **ABOGADO** con dedicación del **10%**, cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciarán:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. EI CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.00.000)**, Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE UN MILLON DE PESOS M/CTE. (\$1.000.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023)**, hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, **(3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE**, cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El **CONTRATISTA**, es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO.** - Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396
BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I** - También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** - **PARÁGRAFO II** - En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS**. Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

CALLE 45ª No 51-47 BARRIO LA ESMERALDA TEL: 7530396

BOGOTÁ D.C

civilcoempresarial@hotmail.com

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: **A.)** El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. **B.)** Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. **C.)** Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.


DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutir las conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente



ANDRES GIOVANNY PARDO CARVAJAL
C.C. No. 79.652.627 DE BOGOTA

TESTIGOS



ANGÉLICA GUERRERO
C.C. No.



DIANA PATRICIA RAMIREZ Z.
C.C. N°

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 860.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000	\$ 0	\$ 860.800	\$ 7.000	\$ 867.800	
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 0	\$ 400.000	\$ 3.300	\$ 403.300	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 704.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 0	\$ 704.000	\$ 5.700	\$ 709.700	
SUBTOTALES:										\$ 1.964.800	\$ 16.000	\$ 1.980.800	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 683.500	\$ 683.500	\$ 5.500	\$ 0	\$ 689.000
SUBTOTALES:									\$ 683.500	\$ 5.500	\$ 0	\$ 689.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SIN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN
1	CC 1026269790	CARRANZA BELTRAN JUAN RICARDO	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		SI																		231001- COLFOND OS	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS008- COMPENS AR	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.500.000		\$ 174.000	2.500.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 10311161933	MARINO BARRETO GINNA MARIA	DEPEND		\$ 1.800.000	FIJO		SI	01																230301- PORVENIR	30	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.000	EPS017- FAMISANA R	30	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 72.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.800.000		\$ 125.300	1.800.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	CC 14268538	LEON ZABALA JOSE EGIDIO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301- PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 12.200	1.160.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 34.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	CC 41416445	AMARILLO ARIZA BERTILDA	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI																	230301- PORVENIR	30	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS008- COMPENS AR	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.200.000		\$ 12.600	1.200.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5	CC 79147410	CALLEJAS VALLEJO ALFREDO	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS001- ALIANSA LUD S.A.	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.500.000		\$ 174.000	2.500.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
6	CC 79305476	RODRIGUEZ SASTRE JAIME ALBERTO	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.900.000	\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.000	EPS017- FAMISANA R	30	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 76.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.900.000		\$ 132.300	1.900.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7	CC 79581186	CAMACHO MUÑOZ JOSE DIEGO	DEPEND		\$ 1.220.000	FIJO		SI																	230301- PORVENIR	30	\$ 1.220.000	\$ 195.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 195.200	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.220.000	\$ 48.800	\$ 0	\$ 48.800	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.220.000	1	\$ 53.100	1.220.000	SCCF24- COMPENS AR	\$ 36.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

803

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 0	\$ 400.000	\$ 4.100	\$ 404.100	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 704.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 704.000	\$ 7.200	\$ 711.200	
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 860.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	\$ 0	\$ 860.800	\$ 8.800	\$ 869.600	
SUBTOTALES:										\$ 1.964.800	\$ 20.100	\$ 1.984.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 683.500	\$ 683.500	\$ 7.000	\$ 0	\$ 690.500
SUBTOTALES:									\$ 683.500	\$ 7.000	\$ 0	\$ 690.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC
1	CC 1026269790	CARRANZA BELTRAN JUAN RICARDO	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		SI																		231001- COLFOND OS	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS008- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.500.000		\$ 174.000	2.500.000	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1031161933	MARINO BARRETO GINNA MARIA	DEPEND		\$ 1.800.000	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.000	EPS017- FAMISANA R	30	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 72.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.800.000		\$ 125.300	1.800.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 14268538	LEON ZABALA JOSE EGIDIO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 12.200	1.160.000	\$ 34.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 41416445	AMARILLO ARIZA BERTILDA	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS008- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.200.000	1	\$ 12.600	1.200.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 79147410	CALLEJAS VALLEJO ALFREDO	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS001- ALIANSA LUD S.A.	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.500.000		\$ 174.000	2.500.000	\$ 75.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 79305476	RODRIGUEZ SASTRE JAIME ALBERTO	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.900.000	\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.000	EPS017- FAMISANA R	30	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 76.000	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.900.000		\$ 132.300	1.900.000	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 79581186	CAMACHO MUÑOZ JOSE DIEGO	DEPEND		\$ 1.220.000	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.220.000	\$ 195.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 195.200	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.220.000	\$ 48.800	\$ 0	\$ 48.800	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.220.000	1	\$ 53.100	1.220.000	\$ 36.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

804

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				NÚMERO PLANILLA:					TIPO DE PLANILLA:				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:						901463604				1107353987					E-EMPLEADOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					BOGOTA DISTRITO CAPITAL	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS				junio AÑO 2023					MES julio AÑO 2023				
DIRECCIÓN:					CLL 45 A # 51 - 47	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL				DÍAS DE MORA: 35					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR	7530396				2023/08/09					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES									915132200				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO													

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 80.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 0	\$ 80.500	\$ 3.300		\$ 83.800	
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 55.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 0	\$ 55.800	\$ 2.300		\$ 58.100	
SUBTOTALES:										\$ 136.300	\$ 5.600		\$ 141.900	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 14.500	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 14.500	\$ 600	\$ 0	\$ 15.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 77.400	\$ 0	\$ 3.100	\$ 0	\$ 77.400	\$ 3.100	\$ 0	\$ 80.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 14.500	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 14.500	\$ 600	\$ 0	\$ 15.100
SUBTOTALES:													\$ 106.400	\$ 4.300	\$ 0	\$ 110.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 59.400	\$ 59.400	\$ 2.400	\$ 0	\$ 61.800
SUBTOTALES:								\$ 59.400	\$ 2.400	\$ 0	\$ 61.800	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	\$ 25.700	\$ 1.100	\$ 26.800	
SUBTOTALES:			\$ 25.700	\$ 1.100	\$ 26.800	

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES									
		ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO			NOMBRE				APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF			PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR			5	\$ 19.600	\$ 800	\$ 20.400
PASENA			PASENA - SENA			5	\$ 13.100	\$ 600	\$ 13.700
SUBTOTALES:							\$ 32.700	\$ 1.400	\$ 34.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD										ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN		TOTAL APORTE	SENA	ICBF					ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 1031127100	GARZON CHINCHILLA GINA PAOLA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	10																231001- COLFOND OS	10	\$ 386.667	\$ 61.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 61.900	EPS008- COMPENS AR	10	\$ 386.667	\$ 48.400	\$ 0	\$ 48.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	\$ 386.667		\$ 27.000	10	\$ 386.667	CCF24- COMPENS AR	\$ 11.700	\$ 5.900	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0					
2	CC 1049602887	FORERO CORTES DARWIN ABDEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																25-14 COLPENSI ONES	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS002- SALUD TOTAL	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000		\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24- COMPENS AR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0					
3	CC 1068928227	ORTEGON ARISTIZABA L HEIDY LIZETH	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																25-14 COLPENSI ONES	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS008- COMPENS AR	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000		\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24- COMPENS AR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0					
4	CC 52103406	RAMIREZ ZABALA DIANA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																231001- COLFOND OS	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS008- COMPENS AR	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000		\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24- COMPENS AR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0					
5	CC 80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																25-14 COLPENSI ONES	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS037- NUEVA EPS	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000		\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24- COMPENS AR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0					

TOTAL \$ 375.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901463604
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 45 A # 51 - 47	TELÉFONO:	7530396
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	1107374798			TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023		
DIAS DE MORA:			9						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1110162900				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 55.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 55.800	\$ 600	\$ 56.400
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 80.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 80.500	\$ 900	\$ 81.400
SUBTOTALES:										\$ 136.300	\$ 1.500	\$ 137.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 14.500	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 14.500	\$ 200	\$ 0	\$ 14.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 91.900	\$ 0	\$ 1.000	\$ 0	\$ 91.900	\$ 1.000	\$ 0	\$ 92.900
SUBTOTALES:													\$ 106.400	\$ 1.200	\$ 0	\$ 107.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 59.400	\$ 59.400	\$ 700	\$ 0	\$ 60.100
SUBTOTALES:									\$ 59.400	\$ 700	\$ 0	\$ 60.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR		5	\$ 25.700	\$ 300	\$ 26.000
SUBTOTALES:				\$ 25.700	\$ 300	\$ 26.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 19.600	\$ 200	\$ 19.800
PASENA	PASENA - SENA	5	\$ 13.100	\$ 200	\$ 13.300
SUBTOTALES:			\$ 32.700	\$ 400	\$ 33.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO								TOTAL APORTE	
1	CC 1031127100	GARZON CHINCHILLA GINA PAOLA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	10																	231001-COLFONDOS	10	\$ 386.667	\$ 61.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 61.900	EPS008-COMPENSAR	10	\$ 386.667	\$ 48.400	\$ 0	\$ 48.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	\$ 386.667	\$ 27.000	10	\$ 386.667	CCF24-COMPENSAR	\$ 11.700	\$ 5.900	\$ 8.800	\$ 0	\$ 0
2	CC 1049602887	FORERO CORTES DARWIN ABDEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																	25-14 COLPENSI ONES	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000	\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0
3	CC 1068928227	ORTEGON ARISTIZABAL HEIDY LIZETH	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																	25-14 COLPENSI ONES	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000	\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0
4	CC 52103406	RAMIREZ ZABALA DIANA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																	231001-COLFONDOS	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000	\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0
5	CC 80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO	01	03																	25-14 COLPENSI ONES	3	\$ 116.000	\$ 18.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.600	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 116.000	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	\$ 116.000	\$ 8.100	3	\$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 3.500	\$ 1.800	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 364.600
--------------	-------------------


Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.4. ANEXO 4 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

Bogotá D.C, 15 de agosto del 2023

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, **LEIDY CARDONA CACERES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.030.559.044** expedida en la ciudad de Bogotá, actuando en mi condición de residente SST de la empresa CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S Con Nit. 901.463.604-3, Manifiesto que el contratista CONSORCIO PARQUES EDC2023 con NIT 901.665.839-4 ha cumplido durante el periodo comprendido entre el **15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023** con los pagos al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de fondos de pensiones y Cesantías -AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de Aprendizaje, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



Ing. LEIDY CARDONA CACERES
Esp. gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Residente SST
CABA INTERVENTORIA S.A.S

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.5. ANEXO 5 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	40785 VUT
FECHA RADICADO:	05/12/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
IDENTIFICACIÓN:	901463604-3

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	20,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0027

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 17 de enero de 2023



INGRID KATHERINE BOYACÁ CARREÑO

Verificó y Elaboró: Carolina M.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 79.581.186

CAMACHO MUÑOZ

APELLIDOS

JOSE DIEGO

NOMBRES

Jose Camacho Muñoz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1970

GAMBITA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00872614-M-0079581186-20161222

0052732200A 1

1894222240



MinTrabajo
República de Colombia

BOGOTÁ

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ
ACTA DE INSPECCIÓN

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE QUE TRATA EL ART. 24 DE LA LEY 351 DE 1997

La Suscrita Inspectora de trabajo en cumplimiento al Auto No. 679 de fecha 30 de Junio de 2014, emanado por la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano y Tramite, se trasladó a las instalaciones de la empresa BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO, ubicada en la Carrera 45 A No. 51 - 47 de Bogotá. Fue atendida por el señor CLEMENTE BUITRAGO AMARILLO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.433.980 de Bogotá en calidad de Representante Legal de la mencionada empresa.

Se revisaron los documentos necesarios para el trámite:

- Cámara de Comercio de Bogotá NIT (Ho Reporte) - C.C. 19.433.980
- Nómina del Mes de Junio de 2014 donde se evidencia 1 persona en nómina cuyo una se encuentra en condición de discapacidad.
- Contrato laboral del Señor JOSE DIEGO CAMACHO MUÑOZ identificado con C.C. No. 79.581.136 de Bogotá D.C., quien se desempeña MENSAJERO desde el 01 de Noviembre de 2012 a término indefinido.
- Certificado de Discapacidad de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá Condinamarca con un P.C.L del 31,30% del señor JOSE DIEGO CAMACHO MUÑOZ.
- Pagos a la seguridad social desde el mes de Noviembre de 2013 al mes de Mayo de 2014 donde se evidencia una persona como consta en la nómina aportada.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia una vez leída y aprobada y se firma por las personas que en ella intervinieron.

Por el Ministerio:

RELYS CORONUGA CASTILLO
Inspectora de Trabajo GACT

Por la Empresa:

CLEMENTE BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal

Anexo Dos (2) Faltas

Centro Fina 22-53 P20 +52000-122100 Sur, 3408 Bogotá D.C., Colombia

25/06/2014

**JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
DE BOGOTA D.C. Y CUNDINAMARCA**
Reglamentada mediante Decreto 2463 de 2.001 (Min. Trabajo y Seguridad Social)

CERTIFICA

Que la Sala Uno de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, procedió a calificar a JOSE DIEGO CAMACHO MUÑOZ identificado con C.C. 79581186 y que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, así como los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo de 1999), en decisión del día 20 de Mayo de 2013, determinó que la pérdida de capacidad laboral (PCL) es así:

Diagnóstico:
AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA.


CONCEPTO:	%
Deficiencia:	18.00%
Discapacidad:	4.40%
Minusvalía:	9.50%
Total P.C.L:	31.90%


Grado de Limitación	Art. 7 Decreto 2463.01
Moderada entre 15% y 25%	
Severa (mayor >25% e inferior a < 50%)	X
Profunda igual o mayor a =>50%	

RESPONSABLES DE LA CALIFICACION


EDUARDO ALFREDO RINCON GARCIA
MEDICO


SANDRA FRANCO BARRERO
MEDICO


DIANA XIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ
PSICOLOGA Y FISIOTERAPEUTA


RUBEN DARIO MEJIA ALFARO
SECRETARIO

VALIDO UNICAMENTE PARA EFECTO DE RECLAMACION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY 361 DE 1997.

Contra el presente certificado no procede ningún Recurso.

Recibi:

Nombre:

C.C N°

Huella

19483980-522

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.6. ANEXO 6 ACTA DE COPASST




Versión: 1

Implementación: 20/03/2019

ACTA DE REUNION

Código: SST-F-005

Reunión de:		Operaciones___ Brigada___ Comité Convivencia___ Otros __ Cepasst X					
Lugar	VIRTUAL	Fecha Reunión (dd/mm/aa)	29	8	2023	Preparada por	Alejandra Prieto Perez
						Acta No.	5
ASISTENTES							
REPRESENTANTES		Nombre	Cargo		Asiste (Si o No)	Firma	
Empresa		Yuli caro vargas			SI		
		Alejandra Prieto			SI		
AGENDA DE LA REUNIÓN							
No	TEMA						
1	Investigación accidente de trabajo						
2	Revisión plan de trabajo ultima asesoría ARL						
3	Cursos 50 horas						
4	Reunión con la arl						
5	Solicitud capacitaciones						
6							
DESARROLLO DE LA REUNIÓN							
Tema	DESCRIPCIÓN					Resp.	Fecha
1	No hay accidentes de trabajo a la fecha						
2	Se inscribe a Yuly en la plataforma GUARDIAN para curso 50 horas						
3	Se realiza reunión con la ARL para tener en cuenta los proyectos activos						
4	Se solicitan capacitaciones enfocadas en - medición ambiental - uso de epps - Pausas activas						
Fecha Próxima Reunión:		DD	MM	AA	24	9	2023
				Lugar		OFICINA CIVILCO	



ACTA DE REUNION

Versión: 1
Implementación: 20/03/2019

Código: SST-F-005

ANEXO FOTOGRAFICO:



Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SST Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

15.7. ANEXO 7 COMPROBANTES DE PAGO ARRIENDO

Arriendo Julio

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 11/07/2023 Hora: 14:48:55
Jornada: Normal
Oficina: 0016
Terminal: CJ0016W101
Usuario: GNO
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000488400355258
Titular Producto:
OMAR ALFONSO VALDEKAMA AMAYA
Vr. Efectivo: \$820,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$820,000.00
Costo Transacción: \$0.00
No Transacción: 249975
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 19483980

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Arriendo Agosto 2023.

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 10/08/2023 Hora: 12:13:36
Jornada: Normal
Oficina: 0016
Terminal: CJ0016W102
Usuario: G19
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000488400355258
Titular Producto:
OMAR ALFONSO VALDERRAMA AMAYA
Vr. Efectivo: \$820,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$820,000.00
Costo Transacción: \$0.00
No Transacción: 194854
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 79581186
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 819 – 2022

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS

DIRECCIÓN: Calle 45A No. 51 – 47

TELÉFONO: 753 03 96

Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FDLK-LP-017- 2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY."

INFORME MENSUAL No. 6 COMPONENTE SOCIAL

PERIODO ENTRE EL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023

TABLA DE CONTROL

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Diana Marcela Ortiz	Profesional Social	
APROBÓ	Andrea Del Pilar Rubio Ramírez	Director de Interventoría	

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Revisión del Documento	Fecha de Modificación	Observaciones
0	04-septiembre-2023	Inicial

AGOSTO DE 2023 / BOGOTÁ D.C

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO.....	5
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS	5
3. CONTEXTO CONTRACTUAL	6
3.1 INFORMACIÓN CONTRATISTA	6
3.2 INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	6
4. PERSONAL RESPONSABLE	7
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	8
6. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.....	9
7. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN.....	9
7.1 Programa de información:	9
7.2 Herramientas de divulgación	11
7.3 Divulgación de información	12
8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	13
9. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN.....	14
10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.....	15
11. PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES	16
12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO	16
13. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO – ACTIVIDADES TÉCNICAS	20
14. REPORTES DE SEGUIMIENTO	21
15. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL.....	22
16. ANEXOS:.....	22

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

TABLAS EN EL CONTENIDO

Tabla 1 – Información contractual contratista	6
Tabla 2 – Información contractual interventoría	6
Tabla 3 – Personal responsable interventoría.....	7
Tabla 4 - Indicador de Productividad- Reuniones de avance (mensual)	10
Tabla 5 – Reuniones informativas de avance	10
Tabla 6 – Consolidado de PSI	11
Tabla 7 – Control de piezas de divulgación	12
Tabla 8 - Indicador de productividad (programa de divulgación).....	13
Tabla 9 - Información general PAC.....	13
Tabla 10 – Indicador de gestión (Programa atención al ciudadano).....	14
Tabla 11 – Generalidades CPC	15
Tabla 12 – Indicador de cumplimiento- Programa de socialización	16
Tabla 13 – Indicador de MONCL	17
Tabla 14 – Personal de mujeres vinculadas	18
Tabla 15 – Indicador de mujeres vinculadas en el proyecto.....	19
Tabla 16 – Indicador Población diferencial	20
Tabla 17 – Consolidación de acompañamiento	21

ILUSTRACIONES EN EL CONTENIDO

Ilustración 1 Zona UPZ LOCALIDAD KENNEDY	8
--	---

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente informe se dan a conocer las diferentes actividades realizadas por parte del área de Gestión Social en el marco del contrato de interventoría N° FDLK-LP-017- 2022 cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública N° FDLK-LP-017- 2022 cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy”.

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los programas y actividades que desarrollará el contratista, bajo el contrato N° 827 de 2022, donde se pretende minimizar los impactos sociales que se generan con la realización del proyecto, fortaleciendo la comunicación entre los actores que inciden en el territorio, es decir, el acercamiento entre la ciudadanía, las instituciones (Entidad - contratante), el contratista e interventoría, en un esquema de corresponsabilidad que pretende fortalecer las acciones frente a la generación de espacios de participación en las actividades que se llevarán a través de la ejecución del contrato.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Brindar información clara, oportuna y confiable acerca del alcance del contrato a la población del área de influencia, a las autoridades locales, organizaciones sociales y demás población que sea influida por el proyecto.
- Definir los mecanismos y espacios para la gestión comunitaria e interinstitucional con ocasión de la ejecución del proyecto
- Crear canales de comunicación entre la comunidad en general, el Contratista, la interventoría y los diferentes actores institucionales y sociales que participen de forma directa o indirecta al contrato de obra, generando un ambiente adecuado para el buen desarrollo de la obra.
- Generar la vinculación de la mano de obra no calificada como una oportunidad para la generación de ingresos, aportando desde ahí a la reducción de necesidades básicas.
- Involucrar a la comunidad en procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.
- Fomentar en la comunidad beneficiaria de la ejecución del proyecto la apropiación del espacio de tal forma, que se busque generar conciencia del beneficio de las obras

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

3. CONTEXTO CONTRACTUAL

3.1 INFORMACIÓN CONTRATISTA

Tabla 1 – Información contractual contratista

CONTRATO No.:	CO-827-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES EDC 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DE OBRA:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.595.690.610,00

3.2 INFORMACIÓN INTERVENTORÍA

Tabla 2 – Información contractual interventoría

CONTRATO No.:	FDLK-819-2022
INTERVENTORÍA:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO – CABA INTERVENTORÍA SAS
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DE OBRA:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE 2023
VALOR INICIAL:	\$ 320.808.503

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

4. PERSONAL RESPONSABLE

El personal responsable de la ejecución del presente informe de gestión social será la residente social de la firma de interventoría, quien reportará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. A continuación, se relaciona la información:


Tabla 3– Personal responsable interventoría

PERSONAL SOCIAL				
No de identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
1.014.212.007	Diana Marcela Ortiz Domínguez	Profesional social	3153935487	Interventoriasocialkennedy @gmail.com

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 1 Zona UPZ LOCALIDAD KENNEDY

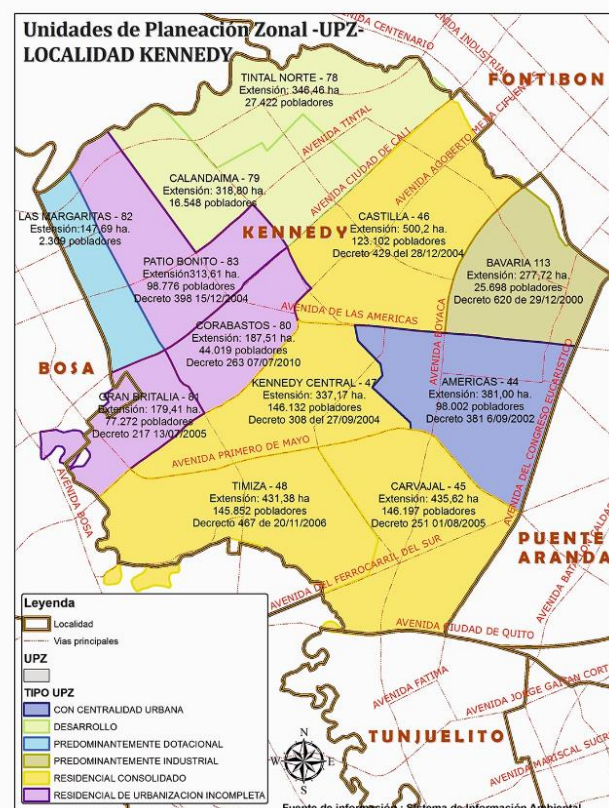

FUENTE: ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY (<http://www.kennedy.gov.co/mi-localidad/mapas>)

Las acciones a desarrollar en el presente proyecto se encuentran localizadas en las UPZ de Kennedy: Castilla, Américas, Carvajal, Kennedy Central, Timiza, Calandaima, Corabastos, Gran Britania, Patio Bonito y Bavaria. La ejecución del proyecto se define a partir de la metodología derivada de los presupuestos participativos, solicitudes incluidas en el banco de iniciativas de la Alcaldía Local de Kennedy y verificación en campo de los parques. Anexo 1. - anexo técnico (FDLK pg. 3 y pg. 4)

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

6. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social en obras, es un programa de planificación que busca garantizar la participación activa de la comunidad a través de estrategias de comunicaciones claras, precisas y oportunas con relación a la ejecución del contrato de obra CO-827-2022 , que se desarrollará en la localidad de Kennedy, buscando mitigar los impactos desfavorables para la comunidad a través de la implementación de acciones que le permitan a la ciudadanía llevar a cabo su cotidianidad simultáneamente con el desarrollo de las intervenciones generando en lo posible y mientras las actividades de obra lo permita la menor afectación e impacto con cada uno de los residentes.

Para el presente periodo no se relaciona ninguna modificación enmarcada en las actividades del PGS.

7. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

Objetivo: Disponer la información general del proyecto al alcance de la comunidad, entendida ésta como todos los ciudadanos que prioritariamente vivan, trabajen o se relacionen de alguna manera con las obras a ejecutar en el presente objeto contractual.

No obstante, informar las actividades y acciones derivadas de las mismas, producto de la ejecución de las fases del proyecto.

7.1 Programa de información:

Dando continuidad, se relacionan las reuniones que se tienen contempladas contractualmente en el proyecto:

- Reunión de inicio: Se realiza la reunión previamente al inicio de actividades constructivas.
- Reunión de avance: Se ejecuta la reunión, una vez se cuente con el avance del 50%
- Reunión de finalización: Se realizará como parte de la entrega de las obras ejecutadas al 95%
- Reunión extraordinaria: En caso de que se presenten situaciones repentinas que afecten a la comunidad y la cual es inherente al desarrollo de la obra.

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

A continuación, se relaciona el indicador de productividad y participación que diligenciará una vez se realicen las reuniones programadas en el plan de gestión social:

- **Reuniones de inicio:** En el periodo y de acuerdo a las dinámicas del contrato, no se realizaron reuniones informativas de inicio.
- **Reuniones de avance:** Durante el periodo se relaciona el siguiente indicador para conocer las reuniones de avance programadas y ejecutadas

Tabla 4- Indicador de Productividad- Reuniones de avance (mensual)

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR	FÓRMULA	PORCENTAJE
Productividad	$\frac{\text{Nº de reuniones realizadas durante el periodo (3)} \times 100}{\text{Nº de reuniones programadas en el periodo (3)}}$	100%
Participación	$\frac{\text{Nº de participantes en las reuniones de avance (20)} \times 100}{\text{Nº de personas convocadas en las reuniones de avance (308)}}$	0.6%

Durante el periodo se dio cumplimiento las actividades del programa de información y divulgación para un porcentaje de productividad del 100%. Sin embargo, la participación de las mismas fue mínima, con un 0.06% de participación. Las tres reuniones de avance corresponden a 08-123 Pinar del Rio, 08-186 Desarrollo Campo Hermoso y 08-06 Riveras De Occidente. A continuación, se relaciona las especificaciones de cada uno de los encuentros:

Tabla 5– Reuniones informativas de avance

REUNIONES INFORMATIVAS DE AVANCE				
PARQUE	FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES
08-123 Pinar del Rio	10/08/2023	9:00 A.M.	Parque	16
08-186 Desarrollo Campo Hermoso		1:30 P.M.		0
08-06 Riveras De Occidente		3:00 P.M.		4

Contratista Consortio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 1– Programa de información – Reuniones de avance (*aprobación de las presentaciones, presentaciones, actas, listados de asistencia y registro fotográfico*)

- **Reuniones de finalización:** En el periodo y de acuerdo a las dinámicas del contrato, no se realizaron reuniones informativas de finalización.
- **Reuniones extraordinarias:** Para las fechas relacionadas en el presente informe no se realizó ninguna reunión extraordinaria con la comunidad.

7.2 Herramientas de divulgación

Hace referencia a las diferentes herramientas con las cuales el contratista de obra lleva a cabo la difusión de la información relevante del proyecto. Cabe resaltar que, la construcción de estas piezas o herramientas de información mantendrán un esquema dado por el manual de imagen corporativo de la Alcaldía Local de Kennedy, al igual que los datos del contrato de obra y logos de las entidades inmersas.

Puntos Satélites De Información:

Durante el desarrollo del presente informe, se realiza instalación y/o actualización de dos (2) puntos satélites de información instalados y fechas relacionados a continuación:

Tabla 6– Consolidado de PSI

CONSOLIDADO DE PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN				
Nº	PARQUE	DIRECCIÓN	FECHA	PIEZAS INSTALADAS Y CANTIDAD
1	Cod- 08-123 Pinar del Rio,	Carrera 83 A N. 39-60	04/08/2023	Un (1) Volante informativo de convocatoria a reunión de avance
2	Cod - 08-186 Desarrollo Campo Hermoso	Carrera 88 D 35 B-23 Sur		Un (1) Volante informativo de convocatoria a reunión de avance
TOTAL				2 volantes instalados en los PSI

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 2– Programa de divulgación (soportes - PSI)

7.3 Divulgación de información

Objetivo: Disponer de los elementos y/o piezas de divulgación cumpliendo con las especificaciones del manual de identidad visual de la Alcaldía Local de Kennedy, incluyendo aspectos específicos de la obra.

- **Volantes**

A continuación, se relaciona el registro de las piezas de divulgación mediante el periodo y el indicador de productividad:

Tabla 7– Control de piezas de divulgación

N°	PIEZA DE DIVULGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD PIEZAS ENTREGADAS
57	Cod- 08-123 Pinar del Rio.	04/08/2023	04/08/2023	86
58	Cod - 08-186 Desarrollo Campo Hermoso			92
59	Cod 08-006 Riveras De Occidente			130
60	08-620 Santa Catalina 1 Y 2 Sector,		11/08/2023	7
61	08- 253 Urbanización La Gran Britalia,			4
62	08-153 Bertha Hernández de Ospina			10
63	08-681 Urbanización Tayrona			4
64	08-382 Ciudad Kennedy Occidental Manzana 14			4
TOTAL				337

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 3– Programa de divulgación (volantes y soportes de entrega)

Tabla 8- Indicador de productividad (programa de divulgación)

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR	FÓRMULA	PORCENTAJE
Productividad	$\frac{\text{Nº de piezas de divulgación entregadas (337)} \times 100}{\text{Nº de piezas de divulgación proyectadas (337)}}$	100%

Durante el presente periodo se dio cumplimiento al 100% de productividad. A que se hizo el proceso de divulgación de las pizas de divulgación programadas y entregadas.

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Garantizar la atención a los ciudadanos mediante el punto de atención físico, línea telefónica y correo electrónico.

Mediante el plan de gestión social la profesional social de la firma contratista emitió la información correspondiente al Punto de Atención al Ciudadano y se relaciona a continuación:

Tabla 9- Información general PAC

INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN	calle 25 sur # 68 F -67
TELÉFONO	3165639269.
CORREO ELECTRÓNICO	gsparqueskennedy827 @gmail.com.
DÍAS	Lunes, martes y viernes
HORARIOS	8:00 a.m. a 10:00 a.m.
RESPONSABLE	Yesica Agudelo González

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Durante el periodo no se recibieron solicitudes por parte de la comunidad. El indicador de seguimiento se relaciona a continuación:

Tabla 10– Indicador de gestión (Programa atención al ciudadano)

INDICADOR DE GESTIÓN	
INDICADOR	FÓRMULA
PAC	$\frac{\text{Nº de PAC vigentes en el periodo (1)} \times 100\%}{\text{Nº de PAC requeridos contractualmente (1)}} = 100\%$
Productividad PQRS	$\frac{\text{Nº de PQRS atendidas durante el periodo (N/A)} \times 100\%}{\text{Nº de PQRS recibidas en el periodo (N/A)}} = \text{N/A}\%$

Anexo 4– Registro fotográfico PAC

9. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Objetivo: propender la pertenencia, la apropiación de la obra a desarrollar y ser multiplicadores de información ante la comunidad, se establecerá un comité de participación ciudadana para el contrato o de acuerdo con lo que la comunidad solicite.

Inscripción Comités de Participación Ciudadana:

Durante el periodo no se realizó la inscripción de los integrantes de los comités de participación, ya que, por las dinámicas del contrato, no se programan más reuniones informativas de inicio. Las inscripciones de los diferentes parques se reportaron en cada uno de los informes anteriormente radicados.

Durante el periodo se realizaron reuniones correspondientes a los comités de participación ciudadana. Las características de cada reunión se relacionan a continuación:

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Tabla 11– Generalidades CPC

GENERALIDADES COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PARQUE	FECHA	HORA	LUGAR	ASISTENTES
08-620 Santa Catalina 1 Y 2 Sector	14/08/2023	8:00 a.m.	Parque	3
08- 253 Urbanización La Gran Britalia		10:00 a.m.		8
08-153 Bertha Hernández de Ospina		12:00 a.m.		9
08-681 Urbanización Tayrona		2:00 p.m.		2
08-382 Ciudad Kennedy Occidental Manzana 14		3:00 p.m.		5

Anexo 5– Soportes de verificación Comités de participación

10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Objetivo: crear escenarios de participación ciudadana, a través de la información con el propósito de generar sostenibilidad, uso y cuidado de los parques.

Durante el periodo comprendido del presente informe las actividades a desarrollar en la ejecución del programa son:

- Entrega y socialización del manual de mantenimiento y conservación del parque.

En el periodo no se realizó la reunión informativa de finalización y/o entrega de ningún parque en consideración de la programación y las dinámicas del contrato. Por tal razón no se requiere la socialización del manual y conservación.

- Jornadas de educación y sensibilización ambiental.

Para el periodo no se realizaron actividades en este programa ya que la dinámica de la obra no las generó.

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

11. PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES

Objetivos: Capacitar a los trabajadores de acuerdo a las dinámicas y actividades del contrato

Durante el periodo se brindó una capacitación de líneas de atención al ciudadano por parte de la profesional social del contratista. La actividad se realizó el día 14 de agosto del 2023. A continuación, se relaciona el indicador de productividad y participación:

Tabla 12– Indicador de cumplimiento- Programa de socialización

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	FÓRMULA
Productividad	$\frac{\text{Nº de socializaciones a los trabajadores del proyecto ejecutadas (1)}}{\text{Nº de socializaciones a los trabajadores del proyecto programadas (1)}} \times 100\% = 100\%$
Participación	$\frac{\text{Nº de empleados capacitados en el periodo (46)}}{\text{Nº de empleados en el periodo (46)}} \times 100\% = 100\%$

Como se logra evidenciar en el indicador, durante el periodo se registró una productividad y participación del 100%. Ya que se realizaron las actividades programadas y se contó con la participación de todos los empleados del proyecto.

Anexo 6 - Programa de capacitación trabajadores (Soportes de verificación)

12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Objetivos:

- Generar la vinculación de personal no calificado y/o vulnerable, para lo cual se dará cumplimiento con el porcentaje de 10%, requerido en los pliegos de personal no calificado de la Alcaldía Local de Kennedy.
- Contribuir a la disminución de indicadores de desempleo en la zona de influencia directa del proyecto.

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Seguimiento generación de empleo MONC:

Para el seguimiento en lo que concierne el cumplimiento de las obligaciones generales de los numerales 22 y 23 de la CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR de la minuta del CIN-819-2022 donde indica:

22. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.

23. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

La firma contratista en las reuniones informativas de inicio (como se evidencia en las presentaciones adjuntas en el programa de información) de todos los parques, indica la importancia del promover el empleo local y la vinculación de MONC, dispone de las líneas de atención al ciudadano para la recepción de las hojas de vida.

Así mismo, el día 31 de marzo del presente año se radico mediante correo electrónico la solicitud de las hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada de la localidad de Kennedy a las siguientes entidades:

- SENA
- Secretaría De Desarrollo Económico
- Secretaria Distrital de Gobierno

Los soportes de verificación de los radicados anteriormente mencionados se reportaron en el informe mensual N° 2

Para realizar el seguimiento del personal de mano de obra no calificada de la localidad, se relaciona el siguiente indicador:

Tabla 13– Indicador de MONCL

INDICADOR	FÓRMULA	PORCENTAJE
Contratación MONC	$\frac{\text{Nº de personal contratado MONC de la localidad (3)}}{\text{Nº de personas contratadas de MONC (20)}} \times 100$	15%

Como se logra evidenciar en el indicador se da el cumplimiento del 15% de mano de obra no calificada de la localidad.

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Seguimiento mujeres vinculadas:

El cumplimiento de la obligación general No. 91 de la cláusula séptima. - obligaciones generales del interventor de la minuta del CIN-819-2022, donde indica:

9. Vincular y mantener mínimo el 9.3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.

A continuación, se relacionan las mujeres vinculadas:

Tabla 14– Personal de mujeres vinculadas

Nº	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Sandra Liliana Galindo	Residente de transito	Contratista
2	Yesica Agudelo Gonzáles	Residente social	Contratista
3	Ingrid Baéz	Residente SST	Contratista
4	Diana Segura Santamaría	Residente ambiental	Contratista
5	Natalia Urrea Céspedes	Auxiliar Administrativa	Contratista
6	Leidy Yohana Duque	Boal	Contratista
7	Eliana Mendieta	Apoyo Social	Contratista
8	Yamile Merchán	Apoyo Social	Contratista
9	Andrea del Pilar Rubio	Directora	Interventoría
10	Gina Paola Garzón	Residente ambiental	Interventoría

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

11	Leidy Julieth Cardona	Residente SST	Interventoría
12	Diana Marcela Ortiz	Residente social	Interventoría
13	Diana Patricia Ramírez	Profesional de costos	Interventoría
14	Heidy Lizeth Ortegon	Auxiliar técnico (cadenero)	Interventoría

Al verificar la información de la firma contratista el personal, corresponde a 46 personas y en la interventoría el contractualmente aprobado son 11 para un total de 57 personas vinculadas al contrato, de las cuales 14 corresponde a mujeres, como se clasifico en la anterior tabla. Se puede evidenciar el indicador de mujeres vinculadas al proyecto, que se relaciona a continuación:

Tabla 15– Indicador de mujeres vinculadas en el proyecto

INDICADOR	FORMULA
<u>Porcentaje de mujeres vinculadas</u>	$\frac{\text{Mujeres vinculadas en el proyecto (14)} \times 100\%}{\text{Personal vinculado en el proyecto (57)}} = 24 \%$

El porcentaje de participación de mujeres vinculadas al proyecto es del 24%. Dando cumplimiento al plan de gestión social.

El cuanto la obligación general No. 10 de la cláusula séptima. - obligaciones generales del interventor de la minuta del CIN-819-2022, donde menciona:

10. *Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 9,3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.*

Así como se establece esta actividad se desarrolla de manera bimensual y por ende esta se adjuntó en el informe mensual N° 4 y en el presente informe se realiza la remisión del

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

mismo. Igualmente, la relación de las planillas está en el informe interventoría Anexo 1 y contratista Anexo 4.

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.

Esta actividad se reportó en el informe mensual N° 2 y a la fecha el contratista vinculó una mujer más en el personal, quien cuenta con el debido registro en la plataforma solicitada y se reportó en el informe mensual N° 4.

Seguimiento Población diferencial:

Para el periodo se verifica también la cantidad de personal en condición de población diferencial y se relaciona el indicador a continuación:

Tabla 16– Indicador Población diferencial

INDICADOR	FORMULA
<u>Porcentaje población diferencial</u>	$\frac{\text{Personal vinculado durante el periodo (1)} \times 100\%}{\text{Personal establecido en el contrato (1)}} = 100 \%$

El personal solicitado mediante el pliego de condiciones de la firma contratista es de una persona y así mismo en el periodo se dio cumplimiento para un total del 100%.

Anexo 7 – Programa de generación de empleo (Soportes de verificación)

13. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO – ACTIVIDADES TÉCNICAS

Actas de vecindad de inicio:

Durante el periodo no se realizó la ninguna actividad relacionada con las actas de vecindad de inicio por las dinámicas del contrato.

Actas de Vecindad de Cierre de Obra:

Para el periodo del presente informe no se realizó ninguna acta de vecindad de finalización por las dinámicas del contrato.

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes:

En el presente informe no se relaciona ninguna actividad de inspección o inventario ya que estas fueron reportadas en los informes anteriormente radicados.

Actas y compromisos / Acompañamiento social Actividades Técnicas:

Para las actividades relacionadas al acompañamiento al área técnica se relacionan a continuación

Tabla 17– Consolidación de acompañamiento

Consolidación de acompañamiento			
Parque	Fecha	solicitante	Actividad
Unir primera etapa sectores I y II COD 08-096	01/08/2023	Comunidad	Se realiza acompañamiento social al área técnica del contratista para la entrega del mobiliario infantil a la Junta de acción comunal

Anexo 8- Programa Acompañamiento social –Actividades técnicas

14. REPORTES DE SEGUIMIENTO

Reportes Periódicos

- Para este periodo de interventoría y contratista realizó acompañamiento al comité integral de obra que se realiza en la oficina de la firma contratista y a través de la plataforma Meet.
- Se realiza verificación de los informes semanales como seguimiento al plan de acción del componente social, los cuales son aprobados en el informe mensual. En los informes se relaciona el seguimiento a cada uno de los programas
- La interventoría realiza acompañamiento desde las áreas encargadas en el levantamiento de las actas de vecindad y reuniones informativas de inicio, avance y comités de participación ciudadana.

Anexo 9 – Informes semanales contratista – Reuniones de seguimiento

Informe Mensual

- El 22 de agosto se recibió el informe mensual del componente social de la firma contratista del periodo comprendido del 15 de julio al 14 de agosto del 2023. La

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

interventoría emite observaciones el día 28 de agosto y estas son subsanadas el día 31 de agosto. Se emite aprobación por parte de la interventoría el día 02 de septiembre.

Anexo 10 – Aprobación Informe mensual N° 5

15. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Durante el periodo comprendido del 15 de julio al 14 de agosto se realizó el seguimiento del componente social en los comités de obra.

16. ANEXOS:

Anexo 1 – Programa de información – Reuniones de avance (aprobación de las presentaciones, presentaciones, actas, listados de asistencia y registro fotográfico)	11
Anexo 2 – Programa de divulgación (soportes - PSI)	12
Anexo 3 – Programa de divulgación (volantes y soportes de entrega).....	13
Anexo 4 – Registro fotográfico PAC.....	14
Anexo 5 – Soportes de verificación Comités de participación	15
Anexo 6 - Programa de capacitación trabajadores (Soportes de verificación)	16
Anexo 7 – Programa de generación de empleo (Soportes de verificación)	20
Anexo 8 - Programa Acompañamiento social –Actividades técnicas.....	21
Anexo 9 – Informes semanales contratista – Reuniones de seguimiento.....	21
Anexo 10 – Aprobación Informe mensual N° 5.....	22

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 1

Programa de información – Reuniones de avance
(aprobación de las presentaciones, presentaciones,
actas, listados de asistencia y registro fotográfico)

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:10 a. m del día 10 de agosto del 2023, se da apertura a la reunión de avance del parque Pinar de Rio, Identificado con código IDRDR 08-123, de manera presencial en el parque.

Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.

Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión, a lo que el total de asistentes autoriza grabar la reunión.

La residente social la T.S Yesica Agudelo, informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.

Comienza informando el orden del día.

1. Características del contrato
2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
3. Presentación del contratista
4. Presentación de la interventoría
5. Objetivos y tipo del proyecto
6. Acciones contempladas para la zona de intervención
7. Programa de Gestión Social
8. Programa de Manejo Ambiental
9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo
10. Inquietudes de la comunidad.

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración.

Informa las características del contrato manifestando que el contratista que esta realizando la ejecución del contrato es el Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Recuerda a los asistentes que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa a los responsables de la ejecución del proyecto.

Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”.

Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.

Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de las actividades realizadas a la fecha por cada una de las áreas.

Toma la palabra la residente social del contratista e informa, sobre las actividades realizadas en esta área las cuales se relacionan a continuación

- **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato se realizó la reunión de inicio donde se informó sobre las generalidades del contrato; también la compone la reunión de avance que es la que se está ejecutando porque el avance de obra ya supero el 50% de ejecución.

- **Programa de Divulgación:** Se informa que todas las convocatorias y actividades importantes se han dado a conocer por medio de volantes, los cuales han sido entregados predio a predio e instalados en el punto satélite que se encuentra en la cartelera del salón comunal.

- **Programa de atención al ciudadano:** Se recuerda a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas, reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se recuerda el número celular de atención a la comunidad 3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.

- **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Se informa que se ha venido capacitando a los empleados del proyecto en diferentes temas con el fin de fortalecer los procesos de obra.

- **Programa de Control social:** Se informa a los asistentes que se realizó el comité de

participación ciudadana donde se conto con la participación de todas las personas inscritas al comité de participación ciudadana.

- **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad, para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir, por lo que en la reunión de finalización se entregará el manual de mantenimiento del parque, un folleto de sostenibilidad y un folleto de educación ambiental para cuidar el ecosistema que se intervino.

- **Programa para la generación de empleo:** se informa que a la fecha se mantiene el 13 % de contratación de mano de obra no calificada de la localidad.

- **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que previo a las actividades de obra se levantó el acta de inspección preliminar y el inventario de elementos existentes del parque por si se presenta alguna eventual afectación en el área aferente al parque, poder verificar si ya se encontraba a si o es producto de los trabajos de obra en el parque y poder proceder a su correspondiente reparación.

- **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Para dar cumplimiento a este programa se mantienen instaladas las vallas de identificación de los parques y se suministra la dotación a los empleados, de acuerdo con la identidad visual de la administración actual.

Una vez terminada la intervención del área de gestión social, se da la palabra a la profesional encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la ingeniera Ingrid Báez quien informa sobre las actividades realizadas a la fecha.

- **Medicina del trabajo:** El contratista está dando cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro

- **Medicina Preventiva:** Se realizan capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.

- **Higiene Industrial:** Se hacen Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.

- **Seguridad industrial:** Se da cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor

- **Elementos de Protección personal:** Se hace entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

- **Brigadas de Emergencia:** Se formó una brigada de emergencia a la que se capacitó en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.

Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa las actividades en el área realizadas a la fecha.

- **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se realizó la protección de los individuos arbóreos que se encuentran en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.

- **Retiro de material de excavación:** Se está haciendo el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.

- **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se ha mantenido cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.

- **Puntos Ecológicos:** Se esta haciendo la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los parques.

- **Protección de sumideros:** Se esta realizando la protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentran en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra

- **Implementación de PMT:** Continúa instalada la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez se informan sobre las actividades en el área ambiental, se da la palabra al área técnica quien informa las actividades realizadas a la fecha.

- Excavación, instalación de material de relleno, instalación de bordillos, fundida de placa en concreto en la zona de los biosaludables.
- Toma de densidades y compactación de material en la placa de biosaludables, instalación de tubería de desagüe de la zona de juegos infantiles.
- Instalación de piso en caucho negro (SBR) en la zona de juegos infantiles
- Instalación de juegos infantiles y pintura de baranda M-80

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Una vez se da la información de las actividades por área se da paso a las dudas e inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad

Uno de los asistentes a la reunión pregunta que con que acabado queda el piso de la zona de las máquinas biosaludables

RTA: Se informa que el acabado será con pintura sintética de lato tráfico con diseño a dos colores.

Uno de los asistentes a la reunión manifiesta que la comunidad no está de acuerdo con que se deje una zona verde en el parque ya que se prestaría la zona para el uso de las mascotas.

RTA: Se informa que todos los parques deben contar con un porcentaje de zona verde, de igual manera se informa que se instalarán unas señales cívicas las cuales tienen la información de recoger los excrementos de las mascotas.

Uno de los asistentes a la reunión pregunta si se instalarán canecas y bancas.

RTA: Se informa que no se tienen contemplado instalar canecas ni bancas.

Uno de los asistentes a la reunión pregunta si hay posibilidad de instalar bolardos

RTA: Se informa que se consultará con el FDLK y la interventoría y se dará una respuesta en la próxima reunión.

Uno de los asistentes a la reunión pregunta si se adecuara una rampa para discapacitados en el sendero peatonal.

RTA: Se informa que el sendero contará con 2 rampas para el ingreso de personas en condición de discapacidad.

Teniendo en cuenta que no se presentan más dudas por parte de la comunidad se da por terminada la reunión.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN


No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Consultar con el FDLK y la interventoría la posibilidad de instalar bolardos	Contratista, interventoría y FDLK	Próxima reunión

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:


Lugar de la próxima reunión: N/A

FORMATO										BOGOTÁ		
LISTA DE ASISTENCIA												
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN				
FO-PE-13		PLANEACION ESTRATEGICA						4				
Tipo de Evento:		Reunión		Lugar		Parque Pinar del Rio				Fecha		
Nombre Evento		Reunión de avance Parque Pinar del Rio										
Hora de inicio		9:10 am		Duración (horas)		10:15 am		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☒ Uso interno(exclusivo para el área/proc) ☐ Clasificada ☐ Reservado		
Área Organizadora		Gestión Social										
#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Contacto	Dependencia/Entidad	Tipo Vinculación (Planta-Contratista Apoyo a la gestión-Externo)			Sexo(Hombre-Mujer-Intersexual)			e-mail	Firma
					P	C	E	H	M	I		
1	Silvestre Garavito	7940304	312649355	Comunidad			X	X			Silvestre.Garavito.1966@gmail.com	[Firma]
2	Mauricio Castaño	80157603	321343277	Comunidad			X	X			mauricio.sanchez27981@hotmail.com	[Firma]
3	Jose Diaz	17156459	3143939616	Comunidad			X	X			Valentina.yoan@gmail.com	[Firma]
4	Ana delly Pato	52506607	3115363489				X		X			
5	Desiderio Guzman	79520268	322780290	Cultura			X	X				[Firma]
6	Rosario Castellanos	41499864	3138784526				X		X			Rosario Castellanos
7	Lairo Pastillan	19105163		Comunidad			X	X				[Firma]
8	Edgar Cortez	191043441		Comunidad			X	X				[Firma]
9	Jorge R. Sosa	19142690		Comunidad			X	X				[Firma]
10	ISAIRAS CORDOBA	12059896		Baso TL			X	X				[Firma]
11	Gladys Garcia	112055915	3112954079	JAC Pinar			X		X			Gladys Garcia
12	Alba Neusa	31340682	311269426	JAC Pinar J			X		X		albanusa@gmail.com	[Firma]
13	Jorge Vera	19179996	3125713443	JAC			X	X			jac.pinar.deldrio	[Firma]
14	EDUARDO FALLA	19488104	3167251006	JAC Pinar J			X	X				[Firma]
15	Myriam Flores	65498338	3178541911	Comunidad			X		X		Myriam.FL65@gmail.com	[Firma]
16	Lisa Caceres	1110589519	3008420094	Interventura	X				X		Caceres.lisa@gmail.com	[Firma]

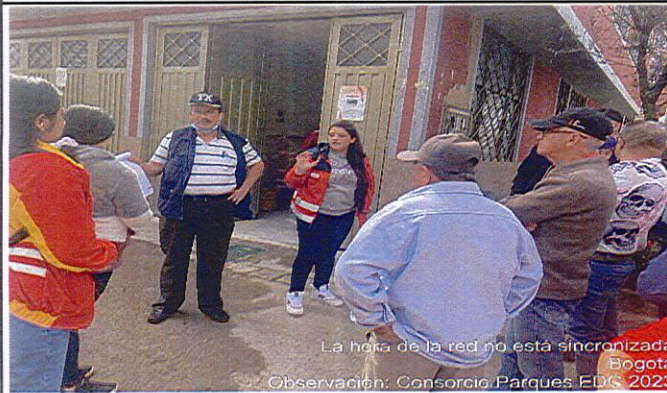CONSORCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE PINAR DEL RIO CÓDIGO IDRD 08-123	
 <p>La hora de la red no está sincronizada Bogotá Observación: Consorcio Parques EDC 2023</p>	 <p>Red: 10/08/2023, 9:25:35 a.m., CO Bogotá Observación: Consorcio Parques EDC 2023</p>	
FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE PINAR DEL RIO CÓDIGO IDRD 08-123	FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE PINAR DEL RIO CÓDIGO IDRD 08-123	
 <p>La hora de la red no está sincronizada Bogotá Observación: Consorcio Parques EDC 2023</p>	 <p>Red: 10/08/2023, 9:17:55 a.m., CO Bogotá Observación: Consorcio Parques EDC 2023</p>	
FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE PINAR DEL RIO CÓDIGO IDRD 08-123	FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE PINAR DEL RIO CÓDIGO IDRD 08-123	



1



2

ORDEN DEL DÍA

1. Información del contrato.
2. Presentación de las entidades responsables del proyecto.
3. Construcción integral de las obras:
 - Componente gestión social
 - Componente área SST,
 - Componente área ambiental
 - Componente área técnica
4. Inquietudes de la comunidad.



3

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista : Consorcio parques EDC 2023

Contrato : 827 de 2022

Objeto: “Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy”.

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2023

Fecha de terminación: 14 de septiembre del 2023

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local De Kennedy



4

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO

Presentación Alcaldía local de Kennedy

Alcaldesa Local: Yeimy Carolina Agudelo Hernández



5

PRESENTACIÓN CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Director de obra: Ing. Alfredo Granados

Inspector de obra: Ing. Jimmy Melly Letrado Peña

Residente técnico: Ing. José Peña

Residente ambiental: Ing. Diana Santamaría Segura

Residente SST: Ing. Ingrid Báez Sanabria

Residente social: T.S Yesica Agudelo

Datos de contacto

Email: gsparqueskennedy827@gmail.com

Teléfono: 316 563 92 69



6

PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA CABA INTERVENTORIA S.A.S

Director de Obra: Arq. Andrea Del Pilar Rubio Ramírez

Residente Técnico: Ing. Alfredo Callejas Vallejo

Residente S.S.T : Ing. Leidy Cardona Cáceres

Residente Ambiental: Ing. Gina Garzón

Residente Social: T.S Diana Marcela Ortiz

Inspectora Técnica: Gina Mariño

Datos de contacto

Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com

Teléfono: 601-7530396



7

PARQUE OBJETO DE INTERVENCIÓN

PARQUE	CODIGO	TIPO DE PARQUE	DIRECCIÓN
Pinar del Rio	08-123	Parque de escala vecinal	CALLE 39A SUR N 83A 16



8

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

1. Programa de información
2. Programa de divulgación.
3. Programa de atención al Ciudadano
4. Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra
5. Programa de control social
6. Programa de sostenibilidad
7. Programa para la generación de empleo
8. Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
9. Cumplimiento de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital



9

GESTIÓN SOCIAL



PROGRAMA DE INFORMACIÓN
Reunión de inicio



PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Volantes y puntos satélites de información




10

GESTIÓN SOCIAL



**INSTALACIÒN DE PUNTOS SATÉLITES DE
INFORMACIÒN**

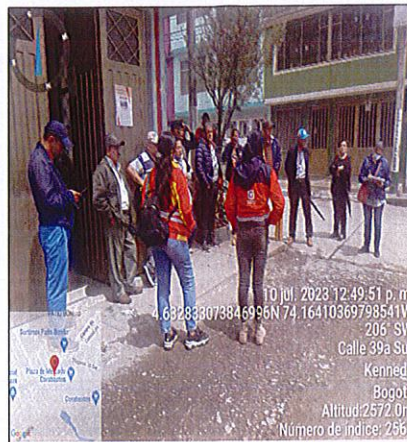

COMITÉ DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA



11


GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS Componente social

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Dirección: Calle 25 sur No 68f - 67
- Barrio: La llanura
- Correo electrónico: gsparqueskennedy827@gmail.com
- Teléfono: 3165639269
- Residente social: Yesica Agudelo

HORARIO DE ATENCIÓN

- Martes, jueves y Viernes de 8:00 am a 4:00 pm




12

COMPONENTE S.S.T. (seguridad y salud en el trabajo)

1. Medicina del trabajo.
2. Medicina preventiva.
3. Higiene industrial.
4. Seguridad industrial.
5. Elementos de protección personal.
6. Jornada de orden y aseo

13

COMPONENTE S.S.T. (seguridad y salud en el trabajo)

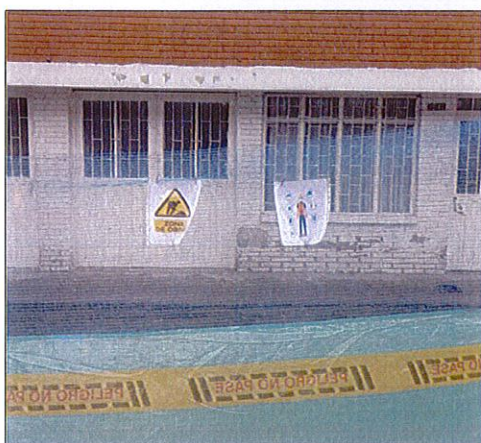


SEÑALIZACIÓN DE OBRA



ENTREGA DE DOTACION

14

COMPONENTE S.S.T. (seguridad y salud en el trabajo)

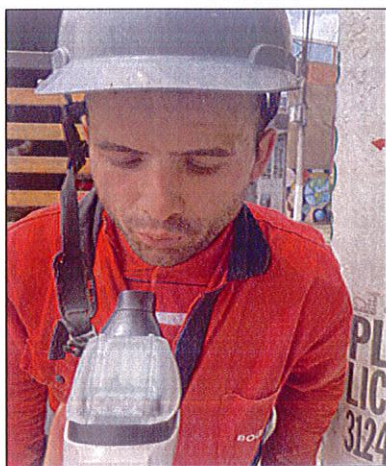

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA



CAMILLA DE EMERGENCIA



15


COMPONENTE AMBIENTAL

1. Protección de individuos arbóreos.
2. Retiro de material de excavación.
3. Acopio de materiales.
4. Puntos ecológicos.
5. Protección de sumideros.
6. Implementación de P.M.T.



16

COMPONENTE AMBIENTAL

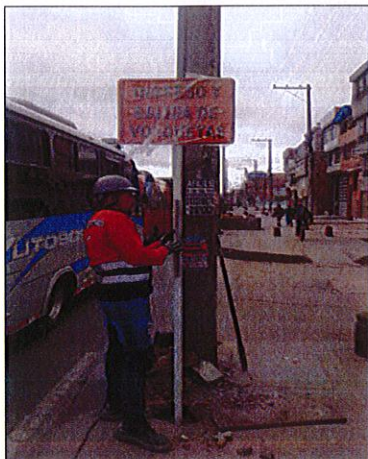

INSTALACIÓN DE PMT



PROTECCIÓN DE MATERIAL DE OBRA



17

COMPONENTE AMBIENTAL



RETIRO DE ESCOMBROS




PROTECCIÓN DE
INDIVIDUOS ARBOREOS



18

COMPONENTE TÉCNICO

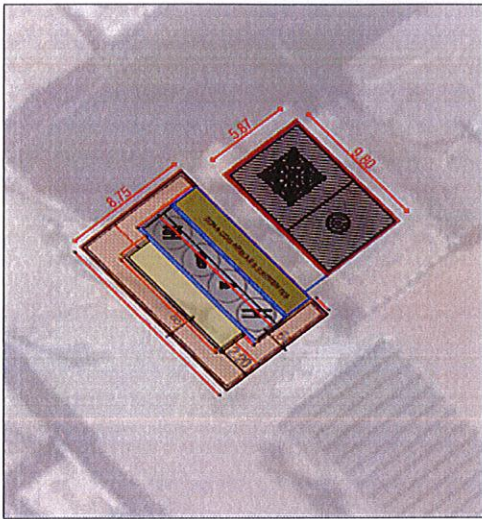

PARQUE PINAR DEL RIO CÓD. 08-123


- ✓ Adecuación zona de juegos infantiles
- ✓ Adecuación de zona de biosaludables
- ✓ Adecuación de senderos de conexión
- ✓ Instalación de señalización



19

COMPONENTE TÉCNICO

ZONA DE BIOSALUDABLES

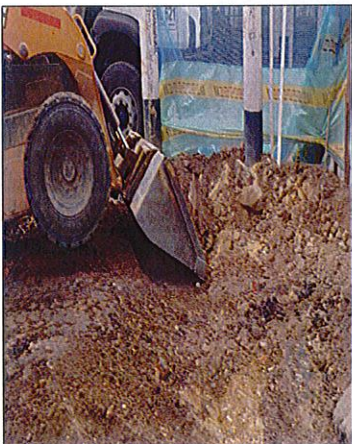


Excavación, instalación de material de relleno, instalación de bordillos, fundida de placa en concreto



20

COMPONENTE TÉCNICO

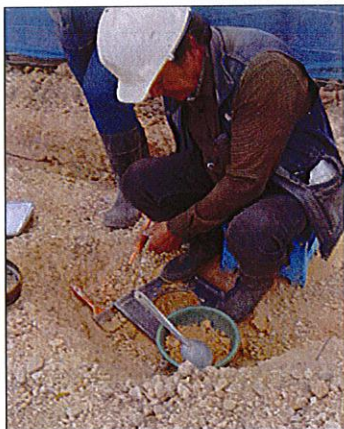

Toma de densidades, compactación de material, instalación de tubería de desagüe



21

COMPONENTE TÉCNICO





Compactación de material, instalación de piso en caucho negro (SBR)



22

COMPONENTE TÉCNICO

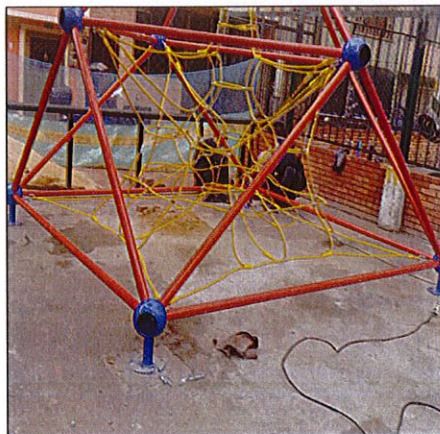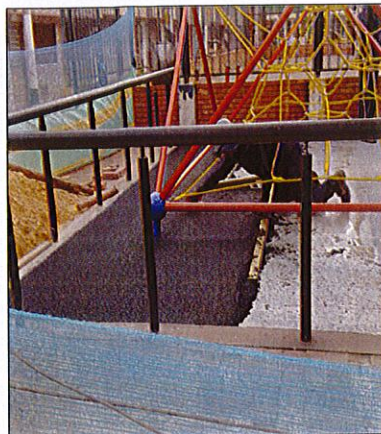

Instalación de juegos infantiles, pintura de baranda M-80



23

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Generación de empleo.
- Mejorará la movilidad peatonal
- Mejoramiento de imagen del sector.



24

RECOMENDACIONES

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.



25

ESPACIO PARA PREGUNTAS



26

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 1:30 p.m. del día 10 de agosto del 2023, se asiste por parte de interventoría y contratista a la reunión de avance del parque 08-186 Desarrollo Campo Hermoso, de manera presencial en el parque.

Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.

Se realizó una espera prudencial por 30 minutos, pero no acudió la comunidad por tal motivo los profesionales asistentes firman la planilla de asistencia como evidencia de la asistencia así mismo se toma registro fotográfico.

Con el fin de mantener informada a la comunidad se remitirá la presentación de la reunión de avance al presidente de la junta de acción comunal.

Inquietudes de la comunidad

No se presentó comunidad a la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	No se generaron compromisos durante la reunión de avance	N/A	N/A

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: N/A

FORMATO												
LISTA DE ASISTENCIA												
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN		BOGOTÁ		
FO-PE-13		PLANEACION ESTRATEGICA						4				
Tipo de Evento:		Reunión		Lugar		Parque Desarrollo Campo Hermoso				Fecha		
Nombre Evento		Reunión de avance Parque Desarrollo campo Hermoso código 08-186								10 08 2023		
Hora de inicio		1:30 PM		Duración (horas)		2:00 PM		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☒ Uso interno(exclusivo para el área/proc) ☐ Clasificada ☐ Reservado		
Área Organizadora		Gestión social										
#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Contacto	Dependencia/Entidad	Tipo Vinculación (Planta-Contratista Apoyo a la gestión-Externo)			Sexo(Hombre-Mujer-Intersexual)			e-mail	Firma
					P	C	E	H	M	I		
1	Vesca Aguado	52.288949	3216725088	Res. social			X		X		gsparqueskennedy27@gmail.com	Vesca Aguado
2	Ingrid Baer	1010208845	3023564573	Contratista		X			X		residentesst@gmail.com	Ingrid Baer
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

CONSORCIO PARQUES EDC 2023		REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓDIGO IDRD 08-186		 Alcaldía Local de Kennedy	
 <p>10 ago. 2023 1:53:05 p. m. 4.640679792501032N 74.16429044678807W 109° E 88-51 Calle 34 Bis Sur Kennedy Bogotá Altitud:2587.0m Número de índice: 2643</p>		 <p>10 ago. 2023 1:53:13 p. m. 4.640674344263971N 74.16428952477872W 119° SE #88c-29 Calle 34 Bis Sur Kennedy Bogotá Altitud:2586.0m Número de índice: 2645</p>			
FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓDIGO IDRD 08-186		FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓDIGO IDRD 08-186			
 <p>10 ago. 2023 1:53:15 p. m. 4.640674344263971N 74.16428952477872W 131° SE #88c-29 Calle 34 Bis Sur Kennedy Bogotá Altitud:2586.0m Número de índice: 2646</p>		 <p>10 ago. 2023 1:53:07 p. m. 4.640679792501032N 74.16429044678807W 108° E 88-51 Calle 34 Bis Sur Kennedy Bogotá Altitud:2587.0m Número de índice: 2644</p>			
FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓDIGO IDRD 08-186		FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓDIGO IDRD 08-186			

Reunión de avance
Contrato de obra pública
827 de 2022
Parque Desarrollo Campo
Hermoso
CÓD.IDRD. 08-186
Localidad de Kennedy



1

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para mayor agilidad de la reunión, escuche atentamente y reserve sus preguntas para el final.
- Por favor diligenciar la lista de asistencia con nombre completo, teléfono y correo electrónico.
- Al intervenir en la reunión mantenga un tono de voz agradable, recomendable usar un lenguaje respetuoso y una comunicación asertiva.



2

ORDEN DEL DÍA

1. Información del contrato.
2. Presentación de las entidades responsables del proyecto.
3. Construcción integral de las obras:
 - Componente gestión social
 - Componente área SST,
 - Componente área ambiental
 - Componente área técnica
4. Inquietudes de la comunidad.



3

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista : Consorcio parques EDC 2023

Contrato : 827 de 2022

Objeto: “Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy”.

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2023

Fecha de terminación: 14 de septiembre del 2023

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local De Kennedy



4

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO

Presentación Alcaldía local de Kennedy

Alcaldesa Local: Yeimy Carolina Agudelo Hernández



5

PRESENTACIÓN CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Director de obra: Ing. Alfredo Granados

Inspector de obra: Ing. Jimmy Melly Letrado Peña

Residente técnico: Ing. José Peña

Residente ambiental: Ing. Diana Santamaría Segura

Residente SST: Ing. Ingrid Báez Sanabria

Residente social: T.S Yesica Agudelo

Datos de contacto

Email: gsparqueskennedy827@gmail.com

Teléfono: 316 563 92 69



6

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

1. Programa de información
2. Programa de divulgación.
3. Programa de atención al Ciudadano
4. Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra
5. Programa de control social
6. Programa de sostenibilidad
7. Programa para la generación de empleo
8. Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
9. Cumplimiento de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital



9

GESTIÓN SOCIAL



PROGRAMA DE INFORMACIÓN
Reunión de inicio



PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Volantes y puntos satélites de información



10

GESTIÓN SOCIAL



INSTALACIÓN DE PUNTOS SATÉLITES DE
INFORMACIÓN



11

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS


Componente social

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Dirección: Calle 25 sur No 68f - 67
- Barrio: La llanura
- Correo electrónico: gsparqueskennedy827@gmail.com
- Teléfono: 3165639269
- Residente social: Yesica Agudelo

HORARIO DE ATENCIÓN

- Martes, jueves y Viernes de 8:00 am a 4:00 pm

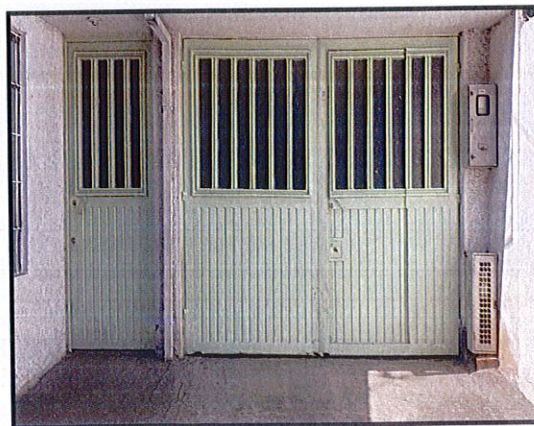

12


COMPONENTE S.S.T. (seguridad y salud en el trabajo)

1. Medicina del trabajo.
2. Medicina preventiva.
3. Higiene industrial.
4. Seguridad industrial.
5. Elementos de protección personal.
6. Jornada de orden y aseo



13

COMPONENTE S.S.T. (seguridad y salud en el trabajo)

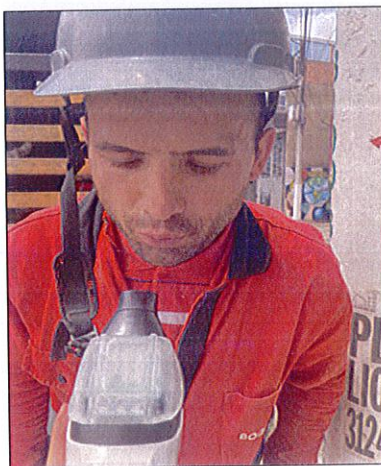

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA



14

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Protección de individuos arbóreos.
2. Retiro de material de excavación.
3. Acopio de materiales.
4. Puntos ecológicos.
5. Protección de sumideros.
6. Implementación de P.M.T.



15

COMPONENTE AMBIENTAL




Implementación del cerramiento



16

COMPONENTE TÉCNICO

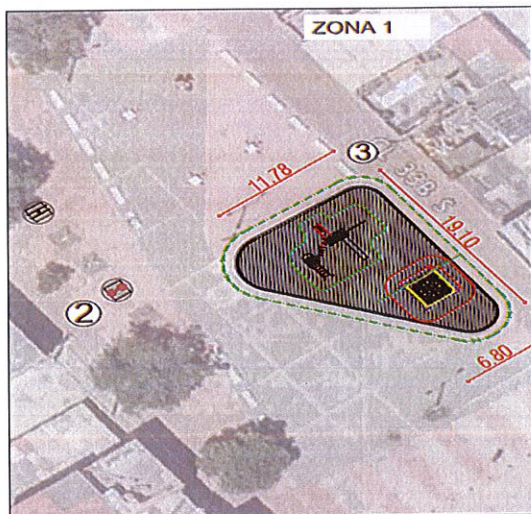

PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓD. 08-186

- ✓ Mantenimiento zona de juegos infantiles
- ✓ Mantenimiento máquinas biosaludables



17

COMPONENTE TÉCNICO



Retiro de piso en caucho, Desmonte de juego infantil M-5, instalación de mobiliario infantil nuevo



18

COMPONENTE TÉCNICO



Lijado de juego infantil existente



19

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Generación de empleo.
- Mejorará la movilidad peatonal
- Mejoramiento de imagen del sector.



20

RECOMENDACIONES

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.



21

ESPACIO PARA PREGUNTAS



22

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:30 p.m. del día 10 de agosto del 2023, se da apertura a la reunión de avance del parque Riveras de occidente, Identificado con código IDRD 08-006, de manera presencial en el parque.

Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.

Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión, a lo que el total de asistentes autoriza grabar la reunión.

La residente social la T.S Yesica Agudelo, informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.

Comienza informando el orden del día.

1. Características del contrato
2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
3. Presentación del contratista
4. Presentación de la interventoría
5. Objetivos y tipo del proyecto
6. Acciones contempladas para la zona de intervención
7. Programa de Gestión Social
8. Programa de Manejo Ambiental
9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo
10. Inquietudes de la comunidad.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración.

Informa las características del contrato manifestando que el contratista que está realizando la ejecución del contrato es el Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.

Recuerda a los asistentes que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa a los responsables de la ejecución del proyecto.

Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”.

Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.

Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de las actividades realizadas a la fecha por cada una de las áreas.

Toma la palabra la residente social del contratista e informa, sobre las actividades realizadas en esta área las cuales se relacionan a continuación

- **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato se realizó la reunión de inicio donde se informó sobre las generalidades del contrato; también la compone la reunión de avance que es la que se está ejecutando porque el avance de obra ya supero el 50% de ejecución.

- **Programa de Divulgación:** Se informa que todas las convocatorias y actividades importantes se han dado a conocer por medio de volantes, los cuales han sido entregados predio a predio e instalados en el punto satélite que se encuentra en la cartelera del salón comunal.

- **Programa de atención al ciudadano:** Se recuerda a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas, reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se recuerda el número celular de atención a la comunidad

EVIDENCIA DE REUNIÓN

3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.

• **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Se informa que se ha venido capacitando a los empleados del proyecto en diferentes temas con el fin de fortalecer los procesos de obra.

• **Programa de Control social:** Se informa a los asistentes que se realizó el comité de participación ciudadana donde se conto con la participación de todas las personas inscritas al comité de participación ciudadana.

• **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad, para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir, por lo que en la reunión de finalización se entregará el manual de mantenimiento del parque, un folleto de sostenibilidad y un folleto de educación ambiental para cuidar el ecosistema que se intervino.

• **Programa para la generación de empleo:** se informa que a la fecha se mantiene el 13 % de contratación de mano de obra no calificada de la localidad.

• **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que previo a las actividades de obra se levantó el acta de inspección preliminar y el inventario de elementos existentes del parque por si se presenta alguna eventual afectación en el área aferente al parque, poder verificar si ya se encontraba a si o es producto de los trabajos de obra en el parque y poder proceder a su correspondiente reparación.

• **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Para dar cumplimiento a este programa se mantienen instaladas las vallas de identificación de los parques y se suministra la dotación a los empleados, de acuerdo con la identidad visual de la administración actual.

Una vez terminada la intervención del área de gestión social, se da la palabra a la profesional encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la ingeniera Ingrid Báez quien informa sobre las actividades realizadas a la fecha.

• **Medicina del trabajo:** El contratista está dando cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro

• **Medicina Preventiva:** Se realizan capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.

• **Higiene Industrial:** Se hacen Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

- **Seguridad industrial:** Se da cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor
- **Elementos de Protección personal:** Se hace entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.
- **Brigadas de Emergencia:** Se formó una brigada de emergencia a la que se capacitó en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.

Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa las actividades en el área realizadas a la fecha.

- **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se realizó la protección de los individuos arbóreos que se encuentran en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.
- **Retiro de material de excavación:** Se está haciendo el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.
- **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se ha mantenido cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.
- **Puntos Ecológicos:** Se esta haciendo la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los parques.
- **Protección de sumideros:** Se esta realizando la protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentran en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra
- **Implementación de PMT:** Continúa instalada la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez se informan sobre las actividades en el área ambiental, se da la palabra al área técnica quien informa las actividades realizadas a la fecha.

ZONA 1 – ZONA DE JUEGOS INFANTILES

- Excavación de dados y regata perimetral de zona de juegos infantiles, adecuación de piso para posteriormente instalar el piso caucho negro (SBR)

- Instalación de juegos infantiles y complemento de baranda M-83

ZONA 2 – ZONA DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES

- Corte y fundida de dados de concreto, instalación de máquinas biosaludables

Una vez se da la información de las actividades por área se da paso a las dudas en inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad

Uno de los asistentes a la reunión pregunta que en la zona de los biosaludables porque se instalaron y se volvieron a quitar las máquinas

RTA: Se informa que el supervisor del contrato realizo unas observaciones en cuanto a la ubicación de la máquinas biosaludables, por tal motivo toco retirarlas para distribuirlas de una manera mas organizada.

Una de las asistentes a la reunión pregunta sobre el tiempo de garantía, ya que la comunidad le ha informado que el piso en caucho no les parece que lo estén instalando de una manera adecuada.

RTA: Se informa que el contrato cuanta con las pólizas de estabilidad de dos años a partir de la terminación del contrato, de igual manera se informa que todas las actividades realizadas se hacen con la aprobación de la interventoría.

Teniendo en cuenta que no se presentan más dudas por parte de la comunidad se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	DE
1	No se generaron compromisos durante la reunión de avance	N/A	N/A	

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

GDI-GPD-F029
Versión 2
Vigencia: 09 de mayo de 2018
5 de 5

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:30 p.m. del día 10 de agosto del 2023, se da apertura a la reunión de avance del parque Riveras de occidente, Identificado con código IDRD 08-006, de manera presencial en el parque.

Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.

Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión, a lo que el total de asistentes autoriza grabar la reunión.

La residente social la T.S Yesica Agudelo, informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.

Comienza informando el orden del día.

1. Características del contrato
2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
3. Presentación del contratista
4. Presentación de la interventoría
5. Objetivos y tipo del proyecto
6. Acciones contempladas para la zona de intervención
7. Programa de Gestión Social
8. Programa de Manejo Ambiental
9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo
10. Inquietudes de la comunidad.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración.

Informa las características del contrato manifestando que el contratista que está realizando la ejecución del contrato es el Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.

Recuerda a los asistentes que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa a los responsables de la ejecución del proyecto.

Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”.

Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.

Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de las actividades realizadas a la fecha por cada una de las áreas.

Toma la palabra la residente social del contratista e informa, sobre las actividades realizadas en esta área las cuales se relacionan a continuación

- **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato se realizó la reunión de inicio donde se informó sobre las generalidades del contrato; también la compone la reunión de avance que es la que se está ejecutando porque el avance de obra ya supero el 50% de ejecución.

- **Programa de Divulgación:** Se informa que todas las convocatorias y actividades importantes se han dado a conocer por medio de volantes, los cuales han sido entregados predio a predio e instalados en el punto satélite que se encuentra en la cartelera del salón comunal.

- **Programa de atención al ciudadano:** Se recuerda a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas, reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se recuerda el número celular de atención a la comunidad

EVIDENCIA DE REUNIÓN

3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.

- **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Se informa que se ha venido capacitando a los empleados del proyecto en diferentes temas con el fin de fortalecer los procesos de obra.

- **Programa de Control social:** Se informa a los asistentes que se realizó el comité de participación ciudadana donde se conto con la participación de todas las personas inscritas al comité de participación ciudadana.

- **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad, para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir, por lo que en la reunión de finalización se entregará el manual de mantenimiento del parque, un folleto de sostenibilidad y un folleto de educación ambiental para cuidar el ecosistema que se intervino.

- **Programa para la generación de empleo:** se informa que a la fecha se mantiene el 13 % de contratación de mano de obra no calificada de la localidad.

- **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que previo a las actividades de obra se levantó el acta de inspección preliminar y el inventario de elementos existentes del parque por si se presenta alguna eventual afectación en el área aferente al parque, poder verificar si ya se encontraba a si o es producto de los trabajos de obra en el parque y poder proceder a su correspondiente reparación.

- **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Para dar cumplimiento a este programa se mantienen instaladas las vallas de identificación de los parques y se suministra la dotación a los empleados, de acuerdo con la identidad visual de la administración actual.

Una vez terminada la intervención del área de gestión social, se da la palabra a la profesional encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la ingeniera Ingrid Báez quien informa sobre las actividades realizadas a la fecha.

- **Medicina del trabajo:** El contratista está dando cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro

- **Medicina Preventiva:** Se realizan capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.

- **Higiene Industrial:** Se hacen Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

- **Seguridad industrial:** Se da cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor
- **Elementos de Protección personal:** Se hace entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.
- **Brigadas de Emergencia:** Se formó una brigada de emergencia a la que se capacitó en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.

Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa las actividades en el área realizadas a la fecha.

- **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se realizó la protección de los individuos arbóreos que se encuentran en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.
- **Retiro de material de excavación:** Se está haciendo el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.
- **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se ha mantenido cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.
- **Puntos Ecológicos:** Se esta haciendo la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los parques.
- **Protección de sumideros:** Se esta realizando la protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentran en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra
- **Implementación de PMT:** Continúa instalada la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez se informan sobre las actividades en el área ambiental, se da la palabra al área técnica quien informa las actividades realizadas a la fecha.

ZONA 1 – ZONA DE JUEGOS INFANTILES

- Excavación de dados y regata perimetral de zona de juegos infantiles, adecuación de piso para posteriormente instalar el piso caucho negro (SBR)

EVIDENCIA DE REUNIÓN

- Instalación de juegos infantiles y complemento de baranda M-83

ZONA 2 – ZONA DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES

- Corte y fundida de dados de concreto, instalación de máquinas biosaludables

Una vez se da la información de las actividades por área se da paso a las dudas en inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad

Uno de los asistentes a la reunión pregunta que en la zona de los biosaludables porque se instalaron y se volvieron a quitar las máquinas

RTA: Se informa que el supervisor del contrato realizo unas observaciones en cuanto a la ubicación de la máquinas biosaludables, por tal motivo toco retirarlas para distribuirlas de una manera mas organizada.

Una de las asistentes a la reunión pregunta sobre el tiempo de garantía, ya que la comunidad le ha informado que el piso en caucho no les parece que lo estén instalando de una manera adecuada.

RTA: Se informa que el contrato cuanta con las pólizas de estabilidad de dos años a partir de la terminación del contrato, de igual manera se informa que todas las actividades realizadas se hacen con la aprobación de la interventoría.

Teniendo en cuenta que no se presentan más dudas por parte de la comunidad se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	DE
1	No se generaron compromisos durante la reunión de avance	N/A	N/A	

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.


GDI-GPD-F029
Versión 2
Vigencia: 09 de mayo de 2018
5 de 5

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 2

Programa de divulgación (Puntos satélites de información)

CONTRATO No.:		CO-827-2022	GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONTROL PUNTOS SATELITE	
Hoja 1 de 1				
FECHA				
04	08	23	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"	
DD	MM	AA		
REGISTRO No.:				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO	Negativo No.
	
04-08-2023 2:32:45 PM	

2. DATOS DE PUNTO SATELITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Salón Comunal

DIRECCIÓN: Carrera 88d # 35B-23 sur

TELÉFONO: 3183520241

PERSONA CONTACTO: Gina Chaparro

3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	
CUAL?		

4. OBSERVACIONES Se instala punto satelite de informacion con el volante de convocatoria a la reunion de avance del parque Desarrollo Campo Hermoso, Desarrollo patio Bonito II Sector 08-136.

NOTA= la presidenta de la JAC autoriza la instalacion del volante, mediante llamada telefonica

5. FIRMAS

Autoriza mediante llamada telefonica

Funcionario/Contacto

Representante del Contratista

Representante de la Interventoria

C.C. O NIT

C.C. O NIT

C.C. O NIT

CONTRATO No.:		CO-827-2022		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONTROL PUNTOS SATELITE		
Hoja <u>1</u> de <u>1</u>						
FECHA						
<u>4</u>	<u>08</u>	<u>23</u>	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"			
DD	MM	AA				
REGISTRO No.:						

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO	Negativo No.
	

2. DATOS DE PUNTO SATELITE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Predio Esquimero.

DIRECCIÓN: C/a 83A # 39-60

TELÉFONO: 3124911513



PERSONA CONTACTO: Raul Martinez



3. PIEZAS DE DIVULGACION

	TIPO	CANTIDAD
AFICHE	☐	
VOLANTE	☒	1
PLEGABLE	☐	
BOLETIN	☐	
OTRO	☐	
CUAL?		

4. OBSERVACIONES Se instala punto satelite de informacion con el volante de convocatoria a la reunion de avance del Parque Pinar del Rio 08-123.

5. FIRMAS

 Funcionario/Contacto C.C. O NIT <u>79 587 969</u>	 Representante del Contratista C.C. O NIT <u>522 884 119</u>	 Representante de la Interventoria C.C. O NIT _____
---	--	--

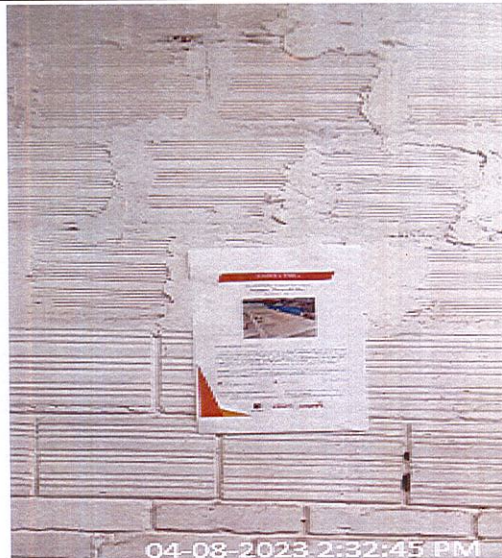CONSORCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN	
		
FOTO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN CON VOLANTE DE REUNION DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO CÓDIGO IDRD 08-186	FOTO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE PUNTO SATÉLITE DE INFORMACIÓN CON VOLANTE DE REUNION DE AVANCE PARQUE PINAR DEL RIO CÓDIGO IDRD 08-123	

Contratista Consortio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 3

Programa de Divulgación

(Volantes, aprobaciones y soportes de entrega)

Programación de reuniones en el periodo

9 mensajes

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

2 de agosto de 2023, 20:48

Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>, CONTRATO KENNEDY 827 <kennedyparques827@gmail.com>

Señores

Interventoria

Atn, Residente social

Asunto : Programación de reuniones para el periodo

Señores

Interventoria

Atn, Residente social

Asunto : programación de reuniones para el periodo

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PERIODO			
PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	HORA
SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR 08-620	Comité de participación	09/08/2023	8:00
URBANIZACIÓN LA GRAN BRITALIA 08-	Comité de participación	09/08/2023	10:00
BERTHA	Comité de participación	09/08/2023	12:00
TAYRONA	Comité de participación	09/08/2023	2:00
MANZANA 14	Comité de participación	09/08/2023	3:30
PINAR DEL RIO 08-123	Reunión de avance	10/08/2023	9:00
UNIR 1 ETAPA 1 Y 2 08-086	Reunión de avance	10/08/2023	11:00
DESARROLLO CAMPO HERMOSO 08-186	Reunión de avance	10/08/2023	1:30
RIVERAS DE OCCIDENTE 08-006	Reunión de avance	10/08/2023	3:00

De acuerdo a solicitud se remite programación de reuniones para el periodo

Atentamente ,

Yesica Agudelo

Residente social

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>

4 de agosto de 2023, 11:34

Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

CC: CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

Buen día,

Espero que se encuentre muy bien. Para efectos de realizar revisión de los insumos para los comités de participación ciudadana y las reuniones de avance, solicito de manera cordial que sean enviados los volantes de convocatoria y las presentaciones.

Cordialmente,

[Texto citado oculto]

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

4 de agosto de 2023, 12:26

Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CONTRATO KENNEDY 827 <kennedyparques827@gmail.com>

Señores

Interventoria

Atn, Residente social

Asunto : Volantes de convocatoria a las reuniones con comunidad

Buenas tardes

Se remite para revisión y aprobación los volantes de convocatoria a la reuniones con comunidad relacionadas en el siguiente cuadro:

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PERIODO				
PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	HORA	FECHA DE DIVULGACIÓN
SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR 08-620	Comité de participación	09/08/2023	8:00	4 de agosto de 2023
URBANIZACIÓN LA GRAN BRITALIA 08-	Comité de participación	09/08/2023	10:00	4 de agosto de 2023
BERTHA	Comité de participación	09/08/2023	12:00	4 de agosto de 2023
TAYRONA	Comité de participación	09/08/2023	2:00	4 de agosto de 2023
MANZANA 14	Comité de participación	09/08/2023	3:30	4 de agosto de 2023
PINAR DEL RIO 08-123	Reunión de avance	10/08/2023	9:00	8 de agosto de 2023
UNIR 1 ETAPA 1 Y 2 08-086	Reunión de avance	10/08/2023	11:00	8 de agosto de 2023
DESARROLLO CAMPOHERMOSO 08-186	Reunión de avance	10/08/2023	1:30	8 de agosto de 2023
RIVERAS DE OCCIDENTE 08-006	Reunión de avance	10/08/2023	3:00	8 de agosto de 2023

Atentamente

Yesica Agudelo

Residente social

[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos

-  08-382.pdf
159K
-  08-153.pdf
160K

 **08-253.pdf**
160K

 **08-620.pdf**
217K

 **08-681.pdf**
283K

 **riveras 006.pdf**
197K

 **campo 186.pdf**
234K

 **unir 096.pdf**
203K

 **pinar 123.pdf**
221K

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

4 de agosto de 2023, 19:08

Cordial saludo,

Una vez revisados los volantes de convocatoria a las reuniones informativas de avance y de los comités de participación ciudadana, nos permitimos remitir la **aprobación** por parte de la interventoría. Por favor proceder al proceso de convocatoria con su respectivos soportes de verificación.

Atentamente,
[Texto citado oculto]

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

9 de agosto de 2023, 16:59

Cordial saludo,

Espero que se encuentre muy bien en sus labores diarias. De acuerdo a lo establecido en la programación enviada por la firma contratista y así como lo requirió la interventoría en el correo del día viernes 04 de agosto, se solicita de manera perentoria las presentaciones de las reuniones informativas de avance que se realizarán el día de mañana, o en su defecto la metodología a implementar en el encuentro.

Quedo atenta a su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

9 de agosto de 2023, 20:27

Cordial Saludo

Se remiten para revisión y aprobación las presentaciones para las reuniones de avance de los parques Pinar del Río, Unir 1 Etapa, Desarrollo Campo Hermoso y Riveras de occidente.

Atentamente

Yesica Agudelo
Residente social

-  **REUNIN DE AVANCE CAMPO.pptx**
-  **REUNIN DE AVANCE PINAR.pptx**
-  **REUNIN DE AVANCE RIVERAS.pptx**
-  **REUNIN DE AVANCE UNIR.pptx**

[Texto citado oculto]

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

10 de agosto de 2023, 11:03

Cordial saludo,

Una vez revisadas las presentaciones para las reuniones de informativas de avance. Esta interventoría emite aprobación por parte de todos los componentes.

Cordialmente
[Texto citado oculto]

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

11 de agosto de 2023, 10:17

Señores

Interventoria

Atn, Residente social

Asunto : Programación y volantes informativos para las reuniones del periodo.

Señores

Interventoria

Atn, Residente social

Dando alcance al correo ,se remite a la interventoría para revisión y aprobación los volantes informativos y la programación de las reuniones para el periodo con ajustes.

Gracias .

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PERIODO				
PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	HORA	FECHA DE DIVULGACIÓN
SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR	Comité de participación	14/08/2023	8:00 a.m	11 de agosto de 2023
URBANIZACIÓN LA GRAN BRITALIA	Comité de participación	14/08/2023	10:00 a.m	11 de agosto de 2023
BERTHA	Comité de participación	14/08/2023	12:00 m	11 de agosto de 2023
TAYRONA	Comité de participación	14/08/2023	2:00 p. m	11 de agosto de 2023
MANZANA 14	Comité de participación	14/08/2023	3:30 p.m	11 de agosto de 2023
UNIR 1 ETAPA 1 Y 2	Reunión de avance	16/08/2023	8:00 a.m	11 de agosto de 2023

[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos

-  comite santa catalina (ajustado).pdf
229K
-  comite de participación gran britalia(ajustado).pdf
172K
-  comite de participacion berta ospina (ajustado).pdf
173K
-  comite de participacion tayrona(ajustado).pdf
296K
-  comite de participacion manzana 14 (ajustado).pdf
172K
-  reunion de avance unir (ajustado).pdf
215K

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

14 de agosto de 2023, 06:22

Cordial saludo,

Una vez revisados los volantes de convocatoria a las reuniones informativas de avance y de los comités de participación ciudadana, nos permitimos remitir la **aprobación** por parte de la interventoría. Por favor proceder al proceso de convocatoria con su respectivos soportes de verificación.

Cordialmente,

[Texto citado oculto]

CONVOCATORIA

Reunión de avance de obra Parque Pinar del Rio Cod. 08-123



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente de la reunión de avance del contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer el avance de las actividades que se están ejecutando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
10 de agosto de 2023



Lugar: Parque



Hora 9:00 a.m

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.
Teléfono: 3165639269
Correo: gsparqueskennedy827@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.
Teléfono: 7530396
Correo: interventoriacabasas.2023@gmail.com



ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY



CONTRATO No.: CO-827-2022	
Hoja 1 de 2	
FECHA	
4	08 2023
DD	MM AA

**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE
EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO
PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"**



CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

TIPO DE PIEZA

Se realiza la entrega del volante de convocatoria a la reunión de cuance del parque Pinar del Rio 08/12/23

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	Pavi Martinez	Cra 83A # 39-60	Pinar I	3124911513	<i>Pavi Martinez</i>	
2	Wilson Lopez	Cra 86 # 38d-69 sur	Pinar I	3023382574	<i>Wilson Lopez</i>	
3	Rosa Romero	Cra 83A # 38c-32 sur	Pinar I	3132618116	<i>Ana Rosa Romero</i>	
4	Hugo Pubiano	Cra 83A # 8A-24 sur	Pinar I	3157911537	<i>Hugo Pubiano</i>	
5	Maria Beatriz P.	Cil 38d sur N° 83A-06	Pinar I	3246660246	<i>Beatriz</i>	
6	Jenny Lorenzo	Cil 38d sur # 83A-37	Pinar I	3133851031	<i>Ugemy Lorenzo</i>	
7	Alexander Ramos	Cil 38d sur # 83A-41	Pinar I	3208047704	<i>Alexander Ramos</i>	
8	Uitalia Diaz	Cil 38d sur # 83A-46	Pinar I	3103305646	<i>Uitalia Diaz</i>	
9	Consuelo Escandon	Cra 85 # 29-11 sur	Pinar I	3133820809	<i>Consuelo Escandon</i>	
10	Dora Nery	Cil 38d sur # 85-14	Pinar I	3238129133	<i>Dora Nery</i>	
11	Afonso Lozano	Cil 39P sur # 83A-34	Pinar I	3103986184	<i>Afonso Lozano</i>	
12	Desiderio	Calle 39A N° 85-75	Pinar I	3227280206	<i>Desiderio</i>	
13	Jose Vera	Cra 85 # 39-35 sur	Pinar I	3125713443	<i>Jose Vera</i>	Se entregaron 30 volantes
14	Claudia Tuta	Cil 39A sur # 85-07	Pinar I	3142488688	<i>Claudia Tuta</i>	
15	Bajo puerta	Cil 39A sur # 85-63	Pinar I		<i>Bajo puerta</i>	
16	Jose Paez	Cil 39A sur # 83A-55	Pinar I	3208174195	<i>Jose Paez</i>	
17	Jose Uri	Cil 39A sur # 83A-47	Pinar I	3143934616	<i>Jose Uri</i>	
18	Bajo puerta	Cil 39A sur # 83-43	Pinar I	3115682972	<i>Atiende desde 2 p.m.</i>	
19	Silvestre Garduño	Cra 85 # 39-28 sur	Pinar I	3126493559	<i>Silvestre Garduño</i>	
20	Clemencia Sanchez	Cra 85 # 39-10 sur	Pinar I	3112971576	<i>Clemencia S.</i>	
21	Ines Lerner	Cra 85 # 39-22 sur	Pinar I	3112017538	<i>Tercera edad</i>	

Total = 50 volantes

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

Yessica Aquino

Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]

Residente social de Interventoria

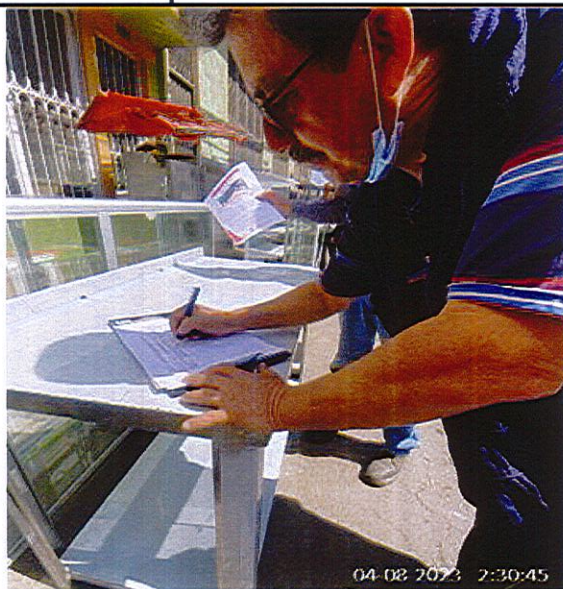


FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE
PARQUE PINAR DEL RÍO CÓDIGO IDRD 08-123

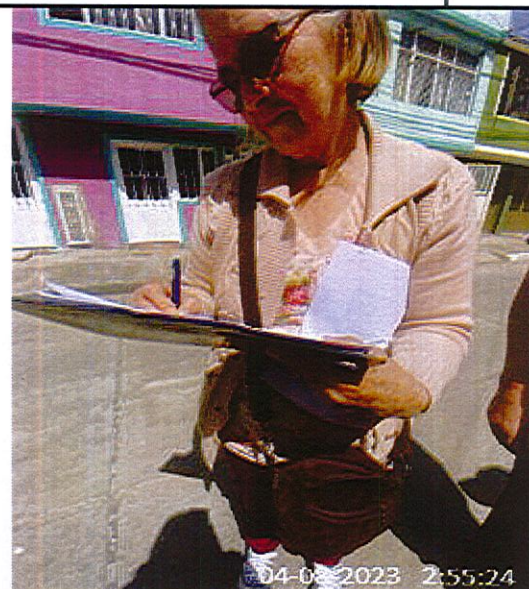


FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE
PINAR DEL RÍO CÓDIGO IDRD 08-123

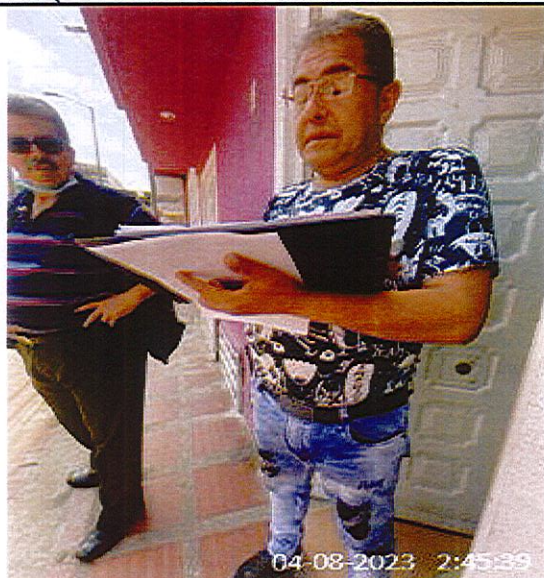


FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE
PARQUE PINAR DEL RÍO CÓDIGO IDRD 08-123

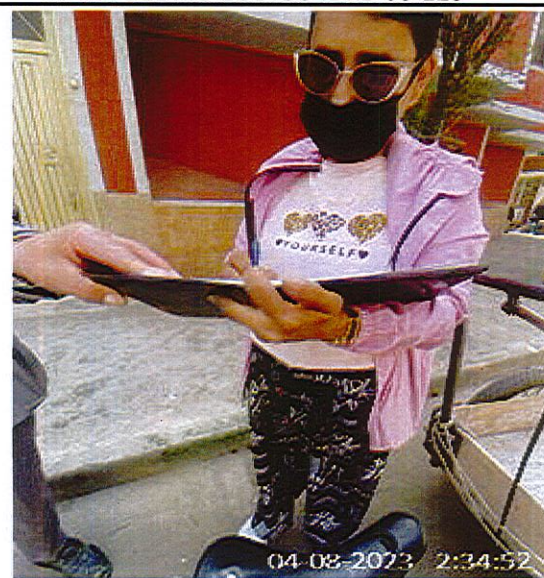


FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE
PINAR DEL RÍO CÓDIGO IDRD 08-123

CONVOCATORIA

Reunión de avance de obra Parque Desarrollo Campo Hermoso

Cod. 08-186



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente de la reunión de avance del contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer el avance de las actividades que se están ejecutando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
10 de agosto de 2023



Lugar: Parque



Hora 1:30 p.m

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.
Teléfono: 3165639269
Correo: gsparqueskennedy827@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.
Teléfono: 7530396
Correo: interventoriacabasas.2023@gmail.com



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY



CONTRATO No.: CO-827-2022	
Hoja 1 de 1	
FECHA	
4	08 2023
DD	MM AA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE
EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO
PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"



CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

TIPO DE PIEZA

Se realiza entrega de volante de convocatoria a la reunión de avance del Parque Des. Campo Hermoso 03-186

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	Bajo Puerta	Cra 107 #34-14 sur	Campo Hermoso	—	—	
2	Bajo Puerta	Cll 34 sur # 88c-15 sur	Campo Hermoso	—	—	
3	Bajo Puerta	Cll 34 sur # 88c-09 sur	Campo Hermoso	—	—	
4	Bajo Puerta	Cll 34 sur # 88c-35	Campo Hermoso	—	—	
5	Cecilia Torres	Cll 34 sur # 88A-21	Campo Hermoso	—	—	la ciudadana no firma
6	Rosalba Guerrero	Cll 34 Bis # 88A-09	Campo Hermoso	3123228370	Rosalba Guerrero	
7	Bajo Puerta	Cra 88A #33A -21	Campo Hermoso	—	—	
8	Bajo Puerta	Cra 88A #33A -20	Campo Hermoso	—	—	
9	Bajo Puerta	Cra 88A #33A -14	Campo Hermoso	—	—	
10	Bajo Puerta	Cll 34 sur # 88A-14	Campo Hermoso	—	—	
11	Bajo Puerta	Cll 34 sur # 88A-22	Campo Hermoso	—	—	
12	Gabriel Reyes	Cll 34 sur # 88A-26	Campo Hermoso	3112918155	Gabriel Reyes	se dejan 20 volantes
13	Antonio Benjumea	Cll 33B # 88A-22	Campo Hermoso	3115972113	Antonio Benjumea	se dejan 30 volantes Tiendas
14	Camila Gutierrez	Cll 33B # 88A-32	Campo Hermoso	3119811320	Camila Gutierrez	
15	Gabriel Reyes	Cll 33B # 88A-40	Campo Hermoso	2981570	Gabriel Reyes	se dejan 30 volantes
16						

Total = 92 volantes

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)



Yessica Aquilino 6

Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]

Residente social de Interventoria

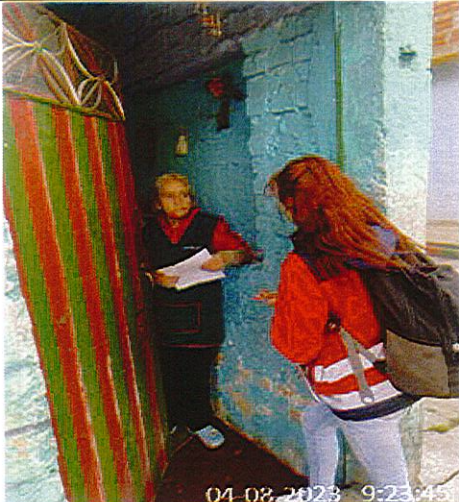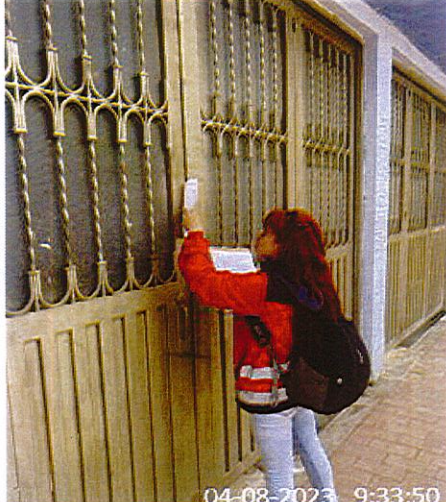CONSORCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-186	
		
FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-186	FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-186	
		
FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-186	FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-186	

CONVOCATORIA

Reunión de avance de obra Parque Riveras de Occidente Cod. 08-006



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente de la reunión de avance del contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer el avance de las actividades que se están ejecutando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
10 de agosto de 2023



Lugar: Frente al salón
comunal Riveras de
Occidente Etapa I



Hora: 3:30 p.m

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.
Teléfono: 3165639269
Correo: gsparqueskennedy827@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.
Teléfono: 7530396
Correo: interventoriacabasas.2023@gmail.com



ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY



CONTRATO No.:		CO-827-2022
Hoja		de 2
FECHA		
4	08	2023
DD	MM	AA

**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE
EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO
PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"**



CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

TIPO DE PIEZA

Se realiza la entrega del volante de convocatoria a la reunión de aforo del parque Riveras de occidente 08-08-2023

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	Bajo puerta	Cil 36A ^s # 91c-32	Riveras occi.	—	—	
2	Jose Gutierrez	Cil 91c # 58A-14	Riveras occ	3204521928	<i>[Firma]</i>	
3	Bajo puerta	Cil 37A ^s # 90A-82	Riveras occ	—	—	
4	Ana Vanegas	Cil 35A ^s # 93-01	Riveras occ	4631670	<i>[Firma]</i>	
5	Bajo puerta	Cil 35A ^s # -43-03	Riveras occ	—	—	
6	Rafael Peraza	Cil 35A ^s # 93-07	Riveras occ	3043886788	<i>[Firma]</i>	
7	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-09	Riveras occ	—	—	
8	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-13	Riveras occ	—	—	
9	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-14	Riveras occ	—	—	
10	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-10	Riveras occ	—	—	
11	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-08	Riveras occ	—	—	
12	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-04	Riveras occ	—	—	
13	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 93-02	Riveras occ	—	—	
14	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 91c-82	Riveras occ	—	—	
15	Bajo puerta	Cil 35A ^s # 91c-76	Riveras occ	—	—	
16	Bajo puerta	Cil 36 ^s # 91c-74	Riveras occ	—	—	
17	Bajo puerta	Cil 36 ^s # 91c-73	Riveras occ	—	—	
18	Bajo puerta	Cil 36 ^s # 91c-75	Riveras occ	—	—	
19	Doris Can	Cil 37A ^s # 75-72	Riveras occ	3208246646	<i>[Firma]</i>	
20	Francisco Ortiz	Cil 36 ^s # 91-11	Riveras occ	3212620026	<i>[Firma]</i>	
21	Jesús Ramos	Cil 37 ^s # 91-12	Riveras occ	3115569188	JESÚS RAMOS	se dejan 20 volantes

Total=40 volantes

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
Yessica Aponte

Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Firma]
Jesús Ramos

Residente social de Interventoría

CONTRATO No.:	CO-827-2022
Hoja	2 de 2
FECHA	
4	08 2023
DD	MM AA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"



CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

08-006

TIPO DE PIEZA

Se realiza la entrega del volante de convocatoria a la reunion de avance del parque Pueros de occidente

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACION
1	Marcela Parras	Cll 37 sur # 41-22	Riveras occ	3975270	Marcela Parras	se dejan 10 volantes
2	Aracely Castillo	Cll 36 sur # 90-61	Riveras occ	3115237830		
3	Yaris Escobar	Cll 36 sur # 90A-90	Riveras occ	3008783123		
4	Bajo puerta	Cll 35 sur # 91-12	Riveras occ	—	—	
5	Bajo puerta	Cll 35 sur # 91-11	Riveras occ	—	—	
6	Bajo puerta	Cll 36 sur # 91-12	Riveras occ	—	—	
7	Bajo puerta	Cll 35 sur # 91-15	Riveras occ	—	—	
8	Luz Quintero	Cll 36 sur # 90A-80	Riveras occ	3113254723	Luz Quintero	
9	Fernando Ramirez	Cll 35A sur # 90A-87	Riveras occ	3123949706		
10	Vivian Gomez	Cll 35 sur # 90A-90	Riveras occ	3214554473		Tienda-se dejan 40 volantes
11	Bajo Puerta	Cll 35 sur # 90A-90	Riveras occ	3		
12	Bajo Puerta	Cll 35A sur # 90A-87	Riveras occ	—		
13	Ines Orjuela	Cll 37 sur # 93-03	Riveras occ	3136532111		se dejan 30 volantes
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Total = 90 volantes

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre)


Residente Social - Contratista

APROBÓ:

(Firma)

(Nombre)

Residente social de Interventoria

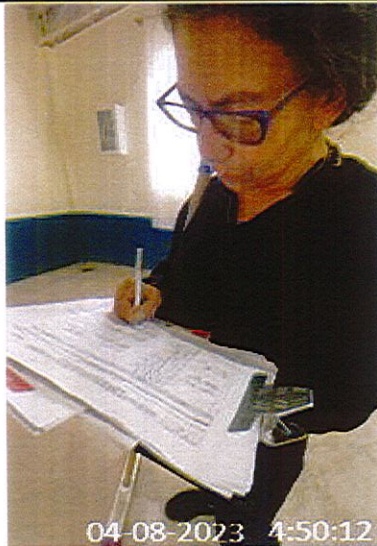CONSORCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE CÓDIGO IDRD 08-006	
 <p>04-08-2023 4:50:12</p>	 <p>04-08-2023 4:05:18</p>	
FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE CÓDIGO IDRD 08-006	FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE CÓDIGO IDRD 08-006	
 <p>04-08-2023 4:21:33</p>	 <p>04-08-2023 4:38:49</p>	
FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE CÓDIGO IDRD 08-006	FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA REUNIÓN DE AVANCE PARQUE RIVERAS DE OCCIDENTE CÓDIGO IDRD 08-006	

CONVOCATORIA

Comité de participación ciudadana Parque Santa Catalina I y II Sector Cod. 08-620



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente del comité de participación ciudadana contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer las actividades puntuales que se están realizando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
14 de agosto de
2023




Lugar Parque



Hora 8:00 a.m

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.
Teléfono: 3165639269
Correo: gsparqueskennedy@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.
Teléfono: 3204809842
Correo: interventoriacabajas.2023@gmail.com

<p>CONSORCIO PARQUES EDC 2023</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA I Y II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620</p>	
		
	<p>FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA I Y II SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620</p>	

CONVOCATORIA

Comité de participación ciudadana Parque Urbanización Gran Britalia Desarrollo la Esperanza Urbanización El Almenar Cod. 08-253



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente del comité de participación ciudadana contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer las actividades puntuales que se están realizando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
14 de agosto de
2023



Lugar Parque



Hora 10:00 am

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.
Teléfono: 3165639269
Correo: gsparqueskennedy@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.
Teléfono: 3204809842
Correo: interventoriacabasas.2023@gmail.com



ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY



"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"



08-253

TIPO DE PIEZA

Se hace entrega del volante de convocatoria al comite de Participación ciudadana del parque Urb Gran Britania


ELABORÓ: Yessica Aguado
(Firma)
(Nombre)

Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)

[Signature]

Residente social de Interventoría

<p>CONSORCIO PARQUES EDC 2023</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE URBANIZACIÒN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÒN EL ALMENAR CÒDIGO IDRD 08-253</p>	
		
<p>FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE URBANIZACIÒN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÒN EL ALMENAR CÒDIGO IDRD 08-253</p>		

CONVOCATORIA

Comité de participación ciudadana Parque Bertha Hernández De Ospina

Cod. 08-153



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente del comité de participación ciudadana contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer las actividades puntuales que se están realizando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
14 de agosto de
2023



Lugar Parque



Hora 12:00 m

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.

Teléfono: 3165639269

Correo: gsparqueskennedy@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoría S.A.S.


Teléfono: 3204809842

Correo: interventoriacabajasas.2023@gmail.com



ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY



<p>CONSORCIO PARQUES EDC 2023</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153</p>	
		
	<p>FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153</p>	

CONVOCATORIA

Comité de participación ciudadana Parque Desarrollo Tayrona

Cod. 08-681



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente del comité de participación ciudadana contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer las actividades puntuales que se están realizando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
14 de agosto de
2023



Lugar Parque



Hora 2:00 pm

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.

Teléfono: 3165639269

Correo: gsparqueskennedy@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.


Teléfono: 3204809842

Correo: interventoriacabasas.2023@gmail.com



ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY



<p>CONSORCIO PARQUES EDC 2023</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE DESARROLLO TAYRONA CODIGO IDRD 08-681</p>	
		
	<p>FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÀFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE DESARROLLO TAYRONA CODIGO IDRD 08-681</p>	

CONVOCATORIA

Comité de participación ciudadana Parque Ciudad Kennedy Occidental Super Manzana 14 Cod. 08-382



Descripción del proyecto

La Alcaldía Local de Kennedy, la interventoría CABA INTERVENTORÍA SAS y el contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023 invitan a las personas interesadas a participar activamente del comité de participación ciudadana contrato N. 827-2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Invitamos a la comunidad beneficiada por el mantenimiento del parque, a conocer las actividades puntuales que se están realizando a través del contratista Consorcio Parques EDC 2023, para mejorar la calidad de vida de los residentes del área de influencia del parque.



Fecha:
14 de agosto de
2023




Lugar Parque



Hora 3:30 pm

Contratista: Consorcio Parques EDC 2023.
Teléfono: 3165639269
Correo: gsparqueskennedy@gmail.com

Interventoría: CABA Interventoria S.A.S.
Teléfono: 3204809842
Correo: interventoriacabasas.2023@gmail.com

<p>CONSORCIO PARQUES EDC 2023</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SÚPER MANZANA 14 CODIGO IDRD 08- 382</p>	
		
<p>FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVOCATORIA POR WHATSAPP COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SÚPER MANZANA 14 CODIGO IDRD 08-382</p>		

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 4

Punto de atención al Ciudadano (Registro fotográfico)



FOTO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



FOTO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



FOTO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



FOTO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Contratista Consorcio Parques EDC 2023	Informe Mensual de Interventoría No. 6 COMPONENTE SOCIAL Contrato de Interventoría No. N° CIN – 819 - 2022	
Supervisor Interventoría Alcaldía Local de Kennedy		

Anexo 5

Programa de participación (Inscripciones en el periodo – Soportes de comités de participación)

Programación de reuniones en el periodo
9 mensajes

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>, CONTRATO KENNEDY 827 <kennedyparques827@gmail.com>

2 de agosto de 2023, 20:48

Señores
Interventoria
Atn, Residente social

Asunto : Programación de reuniones para el periodo

Señores
Interventoria
Atn, Residente social

Asunto : programación de reuniones para el periodo

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PERIODO			
PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	HORA
SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR 08-620	Comité de participación	09/08/2023	8:00
URBANIZACIÓN LA GRAN BRITALIA 08-	Comité de participación	09/08/2023	10:00
BERTHA	Comité de participación	09/08/2023	12:00
TAYRONA	Comité de participación	09/08/2023	2:00
MANZANA 14	Comité de participación	09/08/2023	3:30
PINAR DEL RIO 08-123	Reunión de avance	10/08/2023	9:00
UNIR 1 ETAPA 1 Y 2 08-086	Reunión de avance	10/08/2023	11:00
DESARROLLO CAMPO HERMOSO 08-186	Reunión de avance	10/08/2023	1:30
RIVERAS DE OCCIDENTE 08-006	Reunión de avance	10/08/2023	3:00

De acuerdo a solicitud se remite programación de reuniones para el periodo

Atentamente ,

Yesica Agudelo
Residente social

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
CC: CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

4 de agosto de 2023, 11:34

Buen día,

Espero que se encuentre muy bien. Para efectos de realizar revisión de los insumos para los comités de participación ciudadana y las reuniones de avance, solicito de manera cordial que sean enviados los volantes de convocatoria y las presentaciones.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

Señores

Interventoria

Atn, Residente social

Asunto : Volantes de convocatoria a las reuniones con comunidad

Buenas tardes

Se remite para revisión y aprobación los volantes de convocatoria a la reuniones con comunidad relacionadas en el siguiente cuadro:

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PERIODO				
PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	HORA	FECHA DE DIVULGACIÓN
SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR 08-620	Comité de participación	09/08/2023	8:00	4 de agosto de 2023
URBANIZACIÓN LA GRAN BRITALIA 08-	Comité de participación	09/08/2023	10:00	4 de agosto de 2023
BERTHA	Comité de participación	09/08/2023	12:00	4 de agosto de 2023
TAYRONA	Comité de participación	09/08/2023	2:00	4 de agosto de 2023
MANZANA 14	Comité de participación	09/08/2023	3:30	4 de agosto de 2023
PINAR DEL RIO 08-123	Reunión de avance	10/08/2023	9:00	8 de agosto de 2023
UNIR 1 ETAPA 1 Y 2 08-086	Reunión de avance	10/08/2023	11:00	8 de agosto de 2023
DESARROLLO CAMPOHERMOSO 08-186	Reunión de avance	10/08/2023	1:30	8 de agosto de 2023
RIVERAS DE OCCIDENTE 08-006	Reunión de avance	10/08/2023	3:00	8 de agosto de 2023

Atentamente

Yesica Agudelo

Residente social

[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos

-  08-382.pdf
159K
-  08-153.pdf
160K

-  **08-253.pdf**
160K
-  **08-620.pdf**
217K
-  **08-681.pdf**
283K
-  **riveras 006.pdf**
197K
-  **campo 186.pdf**
234K
-  **unir 096.pdf**
203K
-  **pinar 123.pdf**
221K

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

4 de agosto de 2023, 19:08

Cordial saludo,

Una vez revisados los volantes de convocatoria a las reuniones informativas de avance y de los comités de participación ciudadana, nos permitimos remitir la **aprobación** por parte de la interventoría. Por favor proceder al proceso de convocatoria con su respectivos soportes de verificación.

Atentamente,
[Texto citado oculto]

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

9 de agosto de 2023, 16:59

Cordial saludo,

Espero que se encuentre muy bien en sus labores diarias. De acuerdo a lo establecido en la programación enviada por la firma contratista y así como lo requirió la interventoría en el correo del día viernes 04 de agosto, se solicita de manera perentoria las presentaciones de las reuniones informativas de avance que se realizarán el día de mañana, o en su defecto la metodología a implementar en el encuentro.

Quedo atenta a su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

9 de agosto de 2023, 20:27

Cordial Saludo

Se remiten para revisión y aprobación las presentaciones para las reuniones de avance de los parques Pinar del Río, Unir 1 Etapa, Desarrollo Campo Hermoso y Riveras de occidente.

Atentamente

Yesica Agudelo
Residente social

- | |
|--|
|  REUNIN DE AVANCE CAMPO.pptx |
|  REUNIN DE AVANCE PINAR.pptx |
|  REUNIN DE AVANCE RIVERAS.pptx |
|  REUNIN DE AVANCE UNIR.pptx |

[Texto citado oculto]

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

10 de agosto de 2023, 11:03

Cordial saludo,

Una vez revisadas las presentaciones para las reuniones de informativas de avance. Esta interventoría emite aprobación por parte de todos los componentes.

Cordialmente
[Texto citado oculto]

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

11 de agosto de 2023, 10:17

Señores
Interventoria
Atn, Residente social

Asunto : Programación y volantes informativos para las reuniones del periodo.

Señores
Interventoria
Atn, Residente social

Dando alcance al correo ,se remite a la interventoría para revisión y aprobación los volantes informativos y la programación de las reuniones para el periodo con ajustes.

Gracias .

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL PERIODO				
PARQUE	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	HORA	FECHA DE DIVULGACIÓN
SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR	Comité de participación	14/08/2023	8:00 a.m	11 de agosto de 2023
URBANIZACIÓN LA GRAN BRITALIA	Comité de participación	14/08/2023	10:00 a.m	11 de agosto de 2023
BERTHA	Comité de participación	14/08/2023	12:00 m	11 de agosto de 2023
TAYRONA	Comité de participación	14/08/2023	2:00 p. m	11 de agosto de 2023
MANZANA 14	Comité de participación	14/08/2023	3:30 p.m	11 de agosto de 2023
UNIR 1 ETAPA 1 Y 2	Reunión de avance	16/08/2023	8:00 a.m	11 de agosto de 2023

[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos

-  comite santa catalina (ajustado).pdf
229K
-  comite de participación gran britalia(ajustado).pdf
172K
-  comite de participacion berta ospina (ajustado).pdf
173K
-  comite de participacion tayrona(ajustado).pdf
296K
-  comite de participacion manzana 14 (ajustado).pdf
172K
-  reunion de avance unir (ajustado).pdf
215K

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>

14 de agosto de 2023, 06:22

Cordial saludo,

Una vez revisados los volantes de convocatoria a las reuniones informativas de avance y de los comités de participación ciudadana, nos permitimos remitir la **aprobación** por parte de la interventoría. Por favor proceder al proceso de convocatoria con su respectivos soportes de verificación.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El 14 de agosto de 2023 se realiza el comité de participación ciudadana del parque COD 08-620 Santa Catalina 1 Y 2 Sector.
La profesional social del contratista inicio la reunión dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación
Por parte del contratista realiza acompañamiento el área técnica social, ambiental y SST.
Por parte de la interventoría realiza acompañamiento el área técnica, y social.
Así mismo se da la bienvenida a los asistentes por parte de la comunidad en general.
En seguida la profesional social del contratista les informa a los asistentes que el objetivo de la reunión es dar a conocer las actividades que se están realizando en el parque hasta la fecha.
<ul style="list-style-type: none"> • Replanteo topográfico cancha • Retiro de capa externa de la cancha • Mejoramiento de estructura con la instalación de material granulado • Excavación para instalación de bordillo A-80
Una vez se informa las actividades del área técnica, se procede a informar las actividades el área de seguridad y salud realizadas hasta la fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Exámenes de ingreso al personal • Se implementa programa de prevención y promoción • Suministro a los trabajadores de los elementos de protección personal • Implementación de brigada de emergencia

En el componente ambiental se informa que las actividades realizadas hasta la fecha

- Implementación de plan de manejo de tráfico
- Cerramiento perimetral del parque en malla verde y azul con cinta de seguridad
- Acopio de materiales
- Puntos Ecológicos

Se informa del área de gestión social que las actividades realizadas hasta la fecha son:

- Levantamiento de actas de inspección preliminar del parque e inventario de elementos existentes del parque.
- Reunión de inicio
- Entrega de volantes de convocatoria a reunión de inicio, y comités de participación ciudadana.
- Se mantiene instalada la valla informativa del parque

Inquietudes de la comunidad

Una de las asistentes a la reunión pregunta en que fecha se finalizan los trabajos de obra.

RTA: La profesional social por parte del contratista informa que el contrato tiene fecha de finalización de 14 de septiembre pero que se tratará de terminar antes de esa fecha.


Uno de los asistentes a la reunión pregunta si el avance de obra esta en los tiempos normales o si existe algún atraso

RTA: Se informa que no existe atraso en las labores que se están ejecutando por lo que se planea terminar en los tiempos establecidos contractualmente.

[illegible]

Lugar de la próxima reunión:

FORMATO												
LISTA DE ASISTENCIA												
CÓDIGO		PROCESO								VERSIÓN		
FO-PE-13		PLANEACION ESTRATEGICA								4		
BOGOTÁ												
Tipo de Evento:		Reunión		Lugar		Parque Santa Catalina.				Fecha		
Nombre Evento		Comite de participaci. Santo Catalina y # sector. 08-620										
Hora de inicio		8:32 am.		Duración (horas)		40 min.		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☒ Uso interno(exclusivo para el área/proc) ☐ Clasificada ☐ Reservado		
Área Organizadora		Gestión Social										
#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Contacto	Dependencia/Entidad	Tipo Vinculación (Planista-Contralista Apoyo a la gestión-Externo)			Sexo(Hombre-Mujer-Intersexual)			e-mail	Firma
					P	C	E	H	M	I		
1	Sebastián Moreno	1016074418	3123143607	Comunidad			X	X			no refiere	Quilpu
2	Ximena López	1030691103	3213884308	Comunidad			X		X		no refiere	Ximena López
3	Livia Cipamocha	51749480	3102270258	Comunidad			X		X		no refiere	Livia Cipamocha
4	Luisa Céspedes	110589519	3008428894	Interventora			X		X		no refiere	Luisa Céspedes
5	Yesica Apuleo	522829119	3213905517	Contralista		X			X		asparcogrenered@527@gmail.com	Yesica Apuleo
6	Ingrid Pérez	1010202893	3023569373	Contralista		X			X		residentesst@gmail.com	Ingrid Pérez
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

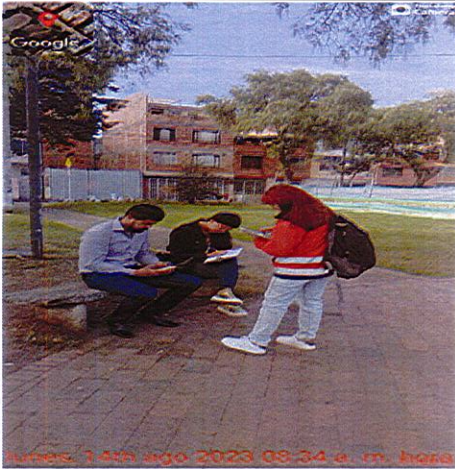CONSORCIO PARQUES EDC 2023		REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620			
					
FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620		FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620			
					
FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620		FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE SANTA CATALINA 1 Y 2 SECTOR CÓDIGO IDRD 08-620			

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El 14 de agosto de 2023 se realiza el comité de participación ciudadana del parque COD 08-253 Gran Britalia.
La profesional social del contratista inicio la reunión dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación
Por parte del contratista realiza acompañamiento el área técnica social, ambiental y SST.
Por parte de la interventoría realiza acompañamiento el área técnica, y social.
Así mismo se da la bienvenida a los asistentes por parte de la comunidad en general.
En seguida la profesional social del contratista les informa a los asistentes que el objetivo de la reunión es dar a conocer las actividades que se están realizando en el parque hasta la fecha.
<ul style="list-style-type: none"> • Replanteo topográfico cancha • Retiro de capa externa existente • Mejoramiento de estructura con la instalación de material granulado • Compactación de base granular en rampa de acceso • Ampliación de la placa de juego infantil. • Trasiego de materiales.
Una vez se informa las actividades del área técnica, se procede a informar las actividades el área de seguridad y salud realizadas hasta la fecha
<ul style="list-style-type: none"> • Exámenes de ingreso al personal • Se implementa programa de prevención y promoción • Suministro a los trabajadores de los elementos de protección personal • Implementación de brigada de emergencia

En el componente ambiental se informa que las actividades realizadas hasta la fecha

- Implementación de plan de manejo de tráfico
- Cerramiento perimetral del parque en malla verde y azul con cinta de seguridad
- Acopio de materiales
- Puntos Ecológicos

Se informa del área de gestión social que las actividades realizadas hasta la fecha son:

- Levantamiento de actas de inspección preliminar del parque e inventario de elementos existentes del parque.
- Reunión de inicio
- Entrega de volantes de convocatoria a reunión de inicio, y comités de participación ciudadana.
- Se mantiene instalada la valla informativa del parque

Inquietudes de la comunidad

Uno de los asistentes a la reunión manifiesta que no están de acuerdo con el presupuesto invertido en el parque ya que no justifican el sueldo de los profesionales y trabajadores y que no hagan presencia en el parque.

RTA: Se informa que las actividades en el parque se están ejecutando de acuerdo con la programación de obra.

Los asistentes en general solicitan entregar el parque a más tardar en 15 días ya que los trabajos que hacen falta son mínimos y se están robando los tornillos de los juegos y están haciendo cambuches en las noches dentro del parque.

RTA: Se informa que se escalará la solicitud al área técnica.

Para la entrega de las bancas en concreto del parque, la señora Aurora comentó en el comité que tienen un acuerdo con la U Nacional para el arreglo de las mismas y posterior instalación en el parque, ella quiere realizar la inauguración del parque y el arreglo de las sillas al mismo tiempo sin embargo la señora Aura informara cuando realicen esta actividad o cuando la tengan programada para evaluar la posibilidad de hacer una misma entrega .

EVIDENCIA DE REUNION

Solicitaron reuniones los fines de semana en la tarde en lo posible para que asista más comunidad a los comités y reuniones.

RTA: Se informa que se escalara la solicitud al área técnica.

Teniendo en cuenta las inconformidades que tiene la comunidad solicitan una reunión extraordinaria para el viernes a las 3:00 pm

RTA: Se les informó que se llevarían las inquietudes a mesa de trabajo con todos los componentes para dar atención a los requerimientos.

Preguntaban porque a las reuniones siempre asisten los mismos profesionales en la reunión de inicio estaban todos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Escalar al área técnica las inquietudes de la presente reunión	Contratista	Próxima reunión

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

FORMATO													
LISTA DE ASISTENCIA													
CÓDIGO FO-PE-13		PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA							VERSIÓN 4		BOGOTÁ		
Tipo de Evento:		Ranión		Lugar		Parque Gran Bitolía						Fecha 14 08 2023	
Nombre Evento		comité de participación ciudadana parque Gran Bitolía											
Hora de inicio		10:15 am		Duración (horas)		40 min		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)			☒ Uso interno(exclusivo para el área/proc) ☐ Clasificada ☐ Reservado		
Área Organizadora		Gestión Social											
#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Contacto	Dependencia/Entidad	Tipo Vinculación (Planta-Contratista Apoyo a la gestión-Externo)			Sexo(Hombre-Mujer-Intersexual)			e-mail	Firma	
					P	C	E	H	M	I			
1	Pédro Bernal D	19355734	3104364675	comunidad			X	X			no refiere	<i>LB</i>	
2	Yvendes Nieto	35402618	3214018816	comunidad			X		X		no refiere	<i>Yvendes Nieto</i>	
3	Cayles Parra	19490503	3105734970	comunidad			X	X			no refiere	<i>Cayles Parra</i>	
4	Aura Hernandez	51869648	3103457787	comunidad			X		X		no refiere	<i>Aura Hernandez</i>	
5	Gloria Cortes	52039808	3177004779	comunidad			X		X		no refiere	<i>Gloria Cortes</i>	
6	Gloria Blum	41221340	3228156138	comunidad			X		X		no refiere	<i>Gloria Blum</i>	
7	Mª Linda Prieto	30685787	3143858977	comunidad			X		X		no refiere	<i>Mª Linda Prieto</i>	
8	ANTONIA PERCS	321204615	comunidad				X		X		no refiere	<i>ANTONIA PERCS</i>	
9	Ingrid Baez	1010208893	3073569373	contratista		X			X		aspaquesrennedy@gmail.com	<i>Ingrid Baez</i>	
10	Yessica Arevalo	32288949	3213905517	Contratista		X			X		aspaquesrennedy@gmail.com	<i>Yessica Arevalo</i>	
11													
12													
13													
14													
15													
16													

CONSORCIO
PARQUES EDC
2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÓN EL
ALMENAR CÓDIGO IDRD 08-253

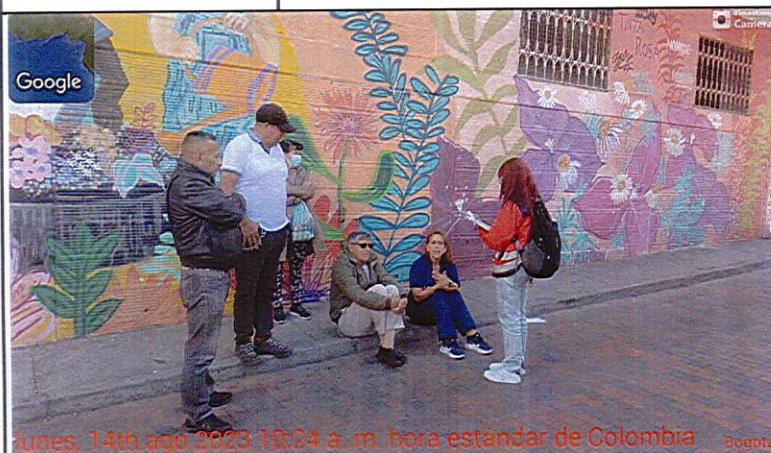


FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÓN EL
ALMENAR CÓDIGO IDRD 08-253

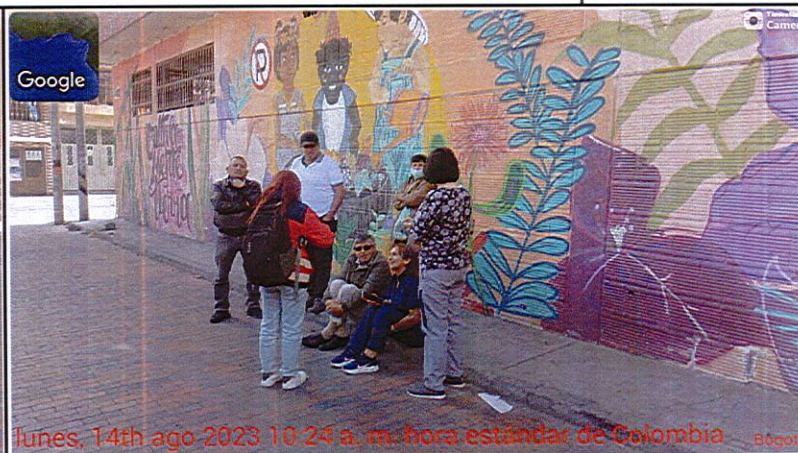


FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÓN EL ALMENAR
CÓDIGO IDRD 08-253



FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÓN EL
ALMENAR CÓDIGO IDRD 08-253



FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÓN EL ALMENAR
CÓDIGO IDRD 08-253

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El 14 de agosto de 2023 se realiza el comité de participación ciudadana del parque COD 08-153 Bertha Hernández de Ospina.
La profesional social del contratista inicio la reunión dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación
Por parte del contratista realiza acompañamiento el área técnica social, ambiental y SST.
Por parte de la interventoría realiza acompañamiento el área técnica, y social.
Así mismo se da la bienvenida a los asistentes por parte de la comunidad en general.
En seguida la profesional social del contratista les informa a los asistentes que el objetivo de la reunión es dar a conocer las actividades que se están realizando en el parque hasta la fecha.
<ul style="list-style-type: none"> • Retiro de césped y trasiego de materiales • Instalación de encofrado de placas de graderías. • Corte de acero, para pilotes y encofrado de bordes de placas de graderías. • Lijado de estructuras de baloncesto. • Lijado de estructuras de Futbol.
<p>Una vez se informa las actividades del área técnica, se procede a informar las actividades el área de seguridad y salud realizadas hasta la fecha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exámenes de ingreso al personal • Se implementa programa de prevención y promoción • Suministro a los trabajadores de los elementos de protección personal • Implementación de brigada de emergencia

En el componente ambiental se informa que las actividades realizadas hasta la fecha

- Implementación de plan de manejo de tráfico
- Cerramiento perimetral del parque en malla verde y azul con cinta de seguridad
- Acopio de materiales
- Puntos Ecológicos

Se informa del área de gestión social que las actividades realizadas hasta la fecha son:

- Levantamiento de actas de inspección preliminar del parque e inventario de elementos existentes del parque.
- Reunión de inicio
- Entrega de volantes de convocatoria a reunión de inicio, y comités de participación ciudadana.
- Se mantiene instalada la valla informativa del parque

Inquietudes de la comunidad

Los asistentes a la reunión comentaron que no están de acuerdo con los trabajos que se están realizando ya que solicitan que se hagan los que quedaron en las actas de las primeras reuniones con la alcaldesa en ese momento y solicitan las copias de estas actas.

RTA: Se informa que se hará entrega de las actas solicitadas.

Uno de los asistentes a la reunión solicita Preguntarle al arquitecto Felipe Peña del FDLK en que va el trámite para el traslado del vehículo que está estacionado al lado de la cancha porque de está prestando para atracos.

RTA: Se informa que se escalaran las dudas de la presente reunión al FDLK

EVIDENCIA DE REUNION

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Escalar al área técnica las inquietudes de la presente reunión	Contratista	Próxima reunión

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA										BOGOTÁ		
CÓDIGO FO-PE-13		PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA						VERSIÓN 4		Fecha		
Tipo de Evento:		Reunión		Lugar		Parque Bertha Hernandez Ospina				14 08 2023		
Nombre Evento		Comité de participación ciudadana Parque Bertha Hernandez Ospina 08-153										
Hora de inicio		12:00 m		Duración (horas)		40 min		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☒ Uso interno(exclusivo para el área/proc) ☐ Clasificada ☐ Reservado		
Área Organizadora		Gestión Social										
#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Contacto	Dependencia/Entidad	Tipo Vinculación (Planta-Contratista Apoyo a la gestión-Externo)			Sexo(Hombre-Mujer-Intersexual)			e-mail	Firma
					P	C	E	H	M	I		
1	F Lora B. Bolívar	81.661218	3106099550	Comunidad			X		X		no refiere	<i>F Lora</i>
2	Dagoberto Ortiz	19.358.372	3106099550	Comunidad			X	X			no refiere	<i>Dagoberto</i>
3	Rizari Pineda	11293847	314225922	COMA-III			X	X			no refiere	<i>Rizari Pineda</i>
4	ALBA NELLY ORTIZ	38.241860	3167289573	ROMA III			X	X			no refiere	<i>Alba Nelly Ortiz</i>
5	Jaime Ramirez	19395039	3213881518	ROMA 9			X	X			no refiere	<i>Jaime Ramirez</i>
6	Edilma Torres	41686875	3158110849	T.P.C. ROMA			X	X			no refiere	<i>Edilma Torres</i>
7	Ingrid Baez	1010208893	3023569573	Contratista			X		X		resden-lessteregma	<i>Ingrid Baez</i>
8	Luisa Cervera	110589519	300842889	Intercomunicación			X		X		comunicacion@...	<i>Luisa Cervera</i>
9	Gregorio Nova	9523374	316537659	Comunidad			X		X		grnovacalidad@...	<i>Gregorio Nova</i>
10	Oscar Jimenez	72303644	3105925442	Comunidad			X				oscarjimenez775@gmail.com	<i>Oscar Jimenez</i>
11	Shaw Henao	39757365	3175185813	Comunidad			X		X		shawhenao@gmail.com	<i>Shaw Henao</i>
12	Cesica Arevalo	52288949	3213908519	Contratista		X			X		cesicaarevalo@gmail.com	<i>Cesica Arevalo</i>
13												
14												
15												
16												

CONSORCIO
PARQUES EDC
2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153



lunes, 14th ago 2023 12:12 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153



lunes, 14th ago 2023 12:12 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153



lunes, 14th ago 2023 12:12 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153



lunes, 14th ago 2023 12:12 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA CÓDIGO IDRD 08-153

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El 14 de agosto de 2023 se realiza el comité de participación ciudadana del parque COD 08-681 Desarrollo Tayrona.
La profesional social del contratista inicio la reunión dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación.
Por parte del contratista realiza acompañamiento el área técnica social, ambiental y SST.
Por parte de la interventoría realiza acompañamiento el área técnica, y social.
Así mismo se da la bienvenida a los asistentes por parte de la comunidad en general.
En seguida la profesional social del contratista les informa a los asistentes que el objetivo de la reunión es dar a conocer las actividades que se están realizando en el parque hasta la fecha.
Se informa a la comunidad que a la fecha ni se han iniciado con las actividades de mantenimiento del parque pero que se iniciara en el transcurso de la semana.
<p>Una vez se informa las actividades del área técnica, se procede a informar las actividades el área de seguridad y salud realizadas hasta la fecha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exámenes de ingreso al personal • Se implementa programa de prevención y promoción • Suministro a los trabajadores de los elementos de protección personal • Implementación de brigada de emergencia
<p>En el componente ambiental se informa que las actividades realizadas hasta la fecha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de plan de manejo de tráfico • Cerramiento perimetral del parque en malla verde y azul con cinta de seguridad • Acopio de materiales • Puntos Ecológicos
<p>Se informa del área de gestión social que las actividades realizadas hasta la fecha son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de actas de inspección preliminar del parque e inventario de

EVIDENCIA DE REUNION

elementos existentes del parque.

- Reunión de inicio
- Entrega de volantes de convocatoria a reunión de inicio, y comités de participación ciudadana.
- Se mantiene instalada la valla informativa del parque

Inquietudes de la comunidad

La señora Leonor de la JAC pregunto qué posibilidad existía de que se instalen bancas al lado de la cancha.

RTA: Se informa que se escalará la inquietud al área técnica y se dará a conocer en el próximo comité

Uno de los asistentes a la reunión pregunta que fecha de entrega tiene el parque

RTA: Se informa a la ciudadana que en el transcurso del mes de septiembre se tienen contemplado terminar las actividades de obra en el parque.

Uno de los asisten a la reunión pregunta cuando inician obra.

RTA: Se informa que se tiene contemplado iniciar en el transcurso de la presente semana.

Uno del asistente a la reunión solicita se haga entrega a la comunidad de las estructuras que se desmonten en la cancha.

Se informa que una ves se desmonten las estructuras se dará a conocer a la JAC para hacer la respectiva entrega.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Iniciar con el mantenimiento del parque	Contratista	Presente semana

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
3 de 4

EVIDENCIA DE REUNION

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

FORMATO										BOGOTÁ		
LISTA DE ASISTENCIA												
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN				
FO-PE-13		PLANEACION ESTRATEGICA						4				
Tipo de Evento:		Reunion		Lugar		Parque Taylora.				Fecha		
Nombre Evento		Comité de participación ciudadana parque Taylora. 08-681										
Hora de inicio		2:00pm		Duración (horas)		40 min.		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☒ Uso interno(exclusivo para el área/proc) ☐ Clasificada ☐ Reservado		
Área Organizadora		Gestión Social										
#	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Contacto	Dependencia/Entidad	Tipo Vinculación (Planta-Contratista Apoyo a la gestión-Externo)			Sexo(Hombre-Mujer-Intersexual)			e-mail	Firma
					P	C	E	H	M	I		
1	Leonor García R.	41647437	3208458103	Taylora			X		X		5 Actoayana.8141	[Firma]
2	Wilsa García	111058956	300847889	Intermunicipal			X		X		W. Garcia	[Firma]
3	Josue Fonseca	18122963	321358237	Taylora			X		X		Josue Fonseca Estela	[Firma]
4	Yessy Aquiles	52288944	3213905517	Contratista		X			X		632.@.yimey.com	[Firma]
5	Ingrid Baet	1010208893	3023569570	Contratista		X			X		le.dentesst@gmail.com	[Firma]
6	Jose Peña	—	3123720428	Contratista		X		X			—	[Firma]
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

CONSORCIO
PARQUES EDC
2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARQUE DESARROLLO TAYRONA CÓDIGO IDRD 08-681



lunes, 14th ago 2023 02:11 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
DESARROLLO TAYRONA CÓDIGO IDRD 08-681



lunes, 14th ago 2023 02:11 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
DESARROLLO TAYRONA CÓDIGO IDRD 08-681



lunes, 14th ago 2023 02:26 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
DESARROLLO TAYRONA CÓDIGO IDRD 08-681



lunes, 14th ago 2023 02:26 p. m. hora estándar de Colombia Bogotá

FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARQUE
DESARROLLO TAYRONA CÓDIGO IDRD 08-681
