



INFORME SEMANAL					
Semana Número: 7		Del: 8 de enero de 2024		Al: 14 de enero de 2024	
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		40 Días			
ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		SEDE CHAPARRAL		SUPERVISOR CESAR BURGOS	
OBJETO:					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1".					
		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)		9,79%		79,20%	
Valor básico de la Obra		\$ 2.738.300,56		\$ 22.152.543,87	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		CONSORCIO SEDE MARSAF		Interventor:	
Contrato No.		2391 de 2023		Contrato No.	
Valor Inicial:		600.182.493,03		Valor Inicial:	
Valor Actualizado:		600.182.493,03		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:		31 de diciembre de 2023		Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:		24 de febrero de 2024		Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:		22 de noviembre de 2023		Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:		24 de febrero de 2024		Fecha de Vencimiento:	
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA			
AVANCE					

Actividades Finalizadas en esta sede.

IMAGENES AVANCE	
	
Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en circulaciones internas del Piso 1.	Comentario: Aplicación de acabados y piuntura a superficies de cielo raso y paredes de la oficina del Registrador.

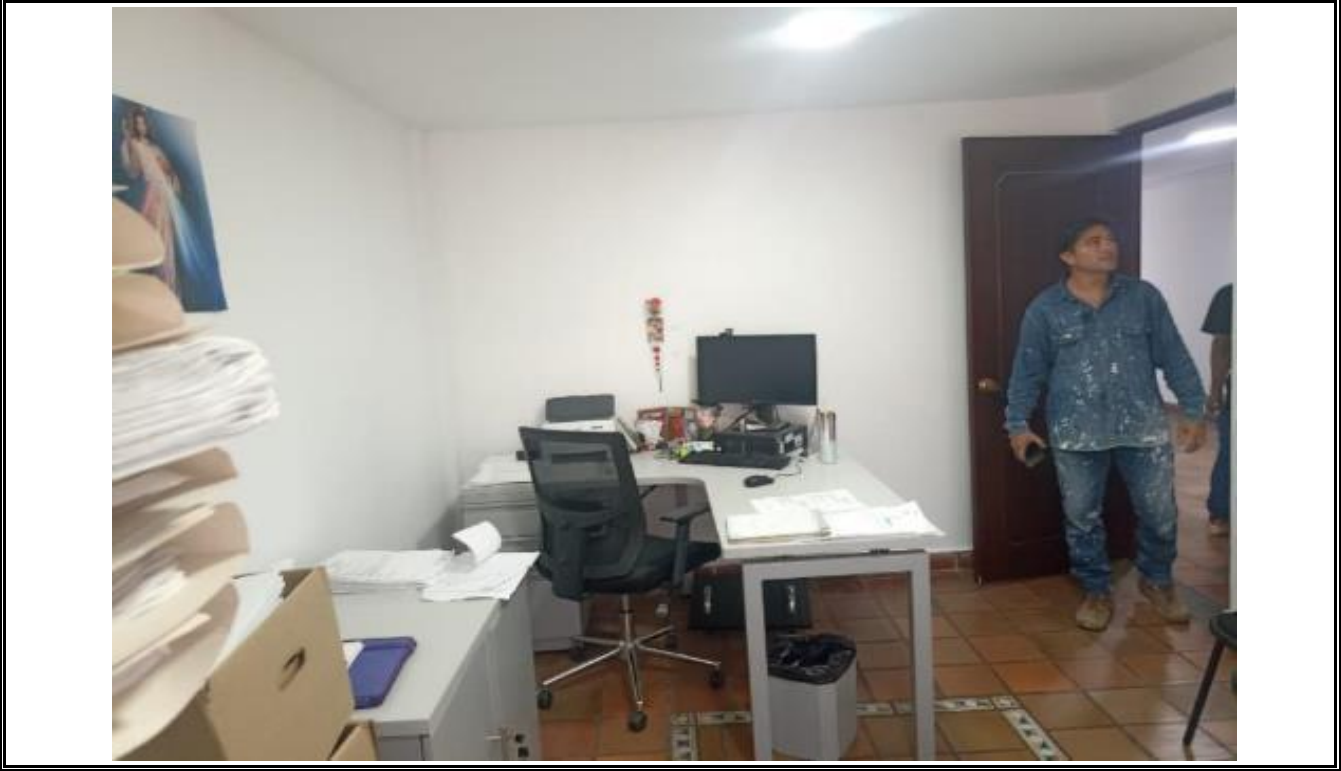


Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en Área de Atención al Público. Acopio provisional y retiro de material.



Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en oficinas administrativas.



Comentario: Aseo General, desmanche de pisos en tablta cerámica de gres en área de escalera.

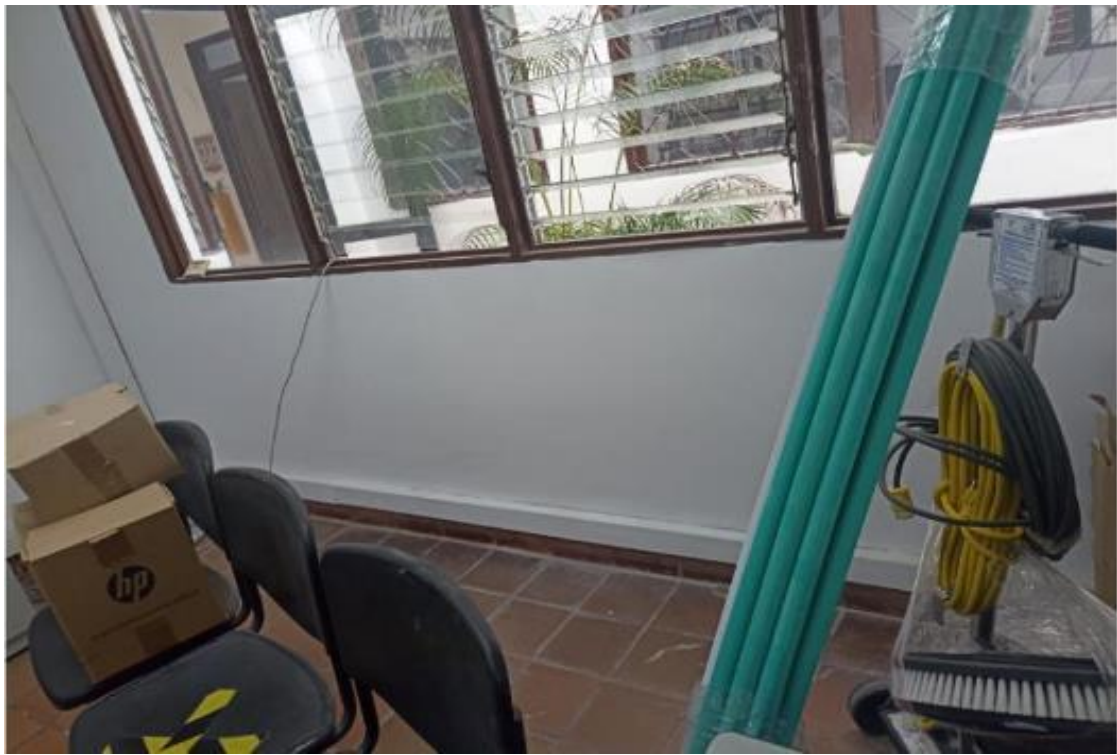

Comentario: Aplicación de acabados, estuco y pintura en oficinas administrativas.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.</div> <div>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND</div>
