



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

CONTRATO	026	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	9	INFORME FINAL	
1. DATOS GENERALES			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA		
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	034 DE FEBRERO 24 DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	026		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FEBRERO 21 DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.		
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
NIT/CC	1113311986-2		
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA		
CÓDIGO CIUU CONTRATISTA	4923 Transporte de carga por carretera		

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIUU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 27.500.000	
ADICION EN VALOR	\$ - 0 -	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 30 DE 2024	
ADICION EN TIEMPO		
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO	
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO		
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO		
NOMBRE DEL CESIONARIO		
NIT/CC		
REPRESENTANTE LEGAL		
GARANTIAS SI O NO	NO	
NUMERO DE POLIZA		
TIPO DE GARANTIAS		
Supervisión e Interventoría	Nombre	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0000050	Valor(es)	\$ 27.500.000	FECHA(S)	ENERO 22 DE 2024
---------------	---------	-----------	---------------	----------	------------------

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

N° RP	0000277	Valor (es)	\$ 27.500.000	FECHA (S)	FEBRERO 21 DE 2024
--------------	---------	------------	---------------	-----------	--------------------

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.0092402112979904 - Propósito General Libre Inversión
--	---

Valor contratado	\$ 27.500.000
------------------	---------------

Valor Primer pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Segundo pago parcial	\$ 2.750.000
----------------------------	--------------

Valor Tercer pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Cuarto pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Quinto pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Sexto pago parcial	\$ 2.750.000
--------------------------	--------------

Valor Séptimo pago parcial	\$ 2.750.000
----------------------------	--------------

Valor Octavo pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Valor Noveno pago parcial	\$ 2.750.000
---------------------------	--------------

Saldo ejecutado a la fecha	\$ 22.000.000
----------------------------	---------------

Saldo por Ejecutar	\$ 2.750.000
--------------------	--------------

**2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS
SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4575229682	OCTUBRE
PENSION	4575229682	OCTUBRE
ARL		

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades																									
22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ACTIVIDADES CONTRATADAS (A 10 MESES)																									
	<table><tr><th>DETALLE</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VR UNIT</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>Realizar inspección Motoniveladora</td><td>No.</td><td>264</td><td>28.000</td><td>7.392.000</td></tr><tr><td>Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora</td><td>No.</td><td>44</td><td>90.000</td><td>3.960.000</td></tr><tr><td>Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión</td><td>No.</td><td>44</td><td>367.000</td><td>16.148.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$27.500.000</td></tr></table>	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	7.392.000	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	3.960.000	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	16.148.000	TOTAL				\$27.500.000
	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL																					
	Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	7.392.000																					
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	3.960.000																					
	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	16.148.000																					
	TOTAL				\$27.500.000																					
	ACTIVIDADES EJECUTADAS (A 1 MES)																									
	<table><tr><th>DETALLE</th><th>UND</th><th>CANT</th><th>VR UNIT</th><th>VR TOTAL</th></tr><tr><td>Realizar inspección Motoniveladora</td><td>Nº</td><td>26.4</td><td>28.000</td><td>739.200</td></tr><tr><td>Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora</td><td>Nº</td><td>4.4</td><td>90.000</td><td>396.000</td></tr><tr><td>Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión</td><td>Nº</td><td>4.4</td><td>367.000</td><td>1.614.800</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$2.750.000</td></tr></table>	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	Realizar inspección Motoniveladora	Nº	26.4	28.000	739.200	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4.4	90.000	396.000	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4.4	367.000	1.614.800	TOTAL				\$2.750.000
	DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL																					
	Realizar inspección Motoniveladora	Nº	26.4	28.000	739.200																					
	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	Nº	4.4	90.000	396.000																					
	Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	Nº	4.4	367.000	1.614.800																					
	TOTAL				\$2.750.000																					
	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES																									
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTO</th><th>RESULTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS</td><td>Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora</td><td>Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma,</td><td>10%</td></tr></table>	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma,	10%																		
ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN																							
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma,	10%																							

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

			llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad (Cant. 26.4)	10%
		Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos (Cant. 4.4)	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	Atención de 135.5 Kms de vías rurales Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector Barragán. Longitud 1 km . Recuperación y ampliación de vía, limpieza de material vegetal. Sector Vía al Crucero. Longitud 5 km Descalificación de ligares con más deterioro. Sector La Rivera, punto placa huellas. Longitud 0.2 km Arreglo Cuneta con deterioro. Sector San Gerardo Bajo. Longitud 13 km Conformación de vía y limpieza de capa vegetal. Sector Limones-Samaria. Longitud 5 km Descoles en charcos de aguas lluvias.	17%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	Atención de 4Km de vías urbanas Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas.	Sector Calle 8 Carrera 7 Limpieza y conformación de vía. Longitud 0.2 km Sector entrada Planta de Beneficio Animal. Conformación y limpieza de vía. Longitud 0.3 Km Sector Brisas del Norte. Conformación de vía,	25%

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

		- Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías	retiro de escombros y capa vegetal. Longitud 0.3 km	
		Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2,6KM de vías asfaltadas en la zona urbana		
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Sector Limones-Samaria. Descoles en charcos de aguas lluvias. Descargue en el lugar de 28 m³ . Sector Brisas del Norte. Retiro de escombros y capa vegetal. 49 m³ .	
		Otras Actividades de Apoyo	Sector Parque agroindustrial (Bodega Secretaría de obras Públicas) Apoyo en construcción de sumidero, colocación de rejilla y limpieza de sumidero	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Registro Fotográfico

Calle 8 Carrera 7 Conformación y limpieza de vía



Vía Barragán, recuperación y ampliación de vía, limpieza material vegetal



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Entrada Planta de Beneficio Animal, Conformación y limpieza



Vía el Crucero, Descalificación sectores críticos



CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Vía La Rivera, Arreglo cuneta



Vía San Gerardo Bajo, Conformación y limpieza de vía



CONTROL DE CAMBIOS


VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Parque Agroindustrial, Construcción sumidero, rejilla.

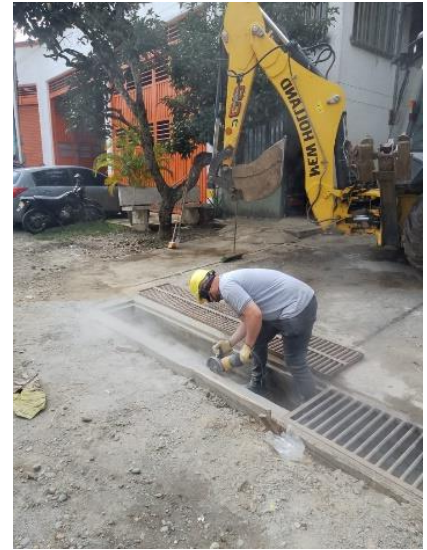

Vía Limones – Samaria, descoles charcos aguas lluvias



CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

Brisas del Norte, Conformación vía y retiro de escombros



Mantenimiento preventivo de Motoniveladora y Retroexcavadora



4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos. (Se realizo mantenimiento programado de la motoniveladora new Holand Rg 140 b a las 1350 horas. Cambio de filtros de combustible, aire, servotransmisión, aceite e hidráulico con su cambio de aceite de motor; además se realizó reparación de la base y la cuchilla que se rompió por causa de una piedra en la vía).

Sector Barragán. Longitud 1 km. Recuperación y ampliación de vía, limpieza de material vegetal; Sector Vía al Crucero. Longitud 5 km Descalificación de ligares con más deterioro; Sector La Rivera, punto placa huellas. Longitud 0.2 km. Arreglo Cuneta con deterioro; Sector San Gerardo Bajo. Longitud 13 km. Conformación de vía y limpieza de capa vegetal; Sector Limones-Samaria. Longitud 5 km. Descoles en charcos de aguas lluvias; Sector Calle 8 Carrera 7. Limpieza y conformación de vía. Longitud 0.2 km; Sector entrada Planta de Beneficio Animal. Conformación y limpieza de vía. Longitud 0.3 Km; Sector Brisas del Norte. Conformación de vía, retiro de escombros y capa vegetal. Longitud 0.3 km; Sector Limones-Samaria. Descoles en charcos de aguas lluvias. Descargue en el lugar de 28 m3; Sector Brisas del Norte. Retiro de escombros y capa vegetal. 49 m3; Sector Parque agroindustrial (Bodega Secretaria de obras Públicas); Apoyo en construcción de sumidero, colocación de rejilla y limpieza de sumidero.

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE

\$ 2.750.000

Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO X

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 003
Fecha: 12.08.2024

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO X

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI X NO___

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI X NO___

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia Valle, 27 de noviembre de 2024

Firma del interventor y/o supervisor:

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO

Secretario de Obras Públicas
Supervisión

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
