

 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachía Nit. 891 857 920-2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ			 SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			
	PROCESO MISIONAL			
	INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS			
	Versión 01	A-MECI-GD-FO-02	FECHA:30-08-2016	

**INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO MC No. 048-DE-2024**

CIUDAD Y FECHA	COVARACHÍA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
OBJETO	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LIMÓN DULCE DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COVARACHÍA NIT 891857920-2 RL: YOLANDA SALAZAR SIERRA CC 23.454.291 DE COVARACHIA - BOYACA
CONTRATISTA	CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901562679-1 R/L: SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS C.C. 1.077.086.615 DE TOCANCIPÁ
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUERENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$33.610.746)
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUERENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$33.610.746)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	CERO (00) PESOS
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION SEGUN ACTA DE INICIO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA SUSPENSION No 1	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024

 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachía Nit. 891 857 920-2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ				 SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO				
	PROCESO MISIONAL				
	INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS				
	Versión 01	A-MECI-GD-FO-02	FECHA:30-08-2016	Página 2 de 6	

FECHA ACTA REINICIO SUSPENSION No 1	TRECE (13) DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE PRORROGA No 1	VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGUN ACTA DE PRORROGA No 1	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
SUPERVISION	SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
PERIODO DEL INFORME	DEL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024 AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025

Como funcionario delegado por el Municipio de Covarachía, para la supervisión de la ejecución del CONTRATO MC No. 054 DE 2024, y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4°, 14°, y 26° de la Ley 80 de 1993, indico que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el contratista a satisfacción, de acuerdo al siguiente por menor:
 El Contratista ejecutó el objeto contractual, realizando las siguientes actividades generales y servicios específicos:

ITEM	OBLIGACION	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA
OBLIGACIONES GENERALES		
1	Cumplir con el objeto del contrato estipulado en los estudios y la invitación pública, la propuesta presentada y la comunicación de aceptación que se suscriba, dentro de los términos establecidos.	El contratista cumplió con el objeto del contrato estipulado en la invitación pública, la propuesta presentada y la comunicación de aceptación que se suscribió, dentro de los términos establecidos.
2	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor.	El contratista acató las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartieron por parte del supervisor.
3	Cumplir con las especificaciones técnicas presentadas en la oferta y las contenidas en la Invitación.	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas presentadas



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachía
Nit. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO MISIONAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS

Versión 01

A-MECI-GD-FO-02

FECHA:30-08-2016

Página 3 de 6



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

		en la oferta y las contenidas en la invitación.
4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	El contratista obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
5	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	El contratista no accedió a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
6	Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo o con objeto del contrato.	El contratista mantuvo reserva sobre la información que legalmente ameritaba ese trato, que le fue suministrada para el desarrollo o con objeto del contrato.
7	Radicar las facturas o cuentas de cobro dentro de los plazos convenidos.	El contratista radicó las facturas o cuentas de cobro dentro de los plazos convenidos.
8	Acreditar estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, en los términos del Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018.	El contratista acreditó estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, en los términos del Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018.
9	Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Alcaldía Municipal de Covarachía para la ejecución del contrato.	El contratista aceptó los procedimientos administrativos que determinó la Alcaldía Municipal de Covarachía para la ejecución del contrato.
10	Abstenerse de adelantar intervenciones alguna de los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando apliquen intervenciones).	El contratista se abstuvo de adelantar intervenciones de alguno de los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando apliquen intervenciones).
11	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	El contratista dio cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachia
Nit. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO MISIONAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS

Versión 01

A-MECI-GD-FO-02

FECHA:30-08-2016

Página 4 de 6



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

12	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	El contratista manifestó que no se presentó situación que implicase una modificación del estado de riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
13	Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del contrato.	El contratista comunicó inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del contrato.
14	Las demás que por ley o contrato le correspondan.	El contratista dio cumplimiento a las demás obligaciones que por ley o contrato le correspondieron.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1	Presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato.	El contratista presentó los documentos necesarios para la suscripción del contrato.
2	Elaborar oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo.	El contratista elaboró oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo.
3	Realizar entrega, según las necesidades y requerimientos de la alcaldía municipal, dentro de los plazos establecidos, manteniendo las especificaciones técnicas.	El contratista realizó entrega, según las necesidades y requerimientos de la alcaldía municipal, dentro de los plazos establecidos, manteniendo las especificaciones técnicas.
4	Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, y para las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	El contratista desarrolló el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, y para las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
5	Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos de la oferta que sea adjudicada, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando	El contratista cumplió con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos de la oferta que fue adjudicada, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando

 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachia Nit. 891 857 920-2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ			 SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			
	PROCESO MISIONAL			
	INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS			
	Versión 01	A-MECI-GD-FO-02	FECHA:30-08-2016	

	oportuna e idóneamente el objeto contratado.	oportuna e idóneamente el objeto contratado.
6	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	El contratista mantuvo estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conoció por causa o con ocasión del contrato.
7	Otorgar las Garantías que apliquen según el presente proceso.	El contratista otorgó las Garantías que aplicaron según el presente proceso.
8	Informar oportunamente al supervisor del contrato, de toda novedad o situación que implique modificaciones, suspensiones, prórrogas y demás aspectos que alteren la normal ejecución del contrato.	El contratista informó oportunamente al supervisor del contrato, de toda novedad o situación que implicó modificaciones, suspensiones, prórrogas y demás aspectos que alteren la normal ejecución del contrato.
9	Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del contrato	El contratista atendió todas las recomendaciones que oportunamente indicó el supervisor del contrato
10	Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan sobre el particular.	El contratista dio cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan sobre el particular.

BALANCE DE PAGOS		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 202412004	Certificado de Registro Presupuestal: 202412081	
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Inicial del Contrato	\$ 33.610.746,00	
Valor Adición	\$ 00,0	
Valor Acta de Pago		\$ 33.610.746,00
Saldo a Favor del Municipio		\$ 00,0
Sumas Iguales	\$ 33.610.746,00	\$ 33.610.746,00

 República de Colombia Departamento de Boyacá Municipio de Covarachía Nit. 891 857 920-2	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ			 SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			
	PROCESO MISIONAL			
	INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS			
	Versión 01	A-MECI-GD-FO-02	FECHA:30-08-2016	

El suscrito SUPERVISOR DEL CONTRATO en mención, igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales y Laborales, anexando copia de las planillas de seguridad.



CARLOS ANDRES SUESCUN BALLESTEROS
 SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

Proyectó / Arq. Fausto Leonel Adarme Rojas



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachia
Nit. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO MISIONAL


INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 7 de 11



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

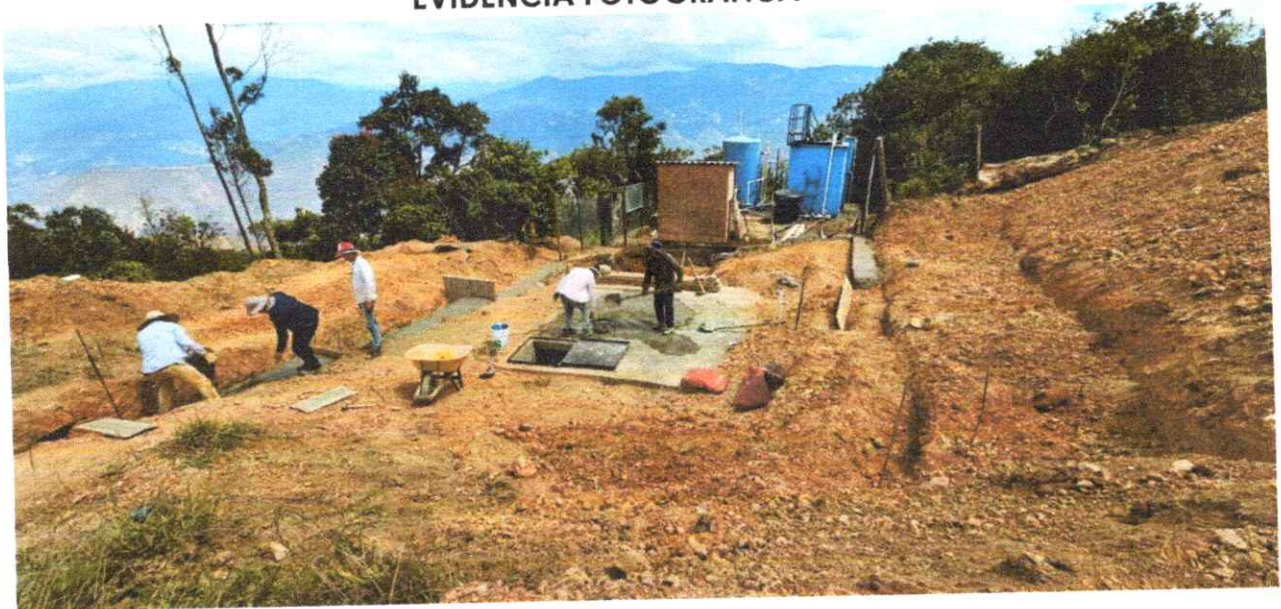



República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachía
Nit. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO MISIONAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 8 de 11





República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachia
Nº. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO MISIONAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 9 de 11





República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachía
Nit. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO


PROCESO MISIONAL


INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 10 de 11

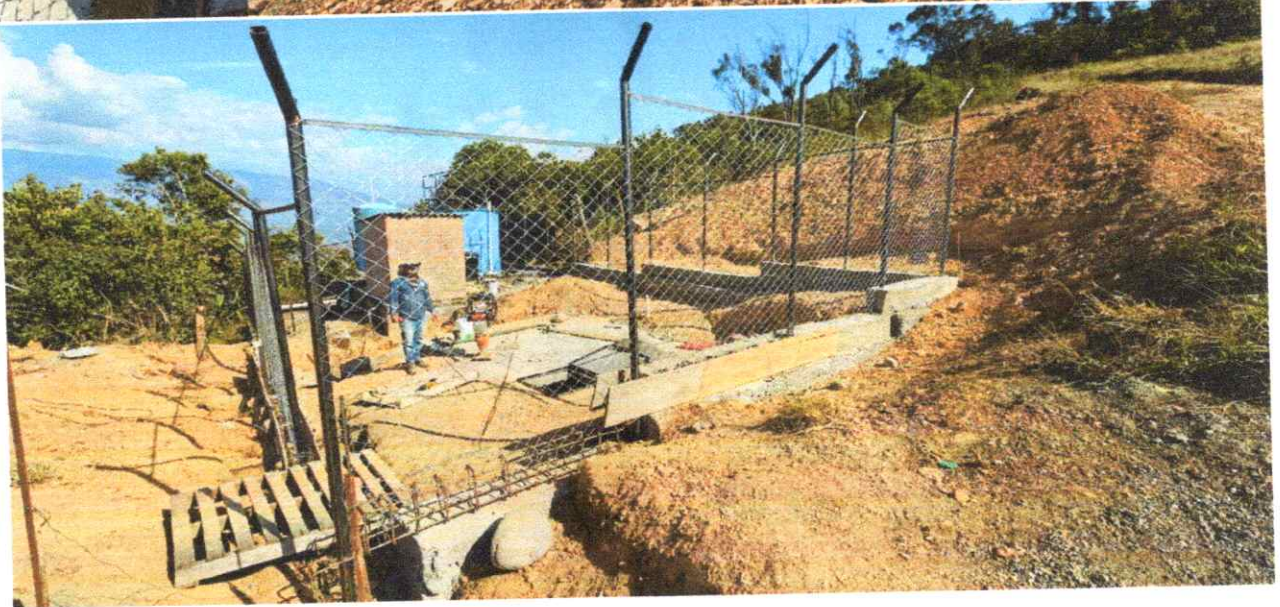





República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Covarachía
Nit. 891 857 920-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE COVARACHÍA - BOYACÁ
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROCESO MISIONAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS



SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

Versión 01 A-MECI-GD-FO-02 FECHA:30-08-2016 Página 11 de 11



