



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



Ibagué, 12 de Marzo de 2025

Doctora
KATERYNE LEÓN MIRANDA
Directora Oficina de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha 12 MAR 2025
Hora 10:45 a.m.
Nº Rdo
Recibe lu

ASUNTO: Radicación de Solicitud de Prorroga del contrato No. 1784 de 2021


Respetada Doctora;

Mediante la presente me permito radicar la siguiente Información:

1. Acta solicitud de prorroga y anexos

del Contrato No. 1784 de 2021 cuyo objeto es "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Añadido a lo anterior cargar la información en el SECOP 2.

Cordial saludo,


JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ
Supervisor

Elaboro: Ing. Leandro Arias – Contratista – Apoyo SIH

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha 14 MAR 2025
Hora 4:55 a.m.
Nº Rdo Perro
Recibe le

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:	Crédito, propio e Invías				
Fecha de elaboración de la solicitud:	12	de	03	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato y/o Convenio número:	1784	de	27 DE AGOSTO DE 2021
Objeto del Contrato y/o Convenio: "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			
Interventor:	CONSORCIO IC & CB NIT. 901.521.515-5 REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA. C.C. 79.730.604		
Supervisor:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
Contratista y/o Cooperante:	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL. NIT 901.505.619-5 REPRESENTANTE LEGAL: (S) JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ. C.C 79.946.569		
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	\$46.209.359.460,00 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE)		
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	SEIS MESES (06), CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:	26	de	octubre de 2021
Fecha de terminación inicial del Contrato y/o Convenio:	25	de	Abril de 2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Acta de suspensión N°001	29 DE JUNIO DE 2022
Acta de reinicio N°001	03 DE AGOSTO DE 2022
Acta de suspensión N°002	29 DE ENERO DE 2024
Acta de reinicio N°002	6 DE MAYO 2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato y/o Convenio No.	Tiempo (días calendario)
Acta Adicional N°001 de fecha 21/04/2022	Mediante Acta adicional N°001 del 21 de abril de 2022 se prorrogó 3 meses el contrato para un plazo de ejecución de 9 meses.
Acta Adicional N°002 de fecha 21/07/2022	Mediante Acta adicional N°002 del 21 de Julio de 2022 se prorrogó 6 días calendario al contrato para un plazo total de ejecución de 9 meses y 6 días.
Acta Adicional N°003 de Fecha 05/08/2022	Mediante Acta adicional N°003 del 5 de agosto de 2022 se prorrogó 148 días calendario al contrato para un plazo total de ejecución de 14 meses y 5 días.
Acta Adicional N°004 de Fecha 21/11/2022	Mediante Acta adicional N°004 del 23 de noviembre de 2022 se prorrogó 5 meses el contrato para un plazo total de ejecución de 19 meses y 5 días, y modificar la cláusula 5. VALOR DEL CONTRATO, adicionando la suma de \$11.063.040.907,84 para un total del valor del contrato de \$ 57.272.400.367,84.
Acta N°005 Aclaratoria al Acta N°004 modificatoria de fecha 23/11/2022	Que por error de digitación en la minuta del Acta ADICIONAL N°004 AL CONTRATO N°1784 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021, Se omitió incluir la descripción del certificado de disponibilidad presupuestal
Acta N°006 Aclaratoria al Acta N°005 modificatoria de fecha 30/11/2022	Que por error de digitación en el ACTA MODIFICATORIA N°005 DEL CONTRATO N°1784 del 27 DE AGOSTO DE 2021 en 01) MODIFICATORIA No se afectaron de manera correcta los certificados de disponibilidad presupuestal.
Acta Adicional N°007 de fecha 15/05/23	Mediante Acta adicional N°007 del 29 de mayo de 2023 se prorrogó 2 meses al contrato para un plazo total de ejecución de 21 meses y 5 días
Acta Adicional N°008 de fecha 28/07/23	Mediante Acta adicional N°008 del 28 de julio de 2023 se prorrogó 2 meses al contrato para un plazo total de ejecución de 23 meses y 5 días.
Acta modificatoria N°008 de fecha 10/08/2023	Mediante Acta adicional N°008 del 10 de agosto 2023 por medio de la cual se modificó la CLAUSULA 8: forma de pago del contrato.
Acta Adicional N°010 Aclaratoria Al Acta Modificatoria Al Contrato 1784 de fecha 20/09/23	Mediante Acta adicional N°010 del 20 de septiembre del 2023 Aclárese que el número del acta de fecha 10 de agosto de 2023 por medio de la cual se modificó la forma de pago del presente contrato es la N°9.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 3 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Acta Adicional N°011 de fecha 27/09/2023	Mediante Acta N°011 del 27 septiembre 2023 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de 1 mes y 3 días.
Acta modificatoria N°012 de fecha 27/10/2023	Mediante Acta N°012 del 27 octubre 2023 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de 1 mes para un total de 25 meses y 8 días.
Acta modificatoria N°013 de fecha 30/11/2023	Mediante Acta N°013 del 30 de noviembre 2023 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de 1 mes y 1 día para un total de 26 meses y 9 días.
Acta modificatoria N°014 de fecha 28/12/2023	Mediante Acta N°014 del 28 de diciembre 2023 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de 3 meses y se adicionan \$3.152.777.269,79 teniendo como fecha próxima de finalización el 31 de marzo de 2024 para un total de 29 meses y 9 días.
Acta aclaratoria N°015 ACTA N°014 PRORROGA N°0010 Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA N°1784 de fecha 29/12/2023	Mediante acta N°015 del 29 de diciembre del 2023 aclárese: "Que por error en la elaboración del acta N°014 prorroga N°0010 y adición al contrato de obra N°1784 del 27 de agosto de 2021, se transcribió de forma incorrecta el valor a adicionar, por ello se hace necesario, aclarar que el valor a adicionar corresponde a TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$3.152.777.269,79) para un valor total de SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE \$60.425.177.637,63"
Acta modificatoria N°10 de fecha 05/07/2024	Mediante Acta Modificatoria N°10 del 5 julio de 2024 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de 2 meses teniendo como fecha próxima de finalización el 7 de septiembre de 2024
Acta modificatoria N°17	Mediante Acta Modificatoria N°16 del 6 septiembre de 2024 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de veintitrés 23 días teniendo como fecha próxima de finalización 30 de septiembre de 2024
Acta modificatoria N°18	Mediante Acta N°018 del 27 de septiembre de 2024 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de 3 meses más un 01 día calendario y se adicionan \$8.888.861.501,13 teniendo como fecha próxima de finalización el 31 de diciembre de 2024., se adiciona al contrato la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$8.888.861.501,13), para un total SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS \$ 69.314.039.138,76
Acta modificatoria N°19	Mediante acta aclaratoria N°19 se aclara que el Nit. del Consorcio Vial Chaparral quedó mal digitado en las ACTAS N°008, N°010, N°016, N°017 y N°018, quedando como NIT del CONSORCIO VIAL CHAPARRAL. NIT 901.505.619-5

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 4 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Acta modificatoria N°20	Mediante Acta N°20 del 27 de diciembre de 2024 la Gobernación del Tolima firmó prorroga al contrato 1784 de 2021 por un término de dos (2) meses y quince (15) días teniendo como fecha de terminación el 15 de marzo de 2025.				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	15	de	marzo	de	2025
Si tiene garantías indicar claramente que se encuentran vigentes.	NOTA: El Supervisor del contrato objeto de modificación, deberá indicar claramente si las garantías se encuentran vigentes. Para la adición del contrato deberá ampliarse la garantía para que la misma cubra el valor adicionado al contrato; cuando se realizan prórrogas y suspensiones al plazo del contrato la garantía deberá ser ampliada en tiempo, de manera tal que abarque la ejecución del contrato y el lapso adicional que resulta de la prórroga o suspensión del contrato; para el caso de las cesiones el nuevo contratista (cesionario) deberá constituir pólizas a favor de la Entidad. Por lo tanto, el (la) Supervisor(a) deberá determinar, de acuerdo con el tipo de modificación, si implica la modificación o actualización de la garantía. Las garantías se encuentran vigentes mediante póliza de cumplimiento No. NB-100177836 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100038146, las cuales se encuentran debidamente publicadas en la plataforma SECOP 2. La actual modificatoria si implica actualización de las garantías.				

Las garantías se encuentran vigentes mediante: Póliza NB- 100038146

AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEG/ACTUAL
Amparo básico – predios, labores y operaciones.	1.155.233.987,00	3.465.701.957,00	3.465.701.956,94
Gastos médicos	346.570.195.00	1.039.710.587,00	1.039.710.587,08
Contratistas y subcontratistas	693.140.391.00	1.039.710.587,00	1.039.710.587,08
Vehículos propios y no propios	693.140.391.00	1.039.710.587,00	1.039.710.587,08

Las garantías se encuentran vigentes mediante: Póliza NB- 100177836

Nombre del Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	21/12/2024	15/10/2025	6.931.403.913,88
PRESTACIONES SOCIALES	27/12/2024	15/03/2028	13.862.807.827,75
CALIDAD DEL SERVICIO	30/09/2024	15/03/2030	737.312.100,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/12/2024	15/03/2025	13.862.807.838,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/03/2025	15/03/2030	13.371.266.427,75

Adiciones

Contrato y/o Convenio No.	Valor (\$)
Acta Adicional N°004 de fecha 21/11/2022	\$11.063.040.907,84
Acta modificatoria N°014 de fecha 28/12/2023	Mediante Acta 014 del 28 de diciembre 2023 la Gobernación del Tolima firmó una adición al contrato 1784 de 2021 \$3.152.777.269,79
Acta modificatoria N°018 de fecha 27/09/2024	Mediante Acta 018 del 27 de septiembre 2024 la Gobernación del Tolima firmó una adición al contrato 1784 de 2021 \$8.888.861.501,13

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 5 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Valor actual del Contrato y/o Convenio:	SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE \$69.314.039.138,76
--	--

Modificaciones		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula N°	Descripción
ACTA N°008 MODIFICATORIA AL CONTRATO 1784 DE 27 DE AGOSTO DE 2021	Modifíquese la CLAUSULA 8: Forma de pago del contrato, la cual quedara de la siguiente manera:	El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obra; El primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al veinte por ciento (20%), Y proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; y los demás pagos al avance de la obra hasta el 95% de la ejecución. El tres por ciento (3%) del valor del contrato será pagadero por el departamento del Tolima al momento de suscribirse el acta de recibo final de obra. 3. Y un pago final equivalente al dos por ciento (2%) de valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos. (...)"

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	MODIFICATORIO 21	Al Contrato 1784 de 2021 No. Proceso LP0-2021-043
Citado así:	Modificar la CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, prorrogándolo en quince (15) días calendario, para un plazo total de 38 meses y 03 días calendario. Teniendo como fecha de terminación el 30 de Marzo de 2025.	

Prórrogas

Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
CLAUSULA N°04	Prorroga por quince (15) días calendario, para un total de TREINTA Y OCHO (38) meses y TRES (3) días calendario				
Fecha actual de terminación del Contrato:	30	de	Marzo	de	2025

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 6 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Adiciones		
Cláusula No.	Valor (\$)	
N/A	N/A	
Fuente de Financiación de los recursos que se van a adicionar (Completar cuando aplique): El contrato se realiza con cargo a recursos de: (marque con una X, según corresponda)	DESTINACIÓN DEL GASTO	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA
	Inversión	
	Funcionamiento	

Cuando la fuente corresponda a recursos del sistema general de participaciones (SGP) se tendrá que señalar la sub fuente a la cual corresponde. (Completar cuando aplique):

FUENTE (ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE VA A CONTRATAR)	MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA
Presupuesto General de la Nación – PGN	
Sistema General de Participaciones – SGP	
(Marque X según corresponda)	
Participación para educación	
Participación para salud	
Participación para propósito general	
• Deporte y Recreación	
• Cultura	
• Propósito general de libre inversión	
• Propósito general de libre destinación municipios categorías 4,5 y 6	
Asignaciones especiales	
• Resguardos indígenas	
• Programas de alimentación escolar	
• Municipios de la ribera del río Magdalena	
Agua Potable y saneamiento básico	
Atención integral de la primera infancia (saldos)	
Sistema General de Regalías SGR	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 7 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

NÚMERO DEL RUBRO	CONCEPTO DEL CDP	VALOR	AFECTACIÓN
XXXXXXXX	XXXXXXXX	\$XXXXXXXX	\$XXXXXXXXXX
BPN: COMPLETAR CUANDO APLIQUE			

Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	\$

Modificaciones	
Se modificarán las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO	
Cláusula N°	Descripción
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:	La cláusula quedará así: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TREINTA Y OCHO (38) MESES Y TRES (03) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Justificación de la solicitud:	Mediante la comunicación CVCH – 647, del 07 de marzo de 2025, el Consorcio Vial Chaparral presentó a la Interventoría la solicitud de prórroga al contrato de obra N°1784 de 2021, justificada así: "Por medio de la presente remitimos ante ustedes la solicitud de prórroga al contrato por un tiempo de quince (15) días calendario, dadas las siguientes justificaciones: Retraso en el giro de recursos por parte de INVIAS Mediante la firma del adicional No. 3, aprobado a través de la modificatoria No. 18 del 30 de septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Vías se comprometió a desembolsar los recursos que respaldan el CDP 4678 del 26 de septiembre de 2024 a la Gobernación del Tolima. A la fecha, dicho compromiso no se ha materializado, afectando el flujo de caja del proyecto. Como ejemplo de esto, el acta parcial No. 21, por un valor de \$583.499.567, presentada en noviembre de 2024, aún no ha sido girada al contratista debido a que la Gobernación no cuenta con los fondos necesarios. Esta situación ha impedido la presentación de nuevas actas de obra porque no se tiene el recurso disponible para el pago de las actividades que se han venido ejecutando desde la fecha del acta anterior a hoy.
---------------------------------------	---

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 8 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Impacto del paro de productores arroceros

En la última semana, el país se ha visto afectado por las manifestaciones y bloqueos viales realizados por los cultivadores de arroz de los departamentos del Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Nariño. Al encontrarnos dentro de una de las zonas afectadas, el transporte de materiales esenciales como agregados y asfaltos se ha visto limitado, lo que deriva en la disminución de los rendimientos de obra.

Viernes, 7 Marzo, 2025


Gremio arrocero mantiene bloqueos mientras avanzan negociaciones con el Gobierno

El paro arrocero en Colombia se extiende por Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Nariño, con bloqueos que han afectado la movilidad y el transporte de carga.




Condiciones climáticas adversas:

Durante los meses de octubre y noviembre de 2024, informamos a la interventoría sobre el impacto negativo que las precipitaciones intensas han tenido en la programación de obra. En lo transcurrido del año 2025, la situación se ha agravado, generando derrumbes recurrentes en el tramo Chaparral - Río Blanco, incluso en sectores previamente estables.

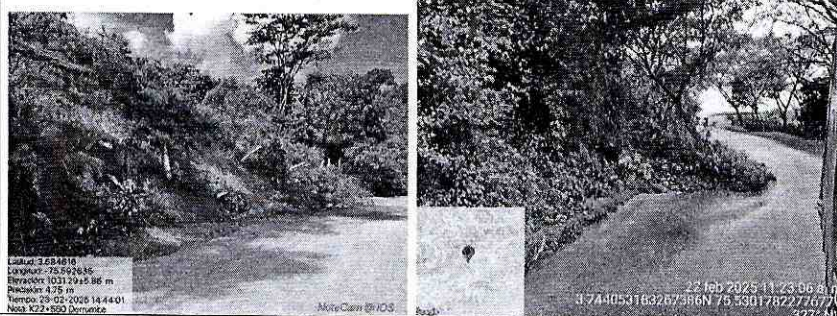


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 10 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Con el fin de garantizar la seguridad vial y la transitabilidad, el consorcio ha destinado maquinaria y personal para la remoción de material en sectores críticos, como La Balastlera, La Guanabanera, Cruce de Maito entre otros. Estas acciones han generado ajustes en el cronograma y la reasignación de recursos operativos, lo que ha impactado la ejecución normal de las actividades constructivas planificadas.

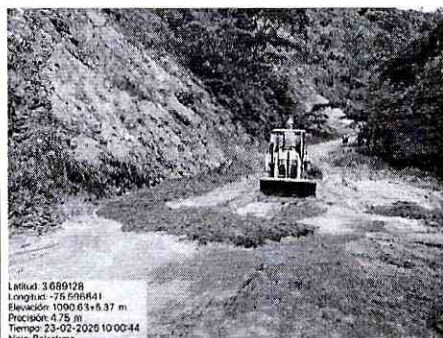

Latitud: 3.699128
 Longitud: -75.698841
 Elevación: 1090.63+5.37 m.
 Proyección: 4.75 m.
 Tiempo: 23-02-2025 10:00:44
 Nota: Balastlera

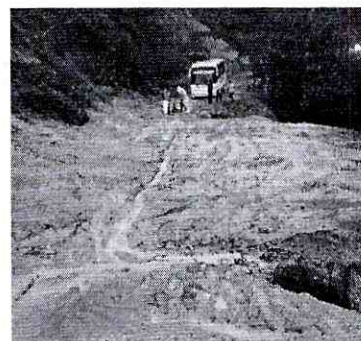

A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de garantías en el giro de los recursos, los bloqueos viales y las condiciones climáticas adversas han afectado la ejecución del proyecto como la consecución y el transporte de materiales necesarios para las actividades de obra. Generando retrasos que comprometen el cumplimiento de los plazos contractuales. Para mitigar estos impactos y garantizar la finalización de las obras con los estándares de calidad establecidos, solicitamos la extensión del contrato por quince días calendario."

JUSTIFICACIÓN LEGAL

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 establece que las modificaciones, prorrogas, adiciones, terminación anticipada, caducidad: de acuerdo a lo establecido en el Decreto departamental, deberá ser tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Se harán los ajustes que se requieran al plan de adaptación de la guía ambiental. La culminación del contrato traerá beneficios a la comunidad al garantizarles seguridad, confort y transitabilidad en los tramos intervenidos en la ejecución del contrato.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 11 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

JUSTIFICACIÓN PREDIAL
N/A"

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA.


La Interventoría mediante comunicación C-1570-GO065-2025, indica,

Consideraciones:

El corredor vial objeto del presente contrato es el que comunica entre si a los municipios de Chaparral y Rioblanco cuyas obras fueron priorizadas por parte de la Gobernación del Tolima entre el K11+280 al K40+040.

A corte de la última acta de obra tramitada N°21, donde se han realizado obras por valor de \$58.260.704.672,39 más provisiones por valor de \$3.163.127.966,00, para un total de \$61.423.832.638,39, equivalente al 88,62%, de lo establecido \$69.314.039.138,76.

A continuación, se presenta un esquema de los sectores de intervención con carpeta asfáltica.

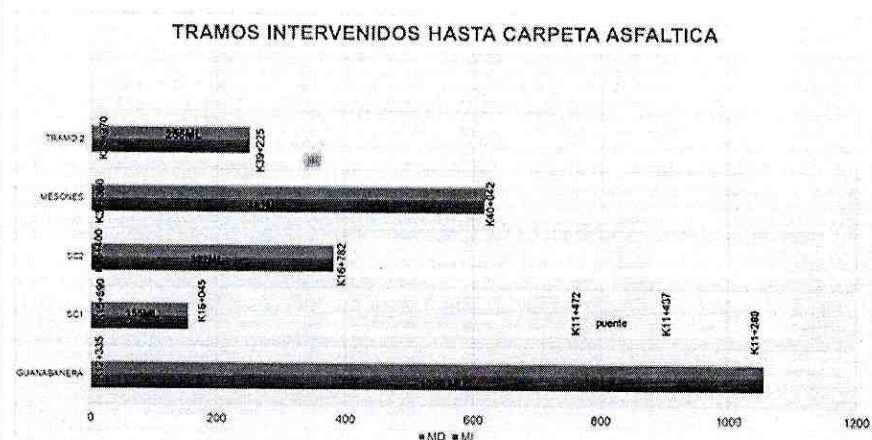

Así mismo, se vienen desarrollando obras correspondientes a las últimas adiciones presupuestales de \$3.152.777.269,79 y \$8.888.861.501,13. En la siguiente tabla se presenta a cuál recurso presupuestal corresponde cada sector crítico y el estado de ejecución.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 12 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD TRAMO (m)	VENTANAS X INESTABILIDAD GEOLOGICA		LONGITUD VENTANA (m)	LONGITUD INTERVENCIÓN (m)	% de long mt	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL				
LA GUAYABANERA	K11+220	K12+323	1.045	K+000	K+000	0.00	1.045	12.2%	META FISICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIÓN N°01
SECTOR CRITICO 1	K12+890	K18+040	150	K+000	K+000	0.00	150	2.4%	TODAS LAS OBRAS TERMINADAS
SECTOR CRITICO 2	K14+450	K16+782	232	K+000	K+000	0.00	232	4.3%	TODAS LAS OBRAS TERMINADAS
EL HELECHAL	K22+210	K23+400	1.190	K23+000	K23+120	120	1.070	17.6%	META FISICA RECURSOS DEL CONTRATO ADICIÓN N°03
ICARCO 1	K35+790	K37+120	1.330	K36+370	K36+480	110	1.220	20.1%	META FISICA RECURSOS CONTRATO ADICIÓN N°02
ICARCO 2	K37+120	K37+721	601	K+000	K+000	0.00	601	9.9%	META FISICA RECURSOS CONTRATO ADICIÓN N°03
EL VISO 2	K38+216	K38+970	754	K38+660	K38+740	80	674	11.1%	META FISICA RECURSOS CONTRATO ADICIÓN N°03
EL VISO 1	K38+970	K37+223	253	K+000	K+000	0.00	253	4.2%	META FISICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIÓN N°01
EL MISTON	K37+320	K40+040	260	K+000	K+000	0.00	260	11.3%	TODAS LAS OBRAS TERMINADAS
PUNTE VERDE									META FISICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIÓN N°03
			6385.00			310.00	6075.00	100%	
META PRECANTALMENTE EJECUTADA									
META FISICA INTERVENIDA A NIVEL DE CARRETA ASFALTICA									
META FISICA EN INTERVENCIÓN									

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Como se ha manifestado, se tienen sectores en donde se realizaron obras de contención y ampliación de la banca de la vía, quedando pendiente su intervención a nivel de estructura de pavimento. Estos sectores fueron objeto de análisis en la determinación del presupuesto de la adición presupuestal N°03 previamente aprobada, con lo cual se determinó una longitud de 2545 metros.

Por lo anterior, es importante indicar que se requiere tramitar la prórroga del Contrato de Obra de la Referencia por 15 días calendario hasta el 30 de marzo de 2025, con el fin de terminar la inversión de los recursos en los sectores en listados anteriormente.


En cuanto a los argumentos expuestos por el Contratista de Obra en su solicitud de prórroga, la Interventoría manifiesta lo siguiente:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 13 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

	- Respecto al <i>“Impacto del paro de productores arroceros”</i>, es del conocimiento de la opinión pública nacional la problemática que actualmente se presenta con el gremio arrocero, generando bloqueos viales que interfieren la normal operación de las vías en distintas regiones del país, para nuestro caso del departamento del Tolima, departamento arrocero por excelencia. En este momento se tienen 1250 metros de base granular lista e imprimada para la instalación del concreto asfáltico respectivo y a mediados de la próxima semana quedaran listos otros 604 metros más; además, el Contratista de Obra tiene programado la llegada de insumos tales como el cemento que proviene de la ciudad de Ibagué, llegada que se puede ver afectada por dicho paro. En consecuencia, por lo aquí expuesto, la Interventoría encuentra que el argumento presentado por el Contratista de Obra obedece a la realidad. - En lo relacionado con las <i>“Condiciones climáticas adversas”</i>, en el registro de lluvias que adelanta la Interventoría dentro del seguimiento a las actividades diarias desarrolladas en obra por parte del Consorcio Contratista se ha evidenciado el incremento significativo en el régimen de precipitaciones presentado en el transcurso de las últimas semanas, cuyos ciclos más intensos se han presentado con mayor frecuencia en periodos de tiempo mas largos, lo cual ha dificultado que se reduzca la humedad de la capa de base granular rápidamente para continuar con la instalación del concreto asfáltico, y por ende la continuidad de las actividades subsecuentes, además la actividad de instalación de la mezcla asfáltica solo puede ser desarrollada en condiciones climáticas favorables sin la presencia de lluvia, razón por la cual la Interventoría encuentra que el argumento expuesto por el CONSORCIO VIAL CHAPARRAL obedece a la realidad.
--	--

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 14 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

- En lo relacionado con la “(...) **Remoción de material en sectores críticos**”, las características geomorfológicas de los taludes aferentes al corredor vial objeto del presente Contrato son del tipo de depósitos sedimentarios que ante la presencia de los torrenciales aguaceros que se han presentado durante las últimas semanas, se han saturado activándose y finalmente generando taponamientos, desprendimientos de la banca, y descomposición de sectores que se encuentran en afirmado, en distintos sitios del corredor vial, razón por la cual el Contratista de Obra ha realizado los trabajos necesarios para habilitar la transitabilidad de la vía, por tal razón, la Interventoría encuentra que este argumento es consecuente con la realidad.

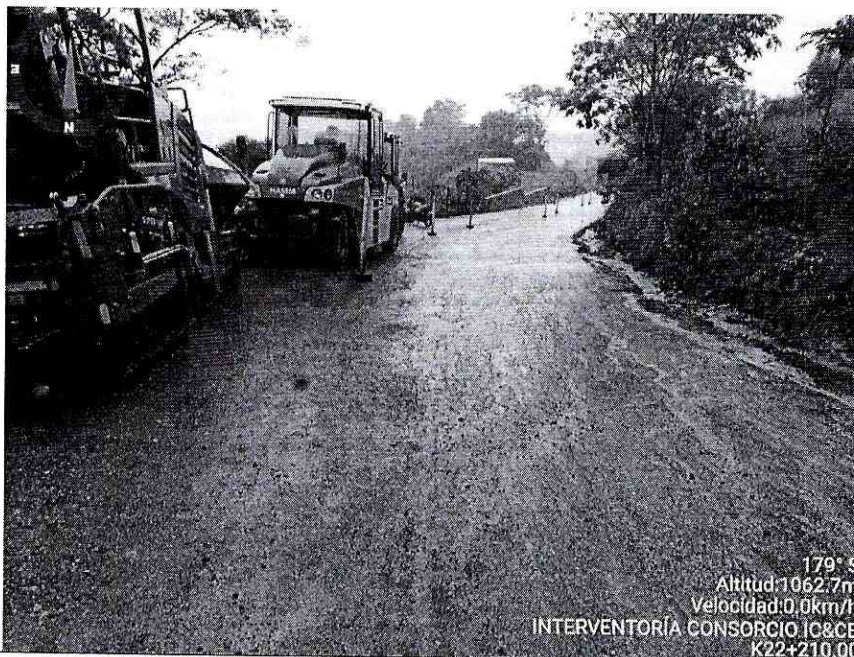

179° S
 Altitud: 1062.7m
 Velocidad: 0.0km/h
 INTERVENTORÍA CONSORCIO IC&CB
 K22+210.00

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 15 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024



- Frente al denominado “**Retraso en el giro de recursos por parte de INVIAS**”, la Interventoría conoce lo manifestado por parte del Contratista de Obra en este aparte, en donde el mismo Consorcio Contratista reconoce que existe el compromiso por parte del INVIAS para desembolsar los recursos a la Gobernación del Departamento del Tolima para cubrir las actas de recibo parcial de obra, cuyo valor corresponde a las obras ejecutadas con ocasión del presente Contrato, sin embargo, la Interventoría considera que este argumento analizado desde la óptica contractual corresponde a la obligación de pago que se dará por cumplida en el momento que el INVIAS gire los recursos en mención. Por lo tanto, esta situación no exime al Consorcio Contratista del cumplimiento de compromisos adquiridos contractualmente, en razón que existen otros mecanismos para que solicite el pago de sus actas.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 16 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Por lo expuesto anteriormente, la Interventoría encuentra que existen suficientes argumentos para otorgar la JUSTIFICACIÓN TÉCNICA para prorrogar el Contrato de Obra de la Referencia en el plazo solicitado por el Contratista de Obra y quince (15) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de marzo de 2025, para culminar las obras conforme a lo establecido contractualmente, teniendo en cuenta los argumentos relacionados con los impactos generados por el paro arrocero, las condiciones climáticas adversas y la remoción de derrumbes en sitios críticos.

JUSTIFICACIÓN LEGAL

Ley 80 de 1993, modificada a su vez por la Ley 1150 de 2007 establece el marco jurídico dentro del cual se desarrolla la presente solicitud de parte del Contratista, así mismo, la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, ha establecido ciertas líneas de interpretación y aplicación en lo que respecta a la modificación del contrato estatal. Por lo cual, en los marcos normativos y hermenéuticos vigentes se hará el correspondiente análisis de procedencia de la actual solicitud.

La contratación estatal, es un instrumento mediante el cual, la administración persigue el cumplimiento de los fines del estado, tan es así, que el cimiento y la estructura de la contratación, lo constituye la búsqueda del cumplimiento de las necesidades de la colectividad, es decir, la finalidad primordial es la satisfacción del interés general, así lo ha definido la Corte Constitucional:

“El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 17 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...) En este orden de ideas, es innegable el carácter instrumental que ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en sí mismo sino un medio para la consecución de los altos objetivos del Estado.”¹

Bajo este precepto, es deber de las entidades analizar los casos puntuales en los cuales, si a través de una modificación contractual, se satisfacer estos elementos enunciados.

Ahora bien, la ley 80 de 1993 en su artículo su artículo 14, establece: “ARTÍCULO 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

(...)

*2o. **Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales,** de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado, así*

¹ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-713/09. Fecha: 07 de octubre de 2009. Exp.D-7663

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 18 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. (...) (Negrita y subrayas fuera del texto).

Como se observa, las entidades públicas tienen facultades para modificar el contrato sin que existe impedimento o restricción.

Bajo Concepto C – 784 de 2022, emitido por Colombia Compra Eficiente, respecto de las modificaciones y adiciones a los contratos obra, expreso:

“Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. De esta manera, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos.

Además de lo anterior, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, pues ello supondría la alteración de su esencia y lo convertiría en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo.

Sobre este último punto, la doctrina² ha precisado que cuando «se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad,

² "Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 19 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en la fase previa»³. Para la determinación de los aspectos que no alteran la esencia del contrato estatal y que por ello al variarse no lo convierte en otro contrato, resulta útil remitirse a lo previsto en el artículo 1501 del Código Civil, que establece que los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales. Las definiciones de cada uno de dichos conceptos efectuadas en el artículo en comento resultarán útiles para establecer, en un caso determinado, si una específica modificación altera la esencia del contrato.

En todo caso, corresponderá a cada entidad estatal realizar el análisis respecto a la precedencia de modificar determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, además de definir previamente su procedencia desde la perspectiva jurídica, técnica y financiera. (Negrita fuera del texto).

En este contexto, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, al punto que suponga la alteración de su esencia y se convierta en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo. Estas reglas proceden cuando la modificación sea de manera bilateral, así como cuando se realice de forma unilateral por la entidad estatal, esta última teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 señala que si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución.”

A nivel jurisprudencial, tanto la corte constitucional como el consejo de estado, se ha pronunciado al respecto, para el caso, la sentencia C-416 de 2012, ha establecido:

³ Sobre el particular resultan pertinentes las consideraciones efectuadas en el mismo sentido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo y por la Corte Constitucional en la sentencia C-300 de 2012”.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 20 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación», entre otros. **En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación– pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.** Negrita y subrayado fuera de texto [...]

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 21 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

concuerta con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.»

Así mismo, mediante concepto emitido por la sala de consulta y servicio civil, del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, indico:

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

[...]

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 22 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.

Que, de acuerdo con lo anterior, aunado a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración.

Consecuencia de todo lo expuesto, se considera que la prórroga solicitada por el Contratista de Obra en aras de intervenir la longitud de vía a nivel de carpeta asfáltica objeto del Contrato, protegiendo zonas ya intervenidas con obras de estabilización, representa una necesidad vivida en el contrato, y a su vez su materialización representa una adecuada ejecución y finalización del objeto contractual y los fines del Estado que representa la presente intervención contractual en el marco de las necesidades comunes de la sociedad beneficiada, como ha sido considerado por la entidad en la estructuración del proceso de contratación.

Es importante manifestar que, como interventoría recomendamos realizar la prórroga desde el punto de vista técnico, para proteger las obras de contención ejecutadas por el Contratista de Obra.

Adicionalmente, ponemos en conocimiento que, para el cumplimiento de la ley y las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista del cumplimiento de lo establecido en el artículo 85, Continuidad de la interventoría, de la Ley 1474 de 2011, igualmente se requiere de la prórroga de la Interventoría.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 23 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Esta solicitud no requiere de adición presupuestal.

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

Como se ha mencionado anteriormente en el presente documento la prórroga solicitada por el Contratista de Obra no afecta el presupuestó del Contrato.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.

Las obras objeto de la prórroga, cuentan con la resolución de intervención de Cauce, y compensaciones forestales otorgada por CORTOLIMA.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

Con la intervención a nivel de carpeta asfáltica, se mejoran las condiciones para los residentes y usuarios de la vía, de manera segura, así mismo se mejoran los tiempos de desplazamiento y menos contaminación por particulados a los residentes de los tramos intervenidos.

CONCLUSIÓN


Consideramos como interventoría, procedente realizar prórroga por quince (15) días calendario, con nueva fecha de terminación al 30 de marzo 2025, de acuerdo con lo solicitado por el Contratista de Obra, Consorcio Vial Chaparral, con lo cual se logrará realizara la intervención a nivel de carpeta asfáltica de cerca de 2,5 km de vía, protegiendo las obras de estabilización y contención, hasta donde los recursos contractuales lo posibilitan y teniendo en cuenta los impactos generados por el paro arrocero, las condiciones climáticas adversas y la remoción de derrumbes en sitios críticos.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 24 de 24
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

	CONCLUSIÓN. En vista de lo manifestado la secretaria de Infraestructura y Hábitat considera viable conceder la prórroga de quince (15) días calendario solicitada por el contratista de obra y avalada por la interventoría.
--	---


SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS
 Secretaria de Infraestructura y hábitat
 ORDENADOR DEL GASTO
 Gobernación del Tolima


JULIO CESAR GALLO ORTIZ
 Director de infraestructura
 Gobernación del Tolima
 Supervisor del Contrato


JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ
 Consorcio vial Chaparral
 CONTRATISTA


GERMÁN ALONSO PINEDA OCHOA
 CONSORCIO IC & CB
 INTERVENTOR



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NIT 901.505.619-5

Bogotá D.C., 07 de marzo de 2025

CVCH – 647

Señores,
Consorcio IC & CB
ATN: German Alonso Pineda Ochoa
Representante legal de Interventoría
Bogotá, D.C

Referencia: Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.

Asunto: Solicitud de prórroga #19

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente remitimos ante ustedes la solicitud de prórroga al contrato por un tiempo de quince (15) días calendario, dadas las siguientes justificaciones:

Retraso en el giro de recursos por parte de INVIAS

Mediante la firma del adicional No. 3, aprobado a través de la modificatoria No. 18 del 30 de septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Vías se comprometió a desembolsar los recursos que respaldan el CDP 4678 del 26 de septiembre de 2024 a la Gobernación del Tolima. A la fecha, dicho compromiso no se ha materializado, afectando el flujo de caja del proyecto. Como ejemplo de esto, el acta parcial No. 21, por un valor de \$583.499.567, presentada en noviembre de 2024, aún no ha sido girada al contratista debido a que la Gobernación no cuenta con los fondos necesarios. Esta situación ha impedido la presentación de nuevas actas de obra porque no se tiene el recurso disponible para el pago de las actividades que se han venido ejecutando desde la fecha del acta anterior a hoy.

Impacto del paro de productores arroceros

En la última semana, el país se ha visto afectado por las manifestaciones y bloqueos viales realizados por los cultivadores de arroz de los departamentos del Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Nariño. Al encontrarnos dentro de una de las zonas afectadas, el transporte de materiales esenciales como agregados y asfaltos se ha visto limitado, lo que deriva en la disminución de los rendimientos de obra.



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
NIT 901.505.619-5

Viernes, 7 Marzo, 2025

Gremio arrocero mantiene bloqueos mientras avanzan negociaciones con el Gobierno

El paro arrocero en Colombia se extiende por Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Nariño, con bloqueos que han afectado la movilidad y el transporte de carga.

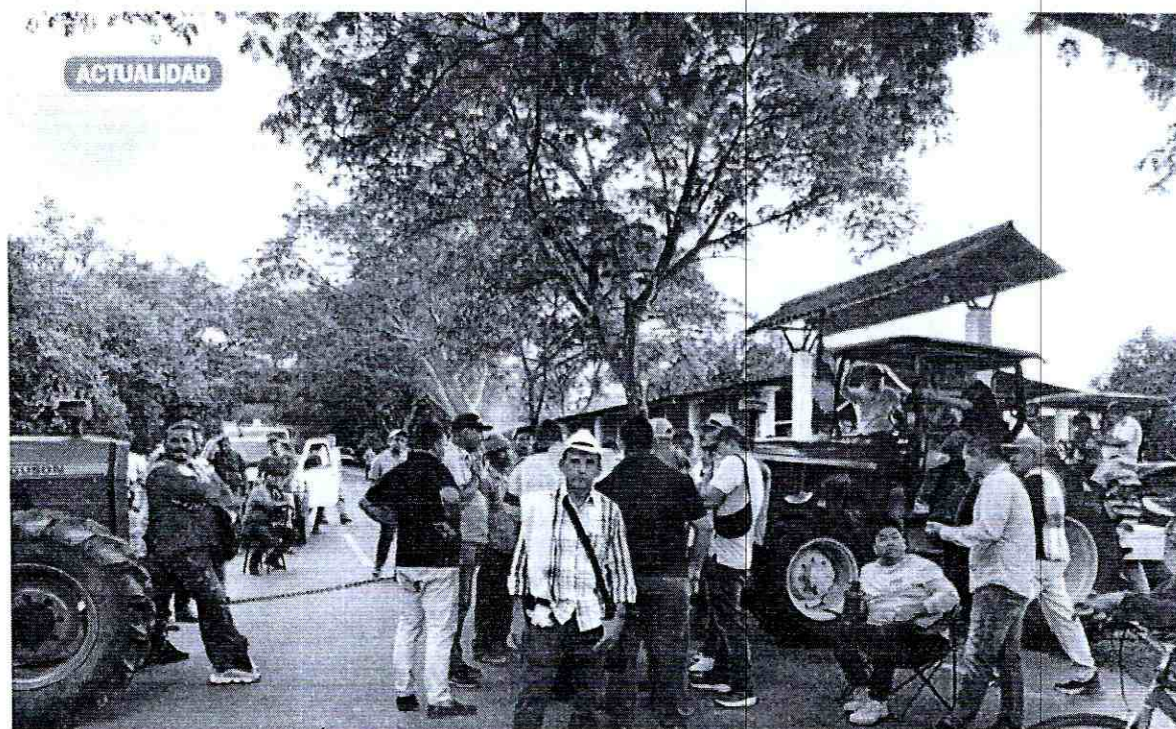


Ilustración 1. Tomado de: <https://www.radionacional.co/actualidad/paro-arrocero-hoy-estado-movilidad-y-vias-en-diferentes-regiones>

Condiciones climáticas adversas:

Durante los meses de octubre y noviembre de 2024, informamos a la interventoría sobre el impacto negativo que las precipitaciones intensas han tenido en la programación de obra. En lo transcurrido del año 2025, la situación se ha agravado, generando derrumbes recurrentes en el tramo Chaparral - Río Blanco, incluso en sectores previamente estables.




CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NIT 901.505.619-5



Latitud: 3.684616
Longitud: -75.592635
Elevación: 1031.29±5.86 m
Precisión: 4.75 m
Tiempo: 23-02-2025 14:44:01
Nota: K22+680 Derrumbe

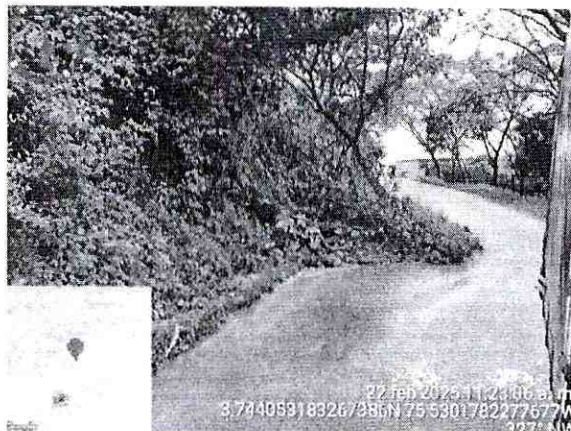

22 Feb 2025 11:28:06 a.m.
3.784099183267386N 75.5301782277677W
327° NW

Ilustración 2. Nuevos derrumbes presentados en Sector Helechales

Entidades como El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) han emitido alertas sobre el aumento de precipitaciones generando riesgos elevados de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente. De acuerdo con CORTOLIMA:

"Según las estimaciones, este fenómeno de La Niña se extenderá durante los días que restan de febrero e irá hasta abril. (...)

Así mismo, el último boletín de alertas del Ideam y debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente y, por tanto, se dan las siguientes alertas: (ver Ilustración 3)" (tomado de: <https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/4362-temporada-de-mas-lluvias-en-tolima-22-municipios-en-alerta-naranja-y-cuatro-en-alerta-roja>)

[illegible]


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1028995282598119&set=a.617974383700213&type=3&ref=embed_page

Calle 100 No. 8 A-55 Torre C, Oficina 401; Tel. 4660906; Email. Juancamilo.silva@gmail.com



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NIT 901.505.619-5

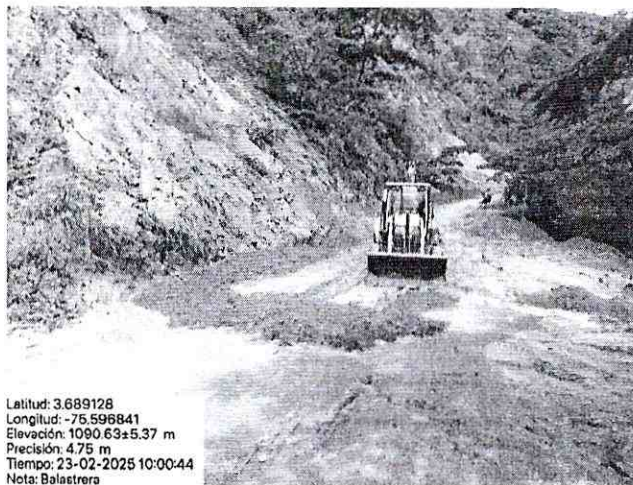

Latitud: 3.689128
Longitud: -76.596841
Elevación: 1090.63±5.37 m
Precisión: 4.75 m
Tiempo: 23-02-2025 10:00:44
Nota: Balastlera




Ilustración 4. Atención a derrumbes en sector La Balastlera

A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de garantías en el giro de los recursos, los bloqueos viales y las condiciones climáticas adversas han afectado la ejecución del proyecto como la consecución y el transporte de materiales necesarios para las actividades de obra. Generando retrasos que comprometen el cumplimiento de los plazos contractuales. Para mitigar estos impactos y garantizar la finalización de las obras con los estándares de calidad establecidos, solicitamos la extensión del contrato por quince días calendario

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta aprobación de esta solicitud.

Atentamente,


JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
Representante legal
Consorcio Vial Chaparral



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NIT 901.505.619-5



INICIO LA CORPORACIÓN PLANES Y PROGRAMAS TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSPARENCIA SERVICIO AL CIUDADANO PARTICIPA SALA DE PRENSA

TEMPORADA DE MÁS LLUVIAS EN TOLIMA: 22 MUNICIPIOS EN ALERTA NARANJA Y CUATRO EN ALERTA ROJA



El más reciente informe del Ideam advierte cuatro municipios con alerta roja, 22 en naranja y ocho en amarilla.

Ilustración 5. Tomado de <https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/4362-temporada-de-mas-lluvias-en-tolima-22-municipios-en-alerta-naranja-y-cuatro-en-alerta-roja>

SALA DE PRENSA

- > Noticias
- > COVID-19
- > Minutos Cortolima Podcast
- > Galería de Imágenes



Cortolima
Corporación
Autónoma

C-1570-GO065-2025

Chaparral (Tolima), 07 de marzo de 2025

Señores

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Atn.: Ing. JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ

Director de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Supervisor Contrato de Obra

Ibagué (Tolima),

Referencia: Contrato de Obra de Gobernación del Tolima N°1784 de 2021 cuyo objeto es El Mejoramiento de la vía Chaparral - Rioblanco en el departamento del Tolima, cuya Interventoría está a cargo del **Contrato INVIAS N°1570 de 2021**.

Asunto: Concepto Interventoría a la solicitud de prórroga presentada para el Contrato de la Referencia por el Contratista de Obra a través del comunicado **CVCH-647**.

Respetado Ingeniero:

El Consorcio IC&CB en cumplimiento de sus compromisos adquiridos contractualmente, enmarcado en el Convenio Interadministrativo N°1755 de 2020 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Gobernación del Departamento de Tolima cuyo objeto es Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la carretera Chaparral - Rioblanco, realiza la revisión y verificación de la solicitud de prórroga para el Contrato de la Referencia presentada por el Contratista de Obra a través del comunicado CVCH-647 del 07 de marzo de 2025, en donde se tiene:

SOLICITUD DEL CONTRATISTA

A través del comunicado CVCH-647 el **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL** presenta solicitud de prórroga al Contrato de Obra de la Referencia por un tiempo de quince (15) días calendario, dadas las siguientes justificaciones:

“Retraso en el giro de recursos por parte de INVIAS

Mediante la firma del adicional No. 3, aprobado a través de la modificatoria No. 18 del 30 de septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Vías se comprometió a desembolsar los recursos que respaldan el CDP 4678 del 26 de septiembre de 2024 a la Gobernación del Tolima. A la fecha, dicho compromiso no se ha materializado, afectando el flujo de caja del proyecto. Como ejemplo de esto, el acta parcial No. 21, por un valor de \$583.499.567, presentada en noviembre de 2024, aún no ha sido girada al contratista debido a que la Gobernación no cuenta con los fondos necesarios.”

“Impacto del paro de productores arroceros

En la última semana, el país se ha visto afectado por las manifestaciones y bloqueos viales realizados por los cultivadores de arroz de los departamentos del Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Nariño. Al encontrarnos dentro de una de las zonas afectadas, el transporte de materiales esenciales como agregados y asfaltos se ha visto limitado, lo que deriva en la disminución de los rendimientos de obra.”

Viernes, 7 Marzo, 2025

Gremio arrocero mantiene bloqueos mientras avanzan negociaciones con el Gobierno


El paro arrocero en Colombia se extiende por Huila, Tolima, Sucre, Córdoba y Nariño, con bloqueos que han afectado la movilidad y el transporte de carga.



Ilustración 1. Tomado de: <https://www.radionacional.co/actualidad/paro-arroceros-hoy-estado-movilidad-y-vias-en-diferentes-regiones>

“Condiciones climáticas adversas:

Durante los meses de octubre y noviembre de 2024, informamos a la interventoría sobre el impacto negativo que las precipitaciones intensas han tenido en la programación de obra. En lo transcurrido del año 2025, la situación se ha agravado, generando derrumbes recurrentes en el tramo Chaparral - Río Blanco, incluso en sectores previamente estables.”



Así mismo, el último boletín de alertas del Ideam y debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente y, por tanto, se dan las siguientes alertas: (ver Ilustración 3)“ (tomado de: <https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/4362-temporada-de-mas-lluvias-en-tolima-22-municipios-en-alerta-naranja-y-cuatro-en-alerta-roja>)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1028995282598119&set=a.617974383700213&type=3&ref=embed_page

Con el fin de garantizar la seguridad vial y la transitabilidad, el consorcio ha destinado maquinaria y personal para la remoción de material en sectores críticos, como La Balastreira, La Guanabanera, Cruce de Maito entre otros. Estas acciones han generado ajustes en el cronograma y la reasignación de recursos operativos, lo que ha impactado la ejecución normal de las actividades constructivas planificadas.



Latitud: 3.689128
Longitud: -75.596841
Elevación: 1090.63±5.37 m
Precisión: 4.75 m
Tiempo: 23-02-2025 10:00:44
Nota: Balastreira



Ilustración 4. Atención a derrumbes en sector La Balastreira

A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de garantías en el giro de los recursos, los bloqueos viales y las condiciones climáticas adversas han afectado la ejecución del proyecto como la consecución y el transporte de materiales necesarios para las actividades de obra. Generando retrasos que comprometen el cumplimiento de los plazos contractuales. Para mitigar estos impactos y garantizar la finalización de las obras con los estándares de calidad establecidos, solicitamos la extensión del contrato por quince días calendario”.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA


Consideraciones:

El corredor vial objeto del presente contrato es el que comunica entre si a los municipios de Chaparral y Rioblanco cuyas obras fueron priorizadas por parte de la Gobernación del Tolima entre el K11+280 al K40+040.

A corte de la última acta de obra tramitada N°21, donde se han realizado obras por valor de \$58.260.704.672,39 más provisiones por valor de \$3.163.127.966,00, para un total de \$61.423.832.638,39, equivalente al 88,62%, de lo establecido \$69.314.039.138,76.

A continuación, se presenta un esquema de los sectores de intervención con carpeta asfáltica.

TRAMOS INTERVENIDOS HASTA CARPETA ASFALTICA

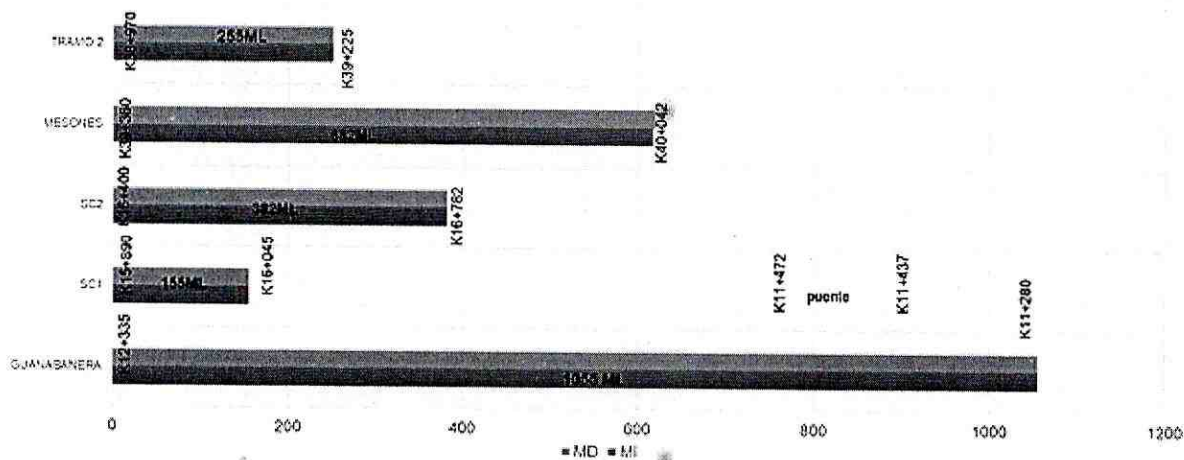

Así mismo, se vienen desarrollando obras correspondientes a las últimas adiciones presupuestales de \$3.152.777.269,79 y \$8.888.861.501,13. En la siguiente tabla se presenta a cuál recurso presupuestal corresponde cada sector crítico y el estado de ejecución.

TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD TRAMO (m)	VENTANAS X INESTABILIDAD GEOLOGICA		LONGITUD VENTANA (m)	LONGITUD INTERVENCIÓN (m)	% de Long MF	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL				
LA GUANABANERA	K11+280	K12+325	1.045	K+000	K+000	0.00	1.045	17,2%	- META FÍSICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIÓN N°01.
SITIO CRITICO 1	K15+890	K16+040	150	K+000	K+000	0,00	150	2,5%	- TODAS LAS OBRAS TERMINADAS.
SITIO CRITICO 2	K16+400	K16+782	382	K+000	K+000	0.00	382	6,3%	
EL HELECHAL	K22+210	K23+400	1.190	K23+000	K23+120	120	1.070	17,6%	- META FÍSICA RECURSOS DEL CONTRATO ADICIÓN N°03.
ICARCO 1	K35+790	K37+120	1.330	K36+370	K36+480	110	1.220	20,1%	- META FÍSICA RECURSOS CONTRATO ADICIÓN N°02
ICARCO 2	K37+120	K37+721	601	K+000	K+000	0,00	601	9,9%	- META FÍSICA RECURSOS CONTRATO ADICIÓN N°03.
EL VISO 2	K38+216	K38+970	754	K38+660	K38+740	80	674	11,1%	- META FÍSICA RECURSOS CONTRATO ADICIÓN N°03.
EL VISO 1	K38+970	K39+223	253	K+000	K+000	0.00	253	4,2%	- META FÍSICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIÓN N°01.
EL MESON	K39+360	K40+040	680	K+000	K+000	0.00	680	11,2%	- TODAS LAS OBRAS TERMINADAS.
PUENTE VERDE									- META FÍSICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIÓN N°01.
			6385.00			310.00	6075.00	100%	

META FÍSICA TOTALMENTE EJECUTADA
META FÍSICA INTERVENIDA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA
META FÍSICA EN INTERVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Como se ha manifestado, se tienen sectores en donde se realizaron obras de contención y ampliación de la banca de la vía, quedando pendiente su intervención a nivel de estructura de pavimento. Estos sectores fueron objeto de análisis en la determinación del presupuesto de la adición presupuestal N°03 previamente aprobada, con lo cual se determinó una longitud a intervenir de 2545 metros.

Por lo anterior, es importante indicar que se requiere tramitar la prórroga del Contrato de Obra de la Referencia por 15 días hasta el 30 de marzo de 2025, con el fin de terminar la inversión de los recursos en los sectores en listados anteriormente.

En cuanto a los argumentos expuestos por el Contratista de Obra en su solicitud de prórroga, la Interventoría manifiesta lo siguiente:

- Respecto al **“Impacto del paro de productores arroceros”**, es del conocimiento de la opinión pública nacional la problemática que actualmente se presenta con el gremio arrocero, generando bloqueos viales que interfieren la normal operación de las vías en distintas regiones del país, para nuestro caso del departamento del Tolima, departamento arrocero por excelencia. En este momento se tienen 1250 metros de base granular lista e imprimada para la instalación del concreto asfáltico respectivo y a mediados de la próxima semana quedarán listos otros 604 metros más. Además, el Contratista de Obra tiene programado la llegada de insumos tales como el cemento que proviene de la ciudad de Ibagué, llegada que se puede ver afectada por dicho paro. En consecuencia, por lo aquí expuesto, la Interventoría encuentra que el argumento presentado por el Contratista de Obra obedece a la realidad.
- En lo relacionado con las **“Condiciones climáticas adversas”**, en el registro de lluvias que adelanta la Interventoría dentro del seguimiento a las actividades diarias desarrolladas en obra por parte del Consorcio Contratista se ha evidenciado el incremento significativo en el régimen de precipitaciones presentado en el transcurso de las últimas semanas, cuyos ciclos más intensos se han presentado con mayor frecuencia en periodos de tiempo más largos, lo cual ha dificultado que se reduzca la humedad de la capa de base granular rápidamente para continuar con la instalación del concreto asfáltico, y por ende la continuidad de las actividades subsecuentes, además la actividad de instalación de la mezcla asfáltica solo puede ser desarrollada en condiciones climáticas favorables sin la presencia de lluvia, razón por la cual la Interventoría encuentra que el argumento expuesto por el CONSORCIO VIAL CHAPARRAL obedece a la realidad.
- En lo relacionado con la **“(…) Remoción de material en sectores críticos”**, las características geomorfológicas de los taludes aferentes al corredor vial objeto del presente Contrato son del tipo de depósitos sedimentarios que ante la presencia

de los torrenciales aguaceros que se han presentado durante las últimas semanas, se han saturado activándose y finalmente generando taponamientos, desprendimientos de la banca, y descomposición de sectores que se encuentran en afirmado en distintos sitios del corredor vial, razón por la cual el Contratista de Obra ha realizado los trabajos necesarios para habilitar la transitabilidad de la vía, por tal razón, la Interventoría encuentra que este argumento es consecuente con la realidad.



- Frente al denominado **"Retraso en el giro de recursos por parte de INVIAS"**, la Interventoría conoce lo manifestado por parte del Contratista de Obra en este

aparte, en donde el mismo Consorcio Contratista reconoce que existe el compromiso por parte del INVIAS para desembolsar los recursos a la Gobernación del Departamento del Tolima para cubrir las actas de recibo parcial de obra, cuyo valor corresponde a las obras ejecutadas con ocasión del presente Contrato, sin embargo, la Interventoría considera que este argumento analizado desde la óptica contractual corresponde a la obligación de pago que se dará por cumplida en el momento que el INVIAS gire los recursos en mención. Por lo tanto, esta situación no exime al Consorcio Contratista del cumplimiento de compromisos adquiridos contractualmente, en razón que existen otros mecanismos para que solicite el pago de sus actas.

Por lo expuesto anteriormente, la Interventoría encuentra que existen suficientes argumentos para otorgar la JUSTIFICACIÓN TÉCNICA para prorrogar el Contrato de Obra de la Referencia en el plazo solicitado por el Contratista de Obra y quince (15) días, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de marzo de 2025, para culminar las obras conforme a lo establecido contractualmente, teniendo en cuenta los argumentos relacionados con los impactos generados por el paro arrocero, las condiciones climáticas adversas y la remoción de derrumbes en sitios críticos.

JUSTIFICACIÓN LEGAL

Ley 80 de 1993, modificada a su vez por la Ley 1150 de 2007 establece el marco jurídico dentro del cual se desarrolla la presente solicitud de parte del Contratista, así mismo, la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, ha establecido ciertas líneas de interpretación y aplicación en lo que respecta a la modificación del contrato estatal. Por lo cual, en los marcos normativos y hermenéuticos vigentes se hará el correspondiente análisis de procedencia de la actual solicitud.

La contratación estatal, es un instrumento mediante el cual, la administración persigue el cumplimiento de los fines del estado, tan es así, que el cimiento y la estructura de la contratación, lo constituye la búsqueda del cumplimiento de las necesidades de la colectividad, es decir, la finalidad primordial es la satisfacción del interés general, así lo ha definido la Corte Constitucional:

"El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado (...). En este orden de ideas, es innegable el carácter instrumental que

*ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en sí mismo sino un medio para la consecución de los altos objetivos del Estado."*¹

Bajo este precepto, es deber de las entidades analizar los casos puntuales en los cuales, si a través de una modificación contractual, se satisfacen estos elementos enunciados.

Ahora bien, la ley 80 de 1993 en su artículo 14, establece: "**ARTÍCULO 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:**

1o. **Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.**

(...)

2o. **Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. (...)** (Negrita y subrayas fuera del texto).

Como se observa, las entidades públicas tienen facultades para modificar el contrato sin que existe impedimento o restricción.

Bajo Concepto C – 784 de 2022, emitido por Colombia Compra Eficiente, respecto de las modificaciones y adiciones a los contratos obra, expreso:

"Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar

¹ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-713/09. Fecha: 07 de octubre de 2009. Exp.D-7663

cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. De esta manera, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos.

Además de lo anterior, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, pues ello supondría la alteración de su esencia y lo convertiría en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo.

Sobre este último punto, la doctrina² ha precisado que cuando «se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en la fase previa»³. Para la determinación de los aspectos que no alteran la esencia del contrato estatal y que por ello al variarse no lo convierte en otro contrato, resulta útil remitirse a lo previsto en el artículo 1501 del Código Civil, que establece que los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales. Las definiciones de cada uno de dichos conceptos efectuadas en el artículo en comento resultarán útiles para establecer, en un caso determinado, si una específica modificación altera la esencia del contrato.

En todo caso, corresponderá a cada entidad estatal realizar el análisis respecto a la precedencia de modificar determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, además de definir previamente su procedencia desde la perspectiva jurídica, técnica y financiera. (Negrita fuera del texto).

En este contexto, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, al punto que suponga la alteración de su esencia y se convierta en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo. Estas reglas proceden cuando la modificación sea de manera bilateral, así como cuando se realice de forma unilateral por la entidad estatal, esta última teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 señala que si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución.”

A nivel jurisprudencial, tanto la corte constitucional como el consejo de estado, se ha pronunciado al respecto, para el caso, la sentencia C-416 de 2012, ha establecido:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios

² “Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387.

³ Sobre el particular resultan pertinentes las consideraciones efectuadas en el mismo sentido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo y por la Corte Constitucional en la sentencia C-300 de 2012”.

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. **En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.**

Negrita y subrayado fuera de texto

[...]

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.

Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.»

Así mismo, mediante concepto emitido por la sala de consulta y servicio civil, del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, indico:

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

[...]

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los

mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.

Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.

Que, de acuerdo con lo anterior, aunado a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración.

Consecuencia de todo lo expuesto, se considera que la prórroga solicitada por el Contratista de Obra en aras de intervenir la longitud de vía a nivel de carpeta asfáltica objeto del Contrato, protegiendo zonas ya intervenidas con obras de estabilización, representa una necesidad vivida en el contrato, y a su vez su materialización representa una adecuada ejecución y finalización del objeto contractual y los fines del Estado que representa la presente intervención contractual en el marco de las necesidades comunes de la sociedad beneficiada, como ha sido considerado por la entidad en la estructuración del proceso de contratación.

Es importante manifestar que, como interventoría recomendamos realizar la prórroga desde el punto de vista técnico, para proteger las obras de contención ejecutadas por el Contratista de Obra.

Adicionalmente, ponemos en conocimiento que, para el cumplimiento de la ley y las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista del cumplimiento de lo establecido en el artículo 85, Continuidad de la interventoría, de la Ley 1474 de 2011, igualmente se requiere de la prórroga de la Interventoría.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Esta solicitud no requiere de adición presupuestal.

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

Como se ha mencionado anteriormente en el presente documento la prórroga solicitada por el Contratista de Obra no afecta el presupuestó del Contrato.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.

Las obras objeto de la prórroga, cuentan con la resolución de intervención de Cauce, y compensaciones forestales otorgada por CORTOLIMA.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

Con la intervención a nivel de carpeta asfáltica, se mejoran las condiciones para los residentes y usuarios de la vía, de manera segura, así mismo se mejoran los tiempos de desplazamiento y menos contaminación por particulados a los residentes de los tramos intervenidos.

CONCLUSIÓN


Consideramos como interventoría, procedente realizar prórroga por quince (15) días calendario, con nueva fecha de terminación al 30 de marzo 2025, de acuerdo con lo solicitado por el Contratista de Obra, Consorcio Vial Chaparral, con lo cual se logrará realizara la intervención a nivel de carpeta asfáltica de cerca de 2,5 km de vía, protegiendo las obras de estabilización y contención, hasta donde los recursos contractuales lo posibilitan y teniendo en cuenta los impactos generados por el paro arrocero, las condiciones climáticas adversas y la remoción de derrumbes en sitios críticos.

En virtud de lo anterior, comedidamente recomendamos revisar y tramitar la prórroga, para lo cual, en cumplimiento de lo establecido en el manual se remite:

- Comunicación CVCH 647 "solicitud prórroga #19"
- Programa de inversiones
- Programación de obra
- Formato de seguimiento pólizas.

Quedamos pendientes de su gestión y trámite.

Atentamente,



Firmado digitalmente por GERMAN
ALONSO PINEDA OCHOA
Fecha: 2025.03.11 09:50:26 -05'00'

GERMÁN ALONSO PINEDA OCHOA


Representante Legal o Apoderado de la Interventoría
Consortio IC & CB

Anexo lo anunciado:

Copia:

Ing. Óscar Rodolfo Acevedo Castro – Subdirector de Vías Regionales – Invías
Ing. Juan David Torres Sanabria –Supervisor del Contrato de Interventoría – Invías
Ing. Germán Ricardo Celis Blanco -Gestor Técnico - Invías
Ing. Sandra García – Secretaria de Infraestructura Gobernación del Tolima
Archivo.

Elaboró: FECR
Revisó:

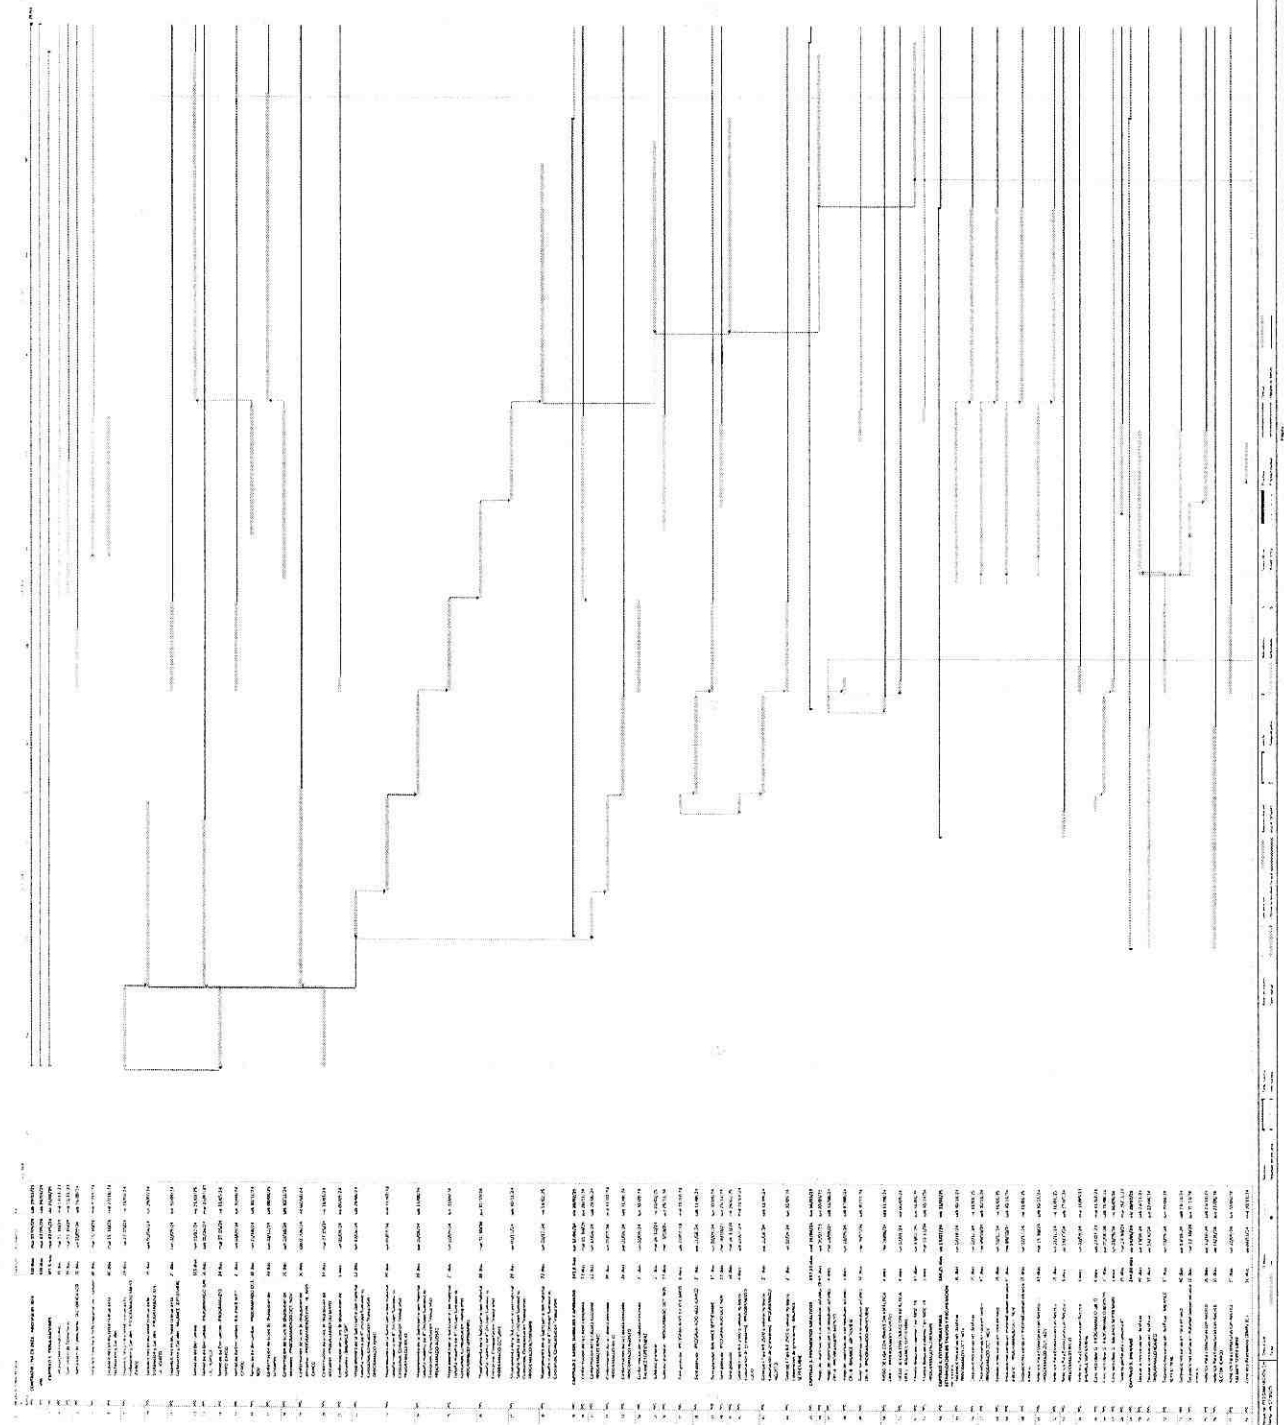



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 13 de marzo de 2025, a las 17:02:19, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8220001381
Código de Verificación	8220001381250313170219

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de marzo de 2025, a las 11:15:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79946569
Código de Verificación	79946569250311111521

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 13 de marzo de 2025, a las 17:24:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Extranjería
No. Identificación	444716
Código de Verificación	444716250313172420

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de marzo de 2025, a las 11:16:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7451483
Código de Verificación	7451483250311111636

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de marzo de 2025, a las 11:16:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUESTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1018415688
Código de Verificación	1018415688250311111611

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:36:31 AM horas del 11/03/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79946569**

Apellidos y Nombres: **SILVA RODRIGUEZ JUAN CAMILO**


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 -
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:28:56 PM horas del 13/03/2025, el ciudadano extranjero con:
Cédula de Extranjería N° **444716**


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Los resultados de esta consulta solo corresponden a antecedentes judiciales dentro del territorio nacional de Colombia.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-ato@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional




Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:38:33 AM horas del 11/03/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **7451483**

Apellidos y Nombres: **SANTOS MARTINEZ EDUARDO**


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 -
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:37:58 AM horas del 11/03/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1018415688**

Apellidos y Nombres: **FIERRO MORA JORGE ARMANDO**


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 -
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-etc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266375797



PIB

17:14:51

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT número 9012223353:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266375470



PIB

17:11:46

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCTORA F G S A identificado(a) con NIT número 8002095303:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266375750



PIB

17:14:17

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGECON S A identificado(a) con NIT número 8220001381:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266376335



PIB

17:18:23

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79946569:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 266376839



PIB
17:22:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BENJAMIN FIGUEROA MOLINA identificado(a) con Cédula Extranjería número 444716:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266376488



PIB

17:19:46

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUARDO SANTOS MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7451483:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266376404



PIB
17:18:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ARMANDO FIERRO MORA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1018415688:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/03/2025 05:29:33 p. m. para la **Cedula de Extranjeria: N°. 444716**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **112436488** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir



Dios y
Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cta. 501n 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CANT, Bogotá D.C.
Línea de atención: 01800-010112

545 9000



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

GOV.CO



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2025 11:39:20 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **7451483**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **112221508**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cta. 5010 05 - 21
Centro Administrativo Nacional CANT, Bogotá D.C.
Línea de atención: 01800-910112





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2025 11:39:56 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1018415688**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **112221606**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cta. 4518 26 - 21
Centro Administrativo Nacional C.A.N., Bogotá D.C.
Línea de atención: 01 (800) 010 112





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/03/2025 11:42:01 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79946569**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **112221883**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Búsqueda](#)[Imprimir](#)

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cía. 4B N° 21
Centro Administrativo Nacional C.A.N. Bogotá D.C.
Línea de atención: 01800-018112

[GOV.CO](#)
