

Contrato No. S-SAMC-260-2024

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 21-05-2025

SUPERVISOR: LILIANA ASENED CIRO DUQUE

COORD. SUPERVISIÓN: LILIANA ASENED CIRO DUQUE

CONTRATISTA: ALPHA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SAS

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL PARAMO DE CORNARE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL: \$ 92.219.235

VALOR FINAL: \$ 92.219.235

FECHA DE INICIACIÓN: 26/11/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/03/2025

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE SONSÓN

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

SUSPENSIONES: NINGUNA

PLAZO FINAL: TRES (3) MESES, VEINTE (20) DÍAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS

DIRECCION: CALLE 7 No. 11 – 48 Tierra Alta, Córdoba

TELEFONO: 3205653438

E-MAIL: alphaic@outbok.com

REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO NAVARRO MORELO

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá, Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit: 890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X @ cornare

SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Que la obra fue ejecutada de acuerdo a lo inicialmente planteado en el contrato de obra, sin que se hubiese presentado variaciones en cuanto a especificaciones técnicas, obras adicionales y mayores cantidades de obra.
2. Que verificado el contrato S-SAMC-260-2024 del 18 de noviembre de 2024 y la propuesta económica del contratista final que ejecutó la obra, ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS, la supervisión constato que no hubo variaciones en cuanto a: especificaciones técnicas, unidades y cantidades con respecto a lo establecido por la Corporación.
3. A continuación, se cita cada uno de los productos y/o cumplimiento de requisitos que debía cumplir el contratista:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIALMENTE CONTRATADA	CANTIDAD FINALMENTE EJECUTADA	VR UNITARIO / SOPORTE APU's CAMACOL	SUBTOTAL PAGADO
OFICINAS PRINCIPALES					
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	8,0	8,0	29.669,595	237.357
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	8,0	8,0	10.831,500	86.652
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	522,0	522,0	19.140,630	9.991.409
Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	245,0	245,0	30.070,485	7.367.269
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	40,0	40,0	11.036,925	441.477
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para bajantes pvc, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	13,3	13,3	9.839,235	130.862

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X Instagram YouTube cornare

Suministro y colocación de barniz para puertas de madera y ventanas en marcos y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	und	24,0	24,0	76.131,750	1.827.162
Desmante de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	245	245	28.012,500	6.863.063
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, reparación de la tablilla defectuosa e instalación de las tejas.	m2	245	245	56.230,425	13.776.454
Hidrofugado para muros exteriores	m2	55,0	55,0	13.704,960	753.773
Demolición enchapes porcelana, incluye botada	m2	2,7	2,7	18.488,250	49.918
Enchape cerámica piso 40 * 40 incluye: mortero de nivelación, suministro e instalación de la cerámica, lechada, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	2,7	2,7	150.678,615	406.832
Suministro e instalación de rejilla sifón de 2" en acero inoxidable.	und	1,0	1,0	43.408,170	43.408
SUBTOTAL					41.975.636
OFICINAS BLOQUE DOS					
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	4,0	4,0	29.669,595	118.678
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	4,0	4,0	10.831,500	43.326
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	135,0	135,0	19.140,630	2.583.985
Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	110,0	110,0	30.070,485	3.307.753

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X @ cornare

Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	22,0	22,0	11.036,925	242.812
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para puertas y ventanas metálicas. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	un	8,0	8,0	76.131,750	609.054
Desmonte de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	110,0	110,0	28.012,50	3.081.375
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, reparación de la tablilla defectuosa e instalación de las tejas donde se requiera.	m2	110,0	110,0	56.230,425	6.185.347
Hidrofugado para muros exteriores	m2	160,0	160,0	13.704,960	2.192.794
Demolición enchapes porcelana, incluye botada en lugar autorizado	m2	38,6	38,6	18.488,250	713.646
Enchape cerámica piso 40 * 40 incluye: mortero de nivelación, suministro e instalación de la cerámica, lechada, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	38,6	38,6	150.678,615	5.816.195
SUBTOTAL					24.894.965
GIMNASIO					
Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros	m2	2,0	2,0	29.669,595	59.339
Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.	m2	2,0	2,0	10.831,500	21.663
Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.	m2	48,0	48,0	19.140,630	918.750

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X @ cornare

Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	m2	20,0	20,0	30.070,485	601.410
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	ml	12,0	12,0	11.036,925	132.443
Suministro y colocación de pintura a base de aceite para puertas y ventanas metálicas. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.	un	3,0	3,0	76.131,750	228.395
SUBTOTAL					1.962.000
QUIOSCO					
Desmante de teja de barro, incluye retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.	m2	61,0	61,0	28.012,500	1.708.763
Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, cambio de la tablilla y guaduas defectuosas e instalación de las tejas donde se requiera.	m2	61,0	61,0	56.230,425	3.430.056
Suministro y colocación de barniz de primera calidad, para estructura en guadua, alfardas, cargueras, parales y tablilla 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.	gl	1,0	1,0	1.523.626,020	1.523.626
Suministro e instalación de puerta en madera inmunizada 2,15 x 2,10 m corrediza, incluye rieles, estructura de soporte, chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	1,0	1,0	1.151.508,000	1.151.508
Suministro e instalación de paneles en madera inmunizada para cerramiento perimetral del quiosco	m2	23,2	23,2	246.185,055	5.711.493
Suministro e instalación de vidrio de 4 mm incluye bisel de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	17,0	17,0	135.644,053	2.305.949

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X @ cornare

SUBTOTAL					15.831.395
EXTERIORES					
Suministro y colocación de material triturado 3/4, en parqueadero	m3	6,0	6,0	184.359,600	1.106.158
Suministro y colocación de pintura para puerta portada incluye producto para impermeabilización de madera (tipo impra color nogal) y anticorrosivo (color negro mate) para las partes metálicas, engrasada.	m2	26,7	26,7	18.869,220	503.808
Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica, con barros verticales en varilla 5/8 a 12 cm, color negro mate.	ml	8,0	8,0	319.435,875	2.555.487
Suministro, reposición e instalación de red eléctrica en tubería metálica galvanizada 1/2" para muro exteriores, incluye desmonte de tub pvc y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	ml	68,0	68,0	49.849,800	3.389.786
SUBTOTAL					7.555.239
COSTO TOTAL OBRA					92.219.235

Registro fotográfico

Ítem 1. Revoque con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En muros



Ítem 2. Estuco: Incluye, ranuras, filetes y dilataciones, en muros.

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X @ cornare



Item 3. Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la supervisión.



Item 4. Suministro y colocación de barniz de primera calidad sobre barniz existente, para tablilla, alfardas y carguera 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X @ cornare



Ítem 5. Suministro y colocación de pintura a base de aceite para canoas en lamina, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir.



Ítem 6. Suministro y colocación de pintura a base de aceite para bajantes pvc, 2 manos a satisfacción de la supervisión. Incluye raspada y adecuación de la superficie a intervenir



Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X @ cornare

Ítem 7. Suministro y colocación de barniz para puertas de madera y ventanas en marcos y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.



Ítem 8. Suministro y colocación de pintura a base de aceite para puertas y ventanas metálicas. Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la supervisión.

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X @ cornare



Ítem 9. Hidrofugado para muros exteriores



Ítem 10. Desmante de teja de barro, incluyo retiro de tela asfáltica y limpieza de la superficie.



Ítem 11. Reparación cubierta en teja de barro, incluye instalación de Manto impermeabilizante ATV 30 3 mm en toda su superficie, sellada de huecos con mortero, reparación de la tablilla defectuosa e instalación de las tejas.

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X @ cornare

Ítem 12. Demolición enchapes porcelana, incluyo botada.



Item 13. Enchape cerámica piso 40 * 40 incluye: mortero de nivelación, suministro e instalación de la cerámica, lechada, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color a definir según aprobación de la supervisión.




Item 14. Suministro e instalación de rejilla sifón de 2" en acero inoxidable.

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X Instagram YouTube cornare

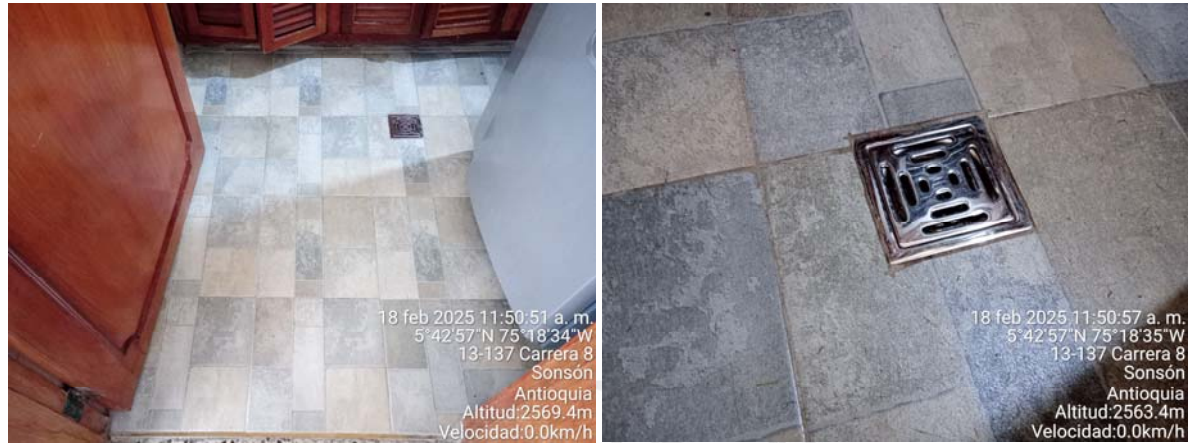

Item 15. Suministro e instalación de paneles en madera inmunizada para cerramiento perimetral del quiosco.



Item 16. Suministro e instalación de vidrio de 4 mm incluye bisel de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.



Item 17. Suministro e instalación de puerta en madera inmunizada 2,15 x 2,10 m corrediza, incluye rieles, estructura de soporte, chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X Instagram YouTube cornare



Item 18. Suministro y colocación de material triturado 3/4, en parqueadero



Item 19. Suministro y colocación de pintura para puerta portada incluye producto para impermeabilización de madera (tipo impra color nogal) y anticorrosivo (color negro mate) para las partes metálicas, engrasada.



Ítem 20. Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica, con barrotes verticales en varilla 5/8 a 12 cm, color negro mate

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X @ cornare



Ítem 21. Suministro, reposición e instalación de red eléctrica en tubería metálica galvanizada 1/2" para muro exteriores, incluye desmonte de tub pvc y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.



SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

1. Que CORNARE, celebro directamente el siguiente contrato:

No. Contrato	Fecha	Objeto	Contratista
CONTRATO S-SAMC-260-2024	18/11/2024	REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL PARAMO DE CORNARE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.	ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X Instagram YouTube cornare

2. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron cuatro informes de supervisión que dan cuenta del cumplimiento total de las actividades planteadas.

Número	Informe supervisión	Recibo a satisfacción	Fecha
1	x		12/12/2024
2	x		13/02/2025
3	x		11/03/2025
4	x		01/04/2025

3. Que, durante el plazo de ejecución, se recibió por parte del Contratista cuatro informes. Informes que acreditan el cumplimiento a satisfacción de las actividades.

Informe contratista	Fecha
1	12/12/2024
2	13/02/2025
3	11/03/2025
4	18/03/2025

4. El plazo de ejecución del contrato fue objeto de modificación durante su ejecución, tal como se detalla a continuación:

Plazo inicial	Plazo (según modificatorio No _1_)	¿Hubo suspensiones? Citar bajo que modificatorio y cuánto tiempo estuvo suspendido	Plazo final
3 meses	20 días	No	3 meses, 20 días

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE

1. Que durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes pagos:

No. de Acta	Fecha acta	Valor pagado por Cornare	Valor pagado otros	Total, pagado en acta
1	12/12/2024	\$ 33.629.426	\$ 0	\$ 33.629.426
2	13/02/2025	\$ 33.619.827	\$ 0	\$ 33.619.827
3	11/03/2025	\$ 12.225.038	\$ 0	\$ 12.225.038
4	01/04/2025	\$ 12.744.944	\$ 0	\$ 12.744.944
GRAN TOTAL		\$ 92.219.135	\$ 0	\$ 92.219.135

El valor del convenio no fue objeto de modificación (adición en recursos), durante su ejecución.

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X @ cornare

SUPERVISIÓN JURÍDICA

1. Cornare exigió las siguientes garantías a la empresa ALPHA INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS y esta a su vez las adquirió con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA, como se detalla a continuación:

Garantías contratista final de la obra

No de póliza (citar No de anexo)	Amparo	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor de la garantía	Las garantías fueron aprobadas por el Secretario Genreal
21-44-101456497 Anexo 2	Cumplimiento	26/11/2024	26/06/2025	\$ 18.443.847	Secretario General
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2024	26/02/2028	\$ 4.610.961	
	Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años		\$ 9.221.923	
21-40-101243944 Anexo 0	Predios laborales y operacionales	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Contratistas y subcontratistas	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Vehículos propios y no propios	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Responsabilidad civil patronal	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Responsabilidad civil cruzada	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Gastos médicos	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Daño emergente y lucro cesante	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
	Perjuicios extrapatrimoniales	18/11/2024	18/02/2025	\$ 260.000.000	
21-44-101456497 Anexo 6	Cumplimiento	26/11/2024	18/07/2025	\$ 18.443.847	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/11/2024	18/03/2028	\$ 4.610.961	
	Estabilidad y calidad de la obra	Se ampara 5 años y 8 días		\$ 9.221.923	
	Cumplimiento	26/11/2024	18/07/2025	\$ 18.443.847	
21-44-101456497 Anexo 7	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/11/2024	18/03/2028	\$ 4.610.961	
	Estabilidad y calidad de la obra	18/03/2025	18/03/2030	\$ 9.221.923	

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
f X Instagram YouTube cornare

2. Los riesgos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante la ejecución del convenio.

SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

El contratista dio cumplimiento a esta obligación, igualmente no se evidenciaron impactos ambientales negativos durante la ejecución de las actividades; por otro lado, no se tuvo registro de incidentes que se hayan presentado con los obreros en la ejecución de la obra

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


En el expediente del contrato S-SAMC-260-2024, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto contratado.

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del avance y ejecución del contrato.

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del convenio se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

ANEXOS

Anexo documental formato digital



Supervisora

Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá, Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

     cornare



Vigente Desde:
20-feb-24

F-GJ-287/V.02



Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

f X @ ▶ cornare
