

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 29 de febrero 2024

**1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1205 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.**

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 16/08/2023 A LA FECHA
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO
	DESDE EL 29/11/2023 A LA FECHA
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosi No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023	Total
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000	\$ 15.000.000.000
Estos recursos se encuentran discriminados de la siguiente manera:		
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema;

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Auraray, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosí3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS				\$24.528.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

5.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

• **OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
26 DE DICIEMBRE DE 2023**

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

• **OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
29 DE DICIEMBRE DE 2023**

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

6. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS PROYECTOS.	21,20%**
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	0,00%**

**Durante el mes de febrero no se continuaron visitas de entrada a las cinco (5) comunidades asignadas a Findeter de los contratista derivados: Araurayu, Étnico, Solguajiro, hidroguajira y Sukuaipa hasta tanto entreguen 21 propuestas económicas incluidos los diagnósticos, no obstante se iniciaron visitas del nuevo contratista derivado Jose Luis Suaza; de otra parte se ajustó la metodología del porcentaje de avance, incluyendo el total de las 191 rehabilitaciones estipulados en los documentos contractuales "estudio Previo" y Otrosi No.3 (ANEXO 4)

7. Conclusiones y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Introducción En mi calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el objeto de: <i>"Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato"</i>, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero de 2024. 2. Avances mes de enero de 2024 El 02 y 09 de febrero de 2024, en atención a la cláusula tercera del Contrato, del ítem 3.1 "Obligaciones generales de FINDETER", numeral 1 en el que se establece participar y apoyar al Ministerio en todas las reuniones relacionadas con la ejecución del contrato, se

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

realizaron los comités de seguimiento como control y seguimiento de avance del contrato interadministrativo 1205-2023.

Se presentan a continuación las gestiones realizadas para el desarrollo del Contrato en mención en relación con los comités de seguimiento (ANEXO 5):


FECHA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
02/02/24	- Carlos Alfonso Vargas Muñoz - Jaher Enrique Mendoza Tirado - Luz Mireya Julio - Henry Andrés Gañán López - Xiomara Alexandra Almanza - Allam Alvarado Ruiz - Bryan Chávez Oviedo - Giovanny José Zúñiga Sotillo - Omar Rueda Rey	- Entregar Diagnósticos Araurayu y Sukuaipa - Acta de concertación de inicio de rehabilitaciones - Entrega de diagnósticos y propuestas Sol Guajiro - Entrega de propuestas Araurayu - Revisión base de seguimiento - Enviar directorio comunidades - Reunión equipo social y de aseguramiento MVCT

El 05, 06, 13 y 22 de febrero: De conformidad con lo establecido en el contrato interadministrativo No 1205-2023, en el numeral 2 de la cláusula décima segunda correspondiente a la Supervisión que realiza este ministerio, en el cual refiere "**Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las condiciones pactadas**", se solicitó mediante el correo institucional a FINDETER las actas No. 9 del comité del 12 de enero, acta No. 10 del 26 de enero y el acta No. 11 del 02 de febrero para revisión.


FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



El 05 y 26 de febrero: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.1 Obligaciones generales, ítem 5: ***"Colaborar con el suministro de la información solicitada por el MINISTERIO, y dar respuesta a los requerimientos que debe atender de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del Contrato"***, mediante correo electrónico se requiere a Findeter los cronogramas de las rehabilitaciones próximas a ejecutar.





FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

El 12, 13, 16 y 19 de febrero: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.1 Obligaciones generales, ítem 5: **"Colaborar con el suministro de la información solicitada por el MINISTERIO, y dar respuesta a los requerimientos que debe atender de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del Contrato"**, mediante correo electrónico se requiere a Findeter los informes de diagnósticos y las propuestas económicas de las visitas realizadas en campo a las comunidades asignadas a los contratistas derivados de Findeter Araurayu, Étnico, Solguajiro, hidroguajira, y Sukuaipa dentro del marco del contrato interadministrativo 1205-2023



FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Solicitudes Comité seguimiento 09/02/2024 - Findeter

 **Jaher Enrique Mendoza Tirado**
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; y 2 más
CC: Luz Mireya Julio Bermudez; Alcides Jose Escobar Pimienta; y 2 más
Lun 19/02/2024 8:43

Dando alcance al correo precedente, me permito reiterar las solicitudes hechas en él para tener la información de manera concreta frente a las entregas realizadas por los derivados a interventoría y ésta a FINDETER respecto a los diagnósticos y propuestas de rehabilitación. Cabe mencionar que con el pasar de los días y el aplazamiento de las fechas establecidas el número de propuestas debería aumentar. Tener en cuenta que los diseños deben ser ajustados a lo requerido y solo en donde se requieran, revisar esos precios antes de enviarlos a elaboración ya que en los informes presentados se ven bastante altos. También tengan presente el ajuste del cuadro Base de Seguimiento Semanal de actividades, llevar a él las más de 130 comunidades y los nuevos contratistas derivados para que los datos sean más reales, teniendo en cuenta que por el momento se tendrán cifras menores por hacer la evaluación sobre un listado más grande.

Quedo atento.



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Jaher Enrique Mendoza Tirado
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
JMendoza@minvivienda.gov.co
+57 (304) 216 5199
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

El 13 de febrero, conforme se estipula en la décima segunda cláusula del contrato, **"Supervisión"**, ítem 7; **"Remitir al expediente contractual toda la documentación, informes, actas y demás soportes generados dentro de la ejecución y cierre del contrato a celebrar"**, se emite vía email al archivo de grupo de contratos, el informe del mes de diciembre 2023 con comunicado No. 2024IE0000796.

Informe de Supervisión - Contrato Interadministrativo No 1205-2023 FINDETER

 **Carlos Alfonso Vargas Muñoz**
Para: Archivo Grupo de Contratos; Tramites Contratos
CC: Andres Felipe Ramirez Jaramillo; Diana Marcela Medina Henao; Jaher Enrique Mendoza Tirado; Diana Carolina Clavijo Jaimes; Johanna Carolina Bello Florez; Luz Mireya Julio Bermudez
ma. 13/02/2024 19:14

 RAD 0796 INFORME SUPERVISION DICIEMBRE-FINDETER.pdf
2 MB

Cordial saludo,
Dr. Andrés Felipe Ramírez Jaramillo
Coordinador Grupo de Contratos

De manera atenta y en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato referido en el asunto, en cumplimiento del deber de conformación y actualización de los expedientes contractuales, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de diciembre 2023 con el fin que obre en el expediente contractual respectivo.

Gracias por su atención,

 **COLOMBIA**
POTENCIA DE LA
VIDA

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carlos Alfonso Vargas Muñoz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
CAVargas@minvivienda.gov.co
+57 (313) 447 1306
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co


El 13 y 21 de febrero: dando cumplimiento a la segunda cláusula del contrato: **Alcance del Objeto** modificado con el No. Otrosi2, en el cual refiere en su Parágrafo Primero: **"Para la estructuración de las convocatorias derivadas es necesario disponer de la priorización de los proyectos que deben ser ejecutados según las concertaciones"**

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

que debe realizar el MVCT con las autoridades respectivas, y en la cual se contará con el acompañamiento de Findeter. Es preciso mencionar que el inicio de la ejecución de los contratos derivados y el tiempo de ejecución del contrato interadministrativo dependerá de estos resultados. El MINISTERIO entregará a FINDETER los proyectos priorizados, con sustento en diferentes criterios, incluidos los socializados con las asociaciones y/o comunidades indígenas y/o etnias (comunidades tradicionales wayuu) en el departamento de La Guajira.”, se enlistan y asignan mediante correo electrónico a FINDETER, 11 comunidades para el contratista derivado Jose Luis Suaza y 20 comunidades para el contratista derivado Construir Guajira, con el propósito de dar inicio a las visitas sociales para el posterior ejercicio técnico de diagnóstico y ejecución de las rehabilitaciones.(ANEXO 6)



Contratista derivado Jose Luis Suaza

MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	COMUNIDAD	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	Y	X
URIBIA	Uribia	Pepsuapa	Microacueducto	11,700597	-72,265197
URIBIA	Rgdo. Alta y Media Guajira	JAIPA	Pozo artesanal	11,773362	-72,174521
URIBIA	Cgto. Wanpeshi	KALALOW	Molino de viento	11,607000	-72,252500
URIBIA	Rgdo. Alta y Media Guajira	IPATU	Pozo artesanal	11,798267	-72,268813
URIBIA	Cgto. Wanpeshi	Shoshinchon	Molino de viento	11,642596	-72,261440
URIBIA	Rgdo. Alta y Media Guajira	AMUCHEN	Pozo artesanal	11,753556	-72,202806

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

URIBIA	Cgto. El Cardón	YOLUMALI	Pozo	11,861000	-72,247000
URIBIA	Cgto. Jojuncito	SAMUTSHIRRA	Molino de viento con pozo artesanal	11,836423	-72,022731
URIBIA	Cgto. Jojuncito	ATURAIMPA	Pozo artesanal	11,825583	-71,921194
URIBIA	Cgto. Jojuncito	MASHALERAIN	Pozo artesanal	11,917611	-72,054056
URIBIA	Cgto. Jojuncito	JOUPANACHO	Pozo	11,759825	-72,151521

Contratista derivado Construir Guajira


MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	COMUNIDAD	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	Y	X
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	CASIYOUREN 1	Pozo artesanal	12,125910	-71,404700
URIBIA	Cgto. Cabo de La Vela	Alijunao	Pozo artesanal	12,167448	-71,984671
URIBIA	Cgto. Cabo de La Vela	CUBAMANA	Pozo	12,173000	-72,015000
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	MELOCOMANA	Pozo artesanal	12,283139	-71,765222
URIBIA	Cgto. Cabo de La Vela	JICHIPA	Pozo	12,123000	-72,021000
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	youlepa	Pozo artesanal	12,263487	-71,822655
URIBIA	Cgto. Casuso	Portete	Pozo artesanal	12,168832	-71,899391
URIBIA	Cgto. Casuso	Ian	Pozo artesanal	12,232072	-71,842000
URIBIA	Cgto. Cabo de La Vela	JOTOMANA	Pozo	12,203000	-72,081000
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	LUACE WINPANARU	Pozo	12,263000	-71,757000
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	Arijunakimana	Pozo Artesanal	12,202750	-71,742444
URIBIA	Cgto. Casuso	Jutsu	Pozo artesanal	12,221722	-71,728833
URIBIA	Cgto. Casuso	LAMUNALU 1	Pozo artesanal	12,203361	-71,745833
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	PATAJATAMANA	Pozo Artesanal	12,240345	-71,70351
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	Lauce	Pozo artesanal, manantial	12,275300	-71,783699
URIBIA	San José de Bahía Honda	Amuyuwou	Pozo profundo - Molino de viento	12,293056	-71,911667
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	MALAKIMANA	Pozo	12,265797	-71,688964
URIBIA	Cgto. San José de Bahía Honda	JURRASQUERA	Pozo	12,277279	-71,684749
URIBIA	Cgto. Tawaira	Orroliwou, nuevo ambiente	Pozo	12,348973	-71,647482
URIBIA	Cgto. Taroa	Bahia Hondita 2	Pozo	12,422422	-71,717914

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27


El 14 y 21 de febrero: en Aras del cumplimiento de la cuarta cláusula del contrato “Obligaciones del Ministerio”, numeral 4“ **Brindar a FINDETER la información que requiera para la ejecución del Contrato, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no sea obligación de FINDETER suministrar**”; se entregó los listados de número de contacto de las comunidades asignadas a Findeter, con el fin que los derivados Jose Luis Suaza y Construir Guajira realicen el acercamiento para las visitas sociales, diagnóstico y rehabilitación.



El 19,21 y 28 de febrero: Partiendo del “Alcance al Objeto” dispuesto en la segunda cláusula del contrato del ítem 1 en el cual refiere: “Las **obligaciones que conlleven la aprobación del plan operativo del contrato, y la revisión y visto bueno de la metodología de ejecución de los proyectos, para asegurar el cumplimiento de los criterios normativos por parte de cada proyecto a intervenir. Esta Metodología puede incluir las actividades de diagnóstico, estudios y/o diseños y la ejecución de las obras en los sitios de intervención priorizados por el MINISTERIO**”; se revisa el cuadro de avance (%) emitido semanalmente por Findeter, como también reajuste y verificación conjuntamente con el Ministerio, Interventoría y Findeter. (ANEXO 4)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

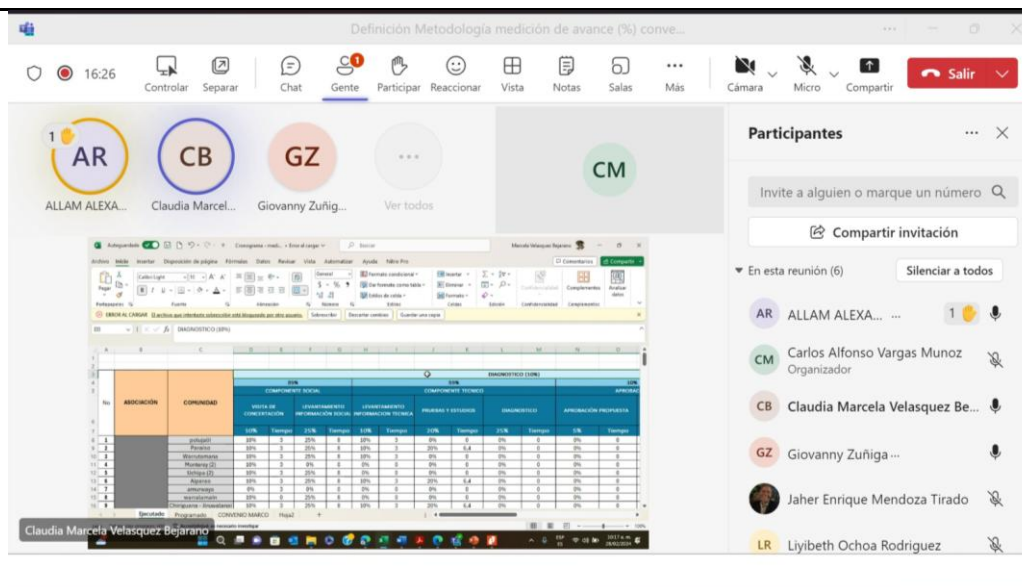

Cuadro Metodología de Avance (en proceso de ajuste)

Plazo	18 meses	Ponderado	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	PROGRAMADO	EJECUTADO
Firma del Acta de Inicio	28/06/2023					
Fecha de Terminación del contrato	27/02/2025					
Fecha adjudicación ultima unidad	20/10/2024					
Tiempo adjudicación por unidad	2,51					
Unidades adjudicadas	96,69	20%	50,63%	50,79%	10,13%	10,16%
Acta de Inicio de Unidades contratadas		20%	50,63%	50,79%	10,13%	10,16%
Etapas de Diagnóstico y Rehabilitación		50%	35,10%	1,77%	17,55%	0,88%
Entrega de proyecto a la comunidad		5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrega de Informe Final		5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		100%			37,80%	21,20%

El 16 y 22 de febrero: En función de la Tercera clausula OBLIGACIONES A CARGO DE FINDETER dispuesto en el ítem 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, numeral 9°: “Remitir al MINISTERIO, para que, a través del equipo técnico designado por el MINISTERIO y FINDETER, se haga la revisión, validación y aprobación de las propuestas de modificación a la rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios o proyectos de soluciones alternativas de agua, que hayan sido previamente priorizadas”, se emite a FINDETER el comunicado No. 2024E0005407 el 26 de febrero 2024 vía email, por el cual se solicita dentro de los cinco (5) primeros días hábiles

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

siguientes al recibo del oficio, la entrega de los precios de referencia de las rehabilitaciones. A esta solicitud FINDETER hace entrega de dichos precios el día 22 de febrero 2024.

Comunicado No 2024EE0005407 -Contrato Interadministrativo No 1205-2023

Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
"CORRESPONDENCIA FINDETER"
CC Diana Marcela Medina Henao; Eladia Beatriz Jimenez Medina; 'haganan@findeter.gov.co'; Rosa Eneyda Martinez Vargas;
Diana Carolina Clavijo James; 'jmercado@findeter.gov.co'; 'Aalvarado@findeter.gov.co'; y 4 usuarios más

Respondió a este mensaje el 20/02/2024 0:05.

RAD 5407 SOLICITUD - PRECIOS DE REFERENCIA REHABILITACIONES.pdf
453 KB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Señores
FINDETER
JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
Gerente de Medio Ambiente

Reciba un cordial saludo, de otra parte, envío comunicado No. 2024EE0005407 respecto a precios de referencia y respuesta al oficio No. 2202350512474 con asunto: "entrega de soportes para el pago de las actividades desarrolladas en la etapa de diagnóstico y propuestas de los puntos a rehabilitar en el marco del contrato interadministrativo No. 1205 de 2023". "para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atento,

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carlos Alfonso Vargas Muñoz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
CAVargas@minvivienda.gov.co
+57 (313) 447 1306
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

RV: MATRIZ DE PRESUPUESTO DE REFERENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023

Para ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz; Jaher Enrique Mendoza Tirado
CC HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ; CESAR OSWALDO CASTRO LEON; HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ

Este remitente AAALVARADO@findeter.gov.co es externo a la organización.

Mensaje reenviado el 22/02/2024 8:39.

COTIZACIONES FINALES.zip
9 MB

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA FINDETER.xlsx
3 MB

Buenos Dias. Carlos y Jaher,

Se remite la matriz de presupuesto de referencia a utilizar en el proceso de Rehabilitación con sus respectivas cotizaciones con una actualización final.

Quedamos muy atentos

Cordialmente,

ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ
Analista II 21
Gerencia de Medio Ambiente
aaalvarado@findeter.gov.co


 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

El 02, 09, 16 y 23 de febrero de 2024; En el cumplimiento de la décima segunda cláusula del contrato.: **"Supervisión"**, ítem 1 **"Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes"**, se realizó la actualización semanal de la ejecución del contrato interadministrativo en el documento Plan Wüin Ülees – Avances, ubicado en el link; [2024](#),



en el cual se consignan el control, seguimiento, avances y novedades presentados durante la semana correspondiente, con relación al desarrollo del Contrato Interadministrativo 1205 del 2023 suscrito con FINDETER.

El 19, 21 y 28 febrero de 2024, se realiza ajustes en el cuadro de actividades en la metodología de diagnóstico y rehabilitación conforme se establece en la segunda cláusula del contrato, punto 1: "Esta metodología puede incluir las actividades de diagnóstico, estudios y/o diseños y la ejecución de las obras en los sitios de intervención priorizados por el ministerio"; de manera que esta metodología es socializadas Findeter el 28 de febrero 2024; (ANEXO 4):

Plazo	18 meses	Ponderado	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	PROGRAMADO	EJECUTADO
Firma del Acta de Inicio	28/06/2023					
Fecha de Terminación del contrato	27/02/2025					
Fecha adjudicación ultima unidad	20/10/2024					
Tiempo adjudicación por unidad	2,51					

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Unidades adjudicadas	96,69	20%	50,63%	50,79%	10,13%	10,16%
Acta de Inicio de Unidades contratadas		20%	50,63%	50,79%	10,13%	10,16%
Etapas de Diagnóstico y Rehabilitación		50%	35,10%	1,77%	17,55%	0,88%
Entrega de proyecto a la comunidad		5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrega de Informe Final		5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		100%			37,80%	21,20%

El 26, 27, 28 y 29 de febrero; en cumplimiento de la segunda cláusula del contrato "Alcance al Objeto", en su modificación estipulada en el Otrosí No.2, PARÁGRAFO SEGUNDO; "La ejecución de los proyectos en cada una de sus etapas estará sujeta a la aprobación de las intervenciones por parte de las comunidades que se pretenden beneficiar. **EL MINISTERIO deberá gestionar el acercamiento y comunicación con las asociaciones y/o comunidades indígenas y/o etnias (comunidades tradicionales wayuu) y coadyuvar con la implementación de las intervenciones**", se realizaron 11 visitas sociales a las comunidades asignadas al contratista derivado de Findeter, Jose Luis Suaza en el departamento de Uribia: Warrarramarlein, Ipatu, Joupanachon, Masheralain, Kalalo, Shonshinshon, Pepsuapa, Jaipa, Amuchein, Samuthira, y Aturampia.

			
Foto 1. Entrada social a la Comunidad Warrarramarlein (26/02/2024)		Foto 2. Infraestructura existente (Molino Desmantelado) comunidad Warrarramarlein (26/02/2024)	
			
Foto 3. Entrada social a la Comunidad Ipatu (26/02/2024)		Foto 4. Infraestructura existente (Pozo Artesanal) comunidad Ipatu (26/02/2024)	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Foto 5. Entrada social a la Comunidad Masheralain (27/02/2024)	Foto 6. Infraestructura existente (Pozo Artesanal) comunidad Masheralain (27/02/2024)
	
Foto 7. Entrada social a la Comunidad Shonshinshon (27/02/2024)	Foto 8. Infraestructura existente (molino de viento y Aero desalinizador) comunidad Shonshinshon (27/02/2024)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

3. Relación de comunicaciones (ANEXO 7)

Radicado Emitido Findeter/MVCT	Radicado Recibido MVCT	Asunto	Remitente	Fecha Recibo/emitted	Radicado Respuesta MVCT	Estado
2202350512474	2023ER0150959	Entrega de soportes para el pago de las actividades desarrolladas en la etapa de Diagnóstico y propuestas de los puntos a rehabilitar en el marco del contrato interadministrativo No. 1205 de 2023	Jorge Emilio Mercado Gonzalez / Findeter	27/12/2023	2024EE0005407 08/02/2024	Emitido
2024EE0005407	NA	Solicitud presentación matriz de precios de referencia y propuestas de rehabilitación y respuesta al documento 2202350512474 con referencia "entrega de soportes para el pago de las actividades desarrolladas en la etapa de diagnóstico y propuestas de los puntos a rehabilitar en el marco del contrato interadministrativo No. 1205 de 2023".	Diana Marcela Medina Henao /MVCT	08/02/2024	NA	Emitido
2202350512473	2023ER0150943	Desembolso de Recursos Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera del Desarrollo Territorial S.A - FINDETER	Jorge Emilio Mercado Gonzalez / Findeter	27/12/2023	2024EE0001486 23/01/2024	Pendiente Visto Bueno de La Coordinadora
2202450500185		Remisión del Informe mensual periódico diciembre de 2023 del Contrato Interadministrativo No 1205-2023	Jorge Emilio Mercado Gonzalez / Findeter	01/10/2024	2024EE0002883 31/01/2024	Pendiente Firma Supervisor Contrato
2024EE0004834		Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - <Planeación de Actividades 2024. Contrato Interadministrativo No 1205-2023>.	Diana Marcela Medina Henao /MVCT	07/02/2024		Pendiente Firma Supervisor Contrato
2024EE0009107		Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Respuesta al radicado No. MVCT 2024ER0016240	Diana Marcela Medina Henao /MVCT	22/02/2024		Pendiente Firma Supervisor Contrato

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		(2202450501227 Findeter) y con asunto <<Remisión Informe mensual 5 - Contrato Interadministrativ o No. 1205-2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter>>.				
2024EE0007820		Solicitud de nombres y teléfonos de personal Findeter para la gestión del Contrato Interadministrativ o No. 1205-2023.	Diana Marcela Medina Henao /MVCT	19/02/2024		Emitido

4. Actividades para realizar en el mes de marzo de 2024

Como sigue pendiente que FINDETER entregue los diagnósticos y propuestas económicas para intervenciones establecidas como compromiso en diciembre de 2023, enero y febrero 2024, nuevamente se establece como compromiso pendiente de cumplir, que FINDETER entregue los diagnósticos y propuestas económicas en los formatos ya establecidos para las obras de rehabilitación y entregados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el primero de febrero de 2024.

De otra parte, FINDETER y sus contratistas derivados continúan elaborando los demás diagnósticos faltantes (pruebas, ensayos de laboratorio) para avanzar con la construcción de las propuestas de intervención y su entrega.

A continuación, se relaciona el estado de los procesos a corte del mes de febrero de 2024:

ID	COMUNIDADES	VISITA SOCIAL	VISITA TÉCNICA	LABORATORIO	PROPUESTAS ECONÓMICAS A PRESENTAR EN FEBRERO DE 2024
ÉTNICO WAYUU	17	12	12	5	5
ARAURAYU	20	17 (hubo 3 reasignaciones, por eso ya no son 20 visitas)	17 (hubo 3 reasignaciones, por eso ya no son 20 visitas)	9	5
SUKUAIPA	13	13	13	0	3*
SOL GUAJIRO	22	18	18	4	2
HIDROGUAJIRA	21	21	21	9	9
TOTALES	93	81	81	27	21

*No se suma Sukuaipa porque solo presentan diagnósticos

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Se implementará a partir de la fecha la nueva metodología de porcentaje (%) de avance por parte del contratista FINDETER de acuerdo con la socialización del formato el día 28 de febrero 2024.

Se continuarán con las visitas de entrada social a las comunidades asignadas al contratista derivado Construir Guajira los días 4, 5, 6, 7 y 9 marzo 2024 conforme programación emitida por el Findeter. (ANEXO 8)

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de febrero de 2024 que correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica, se informa que existen riesgos jurídicos asociados y/o alertas de situaciones que constituyen incumplimiento en las obligaciones contractuales y derivadas de los compromisos que se adquieren por FINDETER S.A. en cada comité de seguimiento, toda vez que no hay avances en las entregas de diagnósticos y propuestas económicas que permitan dar inicio a la ejecución de las rehabilitaciones, situación que retrasa el cumplimiento de las obligaciones, y que repercute en el impacto del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 así como en el Plan Provisional de Acción presentado a la Corte Constitucional el 28-08-2023

Teniendo en cuenta que en el informe con corte 31 de diciembre 2023, se indicó que las garantías que correspondían a los otrosíes No. 2 y 3, se encontraban en trámite y gestión por parte de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER a través de la aseguradora de Seguros del Estado S.A., es oportuno consignar en el presente informe que esta obligación jurídico-contractual se cumplió, quedando la actualización de la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 33-44-101239751 (ANEXO 3) del contrato frente al Otrosí No. 2 y 3 del 26 de enero de 2024, con el siguiente contenido:

<u>COMPAÑÍA DE SEGUROS</u>	<u>AMPARO</u>	<u>PÓLIZA N°</u>	<u>VIGENCIA</u>		<u>VALOR ASEGURADO</u>
			<u>DESDE</u>	<u>HASTA</u>	
<u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</u>	<u>CUMPLIMIENTO</u>	<u>33-44- 101239751</u>	<u>27/06/2023</u>	<u>27/06/2025</u>	<u>\$ 305.901.486,00</u>
	<u>CALIDAD DEL SERVICIO</u>		<u>27/06/2023</u>	<u>27/06/2025</u>	<u>\$ 305.901.486,00</u>
	<u>SALARIOS Y PRESTACIONES</u>		<u>27/06/2023</u>	<u>27/02/2028</u>	<u>\$ 152.950.743,00</u>

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.

No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000,00
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 20.689.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación	\$26.408.000.000,00
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000

La información de los numerales 1 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT y según lo establecido en el OTROSI No. 3 celebrado al Contrato 1205 de 2023 celebrado entre el MVCT y FINDETER S.A. el pasado 29 de diciembre 2023 y 21 de febrero 2024.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada del desembolso realizado a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de febrero 2024.



DIANA MARCELA MEDINA HENAO
Supervisor
Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27
