

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SAMC-GSR-001-2025

CONTRATANTE : INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON
CONTRATISTA : REDEMAS SAS
Nit. : 900269955-9
FECHA INICIO : 20 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 28 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR : YHOHN DANIEL AMAYA BALAGUERA
VALOR : \$ 129.907.540
PLAZO : CUARENTA Y CUNCO (45) DIAS CALENDARIO
OBJETO : ADECUACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED GPON DE CIEN (100) PUNTOS DE DATOS EN FIBRA OPTICA PARA 3 LAS SALAS DE INFORMATICA DEL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON.

La ejecución del contrato SAMC-GSR-001-2025, se desarrollo de acuerdo al plazo y condiciones estipuladas en la minuta de la siguiente manera:

INSTALACION DE PUNTOS RED GPON

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANT	UBICACION
1	ONU/OUT	C-DATA	40	Sala Informática docente Yohn Daniel Amaya Balaguera
2	ONU/OUT	C-DATA	40	Sala Informática docente Mario Andrés Diaz
3	ONU/OUT	C-DATA	24	Sala Informática docente Diego Balaguera

Se contrato la adecuación, instalación y puesta en marcha de 100 puntos de Red Gpon, pero en la propuesta, adicional a lo previsto, el contratista ofreció la instalación de 4 puntos mas los cuales quedaron instalados en la sala del docente DIEGO BALAGUERA, como lo podemos ver en el cuadro anterior.

EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACION
1	OLT	1	V-SOL	V1600G0-B	1CEF03881AC6	RACK PPAL
2	UPS	1	POWEST	GALLEON ONE/T LV 2B 1000	83112503500158	RACK PPAL
3	ROUTER BOARD	1	MIKROTIK	RB3011UIAS-RM	E7E60FE55A9B4	RACK PPAL
4	ODF 24H	1	N/A	N/A	N/A	RACK PPAL
5	ODF 96H	1	N/A	N/A	N/A	RACK PPAL



Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón

Resolución de Aprobación de Estudios No. 0706 del 12 de Octubre de 2012

Código DANE 315001001893 - NIT 820.001.460 - 4

El contratista hizo la instalación de la red de acuerdo a las condiciones técnicas descritas en el pliego definitivo y la propuesta.

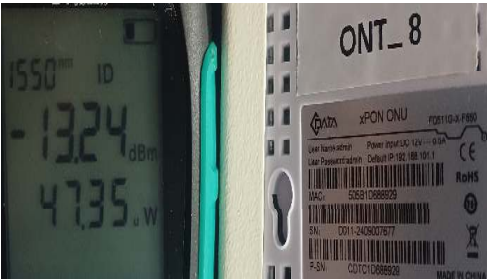
El tiempo de ejecución estaba programado para entrega el 04 de agosto, pero el contratista termino con anticipación e hizo entrega el 28 de julio de 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$129.907.540,00
PAGOS PARCIALES	\$0.00
VALOR EJECUTADO	\$129.907.540,00
VALOR A PAGAR	\$129.907.540,00

En constancia se firma hoy 19 de agosto de 2025 con destino a orden de pago.


YOHN DANIEL AMAYA BALAGUERA
Supervisor

	<div>RED GPON DE CIEN (100) PUNTOS DE DATOS EN FIBRA ÓPTICA</div> <div>INFORME DE CERTIFICACIÓN POTENCIAS ÓPTICAS</div> <div>CONTRATO SAMC-GSR-001-2025</div>		<div>Código:FO-TEC-0024</div> <div>Versión:1</div> <div>Vigente desde:Noviembre de 2024</div>
INFORMACION GENERAL			
Ciudad/Municipio	Tunja	Fecha	
Entidad	Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón		
Sede	Sede Principal		
INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBIÓ LA INSTALACIÓN			
Nombre y Apellidos	Yohn Daniel Amaya Balaguera	Celular	
Correo electrónico	yohn.amaya@itgonzalosuarez.edu.co	Cargo	Docente de Informática (Supervisor)
REPORTE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			
<p>Una vez concluido el proceso de instalación de la red GPON, se llevó a cabo la validación y certificación de los niveles de potencia óptica en todos los puntos instalados. Las pruebas se realizaron de forma presencial en cada uno de los enlaces mediante un medidor de potencia óptica (power meter), y de manera remota a través de la interfaz de gestión de la OLT. Los resultados obtenidos indicaron que las potencias se encontraban dentro de los rangos óptimos establecidos para el correcto funcionamiento y estabilidad del servicio en la red.</p> <p>A continuación, se presenta el registro fotográfico de las mediciones realizadas con el equipo de prueba, así como capturas de pantalla con los niveles de potencia óptica observados desde la plataforma de monitoreo de la OLT.</p>			
OBSERVACIONES			
Durante el proceso de instalación no se presentó ninguna novedad relevante.			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
1. PUNTO DE DATOS 1 (D1)	2. PUNTO DE DATOS 2 (D2)	3. PUNTO DE DATOS 3 (D3)	
			

4. PUNTO DE DATOS 4 (D4)	5. PUNTO DE DATOS 5 (D5)	6. PUNTO DE DATOS 6 (D6)
		
7. PUNTO DE DATOS 7 (D7)	8. PUNTO DE DATOS 8 (D8)	9. PUNTO DE DATOS 9 (D9)
		
10. PUNTO DE DATOS 10 (D10)	11. PUNTO DE DATOS 11 (D11)	12. PUNTO DE DATOS 12 (D12)
		

<p>13. PUNTO DE DATOS 13 (D13)</p> 	<p>14. PUNTO DE DATOS 14 (D14)</p> 	<p>15. PUNTO DE DATOS 15 (D15)</p> 
<p>16. PUNTO DE DATOS 16 (D16)</p> 	<p>17. PUNTO DE DATOS 17 (D17)</p> 	<p>18. PUNTO DE DATOS 18 (D18)</p> 
<p>19. PUNTO DE DATOS 19 (D19)</p> 	<p>20. PUNTO DE DATOS 20 (D20)</p> 	<p>21. PUNTO DE DATOS 21 (D21)</p> 

22. PUNTO DE DATOS 22 (D22)	23. PUNTO DE DATOS 23 (D23)	24. PUNTO DE DATOS 24 (D24)
		
25. PUNTO DE DATOS 25 (D25)	26. PUNTO DE DATOS 26 (D26)	27. PUNTO DE DATOS 27 (D27)
		
28. PUNTO DE DATOS 28 (D28)	29. PUNTO DE DATOS 29 (D29)	30. PUNTO DE DATOS 30 (D30)
		

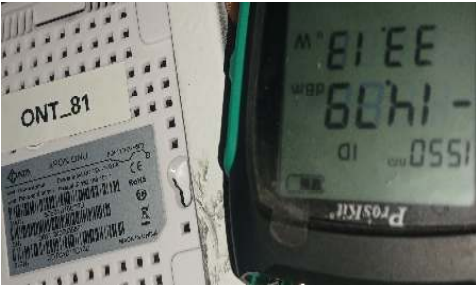
31. PUNTO DE DATOS 31 (D31)	32. PUNTO DE DATOS 32 (D32)	33. PUNTO DE DATOS 33 (D33)
 <p>ONT_31</p> <p>1550nm ID -14.38 dBm 36.42 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C2E9 SN: 2011-2406035810 P-SN: CDT1C1D15C2E9 MADE IN CHINA</p>	 <p>ONT_32</p> <p>1550nm ID -15.62 dBm 27.39 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C2F3 SN: 2011-2406035824 P-SN: CDT1C1D15C2F3 MADE IN CHINA</p>	 <p>ONT_33</p> <p>1550nm ID -13.96 dBm 40.15 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C2F5 SN: 2011-2406035841 P-SN: CDT1C1D15C2F5 MADE IN CHINA</p>
34. PUNTO DE DATOS 34 (D34)	35. PUNTO DE DATOS 35 (D35)	36. PUNTO DE DATOS 36 (D36)
 <p>ONT_34</p> <p>1550nm ID -13.45 dBm 45.14 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C229 SN: 2011-2406035951 P-SN: CDT1C1D15C229 MADE IN CHINA</p>	 <p>ONT_35</p> <p>1550nm ID -15.64 dBm 27.27 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C2A1 SN: 2011-2406035883 P-SN: CDT1C1D15C2A1 MADE IN CHINA</p>	 <p>ONT_36</p> <p>1550nm ID -15.12 dBm 30.73 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C27D SN: 2011-2406035958 P-SN: CDT1C1D15C27D MADE IN CHINA</p>
37. PUNTO DE DATOS 37 (D37)	38. PUNTO DE DATOS 38 (D38)	39. PUNTO DE DATOS 39 (D39)
 <p>ONT_37</p> <p>1550nm ID -14.00 dBm 39.75 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C27D SN: 2011-2406035953 P-SN: CDT1C1D15C27D MADE IN CHINA</p>	 <p>ONT_38</p> <p>1550nm ID -13.85 dBm 41.13 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C277 SN: 2011-2406035950 P-SN: CDT1C1D15C277 MADE IN CHINA</p>	 <p>ONT_39</p> <p>1550nm ID -14.26 dBm 37.46 W</p> <p>DATA xPON ONU P25110-X-P880 User Name admin Power Input DC 12V 0.5A User Password admin Default IP 192.168.101.1 MAC: 808B1D15C2A8 SN: 2011-2406035948 P-SN: CDT1C1D15C2A8 MADE IN CHINA</p>

<p>40. PUNTO DE DATOS 40 (D40)</p> 	<p>41. PUNTO DE DATOS 41 (D41)</p> 	<p>42. PUNTO DE DATOS 42 (D42)</p> 
<p>43. PUNTO DE DATOS 43 (D43)</p> 	<p>44. PUNTO DE DATOS 44 (D44)</p> 	<p>45. PUNTO DE DATOS 45 (D45)</p> 
<p>46. PUNTO DE DATOS 46 (D46)</p> 	<p>47. PUNTO DE DATOS 47 (D47)</p> 	<p>48. PUNTO DE DATOS 48 (D48)</p> 

<p>49. PUNTO DE DATOS 49 (D49)</p>  <p>ONT_49</p> <p>1488 dBm 3243 uW</p>	<p>50. PUNTO DE DATOS 50 (D50)</p>  <p>ONT_50</p> <p>1550 ID -1482 dBm 3294 uW</p>	<p>51. PUNTO DE DATOS 51 (D51)</p>  <p>ONT_51</p> <p>1550 ID -1507 dBm 3111 uW</p>
<p>52. PUNTO DE DATOS 52 (D52)</p>  <p>ONT_52</p> <p>1550 ID -1424 dBm 3760 uW</p>	<p>53. PUNTO DE DATOS 53 (D53)</p>  <p>ONT_53</p> <p>1550 ID -1425 dBm 2541 uW</p>	<p>54. PUNTO DE DATOS 54 (D54)</p>  <p>ONT_54</p> <p>1550 ID -1494 dBm 3200 uW</p>
<p>55. PUNTO DE DATOS 55 (D55)</p>  <p>ONT_55</p> <p>1550 ID -1566 dBm 2712 uW</p>	<p>56. PUNTO DE DATOS 56 (D56)</p>  <p>ONT_56</p> <p>1550 ID -1508 dBm 3098 uW</p>	<p>57. PUNTO DE DATOS 57 (D57)</p>  <p>ONT_57</p> <p>1550 ID -1477 dBm 3326 uW</p>

<p>58. PUNTO DE DATOS 58 (D58)</p> 	<p>59. PUNTO DE DATOS 59 (D59)</p> 	<p>60. PUNTO DE DATOS 60 (D60)</p> 
<p>61. PUNTO DE DATOS 61 (D61)</p> 	<p>62. PUNTO DE DATOS 62 (D62)</p> 	<p>63. PUNTO DE DATOS 63 (D63)</p> 
<p>64. PUNTO DE DATOS 64 (D64)</p> 	<p>65. PUNTO DE DATOS 65 (D65)</p> 	<p>66. PUNTO DE DATOS 66 (D66)</p> 

<p>67. PUNTO DE DATOS 67 (D67)</p> 	<p>68. PUNTO DE DATOS 68 (D68)</p> 	<p>69. PUNTO DE DATOS 69 (D69)</p> 
<p>70. PUNTO DE DATOS 70 (D70)</p> 	<p>71. PUNTO DE DATOS 71 (D71)</p> 	<p>72. PUNTO DE DATOS 72 (D72)</p> 
<p>73. PUNTO DE DATOS 73 (D73)</p> 	<p>74. PUNTO DE DATOS 74 (D74)</p> 	<p>75. PUNTO DE DATOS 75 (D75)</p> 

<p>76. PUNTO DE DATOS 76 (D76)</p> 	<p>77. PUNTO DE DATOS 77 (D77)</p> 	<p>78. PUNTO DE DATOS 78 (D78)</p> 
<p>79. PUNTO DE DATOS 79 (D79)</p> 	<p>80. PUNTO DE DATOS 80 (D80)</p> 	<p>81. PUNTO DE DATOS 81 (D81)</p> 
<p>82. PUNTO DE DATOS 82 (D82)</p> 	<p>83. PUNTO DE DATOS 83 (D83)</p> 	<p>84. PUNTO DE DATOS 84 (D84)</p> 

<p>85. PUNTO DE DATOS 85 (D85)</p> 	<p>86. PUNTO DE DATOS 86 (D86)</p> 	<p>87. PUNTO DE DATOS 87 (D87)</p> 
<p>88. PUNTO DE DATOS 88 (D88)</p> 	<p>89. PUNTO DE DATOS 89 (D89)</p> 	<p>90. PUNTO DE DATOS 90 (D90)</p> 
<p>91. PUNTO DE DATOS 91 (D91)</p> 	<p>92. PUNTO DE DATOS 92 (D92)</p> 	<p>93. PUNTO DE DATOS 93 (D93)</p> 

94. PUNTO DE DATOS 94 (D94)



95. PUNTO DE DATOS 95 (D95)



96. PUNTO DE DATOS 95 (D96)



97. PUNTO DE DATOS 95 (D97)



98. PUNTO DE DATOS 95 (D98)



99.PUNTO DE DATOS 95 (D99)



100. PUNTO DE DATOS (D100)



101. PUNTO DE DATOS (D101)



102. PUNTO DE DATOS (D102)



103. PUNTO DE DATOS (D103)



104. PUNTO DE DATOS (D104)

[illegible]

106. REGISTRO DE POTENCIAS EN OLT PON 2				107. REGISTRO DE POTENCIAS EN OLT PON 3				107. REGISTRO DE POTENCIAS EN OLT PON 3			
ONU ID	Description	RX Power	TX Power	ONU ID	Description	RX Power	TX Power				
GPON0/2:1	D100	NULL	NULL	GPON0/3:1	D50	-12,77	1,85	GPON0/3:36	D76	-15,35	2,15
GPON0/2:2	D102	-13,55	1,81	GPON0/3:2	D49	-14,56	1,9	GPON0/3:37	D90	-13,05	2,06
GPON0/2:3	D101	-13,13	1,94	GPON0/3:3	D51	-13,52	1,89	GPON0/3:38	D94	-13,64	1,79
GPON0/2:4	D103	-17,39	2,34	GPON0/3:4	D52	-12,86	2	GPON0/3:39	D91	-14,23	2,12
GPON0/2:5	D104	-17,25	2,84	GPON0/3:5	D53	-13,66	1,88	GPON0/3:40	D82	-13,1	2,22
GPON0/2:6	D98	-13,56	1,96	GPON0/3:6	D57	-13,25	1,91	GPON0/3:41	D63	-13,22	1,97
GPON0/2:7	D97	-13,25	1,81	GPON0/3:7	D54	-13,33	1,71	GPON0/3:42	D85	-17,42	2,05
GPON0/2:8	D99	-11,12	1,84	GPON0/3:8	D55	-15,06	1,74	GPON0/3:43	D84	-12,61	2,12
				GPON0/3:9	D56	-14,19	1,93	GPON0/3:44	D80	-12,95	2,11
				GPON0/3:10	D58	-15,83	1,82	GPON0/3:45	D87	-12,73	1,98
				GPON0/3:11	D59	-12,88	1,71	GPON0/3:46	D86	-15,83	2,21
								GPON0/3:47	D88	-14,65	2,12
				GPON0/3:12	D60	-12,47	1,71	GPON0/3:48	D77	-13,84	1,98
				GPON0/3:13	D61	-15,61	1,77				
				GPON0/3:14	D62	-14,71	1,86	GPON0/3:24	D67	-13,54	2,11
				GPON0/3:15	D63	-15,27	2,03	GPON0/3:25	D68	-12,78	2,08
				GPON0/3:16	D64	-13,05	2,05	GPON0/3:26	D69	-17,21	1,86
				GPON0/3:17	D70	-15,62	1,72	GPON0/3:27	D79	-15,69	2,03
				GPON0/3:18	D65	-13,87	1,89	GPON0/3:28	D75	-13,31	2,15
				GPON0/3:19	D71	-13,81	1,79	GPON0/3:29	D89	-12,87	2,07
				GPON0/3:20	D74	-12,73	1,93	GPON0/3:30	D95	-20,04	3,18
				GPON0/3:21	D66	-13,62	1,98	GPON0/3:31	D78	-13,33	2,07
				GPON0/3:22	D72	-19,22	2,11	GPON0/3:32	D93	-12,53	2,09
				GPON0/3:23	D73	-13,27	2,11	GPON0/3:33	D80	-12,64	2,13
								GPON0/3:34	D96	-13,07	2,15
								GPON0/3:35	D92	-13,58	2,18

ELABORADO POR:

FIRMA:		
NOMBRE:	ANDREY YAMID CASTILLO B	
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS	
CÉDULA:	1'056.506.703	
N° CELULAR:	321 231 7834	



REDEMAS SAS
NIT 900.269.955-9
Calle 9 B Nro 69 93
Tel: (601) 3176456069
Tunja - Colombia
gerencia@redemas.co



Factura electrónica de venta
No. FE 5682

Señores	INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDON		
NIT	820.001.460-4	Teléfono	(608) 7470303 - Ext. 000
Dirección	CALLE 19 # 15 - 52 KENNEDY	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 10:41
Expedición	31/07/2025, 10:41
Vencimiento	19/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Adecuación, instalación y puesta en marcha de la red GPON, de cien (100) puntos de datos en fibra óptica, para tres salas de informática del INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDON. Descripción: CABECERA - DATACENTER - RED VERTICAL - UN (1) ROUTER CORE - UN (1) OLT GPON CUATRO (4) PUERTOS PON - ODF TRONCAL 24 PUERTOS - CUATRO (4) SFP GPON - DOS (2) SFP+ para red BACKBONE (OLT - ROUTER CORE) - Organizador para rack 30X30 (1U) - RACK GABINETE DE 40 U / 71 CM X 85 CM - UPS ON LINE 1KVA TIPO RACK. Según Contrato de Adquisición de Bienes y Servicios SAMC-GSR-001-2025.	1.00	13,000,000.00	19 %	2,470,000.00	15,470,000.00
2	Adecuación, instalación y puesta en marcha de la red GPON, de cien (100) puntos de datos en fibra óptica, para tres salas de informática del INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDON. Descripción: RED DE DISTRIBUCION Y/O HORIZONTAL - UN (1) PUNTO ONT DE DATOS 1GPBS, con Integración de la red eléctrica existente. Según Contrato de Adquisición de Bienes y Servicios SAMC-GSR-001-2025.	100.00	961,660.00	19 %	18,271,540.00	114,437,540.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento veintinueve millones novecientos siete mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-19 por \$ 129,907,540.00

Observaciones:

Realizar pago a cuenta de Ahorros Bancolombia 88200005231 a nombre de REDEMAS SAS identificado(a) con NIT No. 900269955

Total Bruto	109,166,000.00
IVA 19%	20,741,540.00
Total a Pagar	129,907,540.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: vor en d XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071901851 aprobado en 20240531 prefijo FE desde el número 5576 al 6000 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: cb8b487906f0d581fe3e81a871458868ab366aa0a13cd213f15171a3c270105bda39f0b2b096c698949a944717198eb9

**INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON****NIT:820001460-4****EGRESO CONTABLE No: 2025000038**

Fecha: 19/08/2025
Nombre: REDEMAS SAS
CC o Nit: 900269955 - 9 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2025000039
Concepto: SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE RED GPON CON 100 PUNTOS DE DATOS EN TRES SALAS DE INFORMÁTICA
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS **No de contrato:**
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000012	2025000033	2.1.2.02.02.009.02	Acciones De Mejoramiento Escolar Y Académico - 49 R/bce Superavit Fiscal -recursos Calidad	129,907,540.00
Total:				129,907,540.00


MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Redemas Sas	121,337,880.00	0.00
111005001	Banco Popular 110250021292	Redemas Sas	0.00	121,337,880.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
121,337,880.00	121,337,880.00	121,337,880.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Ica Demas Actividades Del Servicio 10 x mil	1	1,091,660.00	109,166,000.00
Servicios Generales Declarantes 4	4	4,367,000.00	109,166,000.00
Rete Iva Servicios 15%	15	3,111,000.00	20,741,540.00

Valor a girar

CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00 M.C.

 ORDENADOR DEL GASTO 9396841	 FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT
---	--



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: INSTITUTO TECNICO GONZALO SU

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 820001460

Generado por: MARICELA RAMOS ALVARADO

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	COLRED
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/08/19
Hora Carga	11:47:52
Fecha Envío	2025/08/19
Hora Envío	11:48:26
Valor Archivo	\$121,337,880.00
Estado	Enviando
