



FECHA:		05/08/2025		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.																		INFORME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DÍAS RESTANTES		51		Días		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO																								APOYO A LA SUPERVISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO						SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CORTE DEL INFORME:				CONTRATISTA DE OBRA:										CONSORCIO ZF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03 de agosto de 2025				CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:										NOGAALL S.A.S.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		FECHAS										PLAZOS EN DIAS										VALOR CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATOS:		INTERVENTORIA										OBRA										ETAPA:		INTERVENTORIA										ETAPA:		OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO		CO1.PCCNTR.7077772										CO1.PCCNTR.7004833										INICIAL		180										INICIAL		150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INICIO		17 de enero de 2025										17 de enero de 2025										SUSPENSIONES		0										ADICIONES		\$ 574.305.424,00 \$ 4.135.404.054,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERMINACION INICIAL		16/07/2025										16 de junio de 2025										PRÓRROGAS		76										TOTAL		92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERMINACION FINAL		30 de septiembre de 2025										16 de septiembre de 2025										TOTAL		256										TOTAL		242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MOD No		FECHA DE LA MODIFICACION										VALOR ADICION										PRORROGA										OTRO ASPECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		9/07/2025										N.A.										2,5 MESES										PLAZO DEL PERSONAL MINIMO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2																																N.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA										GARANTE:										SEGUROS DEL ESTADO										POLIZAS CONTRATO DE OBRA										ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA										SEGUROS DEL ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
POLIZA		CUMPLIMIENTO										CALIDAD DEL SERVICIO										SALARIOS Y PRESTACIONES										POLIZA										CUMPLIMIENTO										SALARIOS Y PRESTACIONES										ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA										POLIZA										RESPONSABILIDAD CIVIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA										DESDE HASTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
166899		19 12 2024 30 3 2026										19 12 2024 30 9 2030										19 12 2024 30 9 2028										465-47-99400001756										5 12 2024 16 3 2026										5 12 2024 16 3 2026										6 6 2025 16 9 2027										465-74-994000003465										5 12 2024 16 9 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CPF		COLEGIO										LOCALIDAD										SEDE										NOMBRE SEDE										AVANCE ANTERIOR										AVANCE ACTUAL										PROGR %										EJECUTADO VS PROG										Vir FRENTE APROBADO										Vir FRENTE A ESTE PERIODO										FECHA INICIO CRONOGRAMA										FECHA FIN CRONOGRAMA										ene-2025										feb-2025										mar-2025										abr-2025										may-2025										jun-2025										jul-2025										ago-2025										sep-2025										oct-2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</									

AVANCE GENERAL

- Tiempo
- Financiero
- Técnico




EMERGENCIAS




AVANCE FÍSICO

- Avance de Tiempo
- Terminadas
- En ejecución
- Por iniciar



FECHA:	29/07/2025		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INFORME	
DÍAS RESTANTES	51	Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			APOYO A LA SUPERVISIÓN	
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA			GRUPO	
			DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME:			CONTRATISTA DE OBRA:		CONSORCIO ZF		
27 de julio de 2025			CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:		NOGAALL S.A.S.		

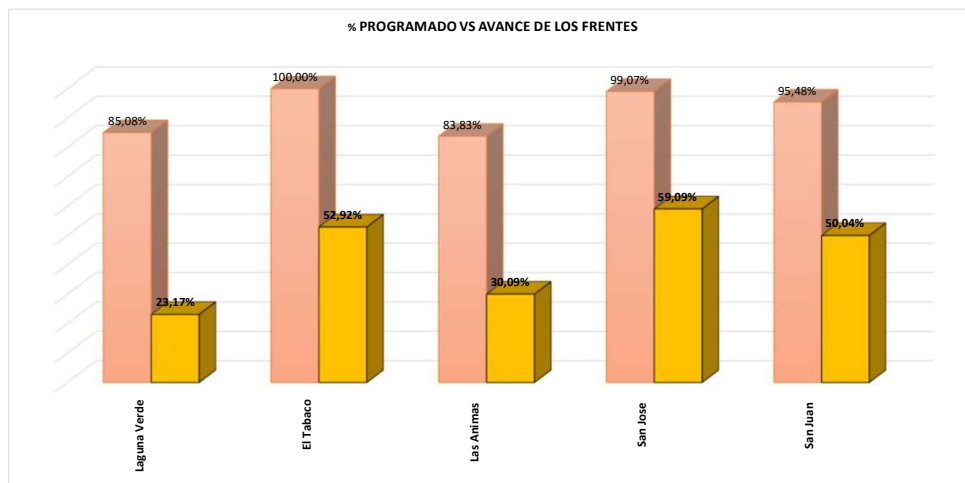

FECHA: 29/07/2025		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACION	INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 51 días		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO						
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANENCIA						
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS						
CORTE DEL INFORME		CONTRATO DE OBRA:		CO1.PCCNTR.7004833	CONTRATISTA:		CONSORCIO ZF	
27 de julio de 2025		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CO1.PCCNTR.7077772	INTERVENTOR:		NOGAALL S.A.S.	

TIPO DE INTERVENCION (% DE AVANCE)	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A (23,17%)	Colegio Campestre Jaime Garzón IED Sede C Laguna Verde	Cambio general de cubierta. Demolición de aula e instalación de aula modular. Espacio para vigilancia, depósito y aseo. Mejoramiento de batería de baños. Mejoramiento de vivienda docente. Mejoramiento de cocina y comedor. Mejoramiento de zonas de circulación, pisos y rampas.	        	  	
2A (52,92%)	Colegio Campestre Jaime Garzón IED Sede D El Tabaco		     	  	
3A (30,09%)	Colegio Campestre Jaime Garzón IED Sede J Las Animas	Cambio de cubierta, mejoramiento de instalaciones eléctricas, redes hidrosanitarias, carpintería metálica, cielo raso, y acabados en general.	        	  	

FECHA: 29/07/2025		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS						INFORME APOYO A LA SUPERVISION		
DIAS RESTANTES 51 Dias								GRUPO		SMPZ-2024
REGISTRO FOTOGRAFICO										
CORTE DEL INFORME 27 de julio de 2025		CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.7004833		CONTRATISTA: CONSORCIO ZF		INTERVENIOR: NOGAALL S.A.S.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.707772										
TIPO DE INTERVENCION (% DE AVANCE)	FRENTE	ALCANCE	INICIAL			DURANTE			ESTADO ACTUAL O FINAL	
4B (59,09%)	Colegio Gimnasio del campo de la Cruz Varela IED Sede G San Jose	En bloque de aula, vivienda docente y cocina, cambio de cubierta, mejoramiento de instalaciones eléctricas. Instalaciones hidrosanitarias, cielo raso, carpintería metálica y pintura. Mejoramiento de batería sanitaria del otro bloque (aula múltiple).	  			 				
5B (50,04%)	Colegio Gimnasio del campo de la Cruz Varela IED Sede J San Juan	Vivienda Docente: Cambio de cubierta, mejoramiento de redes eléctricas y acabados. Aula de sistemas: Demolición completa e instalación de nuevo módulo para aula de sistemas y vivienda docente. Comedor Escolar. Cambio de cubierta, mejoramiento de instalaciones eléctricas y muros.	  			 				
