



SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD  
SAS  
NIT 901.676.254-3  
DIAGONAL 50C 46 08 OF 301  
Tel: 3174398655  
Rionegro - Colombia  
Srbsoluciones.seguridad@gmail.com  
www.srbsolucionesdeseguridad.com



Factura electrónica de venta  
No. SRB 66

|                                           |               |          |                        |                      |                   |
|-------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Señores                                   |               |          |                        | Fecha y hora Factura |                   |
| EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE |               |          |                        | Generación           | 18/09/2025, 08:56 |
| NIT                                       | 800.105.497-0 | Teléfono | (604) 86105 - Ext. 000 | Expedición           | 18/09/2025, 08:57 |
| Dirección                                 | CL 31 30 53   | Ciudad   | Guatape - Colombia     | Vencimiento          | 18/09/2025        |

| Ítem | Descripción             | Cantidad | Vr. Unitario  | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total     |
|------|-------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1    | COMPRA DE SUMINISTROS   | 1.00     | 29,526,259.00 | 19 %         | 5,609,989.21      | 35,136,248.21 |
| 2    | SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 1.00     | 21,512,816.00 | 19 %         | 4,087,435.04      | 25,600,251.04 |
| 3    | CAPACITACIONES          | 1.00     | 9,000,000.00  | 19 %         | 1,710,000.00      | 10,710,000.00 |
| 4    | MANO DE OBRA-AU         | 1.00     | 6,163,754.00  | 0 %          | 0.00              | 6,163,754.00  |

|                                                                                                                                 |  |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Total items: 4                                                                                                                  |  | Total Bruto   | 66,202,829.00 |
| Valor en Letras:<br>Setenta y siete millones seiscientos diez mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte con veinticinco cent. |  | IVA 19%       | 11,407,424.25 |
| Forma de pago:<br>Crédito                                                                                                       |  | Total a Pagar | 77,610,253.25 |
| Medio de pago:<br>Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por                                                        |  | \$            | 77,610,253.25 |

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094288757 aprobado en 20250611 prefijo SRB desde el número 59 al 100 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 8  
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA  
CUFE: 85856f1f076489bc5bb97aa59c66530a732819e71dc1c435ded8ae113416608a1ef0ecd49307a9618bde3b3f7bcfb5f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo N.Lb. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141205487773



(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 2 5 4 3

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Rionegro

6 1 5

41. Dirección principal

DG 5 O C 4608 OF 301

42. Correo electrónico financiera@srbsolucionesdeseguridad.com

43. Código postal 0 5 4 0 4 0

44. Teléfono 1

3 2 1 6 8 7 8 2 2 2

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número  
establecimientos

8 0 2 0

2 0 2 3 0 1 2 4

8 2 3 0

2 0 2 3 0 4 2 8

6 2 0 9 9 5 1 2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RENDON BOTERO STIVEN

985. Cargo Representante legal Certificado

|                                                                                   |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DIAN                                                                              |                                                | Formulario del Registro Único Tributario |                                                                                    | 001                                                                             |                       |
| Espacio reservado para la DIAN                                                    |                                                |                                          | Página 2 de 4 Hoja 2                                                               |                                                                                 |                       |
| 4. Número de formulario                                                           |                                                |                                          | 141205487773                                                                       |                                                                                 |                       |
|  |                                                |                                          |  |                                                                                 |                       |
| (415)7707212489984(8020) 000014120548777 3                                        |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                      |                                                | 6. DV                                    | 12. Dirección seccional                                                            |                                                                                 | 14. Buzón electrónico |
| 9 0 1 6 7 6 2 5 4                                                                 |                                                | 3                                        | Impuestos de Medellín                                                              |                                                                                 | 1 1                   |
| Características y formas de las organizaciones                                    |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 62. Naturaleza                                                                    |                                                | 2                                        | 63. Formas asociativas                                                             |                                                                                 | 1 2                   |
| 65. Fondos                                                                        |                                                |                                          | 66. Cooperativas                                                                   |                                                                                 |                       |
| 68. Sin personería jurídica                                                       |                                                |                                          | 69. Otras organizaciones no clasificadas                                           |                                                                                 |                       |
|                                                                                   |                                                |                                          | 70. Beneficio                                                                      |                                                                                 | 1                     |
| Constitución, Registro y Última Reforma                                           |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Documento                                                                         |                                                | 1. Constitución                          |                                                                                    | 2. Reforma                                                                      |                       |
| 71. Clase                                                                         |                                                | 0 4                                      |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 72. Número                                                                        |                                                | 1                                        |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 73. Fecha                                                                         |                                                | 2 0 2 3 0 1 2 3                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 74. Número de notaría                                                             |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 75. Entidad de registro                                                           |                                                | 0 3                                      |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 76. Fecha de registro                                                             |                                                | 2 0 2 3 0 1 2 7                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 77. No. Matricula mercantil                                                       |                                                | 0 0 0 0 1 5 1 0 2 7                      |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 78. Departamento                                                                  |                                                | 0 5                                      |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 79. Ciudad/Municipio                                                              |                                                | 6 1 5                                    |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Vigencia                                                                          |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 80. Desde                                                                         |                                                | 2 0 2 3 0 1 2 7                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 81. Hasta                                                                         |                                                | 9 9 9 9 1 2 3 1                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Composición del Capital                                                           |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 82. Nacional                                                                      |                                                | 1 0 0 %                                  |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 83. Nacional público                                                              |                                                | 0 . 0 %                                  |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 84. Nacional privado                                                              |                                                | 1 0 0 . 0 %                              |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 85. Extranjero                                                                    |                                                | 0 %                                      |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 86. Extranjero público                                                            |                                                | 0 . 0 %                                  |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 87. Extranjero privado                                                            |                                                | 0 . 0 %                                  |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Entidad de vigilancia y control                                                   |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 88. Entidad de vigilancia y control                                               |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Estado y Beneficio                                                                |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Item                                                                              | 89. Estado actual                              | 90. Fecha cambio de estado               | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                      | 92. DV                                                                          |                       |
| 1                                                                                 | 8 0                                            | 2 0 2 3 0 1 2 7                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 2                                                                                 |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 3                                                                                 |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 4                                                                                 |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 5                                                                                 |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| Vinculación económica                                                             |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 93. Vinculación económica                                                         | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial |                                          |                                                                                    | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        |                       |
|                                                                                   |                                                |                                          |                                                                                    | 96. DV.                                                                         |                       |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                              |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior                  |                                                | 171. País                                |                                                                                    | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |                       |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP           |                                                |                                          |                                                                                    |                                                                                 |                       |

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141205487773



(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 2 5 4 3

Impuestos de Medellín

1 1

## Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 3, 0 1, 2 7

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadaní 1 3

1 0 3 6 9 5 3 6 3 5

1

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

RENDON

BOTERO

STIVEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

|                                                                                   |                                                    |                                                                       |                                                                                                                                  |                              |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIAN                                                                              |                                                    | Formulario del Registro Único Tributario<br>Revisor Fiscal y Contador |                                                                                                                                  | 001                          |                                                   |
| Espacio reservado para la DIAN                                                    |                                                    |                                                                       | Página 4 de 4 Hoja 5                                                                                                             |                              |                                                   |
|                                                                                   |                                                    |                                                                       | 4. Número de formulario<br>141205487773                                                                                          |                              |                                                   |
|  |                                                    |                                                                       | <br>(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3 |                              |                                                   |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 6 7 6 2 5 4                 |                                                    | 6. DV<br>4                                                            | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Medellín                                                                                 |                              | 14. Buzón electrónico<br>1 1                      |
| Revisor Fiscal y Contador                                                         |                                                    |                                                                       |                                                                                                                                  |                              |                                                   |
| Revisor fiscal principal                                                          | 124. Tipo de documento                             | 125. Número de identificación                                         |                                                                                                                                  | 126. DV                      | 127. Número de tarjeta profesional                |
|                                                                                   | 128. Primer apellido                               | 129. Segundo apellido                                                 |                                                                                                                                  | 130. Primer nombre           | 131. Otros nombres                                |
|                                                                                   | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 133. DV                                                               | 134. Sociedad o firma designada                                                                                                  |                              |                                                   |
|                                                                                   | 135. Fecha de nombramiento                         |                                                                       |                                                                                                                                  |                              |                                                   |
| Revisor fiscal suplente                                                           | 136. Tipo de documento                             | 137. Número de identificación                                         |                                                                                                                                  | 138. DV                      | 139. Número de tarjeta profesional                |
|                                                                                   | 140. Primer apellido                               | 141. Segundo apellido                                                 |                                                                                                                                  | 142. Primer nombre           | 143. Otros nombres                                |
|                                                                                   | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 145. DV                                                               | 146. Sociedad o firma designada                                                                                                  |                              |                                                   |
|                                                                                   | 147. Fecha de nombramiento                         |                                                                       |                                                                                                                                  |                              |                                                   |
| Contador                                                                          | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación<br>1 0 3 6 9 2 6 7 6 4                  |                                                                                                                                  | 150. DV<br>5                 | 151. Número de tarjeta profesional<br>2 1 4 0 8 0 |
|                                                                                   | 152. Primer apellido<br>RIOS                       | 153. Segundo apellido<br>RAMIREZ                                      |                                                                                                                                  | 154. Primer nombre<br>NATALI | 155. Otros nombres                                |
|                                                                                   | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 157. DV                                                               | 158. Sociedad o firma designada                                                                                                  |                              |                                                   |
|                                                                                   | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 4 0 4 1 5      |                                                                       |                                                                                                                                  |                              |                                                   |

## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                   |                             |                      |                     |                     |             |                       |             |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                      | Clase Aportante             | Sucursal Principal   | Direccion           | Ciudad-Departamento | Telefono    | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NT 901676254                      | 3       | SRR SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | STIVEN RENDON BOTERO | DIAGONAL SOC #46-08 | RIONEGRO-ANTIOQUIA  | 3174398635  | SI                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                   |                             |                      |                     |                     |             |                       |             |
| Periodo                           |         | Clave                             |                             | Tipo                 |                     | Fecha               |             | Pago                  |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago                              | Planilla                    | Planilla             | Limite              | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor       |
| 2025-08                           | 2025-09 | 1780899713                        |                             | 9491816699           | 2025/09/11          | 2025/09/16          | BANCOLOMBIA | 5                     | \$2,511,100 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                 |                |                                 |        |      |              |             |         |      |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|------|--------------|-------------|---------|------|--------------|
| EMPLEADO                                         |                |                                 |        |      | PENSION      |             |         |      |              |
| No.                                              | Identificación | Nombres                         | Codigo | Dias | IBC          | Aporte      | Codigo  | Dias | Salud        |
| Sucursal: STIVEN RENDON BOTERO (5 Afiliados)     |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$1,632,800 |         |      | \$10,204,650 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO ( 5 Afiliados) |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$1,632,800 |         |      | \$10,204,650 |
| Ciudad: RIONEGR0 Depto: ANTIOQUIA ( 5 Afiliados) |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$1,632,800 |         |      | \$10,204,650 |
| 1                                                | CC 1020032095  | CORTES CAMARONA MARIA ALEXANDRA | 25-14  | 27   | \$1,281,150  | \$205,000   | EPS0002 | 27   | \$1,281,150  |
| 2                                                | CC 394644462   | ORJUELA PEREZ LINA MARCELA      | 230201 | 30   | \$2,500,000  | \$400,000   | EPS010  | 30   | \$2,500,000  |
| 3                                                | CC 1036251077  | RENDON BOTERO KELLY JOHANNA     | 25-14  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS010  | 30   | \$1,423,500  |
| 4                                                | CC 1046953635  | RENDON BOTERO STIVEN            | 230201 | 30   | \$3,000,000  | \$480,000   | EPS010  | 30   | \$3,000,000  |
| 5                                                | CC 1036965676  | VALENCIA LOPEZ CAROLINA         | 230301 | 30   | \$2,000,000  | \$320,000   | EPS010  | 30   | \$2,000,000  |
| Total Afiliados( 5)                              |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$1,632,800 |         |      | \$10,204,650 |
| RIESGOS                                          |                |                                 |        |      | IBC          | Aporte      | Codigo  | Dias | PARAFISCALES |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$53,500    |         |      | \$10,204,650 |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$53,500    |         |      | \$10,204,650 |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$53,500    |         |      | \$10,204,650 |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$1,281,150  | \$6,700     | 14-11   | 27   | \$1,281,150  |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$2,500,000  | \$13,100    | 14-11   | 30   | \$2,500,000  |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$1,423,500  | \$7,500     | 14-11   | 30   | \$1,423,500  |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$3,000,000  | \$15,700    | 14-11   | 30   | \$3,000,000  |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$2,000,000  | \$10,500    | 14-11   | 30   | \$2,000,000  |
|                                                  |                |                                 |        |      | \$10,204,650 | \$53,500    |         |      | \$10,204,650 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                   |                             |                      |                     |                     |                        |                       |           |             |  |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                      | Clase Aportante             | Sucursal Principal   | Direccion           | Ciudad-Departamento | Teléfono               | Exonerado SENA e ICBF |           |             |  |
| NIT 901676254                     | 3       | SMB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | STIVEN RENDON BOTERO | DIAGONAL SOC #46-08 | RIONEGRO-ANTIOQUIA  | 3174398655             | SI                    |           |             |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                   |                             |                      |                     |                     |                        |                       |           |             |  |
| Periodo                           |         | Clave                             |                             | Tipo                 |                     | Fecha               |                        | Pago                  |           | Valor       |  |
| Pensión                           | Salud   | Pago                              | Planilla                    | Planilla             | Planilla            | Limite              | Pago                   | Banco                 | Dias Mora |             |  |
| 2025-08                           | 2025-09 | 1780899713                        | 9491816699                  | E                    |                     | 2025/09/11          | 2025/09/16             | BANCOLOMBIA           | 5         | \$2,511,100 |  |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                                   |                             |                      |                     |                     |                        |                       |           |             |  |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT                               | DV                          | AFILIADOS            | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA      | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR         |           |             |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3)          |         |                                   |                             | 5                    | \$1,632,800         | \$5,300             | \$0                    | \$1,638,100           |           |             |  |
| COLPENSIONES                      | 25-14   | 900,336,004                       | 7                           | 2                    | \$432,800           | \$1,400             | \$0                    | \$434,200             |           |             |  |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808                       | 8                           | 1                    | \$320,000           | \$1,100             | \$0                    | \$321,100             |           |             |  |
| PROTECCION                        | 230201  | 800,229,739                       | 0                           | 2                    | \$880,000           | \$2,800             | \$0                    | \$882,800             |           |             |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                   |                             | 5                    | \$53,500            | \$200               | \$0                    | \$53,700              |           |             |  |
| ARL SURA                          | 14-11   | 890,903,790                       | 5                           | 5                    | \$53,500            | \$200               | \$0                    | \$53,700              |           |             |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                   |                             | 5                    | \$408,300           | \$1,300             | \$0                    | \$409,600             |           |             |  |
| CONFAMA                           | CCF04   | 890,900,841                       | 9                           | 5                    | \$408,300           | \$1,300             | \$0                    | \$409,600             |           |             |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |                                   |                             | 5                    | \$408,300           | \$1,400             | \$0                    | \$409,700             |           |             |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)          | EPS010  | 800,088,702                       | 2                           | 4                    | \$357,000           | \$1,200             | \$0                    | \$358,200             |           |             |  |
| SALUD TOTAL                       | EPS002  | 800,130,907                       | 4                           | 1                    | \$51,300            | \$200               | \$0                    | \$51,500              |           |             |  |
| TOTAL                             |         |                                   |                             | 5                    | \$2,502,900         | \$8,200             | \$0                    | \$2,511,100           |           |             |  |

# Certificado Bancario

Miércoles, 10 de septiembre de 2025


A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS identificado(a) con NIT 901676254, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto          | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 02400009989  | 2023/03/08     | ACTIVA |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit: 901676254-3




(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad



Escaneado con CamScanner



MONTE DEPREMIOS

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1984

RIONEGRO  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

A+

GR. RH


F

SEXO

22-DIC-2004 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRO NACIONAL  
JUAN CARLOS SANTOS VILLAS



P-0121400-006425174-1036926764-20171002

0057760033

W1DTCW0T

Escaneado con CamScanner

## Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit. 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO  
**214080-T**

**NATALI**  
**RIOS RAMIREZ**  
C.C. 1036926764  
RESOLUCION INSCRIPCION 64  
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVIDO  
FECHA 19/02/2016

DIRECTOR GENERAL  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** 219504



216947

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 52 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al P.O. Box 644 42 50 o Devolverla a la UAF - Junta Central de  
Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



## Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsolucionesseguridad@gmail.com](mailto:srbsolucionesseguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 E 4 H H 7 F F E 3 8 E H 2 3 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NATALI RIOS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036926764 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 214080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO  
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web  
[www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## **A QUIEN PUEDA INTERESAR**

**Asunto: Certificado pago salarios, aportes salud y parafiscales y número de empleados**


En calidad de contadora de la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. NIT 901.676.254-3, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

### **CERTIFICO**

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
2. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. ha efectuado oportunamente el pago salarios, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, y se pudo constatar que, la administración ha dado cumplimiento a la normatividad vigente durante el presente año.
3. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., a la fecha cuenta con 5 empleados vinculados.

En fe de lo anterior, firmo el presente certificado en dos ejemplares del mismo tenor y contenido a los nueve (16) días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,



**Natali Ríos Ramírez**  
Contadora pública  
T.P 214080-T



## ACTA DE AVANCE No. 05



| CONTRATO No.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |        |          | OC-020-2025                                                                                             |               |                                                |                | MUNICIPIO DE GUATAPÉ (ANTIOQUIA) |                  |             |                                 |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ" |                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                                                         |               |                                                |                | VALOR PRESENTE ACTA No. 05       |                  |             | \$ 77.610.252,95                |               |               |
| VALOR INICIAL :                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |        |          | \$ 492.662.934,00                                                                                       |               |                                                |                | FECHA INICIO:                    |                  |             | 02/04/2025                      |               |               |
| PLAZO INICIAL                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |        |          | CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |               |                                                |                | FECHA TERMINACIÓN INICIAL:       |                  |             | 02/09/2025                      |               |               |
| FECHA INICIO:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |        |          | 02/04/2025                                                                                              |               |                                                |                | PRÓRROGA OTRO SI No. 01:         |                  |             | 13 DIAS                         |               |               |
| ADICION OTROSI No. 02:                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |        |          | \$ 189.821.622,00                                                                                       |               |                                                |                | PRÓRROGA OTRO SI No. 02:         |                  |             | 45 DIAS                         |               |               |
| VALOR TOTAL:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |        |          | \$ 682.484.556,00                                                                                       |               |                                                |                | FECHA TERMINACIÓN FINAL:         |                  |             | 31/10/2025                      |               |               |
| ADMINISTRACIÓN DELEGADA                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |        |          | EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE                                                                             |               |                                                |                | FECHA ACTA                       |                  |             | 18/09/2025                      |               |               |
| CONTRATISTA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |        |          | SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS                                                                         |               |                                                |                | ACTA No.                         |                  |             | 5                               |               |               |
| PRESUPUESTO GENERAL                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                                                         |               |                                                |                |                                  |                  |             |                                 |               |               |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                            |                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                                                         |               | CONDICIONES ACTUALIZADA MEDIANTE OTROSI No. 02 |                |                                  | ACTA PARCIAL N°5 |             | ACUMULADO TOTAL ACTAS PARCIALES |               |               |
| ITEM                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO                                                                                             | VALOR TOTAL   | MAYORES CANTIDADES                             | CANTIDAD TOTAL | VALOR TOTAL                      | CANTIDAD         | VALOR TOTAL | CANTIDAD                        | VR.UNITARIO   | VALOR TOTAL   |
| 1. SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                            |                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                                                         |               |                                                |                |                                  |                  |             |                                 |               |               |
| 1.1                                                                                                            | Pantalla Smart tv de 42 pulgadas con soporte FHD para línea de red de acceso municipal                                                                                                      | UNIDAD | 2,00     | \$ 2.678.000                                                                                            | \$ 5.356.000  |                                                | 2,00           | \$ 5.356.000                     | 0,00             | \$ 0        | 2,00                            | \$ 2.678.000  | \$ 5.356.000  |
| 1.2                                                                                                            | Camaras PTZ 1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution                                                                                                          | UNIDAD | 4,00     | \$ 12.672.456                                                                                           | \$ 50.689.824 |                                                | 4,00           | \$ 50.689.824                    | 0,00             | \$ 0        | 4,00                            | \$ 12.672.456 | \$ 50.689.824 |
| 1.3                                                                                                            | Camara espectral sensorica DS-2TD4237-50H4L/W                                                                                                                                               | UNIDAD | 1,00     | \$ 59.606.025                                                                                           | \$ 59.606.025 |                                                | 1,00           | \$ 59.606.025                    | 0,00             | \$ 0        | 1,00                            | \$ 59.606.025 | \$ 59.606.025 |
| 1.4                                                                                                            | Camaras ip 8mp motorizada 11.6 ext 60m f wdr 120 db h265Hp67 entrada de audio y alarma hikvision ocuense DS2CD2683G2-1ZS(2.8-12mm)                                                          | UNIDAD | 3,00     | \$ 1.488.405                                                                                            | \$ 4.465.215  |                                                | 3,00           | \$ 4.465.215                     | 0,00             | \$ 0        | 3,00                            | \$ 1.488.405  | \$ 4.465.215  |
| 1.5                                                                                                            | Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para cámara tipo bola ocuense de 4mp                                                                                                       | UNIDAD | 2,00     | \$ 567.100                                                                                              | \$ 1.134.200  | 1,00                                           | 3,00           | \$ 1.701.300                     | 0,00             | \$ 0        | 2,00                            | \$ 567.100    | \$ 1.134.200  |
| 1.6                                                                                                            | Altavoz de tecnologia IP marca HIKVISION.                                                                                                                                                   | UNIDAD | 7,00     | \$ 2.045.663                                                                                            | \$ 14.319.641 |                                                | 7,00           | \$ 14.319.641                    | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 2.045.663  | \$ 14.319.641 |
| 1.7                                                                                                            | Licencia de funcionamiento bocinas - speaker Hikvision IP                                                                                                                                   | UNIDAD | 7,00     | \$ 689.900                                                                                              | \$ 4.829.300  | 4,00                                           | 11,00          | \$ 7.588.900                     | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 689.900    | \$ 4.829.300  |
| 1.8                                                                                                            | Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.                                                                                                           | UNIDAD | 5,00     | \$ 2.565.978                                                                                            | \$ 12.829.890 | 2,00                                           | 7,00           | \$ 17.961.846                    | 0,00             | \$ 0        | 5,00                            | \$ 2.565.978  | \$ 12.829.890 |
| 1.9                                                                                                            | Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca                                                                                     | UNIDAD | 2,00     | \$ 945.000                                                                                              | \$ 1.890.000  | 2,00                                           | 4,00           | \$ 3.780.000                     | 0,00             | \$ 0        | 2,00                            | \$ 945.000    | \$ 1.890.000  |
| 1.10                                                                                                           | Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada                                                                                           | UNIDAD | 5,00     | \$ 2.340.000                                                                                            | \$ 11.700.000 |                                                | 5,00           | \$ 11.700.000                    | 0,00             | \$ 0        | 5,00                            | \$ 2.340.000  | \$ 11.700.000 |
| 1.11                                                                                                           | Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado.                                                                                                                       | UNIDAD | 7,00     | \$ 547.421                                                                                              | \$ 3.831.947  |                                                | 7,00           | \$ 3.831.947                     | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 547.421    | \$ 3.831.947  |
| 1.12                                                                                                           | Corona en varilla de acero punta de 1/2 x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada                                                                               | UNIDAD | 7,00     | \$ 328.940                                                                                              | \$ 2.302.580  | 2,00                                           | 9,00           | \$ 2.960.460                     | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 328.940    | \$ 2.302.580  |
| 1.13                                                                                                           | Electrado de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6                                                                                                      | UNIDAD | 7,00     | \$ 562.173                                                                                              | \$ 3.935.211  | 2,00                                           | 9,00           | \$ 5.059.557                     | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 562.173    | \$ 3.935.211  |
| 1.14                                                                                                           | Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts                                                                                                                             | UNIDAD | 1,00     | \$ 645.000                                                                                              | \$ 645.000    |                                                | 1,00           | \$ 645.000                       | 0,00             | \$ 0        | 1,00                            | \$ 645.000    | \$ 645.000    |
| 1.15                                                                                                           | Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°C a 50°C                                                                                                    | UNIDAD | 500,00   | \$ 3.200                                                                                                | \$ 1.600.000  |                                                | 500,00         | \$ 1.600.000                     | 0,00             | \$ 0        | 500,00                          | \$ 3.200      | \$ 1.600.000  |
| 1.16                                                                                                           | Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob. toma corrientes de uso regular | UNIDAD | 7,00     | \$ 3.437.964                                                                                            | \$ 24.065.748 |                                                | 7,00           | \$ 24.065.748                    | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 3.437.964  | \$ 24.065.748 |
| 1.17                                                                                                           | UPS 1 kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red External)                                      | UNIDAD | 7,00     | \$ 2.833.137                                                                                            | \$ 19.831.959 | 3,00                                           | 10,00          | \$ 28.331.370                    | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 2.833.137  | \$ 19.831.959 |
| 1.18                                                                                                           | Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.                                                                | UNIDAD | 7,00     | \$ 261.109                                                                                              | \$ 1.827.763  | 3,00                                           | 10,00          | \$ 2.611.090                     | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 261.109    | \$ 1.827.763  |
| 1.19                                                                                                           | Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP                                                      | UNIDAD | 7,00     | \$ 2.228.310                                                                                            | \$ 15.598.170 | 1,00                                           | 8,00           | \$ 17.826.480                    | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 2.228.310  | \$ 15.598.170 |
| 1.20                                                                                                           | SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional                                                                                          | UNIDAD | 7,00     | \$ 772.470                                                                                              | \$ 5.407.290  | 3,00                                           | 10,00          | \$ 7.724.700                     | 0,00             | \$ 0        | 7,00                            | \$ 772.470    | \$ 5.407.290  |
| 1.21                                                                                                           | Letras reflectivas en diseño 60 x 40 en lámina de acero para marcación de poste.                                                                                                            | UNIDAD | 33,00    | \$ 126.700                                                                                              | \$ 4.181.100  | 3,00                                           | 36,00          | \$ 4.561.200                     | 0,00             | \$ 0        | 33,00                           | \$ 126.700    | \$ 4.181.100  |
| 1.22                                                                                                           | pantalla interactiva Hikvision 65 pulg 4k DS-D5865RB/A incluye soporte de piso movable.                                                                                                     | UNIDAD | 1,00     | \$ 14.317.550                                                                                           | \$ 14.317.550 |                                                | 1,00           | \$ 14.317.550                    | 0,00             | \$ 0        | 1,00                            | \$ 14.317.550 | \$ 14.317.550 |
| 1.23                                                                                                           | aire acondicionado 12000 btu 220v blanco incluye instalación                                                                                                                                | UNIDAD | 1,00     | \$ 2.624.890                                                                                            | \$ 2.624.890  |                                                | 1,00           | \$ 2.624.890                     | 0,00             | \$ 0        | 1,00                            | \$ 2.624.890  | \$ 2.624.890  |
| 1.24                                                                                                           | Silla ergonomica tipo niza presidente de color negro, con inclinación 1/2, de 4 apoyos en malta de resistencia hasta de 175kg incluye ensamble y estructura de altura                       | UNIDAD | 1,00     | \$ 969.041                                                                                              | \$ 969.041    |                                                | 1,00           | \$ 969.041                       | 0,00             | \$ 0        | 1,00                            | \$ 969.041    | \$ 969.041    |

| INP                                                       | ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                            |        |        |              |                |                |               |              |              |              |               |               |              |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| INP 1.1                                                   | aire acondicionado 12000 btu 220v blanco -Smart superlv                                                                                                                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 3.878.000 | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 3.878.000 | 1,00         | \$ 3.878.000 | 1,00          | \$ 3.878.000  | \$ 3.878.000 |                |
| INP 1.2                                                   | licencia AN-LPR Hikvision                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 0,00   | \$ 1.488.405 | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 1.488.405 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 1.488.405  | \$ 0         |                |
| INP 1.3                                                   | POE LAS60-57CN RJ45 60W 60W PoE injector, RJ45interface.1000M                                                                                                                                  | UNIDAD | 0,00   | \$ 652.371   | \$ 0           | 6,00           | 6,00          | \$ 3.914.226 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 652.371    | \$ 0         |                |
| INP 1.4                                                   | memoria ram de 16gb-kignstone para cpu-escritorio WKT                                                                                                                                          | UNIDAD | 0,00   | \$ 253.412   | \$ 0           | 2,00           | 2,00          | \$ 506.824   | 2,00         | \$ 506.824   | 2,00          | \$ 253.412    | \$ 506.824   |                |
| INP 1.5                                                   | Camara reconocimiento facial motorizada IP8MP FI.6 EXIR                                                                                                                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 1.488.405 | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 1.488.405 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 1.488.405  | \$ 0         |                |
| INP 1.6                                                   | tubería 3/4 galvanizada MT                                                                                                                                                                     | ML     | 0,00   | \$ 36.847    | \$ 0           | 45,00          | 45,00         | \$ 1.658.115 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 36.847     | \$ 0         |                |
| INP 1.7                                                   | condulotas 3/4 rectas                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 0,00   | \$ 9.435     | \$ 0           | 25,00          | 25,00         | \$ 235.875   | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 9.435      | \$ 0         |                |
| INP 1.8                                                   | coraza americana 3/4                                                                                                                                                                           | ML     | 0,00   | \$ 12.302    | \$ 0           | 45,00          | 45,00         | \$ 553.590   | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 12.302     | \$ 0         |                |
| INP 1.9                                                   | Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°C a 50°C                                                                                                       | UNIDAD | 0,00   | \$ 8.200     | \$ 0           | 150,00         | 150,00        | \$ 1.230.000 | 150,00       | \$ 1.230.000 | 150,00        | \$ 8.200      | \$ 1.230.000 |                |
| INP 1.10                                                  | Estructura de acero galvanizado de tubo de 4.5 pulgadas en L de 3mts de alto perna a piso. Capacidad de carga de 150kg con perna en intemperie                                                 | UNIDAD | 0,00   | \$ 4.716.243 | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 4.716.243 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 4.716.243  | \$ 0         |                |
| INP 1.11                                                  | suministro de lámpara de alumbrado público 60 w. incluye foto celda , base de foto celda brazo, encauchetado y demás elementos para su correcto funcionamiento                                 | UNIDAD | 0,00   | \$ 350.000   | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 350.000   | 1,00         | \$ 350.000   | 1,00          | \$ 350.000    | \$ 350.000   |                |
| INP 1.12                                                  | suministro de accesorios para fijación de trenza ( perchas, tornillo expansión , ángulos y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 950.000   | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 950.000   | 1,00         | \$ 950.000   | 1,00          | \$ 950.000    | \$ 950.000   |                |
| INP 1.13                                                  | suministro de trenzo triplex #6 para alimentación de punto electrico                                                                                                                           | ML     | 0,00   | \$ 17.000    | \$ 0           | 420,00         | 420,00        | \$ 7.140.000 | 420,00       | \$ 7.140.000 | 420,00        | \$ 17.000     | \$ 7.140.000 |                |
| INP 1.14                                                  | Upgrade de licencia v1.6 a v3.0 hikcentral-professional Hikvision                                                                                                                              | UNIDAD | 0,00   | \$ 26.055    | \$ 0           | 377,00         | 377,00        | \$ 9.822.735 | 377,00       | \$ 9.822.735 | 377,00        | \$ 26.055     | \$ 9.822.735 |                |
| INP 1.15                                                  | memoria ram de 16gb para servidor central                                                                                                                                                      | UNIDAD | 0,00   | \$ 786.900   | \$ 0           | 2,00           | 2,00          | \$ 1.573.800 | 2,00         | \$ 1.573.800 | 2,00          | \$ 786.900    | \$ 1.573.800 |                |
| INP 1.16                                                  | fibra optica odds drop 2hilos                                                                                                                                                                  | ML     | 0,00   | \$ 3.400     | \$ 0           | 350,00         | 350,00        | \$ 1.190.000 | 350,00       | \$ 1.190.000 | 350,00        | \$ 3.400      | \$ 1.190.000 |                |
| INP 1.17                                                  | puerta de cristal 10mm ingreso CCTV- Diseñada sticker                                                                                                                                          | UNIDAD | 0,00   | \$ 2.884.900 | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 2.884.900 | 1,00         | \$ 2.884.900 | 1,00          | \$ 2.884.900  | \$ 2.884.900 |                |
| INP 1.18                                                  | Transformador para gabinete de aislamiento-monofasico, tipo industrial potencia 1kva voltaje 110-220vac                                                                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 815.300   | \$ 0           | 3,00           | 3,00          | \$ 2.445.900 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 815.300    | \$ 0         |                |
| SUBTOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO |                                                                                                                                                                                                |        |        |              | \$ 267.958.344 | \$ 340.324.802 |               |              |              |              | \$ 29.526.259 |               |              | \$ 297.484.603 |
| IVA 19%                                                   |                                                                                                                                                                                                |        |        |              | \$ 50.912.085  | \$ 64.661.712  |               |              |              |              | \$ 5.609.989  |               |              | \$ 56.522.075  |
| TOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO    |                                                                                                                                                                                                |        |        |              | \$ 318.870.429 | \$ 404.986.514 |               |              |              |              | \$ 35.136.248 |               |              | \$ 354.006.678 |
| 2. INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO       |                                                                                                                                                                                                |        |        |              |                |                |               |              |              |              |               |               |              |                |
| 2.1                                                       | Pantalla Smart tv de 42 pulgadas con soporte FHD para línea de red de ayova municipal.                                                                                                         | UNIDAD | 2,00   | \$ 565.987   | \$ 1.131.974   | 2,00           | \$ 1.131.974  | 0,00         | \$ 0         | 2,00         | \$ 565.987    | \$ 1.131.974  |              |                |
| 2.2                                                       | Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution                                                                                                              | UNIDAD | 4,00   | \$ 1.250.000 | \$ 5.000.000   | 4,00           | \$ 5.000.000  | 0,00         | \$ 0         | 4,00         | \$ 1.250.000  | \$ 5.000.000  |              |                |
| 2.3                                                       | Camara espectral-sensotermica DS-2TD4237-50H4L/W                                                                                                                                               | UNIDAD | 1,00   | \$ 1.546.799 | \$ 1.546.799   | 1,00           | \$ 1.546.799  | 1,00         | \$ 1.546.799 | 1,00         | \$ 1.546.799  | \$ 1.546.799  |              |                |
| 2.4                                                       | Camaras ip 8mp motorizada FI.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+hp67 entrada de audio y alarma hikvision ucense DS2CD2683G2-IZS(2,8-12mm)                                                           | UNIDAD | 3,00   | \$ 986.763   | \$ 2.960.289   | 3,00           | \$ 2.960.289  | 0,00         | \$ 0         | 3,00         | \$ 986.763    | \$ 2.960.289  |              |                |
| 2.5                                                       | Licencia de reconocimiento facial versión 0.4 Hk para cámara tipo bala ucense de 4mp                                                                                                           | UNIDAD | 2,00   | \$ 196.700   | \$ 393.400     | 2,00           | \$ 786.800    | 0,00         | \$ 0         | 2,00         | \$ 196.700    | \$ 393.400    |              |                |
| 2.6                                                       | Altavoz de tecnologia IP marca HIKVISION.                                                                                                                                                      | UNIDAD | 7,00   | \$ 986.763   | \$ 6.907.341   | 7,00           | \$ 6.907.341  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 986.763    | \$ 6.907.341  |              |                |
| 2.7                                                       | Licencia de funcionamiento bocinas - speaker Hikvision IP                                                                                                                                      | UNIDAD | 7,00   | \$ 196.700   | \$ 1.376.900   | 4,00           | \$ 2.163.700  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 196.700    | \$ 1.376.900  |              |                |
| 2.8                                                       | Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.                                                                                                              | UNIDAD | 5,00   | \$ 975.360   | \$ 4.876.800   | 1,00           | \$ 5.852.160  | 0,00         | \$ 0         | 5,00         | \$ 975.360    | \$ 4.876.800  |              |                |
| 2.9                                                       | Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca                                                                                        | UNIDAD | 2,00   | \$ 534.257   | \$ 1.068.514   | 2,00           | \$ 2.137.028  | 0,00         | \$ 0         | 2,00         | \$ 534.257    | \$ 1.068.514  |              |                |
| 2.10                                                      | Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con rosca de acople de 1 pulgada.                                                                                              | UNIDAD | 5,00   | \$ 534.257   | \$ 2.671.285   | 5,00           | \$ 2.671.285  | 0,00         | \$ 0         | 5,00         | \$ 534.257    | \$ 2.671.285  |              |                |
| 2.11                                                      | Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado.                                                                                                                          | UNIDAD | 7,00   | \$ 453.672   | \$ 3.175.704   | 7,00           | \$ 3.175.704  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 453.672    | \$ 3.175.704  |              |                |
| 2.12                                                      | Corona en varilla de acero punta de 1/4 x 40 cm, tornillos de ajuste y amarré a poste con abrazadera laminada                                                                                  | UNIDAD | 7,00   | \$ 146.667   | \$ 1.026.667   | 7,00           | \$ 1.026.667  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 146.667    | \$ 1.026.667  |              |                |
| 2.13                                                      | Electrado de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cala                                                                                                          | UNIDAD | 7,00   | \$ 200.000   | \$ 1.400.000   | 2,00           | \$ 1.800.000  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 200.000    | \$ 1.400.000  |              |                |
| 2.14                                                      | Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts                                                                                                                                | UNIDAD | 1,00   | \$ 345.688   | \$ 345.688     | 1,00           | \$ 345.688    | 1,00         | \$ 345.688   | 1,00         | \$ 345.688    | \$ 345.688    |              |                |
| 2.15                                                      | Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°C a 50°C                                                                                                       | UNIDAD | 500,00 | \$ 15.200    | \$ 7.600.000   | 1,00           | \$ 7.615.200  | 0,00         | \$ 0         | 500,00       | \$ 15.200     | \$ 7.600.000  |              |                |
| 2.16                                                      | Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regulador, caja ab. toma corrientes de uso regulado | UNIDAD | 7,00   | \$ 845.670   | \$ 5.919.690   | 7,00           | \$ 5.919.690  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 845.670    | \$ 5.919.690  |              |                |
| 2.17                                                      | UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red External)                                         | UNIDAD | 7,00   | \$ 435.672   | \$ 3.049.704   | 3,00           | \$ 4.356.720  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 435.672    | \$ 3.049.704  |              |                |
| 2.18                                                      | Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en electra para drenaje                                                                   | UNIDAD | 7,00   | \$ 234.098   | \$ 1.638.686   | 2,00           | \$ 2.106.882  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 234.098    | \$ 1.638.686  |              |                |
| 2.19                                                      | Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP                                                         | UNIDAD | 7,00   | \$ 987.263   | \$ 6.910.841   | 3,00           | \$ 9.872.630  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 987.263    | \$ 6.910.841  |              |                |
| 2.20                                                      | SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.                                                                                            | UNIDAD | 7,00   | \$ 123.487   | \$ 864.409     | 3,00           | \$ 1.234.870  | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 123.487    | \$ 864.409    |              |                |
| 2.21                                                      | Letras reflectivas en diseño 60 x 40 en lámina de acero para marcación de poste.                                                                                                               | UNIDAD | 33,00  | \$ 34.000    | \$ 1.122.000   | 3,00           | \$ 1.224.000  | 0,00         | \$ 0         | 33,00        | \$ 34.000     | \$ 1.122.000  |              |                |
| 2.22                                                      | Diseños y estudios de campo para modernización incluyendo excavación en zona blanda y dura para postes                                                                                         | UNIDAD | 7,00   | \$ 1.456.700 | \$ 10.196.900  | 7,00           | \$ 10.196.900 | 0,00         | \$ 0         | 7,00         | \$ 1.456.700  | \$ 10.196.900 |              |                |
| 2.23                                                      | Movimiento físico de punto de cámara incluye desvestida, vestida e instalación y configuración de todos los equipos a distancia no superior a 7 mts con excavación en zona blanda.             | UNIDAD | 1,00   | \$ 4.771.700 | \$ 4.771.700   | 1,00           | \$ 4.771.700  | 0,00         | \$ 0         | 1,00         | \$ 4.771.700  | \$ 4.771.700  |              |                |
| 2.24                                                      | Integración de sistema existente local de CCTV no superior a 25 channels (nodo principal)                                                                                                      | UNIDAD | 1,00   | \$ 8.500.000 | \$ 8.500.000   | 1,00           | \$ 8.500.000  | 0,00         | \$ 0         | 1,00         | \$ 8.500.000  | \$ 8.500.000  |              |                |
| INP                                                       | ITEMS NO PREVISTOS INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                            |        |        |              |                |                |               |              |              |              |               |               |              |                |
| INP 2.1                                                   | aire acondicionado 12000 btu 220v blanco -Smart superlv                                                                                                                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 345.000   | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 345.000   | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 345.000    | \$ 0         |                |
| INP 2.2                                                   | configuración licencia AN-LPR Hikvision                                                                                                                                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 234.561   | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 234.561   | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 234.561    | \$ 0         |                |
| INP 2.3                                                   | instalación POE LAS60-57CN RJ45 60W 60W PoE injector, RJ45interface.1000M                                                                                                                      | UNIDAD | 0,00   | \$ 34.200    | \$ 0           | 6,00           | 6,00          | \$ 205.200   | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 34.200     | \$ 0         |                |
| INP 2.4                                                   | instalación y configuración memoria ram de 16gb-kignstone para cpu-escritorio WKT                                                                                                              | UNIDAD | 0,00   | \$ 123.400   | \$ 0           | 2,00           | 2,00          | \$ 246.800   | 2,00         | \$ 246.800   | 2,00          | \$ 123.400    | \$ 246.800   |                |
| INP 2.5                                                   | instalación y configuración camara motorizada tipo bala                                                                                                                                        | UNIDAD | 0,00   | \$ 986.763   | \$ 0           | 3,00           | 3,00          | \$ 2.960.289 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 986.763    | \$ 0         |                |
| INP 2.6                                                   | instalación y configuración camara An LPR                                                                                                                                                      | UNIDAD | 0,00   | \$ 1.004.300 | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 1.004.300 | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 1.004.300  | \$ 0         |                |
| INP 2.7                                                   | instalación y configuración Camara reconocimiento facial                                                                                                                                       | UNIDAD | 0,00   | \$ 986.763   | \$ 0           | 1,00           | 1,00          | \$ 986.763   | 0,00         | \$ 0         | 0,00          | \$ 986.763    | \$ 0         |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              |                |                         |                |                |               |                 |                |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| INP 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalación Corona en varilla de acero punta de 1/2 x 40 cm, tornillos de ajuste y manija a poste con abrazadera laminada                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | 0,00 | \$ 146.666   | \$ 0           | 2,00                    | 2,00           | \$ 293.332     | 1,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 146.666     | \$ 0          |
| INP 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instalación de placa de vidrio 10mm para ingreso CCTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 0,00 | \$ 542.311   | \$ 0           | 1,00                    | 1,00           | \$ 542.311     | 1,00          | \$ 542.311      | 1,00           | \$ 542.311     | \$ 542.311    |
| INP 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Configuración ligera de video central V3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | 0,00 | \$ 3.200     | \$ 0           | 377,00                  | 377,00         | \$ 1.206.400   | 377,00        | \$ 1.206.400    | 377,00         | \$ 3.200       | \$ 1.206.400  |
| INP 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación de brazos ajustables para monitores puesto de trabajo-ajustables                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | 0,00 | \$ 32.100    | \$ 0           | 2,00                    | 2,00           | \$ 64.200      | 0,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 32.100      | \$ 0          |
| INP 2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación mensula en estructura de acero-galvanizado de tubo de 4.5 pulgadas en L de 3mts de alto pernaada a piso. Capacidad de carga de 150kg                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | 0,00 | \$ 1.203.562 | \$ 0           | 1,00                    | 1,00           | \$ 1.203.562   | 0,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 1.203.562   | \$ 0          |
| INP 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reorganización interna de cctv -mobiliario, canalización y ajuste de puesto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 0,00 | \$ 895.400   | \$ 0           | 1,00                    | 1,00           | \$ 895.400     | 0,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 895.400     | \$ 0          |
| INP 2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | instalación y configuración de memoria -disco duro de 8tb para servidor central                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 0,00 | \$ 356.700   | \$ 0           | 1,00                    | 1,00           | \$ 356.700     | 1,00          | \$ 356.700      | 1,00           | \$ 356.700     | \$ 356.700    |
| INP 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación y configuración memorias ram 16gb para cpu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | 0,00 | \$ 32.100    | \$ 0           | 2,00                    | 2,00           | \$ 64.200      | 2,00          | \$ 64.200       | 2,00           | \$ 32.100      | \$ 64.200     |
| INP 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | instalación y adecuación de bocinas IP en poste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 0,00 | \$ 223.790   | \$ 0           | 4,00                    | 4,00           | \$ 895.160     | 0,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 223.790     | \$ 0          |
| INP 2.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación de Monitores-video wall marca dahua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | 0,00 | \$ 123.400   | \$ 0           | 2,00                    | 2,00           | \$ 246.800     | 0,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 123.400     | \$ 0          |
| INP 2.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación de cámaras D5- ocusente televisión tipo bola                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | 0,00 | \$ 959.800   | \$ 0           | 3,00                    | 3,00           | \$ 2.879.400   | 0,00          | \$ 0            | 0,00           | \$ 959.800     | \$ 0          |
| INP 2.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | instalación y configuración de memoria ram 16gb para servidor central                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | 0,00 | \$ 432.451   | \$ 0           | 1,00                    | 1,00           | \$ 432.451     | 1,00          | \$ 432.451      | 1,00           | \$ 432.451     | \$ 432.451    |
| SUBTOTAL INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 84.455.291  |                         |                | \$ 108.366.856 |               | \$ 4.741.349    |                | \$ 87.304.153  |               |
| ADMINISTRACIÓN 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 21.113.823  |                         |                | \$ 27.091.714  |               | \$ 1.185.337    |                | \$ 21.826.038  |               |
| UTILIDAD 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 4.222.765   |                         |                | \$ 5.418.343   |               | \$ 237.067      |                | \$ 4.365.208   |               |
| TOTAL INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 109.791.878 |                         |                | \$ 140.876.912 |               | \$ 6.163.754    |                | \$ 113.495.398 |               |
| 3. SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              |                |                         |                |                |               |                 |                |                |               |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 42 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato. | MES    | 5,00 | \$ 6.876.534 | \$ 34.382.670  | 4,00                    | 9,00           | \$ 61.888.806  | 2,00          | \$ 13.753.068   | 6,00           | \$ 6.876.534   | \$ 41.259.204 |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Asistencia correctiva para 42 puntos de cámara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                      | MES    | 5,00 | \$ 3.879.874 | \$ 19.399.370  | 4,00                    | 9,00           | \$ 34.918.866  | 2,00          | \$ 7.759.748    | 6,00           | \$ 3.879.874   | \$ 23.279.244 |
| INP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ITEMS NO PREVISTOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              |                |                         |                |                |               |                 |                |                |               |
| INP 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MES    | 0,00 | \$ 4.500.000 | \$ 0           | 4,00                    | 4,00           | \$ 18.000.000  | 2,00          | \$ 9.000.000    | 2,00           | \$ 4.500.000   | \$ 9.000.000  |
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 53.782.040  |                         |                | \$ 114.807.672 |               | \$ 30.512.816   |                | \$ 73.538.448  |               |
| IVA 19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 10.218.588  |                         |                | \$ 21.813.458  |               | \$ 5.797.435    |                | \$ 13.972.305  |               |
| TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 64.000.628  |                         |                | \$ 136.621.130 |               | \$ 36.310.251   |                | \$ 87.510.753  |               |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              | \$ 492.662.934 | VALOR CONTRACTUAL FINAL | \$ 682.484.556 | VALOR ACTA 5   | \$ 77.610.253 | VALOR ACUMULADO | \$ 555.012.829 |                |               |
| <div><div><div><div>WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA</div><div>Gerente</div><div>EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ</div></div><div><div>WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA</div><div>Gerente</div><div>EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ</div></div></div><div><div>STIVEN RENDON BOTERO</div><div>Representante Legal</div><div>SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |              |                |                         |                |                |               |                 |                |                |               |



## ¿Quiénes somos?

SRB soluciones de seguridad es una empresa especializada y enfocada principalmente en la profesionalización del talento humano de los centros de monitoreo y control, así mismo somos apoyo para las administraciones municipales, regionales y entidades público-privadas de asesorar, participar, proyectar y ejecutar proyectos de seguridad ciudadana enfocados en los centros de monitoreos, esto con el fin de contribuir positiva y asertivamente en la correcta operación de los mismos.

## Visión

En el 2025 SRB soluciones de seguridad será una empresa y compañía líder en el oriente del departamento Antioquia, en proyectar soluciones de seguridad operativa para los centros de monitoreo y control de estos municipios que conforman esta región, así mismo seremos los pioneros en la implementación de proyectos de apoyo a la seguridad ciudadana para estos centros de operación, compenetrados con las diferentes instituciones de las fuerzas del orden, para contribuir en la seguridad, la integridad, el desarrollo y la armonía ciudadana.

## Misión

Trabajar por el principal pilar de la armonía ciudadana como es la seguridad, siendo nuestra empresa eje fundamental para el desarrollo sostenible de la seguridad ciudadana a nivel local, departamental y nacional.

# **INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO.**

## **INFORME #5**

**Contrato: OC 020-2025**

### **OBJETO DEL CONTRATO:**

**MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO,  
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL  
MUNICIPIO DE GUATAPÉ**

**GUATAPÉ- ANTIQUIA  
2025**

#### **Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

## OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONTRATO

Disponer de equipo técnico y profesional para modernizar, instalar, actualizar y configurar todos los sistemas concernientes al CCTV del municipio de Guatapé Antioquia, con el fin de que este mismo sea completamente operativo y dispuesto para el apoyo a la seguridad ciudadana.

## TABLA DE METAS Y/O OBJETIVOS

Para el presente contrato de prestación de servicios se fijaron 3 frentes a desarrollar y ejecutar las cuales estuvieran al servicio 24/7 para la correcta operación técnica, tecnológica y de adecuación físico.

|                                                |                                                                                                                         |                                  |                            |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE COMPRA No | OC 020-2025                                                                                                             | FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2025 |                            |                         |
| NOMBRE CONTRATISTA                             | SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS                                                                                         |                                  |                            |                         |
| NIT:                                           | 901676254-3                                                                                                             | DIRECCIÓN:                       | DIAGONAL 50C#46-08 INT 301 |                         |
| OBJETO CONTRATO                                | “MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ           |                                  |                            |                         |
| CORREO ELECTRÓNICO                             | <a href="mailto:rendonboterostiven@gmail.com">rendonboterostiven@gmail.com</a><br>gerencia@srbsolucionesdeseguridad.com | TELÉFONOS                        | FIJO                       | 614-66 65               |
|                                                |                                                                                                                         |                                  | CELULAR                    | 3216878222 - 3174398655 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR                          | WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA                                                                                        |                                  |                            |                         |
| PERÍODO DE COBRO                               | DEL 01 SEPTIEMBRE AL 18 SEPTIEMBRE DEL 2025                                                                             |                                  |                            |                         |

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





## TABLA DE BALANCE FINANCIERO

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| VALOR CONTRACTUAL INICIAL                                     | \$ 492.662.934 |
| VALOR PAGADO ACTA PAGO ANTICIPADO 40%                         | \$ 197.065.174 |
| VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL OTROS                              | \$ 189.821.622 |
| VALOR CONTRACTUAL FINAL                                       | \$ 682.484.556 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 (MENOS PAGO ANTICIPADO ENTREGADO) | \$ 59.896.639  |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2                                   | \$ 148.372.642 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3                                   | \$ 48.217.997  |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4                                   | \$ 23.850.126  |
| VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 5                                  | \$ 77.610.253  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                                         | \$ 555.012.829 |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PRESENTE ACTA 5                | 11,37%         |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO DEL CONTRATO                   | 81,32%         |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Soporte 7/24 - Atención de incidentes del Centro de Monitoreo y Control:

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





# SRR



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22

Fecha: 9/17/2025 12:03 PM

seguridad

## REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

| #   | Novedad         | Estado    | Descripción                                                  | Fecha               | Funcionario       |
|-----|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 398 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 17 2025 6:23AM  | Jose Ospina       |
| 397 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 17 2025 12:12AM | Maria Valencia    |
| 396 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo servicio sin novedad                                  | Sep 16 2025 6:24PM  | Omar Castro       |
| 395 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.     | Sep 16 2025 1:45PM  | Yenifer Patiño    |
| 394 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 16 2025 6:35AM  | Jose Ospina       |
| 393 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 16 2025 12:13AM | Maria Valencia    |
| 392 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.     | Sep 15 2025 6:58PM  | Yenifer Patiño    |
| 391 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 15 2025 12:47PM | Jose Ospina       |
| 390 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 15 2025 6:04AM  | Maria Valencia    |
| 389 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                    | Sep 15 2025 12:37AM | luis vidal        |
| 388 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.             | Sep 14 2025 7:05PM  | Yenifer Patiño    |
| 387 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 14 2025 1:17PM  | Jose Ospina       |
| 386 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 14 2025 6:53AM  | Maria Valencia    |
| 385 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD ALGUNA             | Sep 14 2025 3:06AM  | luis vidal        |
| 384 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 13 2025 9:13PM  | Jose Ospina       |
| 383 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 13 2025 12:02PM | Maria Valencia    |
| 382 | Inicio de Turno | PENDIENTE | operador del cmc recibo turno sin novedad                    | Sep 13 2025 6:05AM  | luis vidal        |
| 381 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo servicio sin novedad                                  | Sep 13 2025 12:52AM | Omar David Castro |
| 380 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 12 2025 6:17PM  | Jose Ospina       |
| 379 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 12 2025 12:03PM | Maria Valencia    |
| 378 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                    | Sep 12 2025 6:42AM  | luis vidal        |
| 377 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo servicio sin novedad                                  | Sep 12 2025 12:07AM | Omar David Castro |
| 376 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 11 2025 6:08PM  | Maria Valencia    |
| 375 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NUNGUNA NOVEDAD            | Sep 11 2025 12:14PM | luis vidal        |
| 374 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo sin novedad                                           | Sep 11 2025 6:06AM  | Omar David Castro |
| 373 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.     | Sep 11 2025 12:42AM | Yenifer Patiño    |
| 372 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 10 2025 5:55PM  | Maria Valencia    |

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad



Fecha: 9/17/2025 12:03 PM

## REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

|     |                 |            |                                                                                              |                     |                     |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 371 | Inicio de Turno | PENDIENTE  | operador del cmc recibo turno sin novedad                                                    | Sep 10 2025 12:12PM | luis vidal          |
| 370 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Recibo servicio sin novedad                                                                  | Sep 10 2025 5:56AM  | OMAR DAVID CASTRO A |
| 369 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.                                     | Sep 10 2025 12:02AM | Yenifer Patiño      |
| 368 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin novedad                                                                  | Sep 9 2025 12:14PM  | OMAR DAVID CASTRO   |
| 367 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.                                             | Sep 9 2025 6:45AM   | Yenifer Patiño      |
| 366 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 9 2025 12:28AM  | Jose Ospina         |
| 365 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                                                    | Sep 8 2025 6:09PM   | Luis vidal          |
| 364 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SIN NOVEDAD                                                                           | Sep 8 2025 12:04PM  | OMAR DAVID CASTRO A |
| 363 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.                                             | Sep 8 2025 7:41AM   | Yenifer Patiño      |
| 362 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 8 2025 12:13AM  | Jose Ospina.        |
| 361 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SERVICIO SIN NOVEDAD                                                                  | Sep 7 2025 6:16PM   | OMAR DAVID CASTRO A |
| 360 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.                                             | Sep 7 2025 12:59PM  | Yenifer Patiño      |
| 359 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 7 2025 6:06AM   | Jose Ospina         |
| 358 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 7 2025 12:03AM  | Maria Valencia      |
| 357 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin Novedad                                                                  | Sep 6 2025 6:18PM   | OMAR DAVID CASTRO A |
| 356 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC,recibo turno sin novedad                                               | Sep 6 2025 1:48PM   | Yenifer Patiño      |
| 355 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 6 2025 6:31AM   | Jose Ospina         |
| 354 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 6 2025 12:07AM  | Maria Valencia      |
| 353 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, Recibo turno sin ninguna novedad, equipos funcionando con normalidad. | Sep 5 2025 7:44PM   | Yenifer Patiño      |
| 352 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 5 2025 12:24PM  | Jose Ospina         |
| 351 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 5 2025 6:33AM   | Maria Valencia      |
| 350 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                                                    | Sep 5 2025 12:20AM  | LUIS VIDAL          |
| 349 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, Recibo turno sin ninguna novedad, equipos en funcionamiento.          | Sep 4 2025 6:56PM   | Yenifer Patiño      |
| 348 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 4 2025 4:01PM   | Jose Ospina         |
| 347 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 4 2025 6:03AM   | Maria Valencia      |
| 346 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD EN ESPECIAL                                        | Sep 4 2025 12:28AM  | LUIS VIDAL          |
| 345 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 3 2025 6:48PM   | Jose Ospina         |
| 344 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 3 2025 11:57AM  | Maria Valencia      |

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad



Fecha: 9/17/2025 12:03 PM

## REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

|     |                 |            |                                                                    |                    |                     |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 343 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin novedad                                        | Sep 3 2025 12:04AM | OMAR DAVID CASTRO A |
| 342 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.        | Sep 2 2025 6:16PM  | Jose Ospina         |
| 341 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.       | Sep 2 2025 12:20PM | Maria Valencia      |
| 340 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                          | Sep 2 2025 6:10AM  | LUIS VIDAL          |
| 339 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin novedad                                        | Sep 2 2025 12:04AM | OMAR DAVID CASTRO A |
| 338 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.       | Sep 1 2025 6:13PM  | Maria Isabel        |
| 337 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD ALGUNA                   | Sep 1 2025 12:07PM | luis vidal          |
| 336 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin novedad                                        | Sep 1 2025 6:09AM  | Omar David Castro   |
| 335 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, Recibo turno con equipos en funcionamiento. | Sep 1 2025 12:33AM | Yenifer Patiño      |

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

## 2. Generación de informe de Inicio de Turno del CMC



# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 9/17/2025 11:53 AM

REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

Para salir de la pantalla completa, presione Esc

| #   | Novedad         | Estado    | Descripción                                                  | Fecha               | Funcionario       |
|-----|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 398 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 17 2025 6:23AM  | Jose Ospina       |
| 397 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 17 2025 12:12AM | Maria Valencia    |
| 396 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo servicio sin novedad                                  | Sep 16 2025 6:24PM  | Omar Castro       |
| 395 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.     | Sep 16 2025 1:45PM  | Yenifer Patiño    |
| 394 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 16 2025 6:35AM  | Jose Ospina       |
| 393 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 16 2025 12:13AM | Maria Valencia    |
| 392 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.     | Sep 15 2025 6:58PM  | Yenifer Patiño    |
| 391 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 15 2025 12:47PM | Jose Ospina       |
| 390 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 15 2025 6:04AM  | Maria Valencia    |
| 389 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                    | Sep 15 2025 12:37AM | luis vidal        |
| 388 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.             | Sep 14 2025 7:05PM  | Yenifer Patiño    |
| 387 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 14 2025 1:17PM  | Jose Ospina       |
| 386 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 14 2025 6:53AM  | Maria Valencia    |
| 385 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD ALGUNA             | Sep 14 2025 3:06AM  | luis vidal        |
| 384 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 13 2025 9:13PM  | Jose Ospina       |
| 383 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 13 2025 12:02PM | Maria Valencia    |
| 382 | Inicio de Turno | PENDIENTE | operador del cmc recibo turno sin novedad                    | Sep 13 2025 6:05AM  | luis vidal        |
| 381 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo servicio sin novedad                                  | Sep 13 2025 12:52AM | Omar David Castro |
| 380 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.  | Sep 12 2025 6:17PM  | Jose Ospina       |
| 379 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 12 2025 12:03PM | Maria Valencia    |
| 378 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                    | Sep 12 2025 6:42AM  | luis vidal        |
| 377 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo servicio sin novedad                                  | Sep 12 2025 12:07AM | Omar David Castro |
| 376 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 11 2025 6:08PM  | Maria Valencia    |
| 375 | Inicio de Turno | PENDIENTE | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NUNGUNA NOVEDAD            | Sep 11 2025 12:14PM | luis vidal        |
| 374 | Inicio de Turno | PENDIENTE | recibo sin novedad                                           | Sep 11 2025 6:06AM  | Omar David Castro |
| 373 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.     | Sep 11 2025 12:42AM | Yenifer Patiño    |
| 372 | Inicio de Turno | PENDIENTE | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio. | Sep 10 2025 5:55PM  | Maria Valencia    |

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
NIT. 001676942



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

Fecha: 9/17/2025 11:53 AM



## REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

|     |                 |            |                                                                                              |                     |                     |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 371 | Inicio de Turno | PENDIENTE  | operador del cmc recibo turno sin novedad                                                    | Sep 10 2025 12:12PM | luis vidal          |
| 370 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Recibo servicio sin novedad                                                                  | Sep 10 2025 5:56AM  | OMAR DAVID CASTRO A |
| 369 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.                                     | Sep 10 2025 12:02AM | Yenifer Patiño      |
| 368 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin novedad                                                                  | Sep 9 2025 12:14PM  | OMAR DAVID CASTRO   |
| 367 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.                                             | Sep 9 2025 6:45AM   | Yenifer Patiño      |
| 366 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 9 2025 12:28AM  | Jose Ospina         |
| 365 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                                                    | Sep 8 2025 6:09PM   | Luis vidal          |
| 364 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SIN NOVEDAD                                                                           | Sep 8 2025 12:04PM  | OMAR DAVID CASTRO A |
| 363 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.                                             | Sep 8 2025 7:41AM   | Yenifer Patiño      |
| 362 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 8 2025 12:13AM  | Jose Ospina.        |
| 361 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SERVICIO SIN NOVEDAD                                                                  | Sep 7 2025 6:16PM   | OMAR DAVID CASTRO A |
| 360 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, recibo turno sin novedad.                                             | Sep 7 2025 12:59PM  | Yenifer Patiño      |
| 359 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 7 2025 6:06AM   | Jose Ospina         |
| 358 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 7 2025 12:03AM  | Maria Valencia      |
| 357 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin Novedad                                                                  | Sep 6 2025 6:18PM   | OMAR DAVID CASTRO A |
| 356 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC,recibo turno sin novedad                                               | Sep 6 2025 1:48PM   | Yenifer Patiño      |
| 355 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 6 2025 6:31AM   | Jose Ospina         |
| 354 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 6 2025 12:07AM  | Maria Valencia      |
| 353 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, Recibo turno sin ninguna novedad, equipos funcionando con normalidad. | Sep 5 2025 7:44PM   | Yenifer Patiño      |
| 352 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 5 2025 12:24PM  | Jose Ospina         |
| 351 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 5 2025 6:33AM   | Maria Valencia      |
| 350 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD                                                    | Sep 5 2025 12:20AM  | LUIS VIDAL          |
| 349 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC, Recibo turno sin ninguna novedad, equipos en funcionamiento.          | Sep 4 2025 6:56PM   | Yenifer Patiño      |
| 348 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 4 2025 4:01PM   | Jose Ospina         |
| 347 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 4 2025 6:03AM   | Maria Valencia      |
| 346 | Inicio de Turno | FINALIZADO | OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO SIN NOVEDAD EN ESPECIAL                                        | Sep 4 2025 12:28AM  | LUIS VIDAL          |
| 345 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operador del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                  | Sep 3 2025 6:48PM   | Jose Ospina         |
| 344 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en servicio.                                 | Sep 3 2025 11:57AM  | Maria Valencia      |

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

### 3. Capacitaciones personales CMC E Instituciones.

Capacitación realizada el día 15 de septiembre del 2025 al personal Operativo del CMC Guatapé.

Implementación del sistema Hikcentral, virtudes y nuevas tecnologías para el municipio.

| REGISTRO DE ASISTENCIA                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |                |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| TIPO: Charla <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Entrenamiento <input type="checkbox"/> Actividad lúdica <input type="checkbox"/> |                          |                                                                                         |                |                                    |
| Fecha: 15/09/2025                                                                                                                                                       |                          | Lugar: Guatapé Antioquia                                                                |                | Duración: Hora Inicio: Hora Final: |
| Realizada por: Empresa <input type="checkbox"/> Ente Externo <input type="checkbox"/>                                                                                   |                          | Si es externo: <input checked="" type="checkbox"/> ¿Cuál? Hikvision Colombia            |                |                                    |
| Genera costo: Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                   |                          | Monto \$                                                                                |                |                                    |
| TEMA(S): Manejos de las versiones Hikcentral Professional 2.6 y siguientes                                                                                              |                          |                                                                                         |                |                                    |
| OBJETIVO(S): Manejos de las versiones Hikcentral Professional 2.6 y siguientes                                                                                          |                          |                                                                                         |                |                                    |
| Nombre del Capacitador: Oscar Juan Valencia                                                                                                                             |                          | Firma:                                                                                  |                |                                    |
| Se requiere evaluación del tema? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                |                          | Se requiere verificar eficacia? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |                |                                    |
| Nombre del Verificador de eficacia:                                                                                                                                     |                          | Firma:                                                                                  |                |                                    |
| LISTADO DE ASISTENCIA                                                                                                                                                   |                          |                                                                                         |                |                                    |
| No.                                                                                                                                                                     | NOMBRE                   | CEDULA                                                                                  | CARGO          | FIRMA                              |
| 1                                                                                                                                                                       | Haroon J. Girona A.      | 91045380                                                                                | Prof. Sistema  |                                    |
| 2                                                                                                                                                                       | Eliana MAURICIO ALBOLERA | 70734322                                                                                | OP. M. T.      |                                    |
| 3                                                                                                                                                                       | Mario E. Ochoa           | 114012510                                                                               | Ing. Proyectos |                                    |
| 4                                                                                                                                                                       | María Elena Rodríguez    | 59652323                                                                                | Ing. Sistema   |                                    |
| 5                                                                                                                                                                       | Jaiz Alberto Roa Roa     | 79431696                                                                                | Ing. Soporte   |                                    |
| 6                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 7                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 8                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 9                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 10                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 11                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 12                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 13                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 14                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 15                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 16                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 17                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |
| 18                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                         |                |                                    |



#### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

**Capacitación realizada el día 16 de septiembre del 2025 para el personal Operativo del CMC Guatapé, peñol e Instituciones aliadas.**

**En manejos de los sistemas inteligentes del municipio y nuevas implementaciones de seguridad.**

| SRB                                                                                                                                                                     |                                   | REGISTRO DE ASISTENCIA                                                                             |            |                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| TIPO: <input type="checkbox"/> Charla <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Entrenamiento <input type="checkbox"/> Actividad lúdica |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| Fecha: 16/09/2023                                                                                                                                                       |                                   | Lugar: Guatapé Antioquia                                                                           |            | Duración: Hora Inicio: Hora Final:       |                                      |
| Realizada por:                                                                                                                                                          |                                   | Empresa <input type="checkbox"/> Ente Externo <input checked="" type="checkbox"/>                  |            | Si es externo: ¿Cuál? HIKVISION Colombia |                                      |
|                                                                                                                                                                         |                                   | Genera costo: Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                   |            | Monto \$                                 |                                      |
| TEMA(S): Manejos de las Versiones Hikcentral Professional                                                                                                               |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| OBJETIVO(S): Manejos de las Versiones Hikcentral Professional                                                                                                           |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| Nombre del Capacitador: Oscar Ivan Valencia                                                                                                                             |                                   | Firma: [Firma]                                                                                     |            |                                          |                                      |
| Se requiere evaluación del tema? Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                     |                                   | Se requiere Verificar eficacia? Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |            |                                          |                                      |
| Nombre del Verificador de eficacia:                                                                                                                                     |                                   | Firma:                                                                                             |            |                                          |                                      |
| LISTADO DE ASISTENCIA                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                    |            |                                          | EFICACIA                             |
| No.                                                                                                                                                                     | NOMBRE                            | CEDULA                                                                                             | CARGO      | FIRMA                                    | Fecha: Se cumplió el Objetivo? SI NO |
| 1                                                                                                                                                                       | Jose Humberto Lopez Hoyano        | 107704038                                                                                          |            | [Firma]                                  |                                      |
| 2                                                                                                                                                                       | Jimmy Quintero Acevedo            | 1152184147                                                                                         |            | [Firma]                                  |                                      |
| 3                                                                                                                                                                       | Yennifer Patiño Montoya           | 833650639                                                                                          |            | [Firma]                                  |                                      |
| 4                                                                                                                                                                       | Luisa Vela                        | 105013475                                                                                          |            | [Firma]                                  |                                      |
| 5                                                                                                                                                                       | Luis Fernando Jimenez             | 98912377                                                                                           |            | [Firma]                                  |                                      |
| 6                                                                                                                                                                       | Marcela Quijada Perez             | 39424462                                                                                           | Supervisor | [Firma]                                  |                                      |
| 7                                                                                                                                                                       | Orlando Andres Florentino Pinceda | 1056032190                                                                                         | PONAL      | [Firma]                                  |                                      |
| 8                                                                                                                                                                       | Fancy Castro Vargas               | 1121813896                                                                                         | PONAL      | [Firma]                                  |                                      |
| 9                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 10                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 11                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 12                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 13                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 14                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 15                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 16                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 17                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |
| 18                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                    |            |                                          |                                      |



## Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





**SRB**  
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S  
Nit: 901676254-3



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

#### 4. Configuración e instalación cámara Térmica.

Instalación y configuración de la cámara el malecón, Guatapé Antioquia, cámara térmica.



#### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**





**SRRB**  
SOLUCIONES E  
Nit: 90

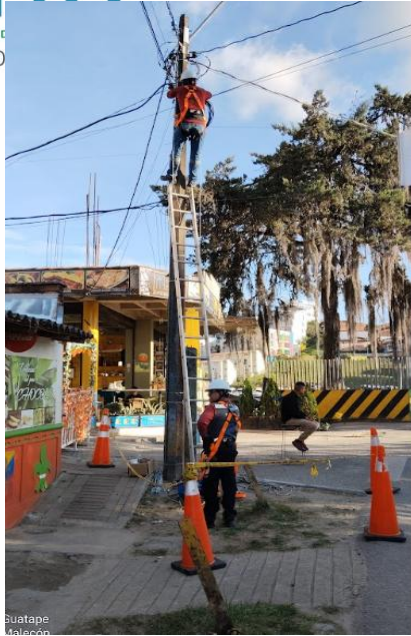

Buatape  
Telecom



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

## Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**






# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit: 901676254-3

## 5. Instalación de puerta de cristal CMC

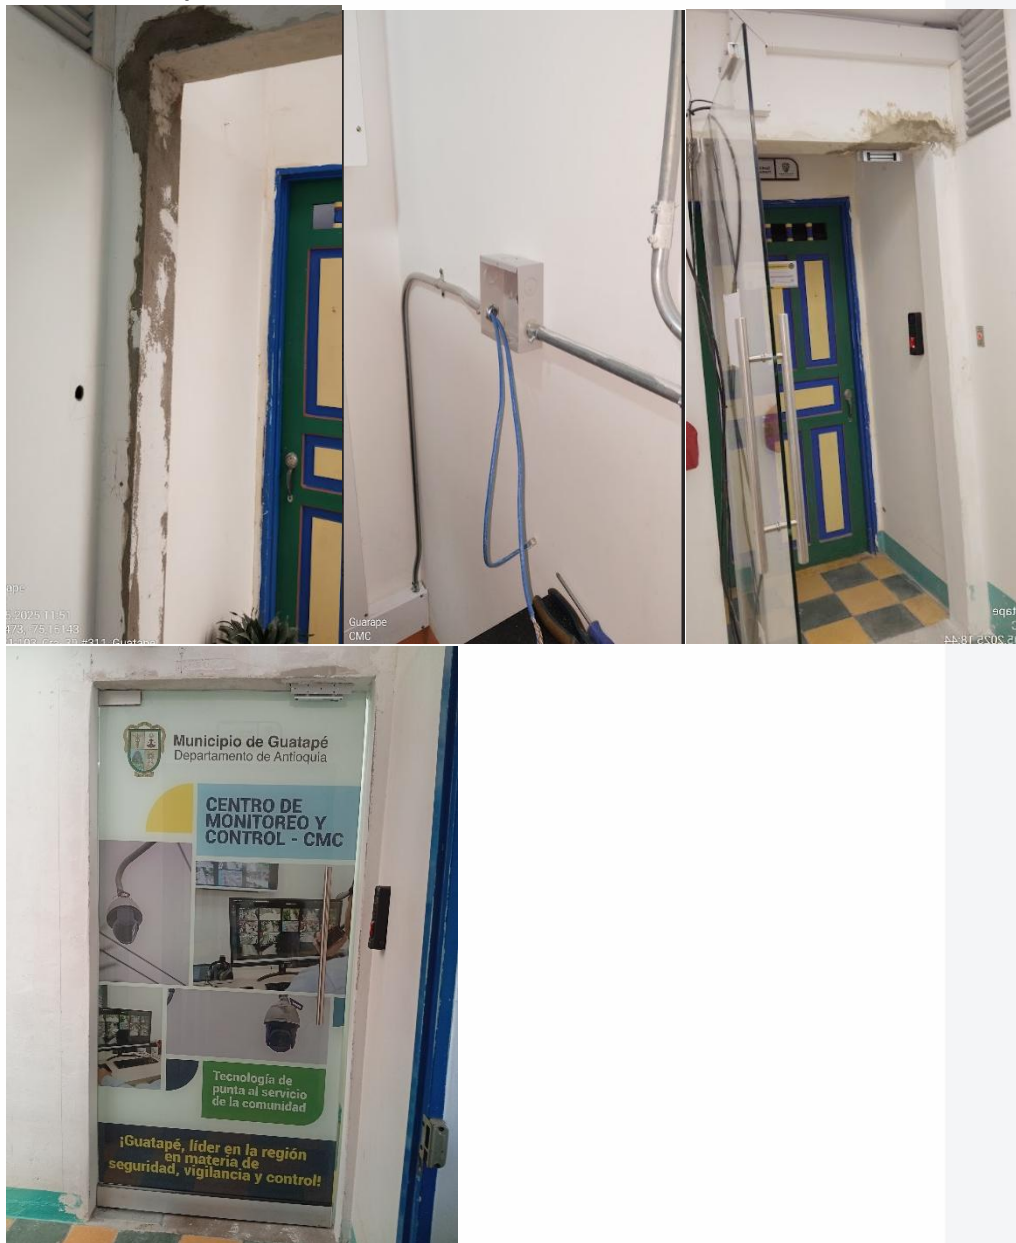

(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit: 901676254-3

## 6. Suministro de aire acondicionado



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad

## 7. Instalación, suministro y puesta en marcha de iluminación en espacio público sector veredal el puente colgante.



### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)





# SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit: 901676254-3

## 8. Suministro de fibra óptica monomodo 24 hilos spam 200 y fibra drop.



Cordialmente,

**Stiven Rendón Botero**  
Coordinador de Proyectos.

CC 1.036.953.635

**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**

NIT: 901 676 254-3

### Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH  
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

[srbsoluciones.seguridad@gmail.com](mailto:srbsoluciones.seguridad@gmail.com)

[www.srbsolucionesdeseguridad.com](http://www.srbsolucionesdeseguridad.com)



(604) 614 66 65  
(+57) 317 439 8655  
(+57) 321 687 82 22



srbsdseguridad
