



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

# FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 1 de 19

## CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	15
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	15
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:	15
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST	16
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II	16
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	17
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.	17

## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000809 H3 de la vigencia 2025  
Nombre del Contratista: ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S.  
Periodo del informe: 16 de junio al 05 de noviembre del 2025  
Fecha del informe: 06 de noviembre de 2025  
Nombre del Interventor: Henry Andrés Córdoba Maldonado  
Área perteneciente: Grupo de Mantenimiento Sistemas Navegación Área

## INFORMACION CONTRACTUAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	04 de junio de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	16 de junio del 2025



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 19

<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	16 de junio del 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	16 de octubre del 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:</b>	01 de diciembre de 2025
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$590.604.500
<b>VALOR ACTUALIZADO:</b>	\$590.604.500

## OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR INSTALAR Y PONER EN SERVICIO LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA SEPARACIÓN DE RADIOS DE TX Y RX DE LA SERIE EU4200 Y SU4200 PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LETICIA, NEIVA Y GUAYMARAL

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 16 de junio al 05 de noviembre del 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES (
Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**FORMATO**

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL**

**Principio de procedencia:**  
3300.092

**Clave:** GCON-1.0-12-046

**Versión:** 02

**Fecha:** 04/oct/2019

**Página:** 3 de 19

que le señale la administración del aeropuerto. La Gerencia del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.		Aerea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Se compromete para con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Está obligado a responder a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 19

AERONÁUTICA CIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato		Aerea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/ <b>CONTRATOS/25000803</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación aérea/2025/ CONTRATOS/ <b>25000809</b> H3 2025 ANTENAS COLINEALES

### 3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
- Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
- Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La Gerencia del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
- Se compromete para con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 19

del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

- e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
- f) Está obligado a responder a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
- g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
- h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
- i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
- j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
- k) Dar a conocer a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
- m) Responder ante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

### 3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL
1	ESTACION LETICIA						
1.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	2	Antenas de torre de torre de control en proceso de instalación y la antena de la torre autosorpotada ya tiene soporte y se instalara entre el 23 y 24 de octubre.	90%	14%	13%



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 19

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL	
1.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	6	Todos, los accesorios están en Leticia, en proceso de instalación	90%	8%	7%	
1.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	6	Materiales en sitio. pendiente los trabajos en torre de radar, reubicación de los sistemas de VHF de la torre de control y la sala técnica.	85%	8%	7%	
1.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	6	Materiales en sitio. pendiente los trabajos en torre de radar, reubicación de los sistemas de VHF de la torre de control y la sala técnica.	85%	4%	3%	
1.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Materiales en sitio. pendiente los trabajos en torre de radar, reubicación de los sistemas de VHF de la torre de control y la sala técnica.	80%	11%	9%	
2	ESTACION NEIVA							



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 19

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL	
2.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	100%	7%	7%	
	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 2 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	100%	5%	5%	
2.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	4	Terminado	100%	5%	5%	
2.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	4	Terminado	100%	5%	5%	
2.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	4	terminado	100%	3%	3%	
2.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACION Y COMPROBACION DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACION VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	100%	8%	8%	
3	ESTACION GUAYMARAL							



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 19

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL
3.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	La antena está instalada y operativa	100%	7%	7%
3.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	3	Terminado	100%	4%	4%
3.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	3	Terminado	100%	4%	4%
3.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	3	Terminado	100%	2%	2%
3.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	100%	4%	4%
<b>PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL</b>							<b>94%</b>



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 19

CAPITULO	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANTO O ATRASO
CAPITULO 1 – PARCIAL 1	\$351.704.500	%100	\$351.704.500	%100	0

### REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROPUERTO DE GUAYMARAL



Foto No. 1. Antena instalada



Foto No. 2. Cambio de mástil de pararrayos



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

# FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 10 de 19



Foto 3. Gabinete de comunicaciones

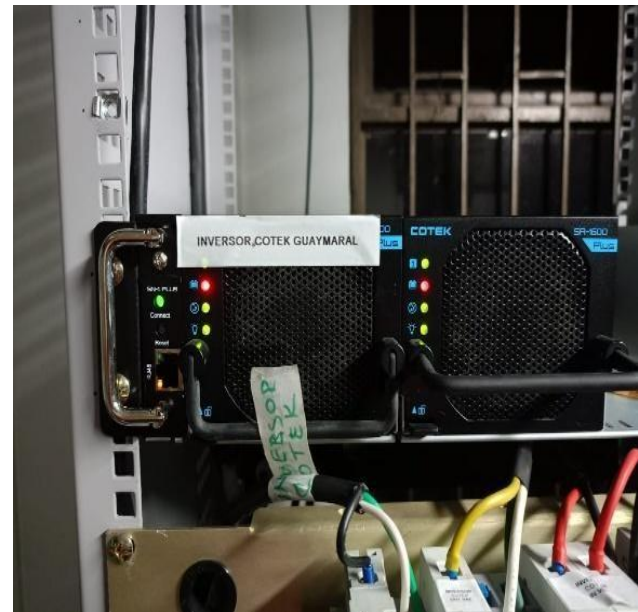


Foto 4. reubicación del sistema de inversor red ATN

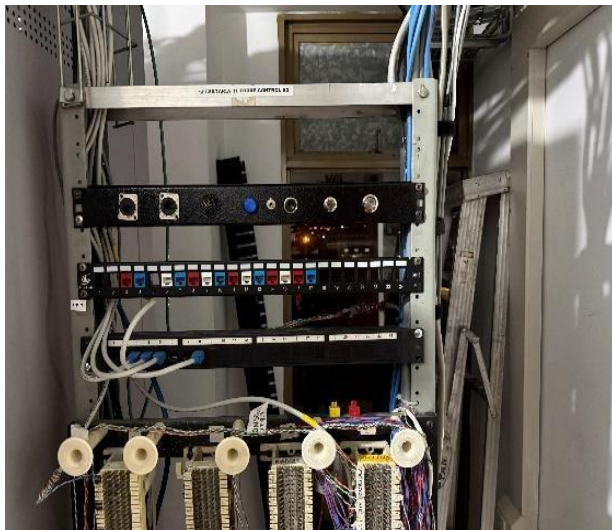


Foto 5. Sistema de patch panel y sistema de prueba



Foto 6. cambio de gabinete y reubicación de radios, equipos red ATN y multiplexor rad.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046


Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 11 de 19



**Foto 7. Entrega de material sobrante en almacén de Aerocivil Regional Centro Sur**

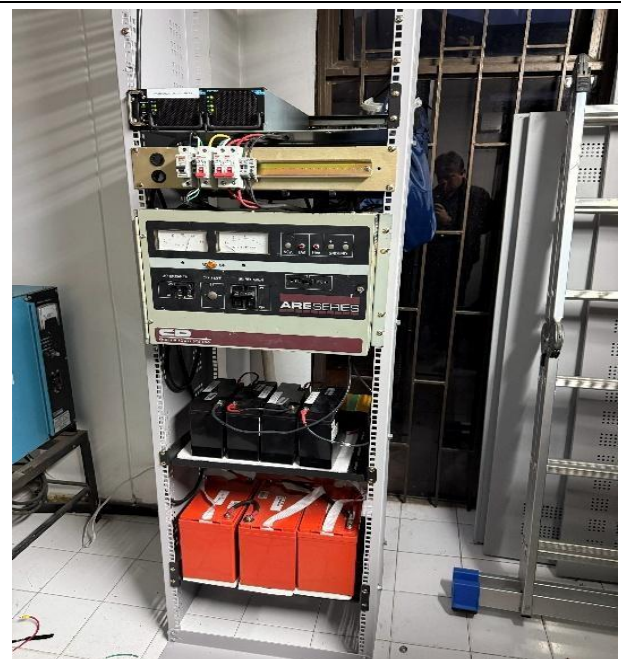

**Foto 8. Equipos de energía reubicados en cuarto eléctrico del primer piso**



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 19

## REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROPUERTO DE NEIVA



Foto No. 1.



Foto No. 2.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

# FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 13 de 19



Foto 3.

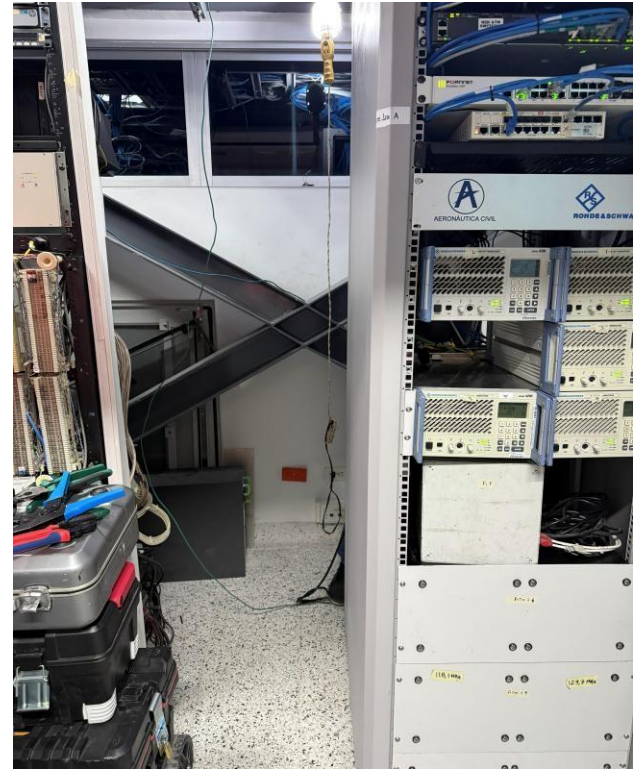


Foto 4.

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	A SATISFACCIÓN
2	ESTACION NEIVA				
2.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	SI
	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 2 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	SI
2.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	4	Terminado	SI



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**FORMATO**

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 14 de 19

2.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	4	Terminado	SI
2.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	4	terminado	SI
2.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	SI
3	<b>ESTACION GUAYMARAL</b>				
3.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	La antena está instalada y operativa	SI
3.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	3	Terminado	SI
3.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	3	Terminado	SI
3.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	3	Terminado	SI



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## FORMATO

### FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 15 de 19

3.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	SI
-----	---	-----	---	-----------	----

### 3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.


Se realizo prorroga por retraso del proyecto de radares en Leticia

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

### 5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
<b>Principio de procedencia:</b> 3300.092	<b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046	<b>Versión:</b> 02	<b>Fecha:</b> 04/oct/2019	<b>Página:</b> 16 de 19

## 6. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

### 7.1 EXAMEN OCUPACIONAL

<b>¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?</b>	
<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>X</b>
<b>¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?</b>	
<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>X</b>

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:


<b>FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN</b>
-	-

### 7.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<b>¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?</b>	
<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>X</b>	
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN</b>	
17 de junio del 2025	

## 8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

<b>NÚMERO DE INFORME</b>	<b>PUBLICACIÓN EN SECOP II</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1		<b>X</b>

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 17 de 19

## 9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 9.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: \$590.604.500

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO					
No. PAGO	FECHA DE RADICACIÓN EN CxP	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN PAGOS	SALDO POR PAGAR
0	-	0	0	0	\$590.604.500

### 9.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	16 JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	01 DICIEMBRE DEL 2025
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$590.604.500
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$351.704.500
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	%60.5
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$351.704.500
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	%60.5
% DE <b>ATRASO</b> O <b>ADELANTO</b> O DENTRO DEL PLAN (0%)	0

**Nota:** Se ha ejecutado el 94% de las actividades correspondientes a los aeropuertos de Guaymaral, Neiva y Leticia. En esta acta parcial se procederá al pago total de lo ejecutado en Guaymaral y Neiva.

### 9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	5 MESES Y 15 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	4,7
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	85%

## 10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:	NO APLICA



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**FORMATO**

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:  
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 18 de 19

<b>SOLICITUD DE ADICIÓN:</b>	NO APLICA
<b>SOLICITUD DE PRORROGA:</b>	El plazo de prórroga del presente contrato es de UN (1) MESES y QUINCE (15) DIAS, término contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
<b>SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:</b>	NO APLICA
<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:</b>	NO APLICA
<b>REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:</b>	NO APLICA
<b>OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:</b>	NO APLICA

**ESTADO DE LAS GARANTIAS**

<b>Clase de Garantía:</b>	Póliza Garantía Única		
<b>Número de Garantía:</b>	18-44-101106881		
<b>Fecha de Expedición de la Garantía.</b>	22/10/2025	<b>fecha de aprobación de la garantía</b>	28/10/2025
<b>Descripción del Amparo:</b>	Cumplimiento del contrato		
<b>Porcentaje:</b>	20%		
<b>Anexo:</b>	5		
<b>Descripción del Amparo:</b>	pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		
<b>Porcentaje:</b>	20%		
<b>Anexo:</b>	5		
<b>Descripción del Amparo:</b>	calidad y correcto funcionamiento de los bienes		
<b>Porcentaje:</b>	20%		
<b>Anexo:</b>	5		
<b>Clase de Garantía:</b>	Póliza de responsabilidad civil extracontractual		
<b>Número de Garantía:</b>	18-40-101078589		
<b>Fecha de Expedición de la Garantía.</b>	22/10/2025	<b>fecha de aprobación de la garantía</b>	28/10/2025
<b>Descripción del Amparo:</b>	predios labores y operaciones – contratistas y subcontratistas - vehículos propios y no propios		
<b>Porcentaje o valor:</b>	200 SMMLV		
<b>Anexo:</b>	5		



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**FORMATO**

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL**

**Principio de procedencia:**  
3300.092

**Clave:** GCON-1.0-12-046

**Versión:** 02

**Fecha:** 04/oct/2019

**Página:** 19 de 19

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**WILFREDO LEON MONTERO**  
APOYO TÉCNICO

**PAULA ANDREA RUEDA**  
APOYO JURIDICO

**HENRY ANDRES CORDOBA**  
SUPERVISOR

**GINETH ANDREA NARANJO GOMEZ**  
REVISION FINANCIERA

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.**
