



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 1 de 22

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	18
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	18
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:	18
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST	18
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II	19
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	19
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.	20

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	<u>25000809 H3 de la vigencia 2025</u>
Nombre del Contratista:	<u>ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S.</u>
Periodo del informe:	<u>06 de noviembre al 30 de noviembre del 2025</u>
Fecha del informe:	<u>09 de diciembre de 2025</u>
Nombre del Interventor:	<u>Henry Andrés Córdoba Maldonado</u>
Área perteneciente:	<u>Grupo de Mantenimiento Sistemas Navegación Área</u>

INFORMACION CONTRACTUAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	16 de junio del 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	16 de junio del 2025



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 22

FECHA ACTA DE INICIO:	16 de junio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 de octubre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30 de noviembre del 2025
VALOR INICIAL:	\$590.604.500
VALOR ACTUALIZADO:	\$590.604.500

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR INSTALAR Y PONER EN SERVICIO LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA SEPARACIÓN DE RADIOS DE TX Y RX DE LA SERIE EU4200 Y SU4200 PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTOS DE LETICIA, NEIVA Y GUAYMARAL

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 06 de noviembre al 30 de noviembre del 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES (
Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 22

que le señale la administración del aeropuerto. La Gerencia del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.		Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Se compromete para con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Está obligado a responder a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 22

AERONÁUTICA CIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato		Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES
Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos	Cumple	2. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación aérea/2025/CONTRATOS/25000809 H3 2025 ANTENAS COLINEALES

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
- Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
- Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La Gerencia del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
- Se compromete para con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 22

del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

- e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
- f) Está obligado a responder a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
- g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
- h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
- i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
- j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
- k) Dar a conocer a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
- m) Responder ante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL
1	ESTACION LETICIA						
1.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	2	Terminado	100%	14%	14%
1.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	6	Terminado	100%	8%	8%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL	
1.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	6	Terminado	100%	8%	8%	
1.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	6	Terminado	100%	4%	4%	
1.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACION Y COMPROBACION DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACION VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	100%	11%	11%	
2	ESTACION NEIVA							
2.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	100%	7%	7%	
	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 2 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	100%	5%	5%	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL
2.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	4	Terminado	100%	5%	5%
2.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	4	Terminado	100%	5%	5%
2.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	4	terminado	100%	3%	3%
2.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	100%	8%	8%
3	ESTACION GUAYMARAL						
3.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	La antena está instalada y operativa	100%	7%	7%
3.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	3	Terminado	100%	4%	4%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE REAL
3.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	3	Terminado	100%	4%	4%
3.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	3	Terminado	100%	2%	2%
3.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACION Y COMPROBACION DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACION VERTICAL Y HORIZONTAL. CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	100%	4%	4%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL							99%

CAPITULO	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANTO O ATRASO
CAPITULO 1 – PARCIAL 1	\$351.704.500	%100	\$351.704.500	%100	0
CAPITULO 2 - FINAL	\$590.604.500	%100	\$590.604.500	%100	0



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 22

REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROPUERTO DE GUAYMARAL



Foto No. 1. Antena instalada



Foto No. 2. Cambio de mástil de pararrayos



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 10 de 22



Foto 3. Gabinete de comunicaciones



Foto 4. reubicación del sistema de inversor red ATN

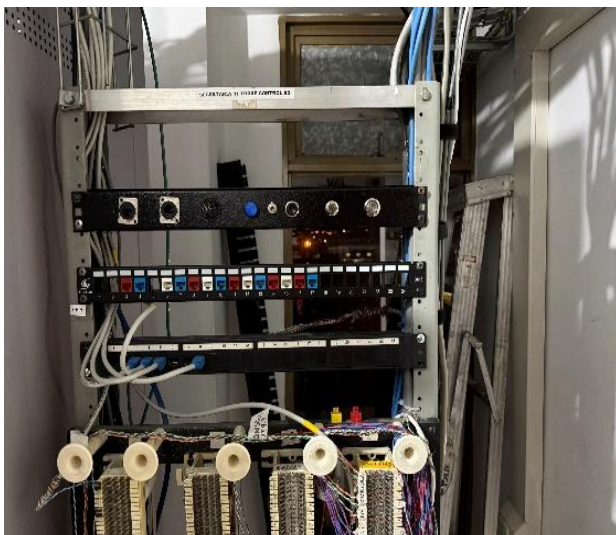


Foto 5. Sistema de patch panel y sistema de prueba

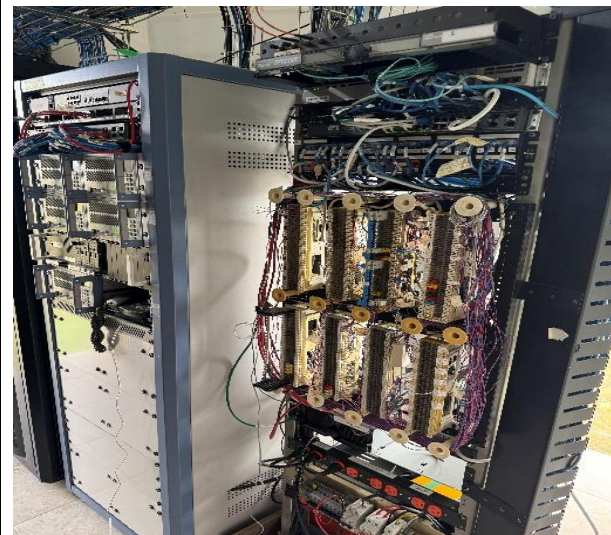


Foto 6. cambio de gabinete y reubicación de radios, equipos red ATN y multiplexor rad.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 11 de 22



Foto 7. Entrega de material sobrante en almacén de Aerocivil Regional Centro Sur



Foto 8. Equipos de energía reubicados en cuarto eléctrico del primer piso



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 12 de 22

REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROPUERTO DE NEIVA



Foto No. 1.



Foto No. 2.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 13 de 22



Foto 3.

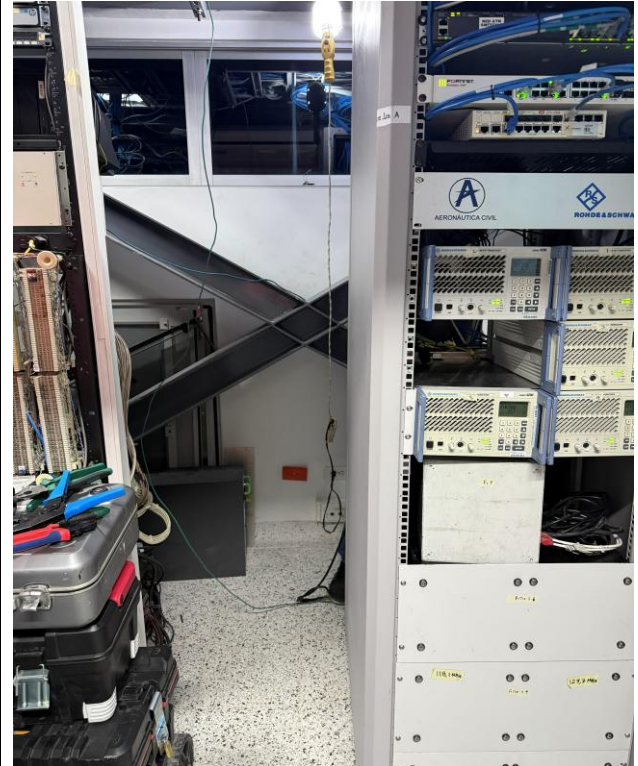


Foto 4.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 14 de 22

REGISTRO FOTOGRAFICO – AEROPUERTO DE LETICIA



Foto No. 1.



Foto No. 2.



Foto 3.



Foto 4.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 15 de 22



Foto 5.



Foto 6.

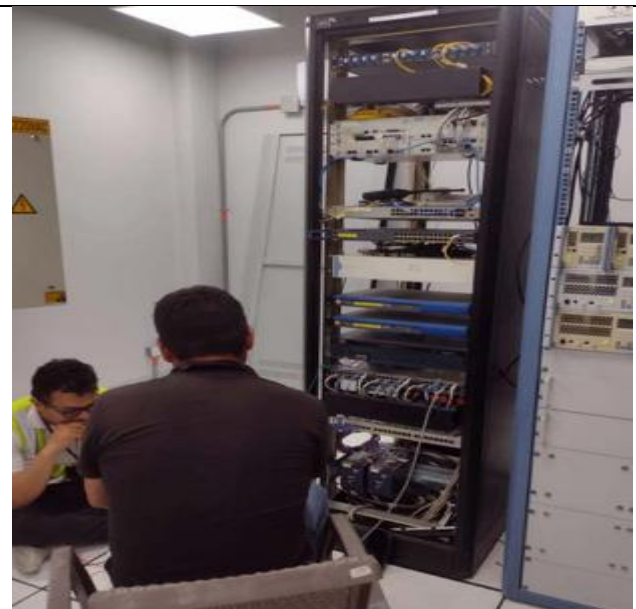


Foto 7.



Foto 8.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 16 de 22

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	A SATISFACCIÓN
1	ESTACION LETICIA				
1.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	2	Terminado	SI
1.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	6	Terminado	SI
1.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	6	Terminado	SI
1.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	6	Terminado	SI
1.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	SI
2	ESTACION NEIVA				
2.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	SI
	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 2 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	antena instalada	SI
2.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	4	Terminado	SI
2.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	4	Terminado	SI
2.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE	GBL	4	terminado	SI



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 17 de 22

	CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES				
2.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	SI
3	ESTACION GUAYMARAL				
3.1	UNA (1) ANTENA COLINEAL DE 3 ELEMENTOS (DIPOLOS)	UND	1	La antena está instalada y operativa	SI
3.2	ACCESORIOS PARA REINSTALACION Y REUBICACION DE RADIOS R&S SERIES 4200.	GBL	3	Terminado	SI
3.3	MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS E&M	GBL	3	Terminado	SI
3.4	SEPARACION DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE CABLOFILL, CINTA VELCRO Y AMARRES	GBL	3	Terminado	SI



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 18 de 22

3.5	IDENTIFICACION Y ROTULACION DEL SISTEMA DE ANTENAS VHF Y VHF DE ALCANCE EXTENDIDO (TANTO EN LA ANTENA COMO EN EL EQUIPO), CAMBIO DE CABLE ACTUAL DE LAS ANTENAS POR CABLES HELIAX DE 1/2 Y CONECTORES ENTRE LOS EQUIPOS Y ANTENAS REORGANIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ANTENAS VHF DE LOS RADIOS Y EQUIPOS DE LA TWR, SEPARACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CALIBRACION DE FILTROS, PRUEBAS DE COBERTURA, PRUEBAS DE INTERFERENCIAS E INTERMODULACIONES, AJUSTE DE POTENCIAS Y PUESTA EN MARCHA	GBL	1	Terminado	SI
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----------	----

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se realizo prorroga por retraso del proyecto de radares en Leticia

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

6. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

7.1 EXAMEN OCUPACIONAL



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 19 de 22

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
-	-

7.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
17 de junio del 2025	

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
2		X

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

9.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: \$590.604.500



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 20 de 22

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO

No. PAGO	FECHA DE RADICACIÓN EN CxP	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN PAGOS	SALDO POR PAGAR
2	-	351.704.500	351.704.500	59.5%	\$238.900.000

9.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO:	16 JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30 NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$590.604.500
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$590.604.500
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	%100
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	\$590.604.500
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	%100
% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)	0

9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	5 MESES Y 15 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	4,7
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	100%

10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:	NO APLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN:	NO APLICA
SOLICITUD DE PRORROGA:	El plazo de ejecución del presente contrato es de CINCO (5) MESES y QUINCE (15 DIAS, término contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 21 de 22

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:	NO APLICA
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:	NO APLICA
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:	NO APLICA

ESTADO DE LAS GARANTIAS

Clase de Garantía:	cumplimiento		
Número de Garantía:	18-44-101106881		
Fecha de Expedición de la Garantía.	10/10/2025	fecha de aprobación de la garantía	16/10/2025
Descripción del Amparo:	cumplimiento		
Porcentaje:	20%		
Anexo:	3		
Descripción del Amparo:	pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		
Porcentaje:	20%		
Anexo:	3		
Descripción del Amparo:	calidad y correcto funcionamiento de los bienes		
Porcentaje:	20%		
Anexo:	3		
Clase de Garantía:	responsabilidad civil extracontractual		
Número de Garantía:	18-40-101078589		
Fecha de Expedición de la Garantía.	10/10/2025	fecha de aprobación de la garantía	16/10/2025
Descripción del Amparo:	predios labores y operaciones - responsabilidad civil patronal - vehiculos propios y no propios		
Porcentaje o valor:	200 SMMLV		
Anexo:	3		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
3300.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 22 de 22

JESÚS SAUMETH G

JESUS ELIAS SAUMETH
APOYO TÉCNICO

PAULA ANDREA RUEDA
APOYO JURIDICO

GINETH ANDREA NARANJO GOMEZ
REVISION FINANCIERA

HENRY ANDRES CORDOBA
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
