

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_006	LUGAR: Presencial Sede Principal MinTic y Virtual Microsoft Teams.	FECHA: 18/12/2024	HORA DE INICIO: 11:40 am	HORA FINAL: 11:55 am

OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de Diciembre de 2024.

ORDEN DEL DÍA
- Avances Generales AE4 - Avance Expansión de Red - Habilitación de Nodos


SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	En proceso (Pendiente de Aprobación Memorias de Calculo por parte de la Supervisión)
2	Realizar la Proyección de entrega de los Municipios	En proceso (En Revisión por parte de la Supervisión)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Específico N. 4, entre Internexa y el equipo del MinTic, El propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Internexa informa que, en relación con el Acuerdo Especifico N.4, se ha venido avanzando sin inconvenientes. Avances Generales AE4 ✓ Satelital: Internexa informa que se envió un comunicado al MinTic con las aclaraciones correspondientes al proceso satelital con el fin de actualizar las memorias de cálculo e informar que municipios serán por fibra o satelital, incluyendo también el incremento en el número de antenas.




 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

- ✓ **Proceso Convocatorias ISP's:** Internexa informa que se han realizado reuniones con Conexión Choco, logrando avance en los temas tratados. Actualmente, se está a la espera de recibir las observaciones por parte de Conexión Choco, las cuales permitirán continuar con el proceso de manera satisfactoria.

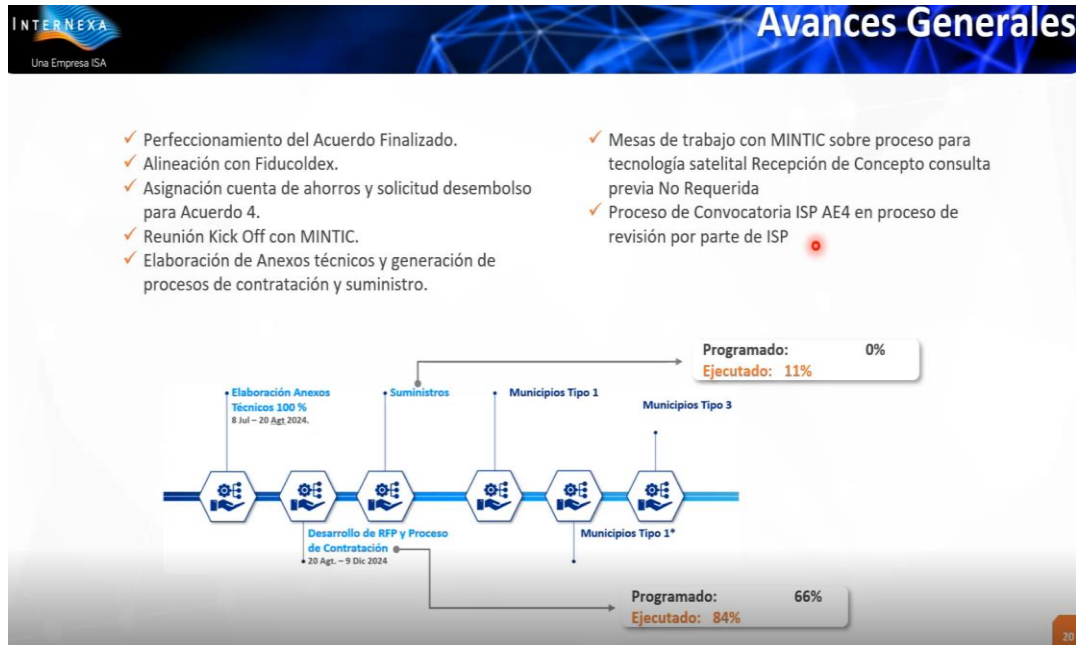

2. Avance Expansión de Red

- ✓ Durante la sesión, Internexa informó sobre el avance de la expansión, destacando que se tiene un avance de tendido del 66 km tendidos de los cuales 56 km ya están terminados y están pendientes 14 km por tendido.
- ✓ Internexa informa que se está trabajando en la entrega documental correspondiente a la habilitación de los nodos de Atrato, Cértegui, Unión P, Tadó, Istmina y Condoto, los cuales se encuentran al 100% operativos.
- ✓ El Equipo de Supervisión informa que para el año 2025, se tiene previsto realizar las visitas ya sean presenciales o virtuales ya que se está llevando a cabo la entrega documental, quedando pendiente la inspección y verificación con el fin de proceder con la entrega de los nodos.
- ✓ Internexa informa que se están llevando a cabo las validaciones de los entregables y en cada sesión, se está realizando un acta con las observaciones correspondientes.

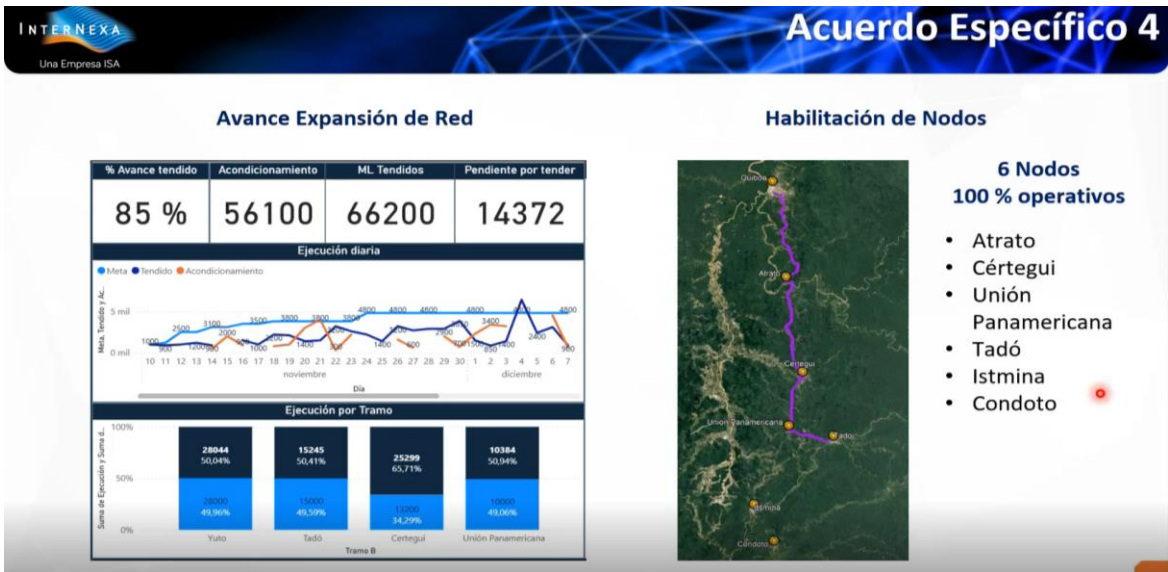

3. Habilitación de Nodos

- ✓ Durante la sesión, Internexa presenta las imágenes que muestran el estado actual de los nodos Atrato, Cértegui, Unión P, Tadó, Istmina y Condoto, los cuales ya se encuentran operativos. Se espera que lleguen los ISP e inicien el proceso de conexión.
- ✓ Internexa informa que los seis nodos se iban a habilitar inicialmente con capacidad de terceros (como lo describe la ingeniería de detalle), una vez se termine el proceso de construcción o expansión, se habilitara la capacidad propia de Internexa.
- ✓ Internexa informa que se iniciará con el cargue de los entregables correspondientes a la Expansión de Red y se avanzará en las mesas técnicas con el equipo de supervisión para la entrega de los cuatro(4) Municipios contemplados en dicha expansión.



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	Internexa – MinTic	En Proceso
Realizar la Proyección de Entrega de los Municipios	Internexa – MinTic	En Proceso



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Denice Bibiana Acero	Directora Infraestructura	MinTic
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Andres Felipe Carrillo G.	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
Oscar Julian Ayala	Grupo de Apoyo a la Supervisión – Aspectos Financieros	MinTic
John Jairo Gonzalez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Fabian Yesid Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
Camilo Andres Rodriguez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Jurídico	MinTic
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - AE2	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas AE4	Internexa
Daniel Gomez Vanegas	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas -AE5	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAD para Cambiar Vidas	Internexa
Melisa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAD para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDAD para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Angela Patricia Ríos	Especialista Proyecto ConectiVIDAD para Cambiar Vidas – Fiduciaria	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAD para Cambiar Vidas	Internexa
Juan Diego Bedoya	Analista Administrativo Proyecto ConectiVIDAD para Cambiar Vidas	Internexa
Jorge Luis Rodriguez	Ingeniero Expansión JR.	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa
Juan Carlos Suárez	Ingeniero Expansión	Internexa
Juan Carlos Osorno	Ingeniero de Proyectos	Internexa
Nina Elizabeth Pinto	Especialista Compliance	Internexa
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Angela María Estrada	Especialista Jurídico y Relaciones Institucionales	Internexa
Andres Esteban Vásquez	Especialista Expansión	Internexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo	Internexa
Katherine Milena Camargo	Analista Administrativo	Internexa



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo	Internexa

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Inicial: JFR
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Inicial: LFR
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A...

Anexos
Presentación Comité Operativo 18122024
