

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_007	LUGAR: Presencial Sede Principal MinTic y Virtual Microsoft Teams.	FECHA: 31/01/2025	HORA DE INICIO: 10:06 am	HORA FINAL: 10:25 am

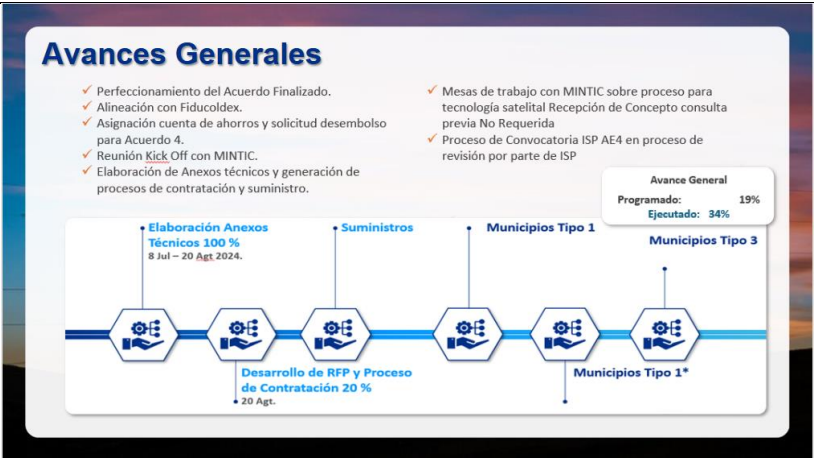
OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de Enero de 2025.

ORDEN DEL DÍA
1. Avances Generales 2. Avance Expansión de Red y Habilitación de Nodos 3. Actividades Clave

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	En proceso (Pendiente de Aprobación Memorias de Calculo por parte de la Supervisión)
2	Realizar la Proyección de entrega de los Municipios	En proceso (En Revisión por parte de la Supervisión)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Específico N. 4, entre InterNexa y el equipo del MinTic, El propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 1. Avances Generales ✓ Internexa realiza presentación de los avances generales de manera detallada las actividades planificadas para el Acuerdo Específico N.4.





2. Avance Expansión de Red y Habilitación de Nodos

- ✓ **Expansión:** InterNexa informa que ha finalizado la expansión, donde se ha construido un total de 76 km y acondicionados 74 km. Actualmente, se están realizando los ajustes finales, quedando 2 km por detallar. No obstante, se confirma que el tendido está completamente finalizado con el objetivo de realizar las mesas de trabajo con el equipo de supervisión para realizar la entrega correspondiente.
- ✓ **Habilitación de nodos:** Durante la sesión, InterNexa confirmó que los seis nodos (Atrato, Cértégui, Unión P, Tadó, Istmina y Condoto) entregados en diciembre están 100% operativos. Sin embargo, se está llevando a cabo un ajuste en las memorias de cálculo, ya que no se incluyó un ítem para la adecuación del nodo Indoor con el fin de realizar una mesa de trabajo para presentar la propuesta del modelo económico.
- ✓ InterNexa informa que se llevará a cabo la Coubicación en algunos nodos. Así mismo, en algunos sitios que inicialmente tenían capacidad satelital y se van a entregar con capacidad terrestres (FO).





TIC

ACTA DE REUNIÓN



Avances Generales

Habilitación de Nodos



CondominioUnión Panamericana

3. Actividades Clave

- ✓ Durante la sesión, InterNexa presentó de manera detallada las actividades planificadas para el Acuerdo Específico N.4.

Acuerdo Específico N°. 4

Actividades Clave

Próximas

- ▶ Mesas técnicas con la supervisión para entrega de expansión de red 76000 mts
- ▶ Mesas técnicas con la supervisión para ajuste de las memorias de cálculo (Adecuación Nodos Indoor, Adecuación Nodo Outdoor)
- ▶ Facturación expansión de red
- ▶ Facturación habilitación de 6 Nodos
- ▶ Mesa técnicas con la supervisión para el inicio de O&M.
- ▶ Próxima entrega habilitación de 13 Nodos Abril 2025
- ▶ Riosucio y San José del Palmar, se entregarán con capacidad terrestre lineal.
- ▶ Medio Baudó que inicialmente tenía fecha de cronograma para septiembre pasará a entregarse en abril de 2025.
- ▶ Carmen del Darién que inicialmente estaba en cronograma para Abril, se entregaría en septiembre.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Pendiente Otrosí N.1 Acuerdo Especifico 4	Internexa – MinTic	En Proceso
Realizar la Proyección de entrega de los Municipios	Internexa – MinTic	En Proceso
Realizar Mesa de Trabajo para iniciar Entregas de la Expansión de Red	Internexa – MinTic	14/02/2025
Realizar Mesa de Trabajo para retomar la revisión y aprobación de las Memoria de cálculo.	Internexa – MinTic	20/02/2025




TIC
ACTA DE REUNIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA



NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Fabian Yesid Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión – Aspectos Técnicos	MinTic
John Jairo Gonzalez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Marco Esteven Fontecha	Grupo de apoyo a la Supervisión – Aspectos Técnicos	MinTic
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Mónica del Rosario Paz	Profesional Especializada Subdirección de Estructuración	MinTic
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas AE2 -AE5	Internexa
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Juan Diego Bedoya	Analista Administrativo Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Melissa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas AE4	Internexa
Daniel Gomez Vanegas	Gerente de Proyecto ConectiVIDad para Cambiar Vidas AE5	Internexa
Katherine Milena Camargo	Analista Administrativo	Internexa
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo ISP	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo	Internexa
Vannesa Pineda Prieto	Especialista Socioambiental	Internexa
Yina Paola Gonzalez	Ingeniero Preventa SR	Internexa
Juan Carlos Osorno	Ingeniero Proyectos	Internexa
Juliana Saldarriaga	Especialista Jurídico y Relaciones Institucionales	Internexa
Angela Patricia Ríos	Especialista – Fiducia	Internexa
Andres Esteban Vásquez	Especialista Expansión	Internexa
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Paola Ruiz Gonzalez	Analista Administrativo	Internexa

REGISTRO DE FIRMAS

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Inicial JFCR



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Inicial LFR
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A...

Anexos

- Presentación Comité Operativo 31012025
