

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_008	LUGAR: Virtual Microsoft Teams	FECHA: 27/02/2025	HORA DE INICIO: 11:06 am	HORA FINAL: 11:14 am


OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DE 2024 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al mes de febrero de 2025.

ORDEN DEL DÍA
1. Avances Generales. 2. Avance Expansión de Red 3. Actividades Claves 4. Informes Mensuales

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Realizar mesa de trabajo para realizar la entrega de la expansión de red.	En proceso
2	Realizar mesa de trabajo para la actualización de las memorias de cálculo.	En proceso


DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia el Comité Operativo del Acuerdo Especifico N. 4, entre InterNexa y el equipo del MinTic, el propósito de este comité es revisar el avance de las actividades acordadas, abordar los temas pertinentes a la ejecución del acuerdo, y coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 1. Avances Generales InterNexa informa que la semana pasada se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la supervisión, durante esta reunión se presentó la propuesta de ajuste de las memorias de cálculo, con el fin de legalizar la entrega anticipada de los seis (6) municipios correspondientes al mes de diciembre y facilitar la entrega de los trece municipios restantes, programada para el mes de abril de 2025.



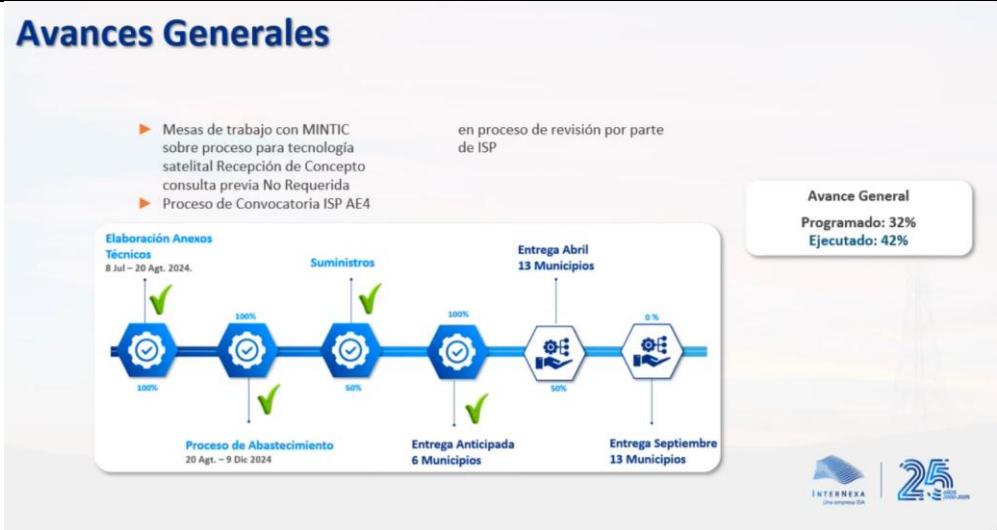

2. Avance Expansión de Red

- ✓ **Expansión:** InterNexa indica que se ha culminado la etapa de expansión, durante la cual se han construido un total de 76 km de tendido y están 100% acondicionados.
- ✓ **Habilitación de nodos:** InterNexa indica que los seis (6) Nodos (Atrato, Certegui, Unión P, Tado, Istmina y Condoto) entregados en diciembre están 100% operativos.

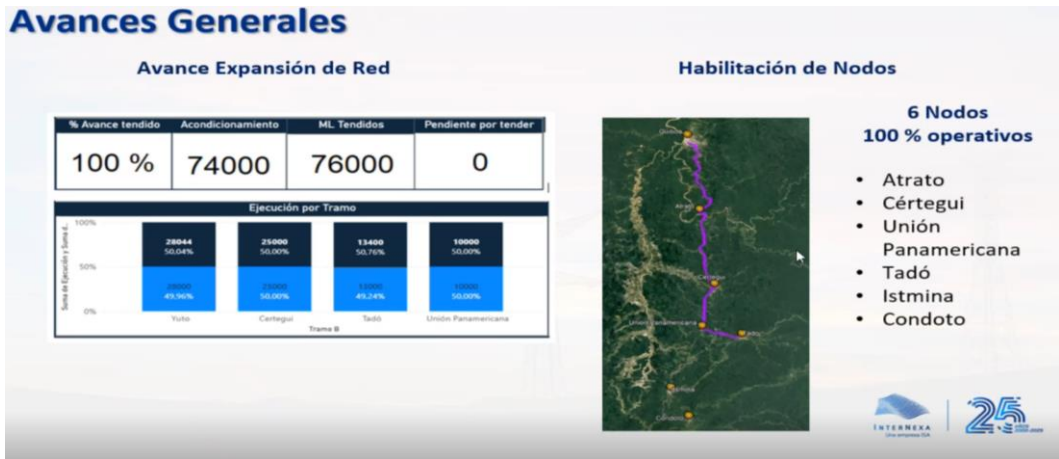

- ✓ **Registro Fotográfico:** InterNexa presenta los registros fotográficos de los Nodos Atrato, Certeguí, Condoto y Unión Panamericana.



TIC

ACTA DE REUNIÓN



Avances Generales

Habilitación de Nodos



Atrato



Certegui



Avances Generales

Habilitación de Nodos



Condoto



Unión Panamericana



3. Actividades Clave

InterNexa presenta las actividades claves en detalle que se han llevado a cabo para el Acuerdo Específico N.4:

- ✓ InterNexa informó que para la próxima semana se tienen programadas mesas técnicas con la supervisión para la entrega de la expansión de Red.
- ✓ InterNexa indica que ha estado avanzando en la habilitación de trece (13) nodos sin novedades, a pesar del paro armado ocurrido en el sur del Chocó, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad establecidas por ISA.
- ✓ InterNexa informa que, una vez se defina los ajustes en las memorias de cálculo, se deberá elaborar un otro si para legalizar la actualización formalmente.






TIC

ACTA DE REUNIÓN



- ✓ InterNexa informa que acompañará a Mintic a Quibdó el 28 de febrero de 2025, para la mesa de trabajo con los ISP locales de Chocó. Para lograr determinar si se tiene disponibilidad de capacidad en radio proporcionada por estos ISP, en caso de incluir la capacidad de radio al acuerdo 4. Será necesario extender el cronograma en aproximadamente 60 días adicionales y así mismo, se deberá que llevar a cabo una socialización con el Mintic sobre los permisos ambientales y SLA para este tipo de despliegue y tecnología.
- ✓ InterNexa informa que la fecha límite para el inicio de actividades relacionadas con la entrega de los municipios de septiembre es el 7 de marzo y que en el caso de avanzar con el tema de Radios se deberá lanzar el proceso respectivo, rondas de preguntas y respuestas, utilizar la plataforma de Ariba y seguir el procedimiento establecido tanto por InterNexa como por ISA para asegurar el cumplimiento de la entrega.

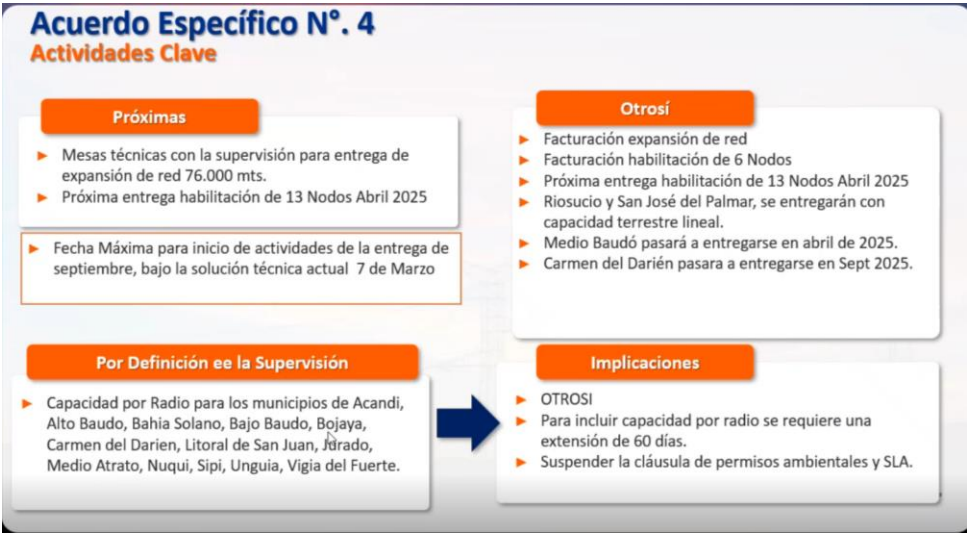

4. Informes mensuales

- ✓ El equipo de apoyo a la supervisión indica que enviaron las observaciones de los informes de los meses de noviembre, diciembre y enero. Por su parte, InterNexa informa que procederá con la respectiva subsanación de los informes.

Informe Mensuales				
Estado de aprobación / conformidad				
No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Octubre – 2024			
2	Noviembre – 2024			
3	Diciembre – 2024			
4	Enero - 2025			

 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Realizar la radicación de la subsanación de los informes mensuales noviembre, diciembre 2024 y enero 2025.	InterNexa	03/03/2025
Realizar mesa de trabajo para realizar la entrega de la expansión de red.	InterNexa	En proceso (Se están llevando a cabo las mesas de trabajo correspondientes)
Realizar mesa de trabajo para la actualización de las memorias de cálculo	InterNexa	14/03/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	MinTic
Luis Fernando Roncancio	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Marco Esteven Fontecha	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
Sebastián Chaparro	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Técnicos	MinTic
John Jairo González	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Fabian Yanquen	Grupo de Apoyo a la Supervisión	MinTic
Camilo Andrés Rodríguez	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Jurídicos	MinTic
Oscar Julian Ayala	Grupo de Apoyo a la Supervisión - Aspectos Financieros	MinTic
Alberto Oliveros	Asesor Técnico Proyecto ConectiVIDAd Para Cambiar Vidas	MinTic
Luis Fernando Jiménez	Profesional Especializado Dirección de Infraestructura	MinTic
Diana Milena Jaramillo	Directora Proyecto Plan Nacional de ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Erika Johana Ferro	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas - ISP's	Internexa
Melissa Lozano	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Juan Diego Bedoya	Especialista PNC Jr • Dirección PNC	Internexa
John Fredy Chía	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Juliana Saldarriaga	Especialista Jurídico y Relaciones Institucionales	Internexa
Luis Carlos Páez	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Angela Ríos	Especialista Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Roger García	PMO - Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Juan Carlos Osorno	Ingeniero de Proyectos	Internexa
José Ferney Mora	Especialista Socioambiental	Internexa
Daniel Gómez	Gerente de Proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas	Internexa
Juan Carlos Osorno	Ingeniero de Proyectos	Internexa
Paola Ruiz González	Analista Administrativo	Internexa
Michell Andrea Garizabalo	Analista Administrativo	Internexa
Katherine Camargo	Analista Administrativo	Internexa



 TIC	ACTA DE REUNIÓN	
---	------------------------	--

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by: <i>Diana Milena Jaramillo Agudelo</i> 75AFED9F3BFE439... Inicial EMJ Inicial JFCR
Denice Bibiana Acero	Directora de Infraestructura	Firmado por: <i>Denice Bibiana Acero</i> 6AAA3F2A9BB14AE... Inicial Luis F. Acero
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por: <i>Juan Manuel Guerrero</i> C99EA4CCE7F348A... Inicial JMG

Anexos
Presentación Comité Operativo 26022025



Comité Operativo Proyecto Conectividad Para Cambiar Vidas

Convenio 790 de 2023



Honrando el pasado, celebrando
el presente, y proyectando el
futuro para seguir construyendo
un mundo digitalmente humano.





Acuerdo Específico 2

Timeline Expansión de Red



Avances Implementación

TRAMO	ORIGEN	DESTINO	KM A CONSTRUIR (Incluye reservas)	KM CONSTRUIDOS	ESTADO
Tramo 1	Medellín	Peñalisa	73 Km	66.0Km	En ejecución 66 Km tendidos (90%)
Tramo 2	Peñalisa	Carmen de Atrato	58 Km	58Km	Terminado 58Km tendidos (100%)
Tramo 3	Carmen de Atrato	Quibdó	103 Km	94Km	En ejecución 94Km tendidos (91%) Pendiente cierre negociación: 2 comunidades indígenas. 21 de febrero se solicitó ampliación EFM con radicado No. 251018762



- Tramo 1
Medellín – Peñalisa
- Tramo 2
Peñalisa – Carmen de Atrato
- Tramo 3
Carmen de Atrato - Quibdó



Avance predial y comunidades

Tipo de Comunidad	Total	Aceptaron	En proceso	% Avance
Comunidades Indígenas	20	18	2	90%
Comunidades Afro	4	4	0	100%
Juntas de Acción Comunal	2	2	0	100%
Total	26	24	2	92%
NUEVA RUTA				
Tipo de Comunidad	Total	Aceptaron	En proceso	% Avance
Comunidades Indigenas	6	6	0	100%
Comunidades Afro	0	N/A	N/A	N/A
Juntas de Acción Comunal	1	1	0	100%
Total	7	7	0	100%

Ejecución Financiera

Valor Total del AE2 \$ 270,588,385,506

Red Troncal ITX \$ 172,313,115,309

Recursos Desembolsados a ITX \$ 78,294,933,783

45% En proceso de legalización
\$ 4.283.297.481 (5%)

Facturas Emitidas \$ 5,476,022,535

▶ Capacidad Fija Diciembre
▶ Capacidad Variable Diciembre

Pendiente Facturación \$ 4.468.808.343


▶ Capacidad Fija Enero
▶ Capacidad Variable Enero

Ejecución Financiera

Ejecución Presupuestal

Troncal


2023: \$ 19.352 Mn
2024: \$ 61.828 Mn
2025: \$ 73.193 Mn
2026: \$ 17.940 Mn

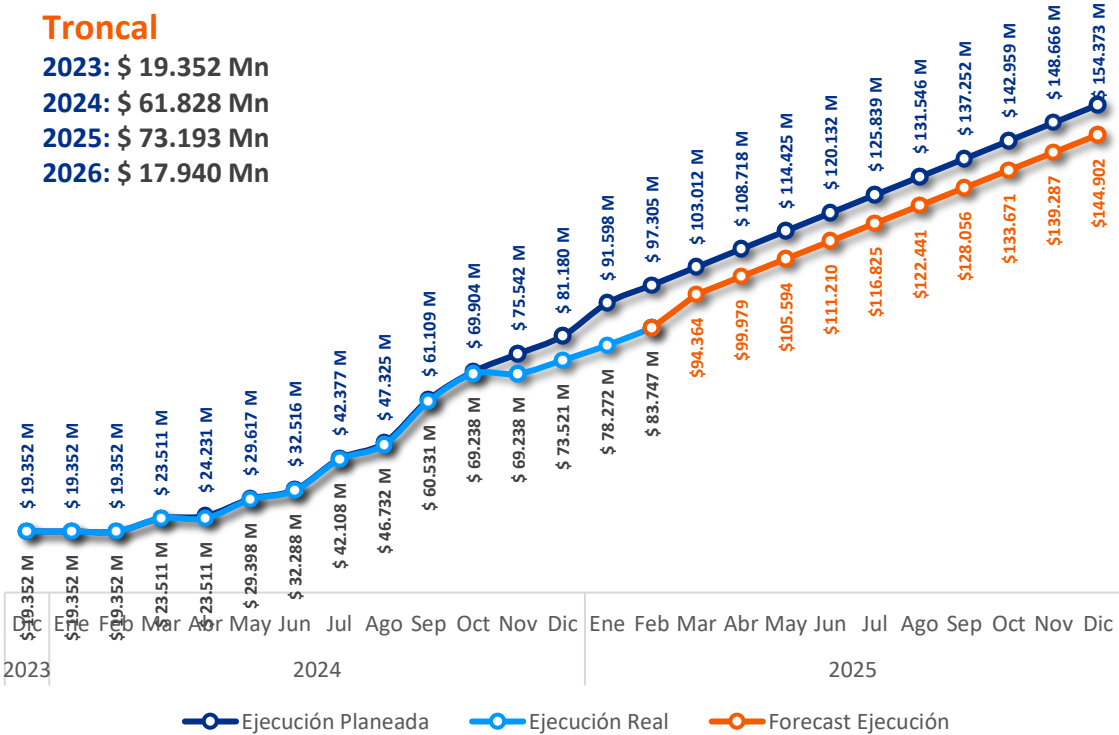

Acceso

2024: \$ 94.643 Mn
2025: \$ 3.338 Mn
2026: \$ 288 Mn

Pendiente aprobación comité:
\$ 1.868.650.000

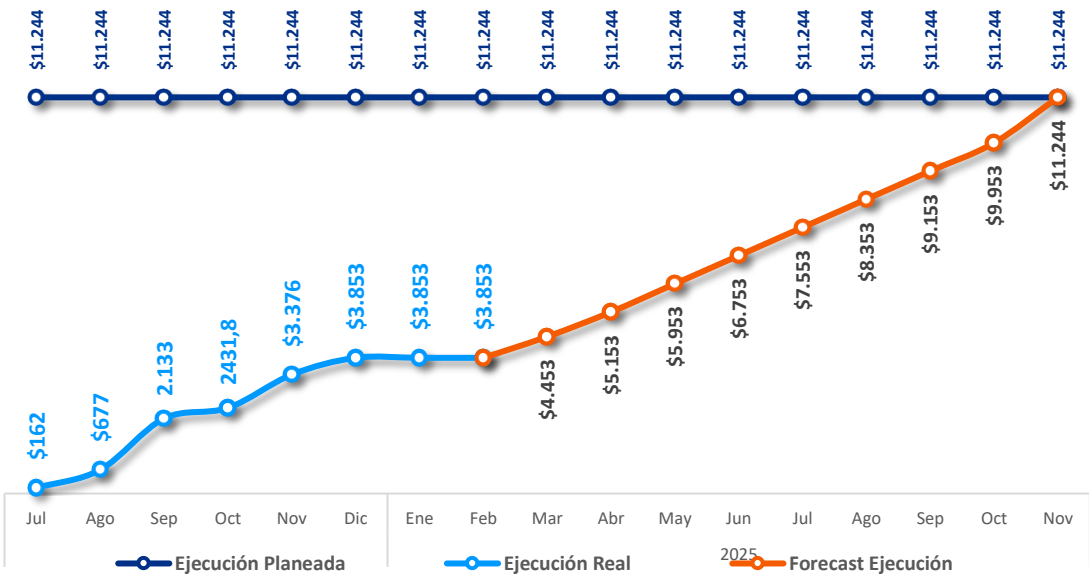

- Ejecución financiera de la red troncal al 99% - 4% red de Acceso: 40% sobre presupuestado en 2024
- Ejecución financiera luego de medidas ~ 50% Pago inicial por habilitación de Municipios adicionados + hogares legalizados



Etapa de Operación

Informes de seguimiento

No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Octubre	241094158 del 08/11/2024 241102666 del 04/12/2024 241108477 del 23/12/2024	242157067 del 26/11/2024	En revisión MINTIC
2	Noviembre	241103629 del 06/12/2024 241110540 del 31/12/2024 251008679 del 27/01/2025	241108043 del 23/12/2024 251000863 del 07/01/2025 251014517 del 11/01/2025	Aprobado
3	Diciembre	251001976 del 09/01/2025 251010156 del 30/01/2025	251007016 del 23/01/2025	En revisión de interventoría
4	Enero	251013534 del 07/02/2025		En revisión de interventoría

Etapa de Operación

Riesgo Alto

R1 – Riesgo Reputacional derivado de la administración de los recursos por parte de actores diferentes a internexa

R2 – Dificultades para lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales

Riesgo Medio

R4 – Falta de alineación en los acuerdos y comunicaciones entre los grupos de interés del proyecto

R5 – Desfase o desviaciones en el diseño / implementación de la red

R6 – Fallas en la integración del modelo operativo con JSPs

R7 – Distorsión de mercado y afectación de competencia

Riesgo Bajo

R8 – Dificultades de gestión derivadas del principio de anualidad en el proyecto

R9 – Dificultades para realizar una planeación adecuada del proyecto

R10 – No disponer oportunamente de personal con competencias y capacidades requeridas

R11 – Riesgo de liquidez

Etapa de Operación

Riesgo

R3 – Impactos por situaciones sociales, orden público y ambientales



Causas

1. Demoras o no obtención de permisos ambientales (licencia ambiental, permisos ambientales).
2. Dificultades en el relacionamiento con comunidades del área de influencia del proyecto (consulta previa).
3. Situaciones sociopolíticas de las zonas adversas.
4. Inconvenientes en gestión de servidumbres o paso por predios privados.
5. Situaciones adversas en zonas de conflicto armado y orden público complejo.

Situación identificada en campo



En la expansión del departamento de Chocó, específicamente para el tramo de Carmen de Atrato – Quibdó, comunidades indígenas que no permiten la instalación de la FO y los requerimientos de grupos al margen de la ley, situaciones que han afectado la entrega del departamento, inicialmente prevista para el 18-Oct-2024.


Interventoría reconoció los Eventos de Fuerza Mayor que se presentaron en Chocó y por consiguiente se presenta un corrimiento de la fecha de entrega de la expansión del departamento hasta el **01 de marzo de 2025**.

21 Febrero se radicó actualización de EFM, solicitando ampliación de fecha para entregar la expansión de Chocó hasta el 28 de marzo de 2025.

Acompañamiento ISP's – Seguimiento hogares y Convocatorias

Convocatoria 1 2023 AE2

Adjudicación: 1 de febrero 24
Fin: 31 de marzo 2025

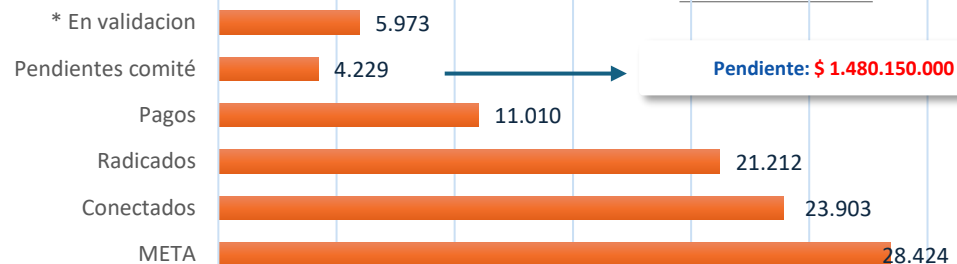

Pendiente: \$ 1.480.150.000

Avance: 84%

Ejecución: \$ 3.853.499.956,19

Validación: subsanación, información incompleta del ISP, documentación no reportada

Convocatoria 1 y 2 2024 AE2

Adjudicación 30 de julio 24




Pendiente: \$ 388.500.000

Avance: 5.71%

Ejecutado : 0

Convocatoria 3 2024 AE2

Adjudicación: 26 de Noviembre 2024



Avance: 0%

Ejecución: \$ 0

Convocatoria 1 2025 AE2

Meta: 7.807
Municipios: 9
Estado: Presentación propuestas
Fecha adjudicación: 25 marzo 2025

Convocatoria 4 2024 AE4

Meta: 47.087
Propuestas: 20
ISP: 13
Hogares propuestos: 21,904
Estado: Validación subsanación
Fecha adjudicación 28 febrero 2025
Nota: Tumaco.24.470.



Acompañamiento ISP's


Acciones

- ▶ Comunicado a Wayiranet como respuesta a la solicitud de ajuste de hogares con copia a la interventoría.
- ▶ Mesa de trabajo técnica para análisis de comportamiento de las graficas
- ▶ Espacio con Wayiranet para explicación de las configuraciones realizadas por el ISP
- ▶ Informe con conclusiones, recomendaciones
- ▶ Acompañamiento para las mejores prácticas de configuración.
- ▶ Ampliación de canal temporalmente en aras de contribuir a una mejor percepción del servicio, durante el proceso de verificación y eventuales correcciones que fueran necesarias en la configuración de los servicios


Conclusiones

- ▶ La capacidad entregada al ISP desde el inicio ha sido calculada con base a la cantidad de hogares adjudicados y los parámetros definidos en acuerdo con MINTIC.
- ▶ Sin embargo, el ISP a consumido toda la capacidad a pesar de haberse ampliado para mejorar la percepción de servicio.
- ▶ Como resultado de las verificaciones y validación técnica se evidencia que el ISP no tiene parámetros de configuración y control de reuso
- ▶ En el mismo ejercicio se identifica que no existen parámetros de optimización de BW, calidad de servicio configuradas adicionales,
- ▶ Adicional, se evidencia que la concurrencia en el momento de hacer la validación es del 68%.
- ▶ Se entregara a disposición del ISP las recomendaciones de configuración y parametrización de administración y optimización recomendados.

Graficas de Consumo iniciales



Graficas de Consumo Actuales



Contratos y pólizas ISP

Convocatoria 1 2023

Contratos Firmados	Pólizas Firmadas	Otrosíes	Ordenes Firmadas
11/11	11/11	16/18	18/18

ISP

San Miguel	Serpronet
ERC	Cirtel
Internet y TV	Fibranet
Tierranet	Servinet
Vivettel	Wayira Net
WISP	

Otrosíes >>

Tierranet
Vivettel

Pendiente reportar a la aseguradora (Otrosíes) >>

Wisp
Tierranet
Wayira Net

Convocatoria 1 y 2 2024

Contratos Firmados	Pólizas Firmadas	Otrosíes	Ordenes Firmadas
10/10	10/10	NA	15/15

ISP

Naranja	Serpronet
Conetxia	San Miguel
Channel	Tunorte
Guajiranet	Legon
Tierranet	World Connections

Convocatoria 3 2024

Contratos Firmados	Pólizas Firmadas	Otrosíes	Ordenes Firmadas
4/4	4/4	NA	9/9

ISP

Conetxia
Codisert
Teserpac
Tunorte

Nota: Cifras actualizadas al 21 de febrero de 2025

Varios

- ▶ Retomar mesas de trabajo jurídicas (ANS).
- ▶ Resultado visitas de interventoría – Copia formatos de visita.
- ▶ Aprobación facturación ISP.
- ▶ Revisión memorias de cálculo ajustadas (Otrosí).
- ▶ Autorización de pago facturas aprobadas en el Comité Asesor 46 – Orden de pago.



Acuerdo Específico 1

Cerrado y Liquidado



Acuerdo Específico 3

Cierre y Liquidación

PENDIENTE

- ▶ Acta de liquidación
- ▶ Informe final enviado Enero 9/2025
- ▶ Conformidad del Informe Final Febrero 21/2025



Acuerdo Específico 4

Avances Generales

- ▶ Mesas de trabajo con MINTIC sobre proceso para tecnología satelital Recepción de Concepto consulta previa No Requerida
- ▶ Proceso de Convocatoria ISP AE4

en proceso de revisión por parte de ISP


Avance General

Programado: 32%

Ejecutado: 42%

Elaboración Anexos Técnicos

8 Jul – 20 Agt. 2024.

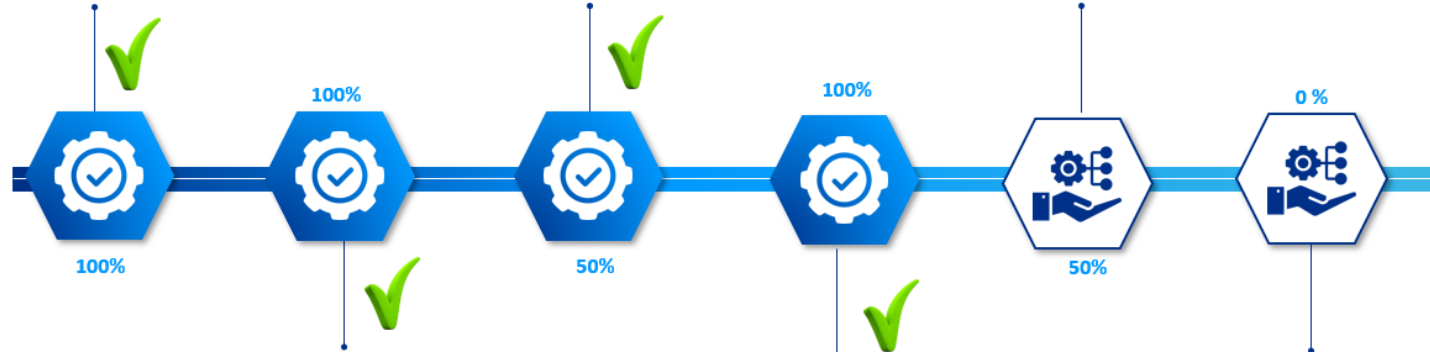

Proceso de Abastecimiento

20 Agt. – 9 Dic 2024

Entrega Anticipada
6 Municipios

Entrega Septiembre
13 Municipios

Avances Generales

Avance Expansión de Red


% Avance tendido	Acondicionamiento	ML Tendidos	Pendiente por tender
100 %	74000	76000	0



Habilitación de Nodos

6 Nodos
100 % operativos

- Atrato
- Cértégui
- Unión Panamericana
- Tadó
- Istmina
- Condoto

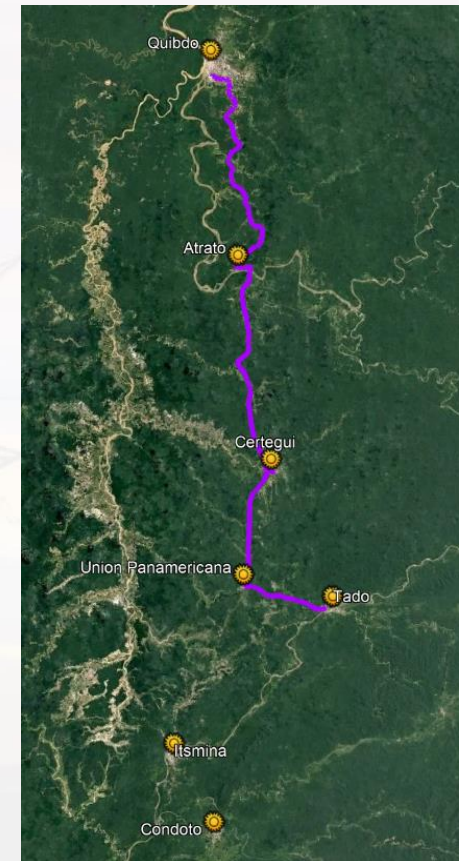

Avances Generales

Habilitación de Nodos



Atrato



Certegui

Avances Generales

Habilitación de Nodos



Condoto



Unión Panamericana

Acuerdo Específico N°. 4

Actividades Clave

Próximas

- ▶ Mesas técnicas con la supervisión para entrega de expansión de red 76.000 mts.
- ▶ Próxima entrega habilitación de 13 Nodos Abril 2025

- ▶ Fecha Máxima para inicio de actividades de la entrega de septiembre, bajo la solución técnica actual 7 de Marzo

Por Definición ee la Supervisión

- ▶ Capacidad por Radio para los municipios de Acandi, Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojaya, Carmen del Darién, Litoral de San Juan, Jurado, Medio Atrato, Nuquí, Sipi, Unguía, Vigía del Fuerte.



Otrosí

- ▶ Facturación expansión de red
- ▶ Facturación habilitación de 6 Nodos
- ▶ Próxima entrega habilitación de 13 Nodos Abril 2025
- ▶ Riosucio y San José del Palmar, se entregarán con capacidad terrestre lineal.
- ▶ Medio Baudó pasará a entregarse en abril de 2025.
- ▶ Carmen del Darién pasara a entregarse en Sept 2025.

Implicaciones


- ▶ OTROSI
- ▶ Para incluir capacidad por radio se requiere una extensión de 60 días.
- ▶ Suspender la cláusula de permisos ambientales y SLA.



Acuerdo Específico 5

Acuerdo Específico N° 5

Cronograma

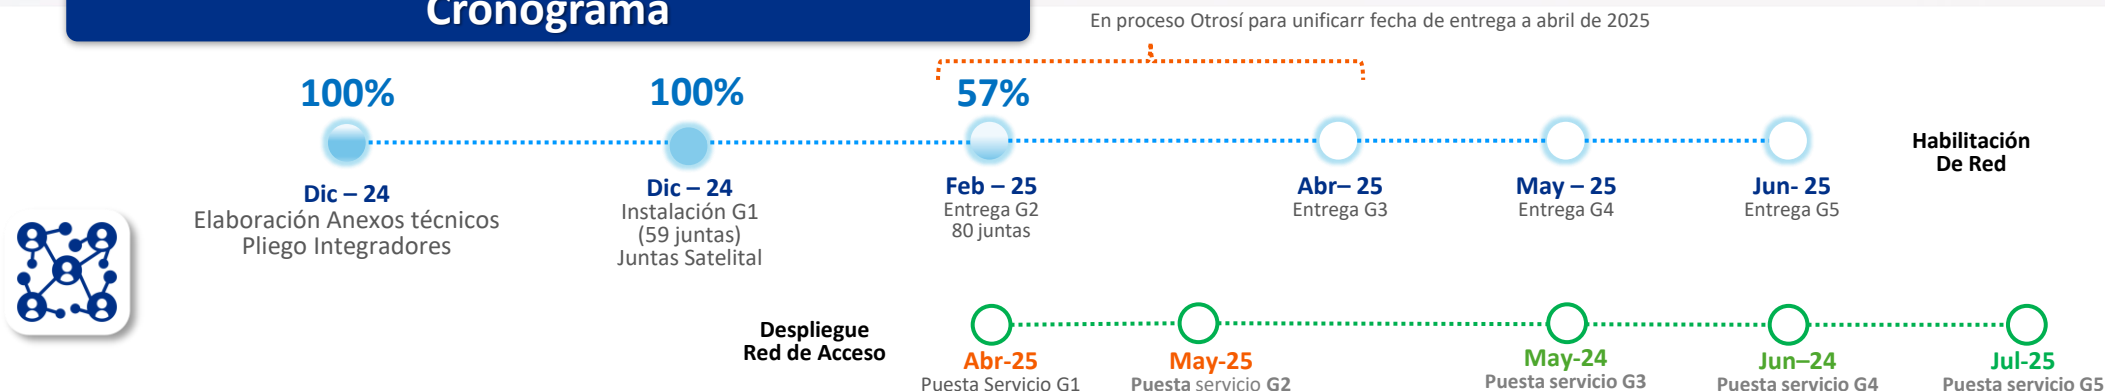

Información Acuerdo

+52.000
Total Hogares Objetivo


+\$189.000 Mn
Valor Total del Acuerdo

31/07/26
Plazo

Actividades Foco


- ▶ Aprobación Juntas grupo 1. (Entregadas 31/Dic/24)
- ▶ Avances Implementación.
- ▶ Adjudicación Selección Integradores. Fecha estimada de adjudicación 10/Marzo 2025
- ▶ Pendiente modificatorio para entrega de los grupos 2 y 3. (Borrador final 17/Feb)
- ▶ En gestión subsanar respuesta escalamiento de juntas satelitales grupos 2 y 3.
- ▶ Pendiente confirmación recepción de nuevo grupo de juntas formalizadas para nuevos procesos – Grupo 4 y 5.

- ▶ Recursos pendientes por desembolsar a la fiducia **\$2.656 Mn** correspondiente al primer desembolso.
- ▶ Recursos pendientes por desembolsar a la fiducia **\$184.418 Mn** correspondiente al segundo desembolso



Acuerdo Específico No.5

Ruta Crítica

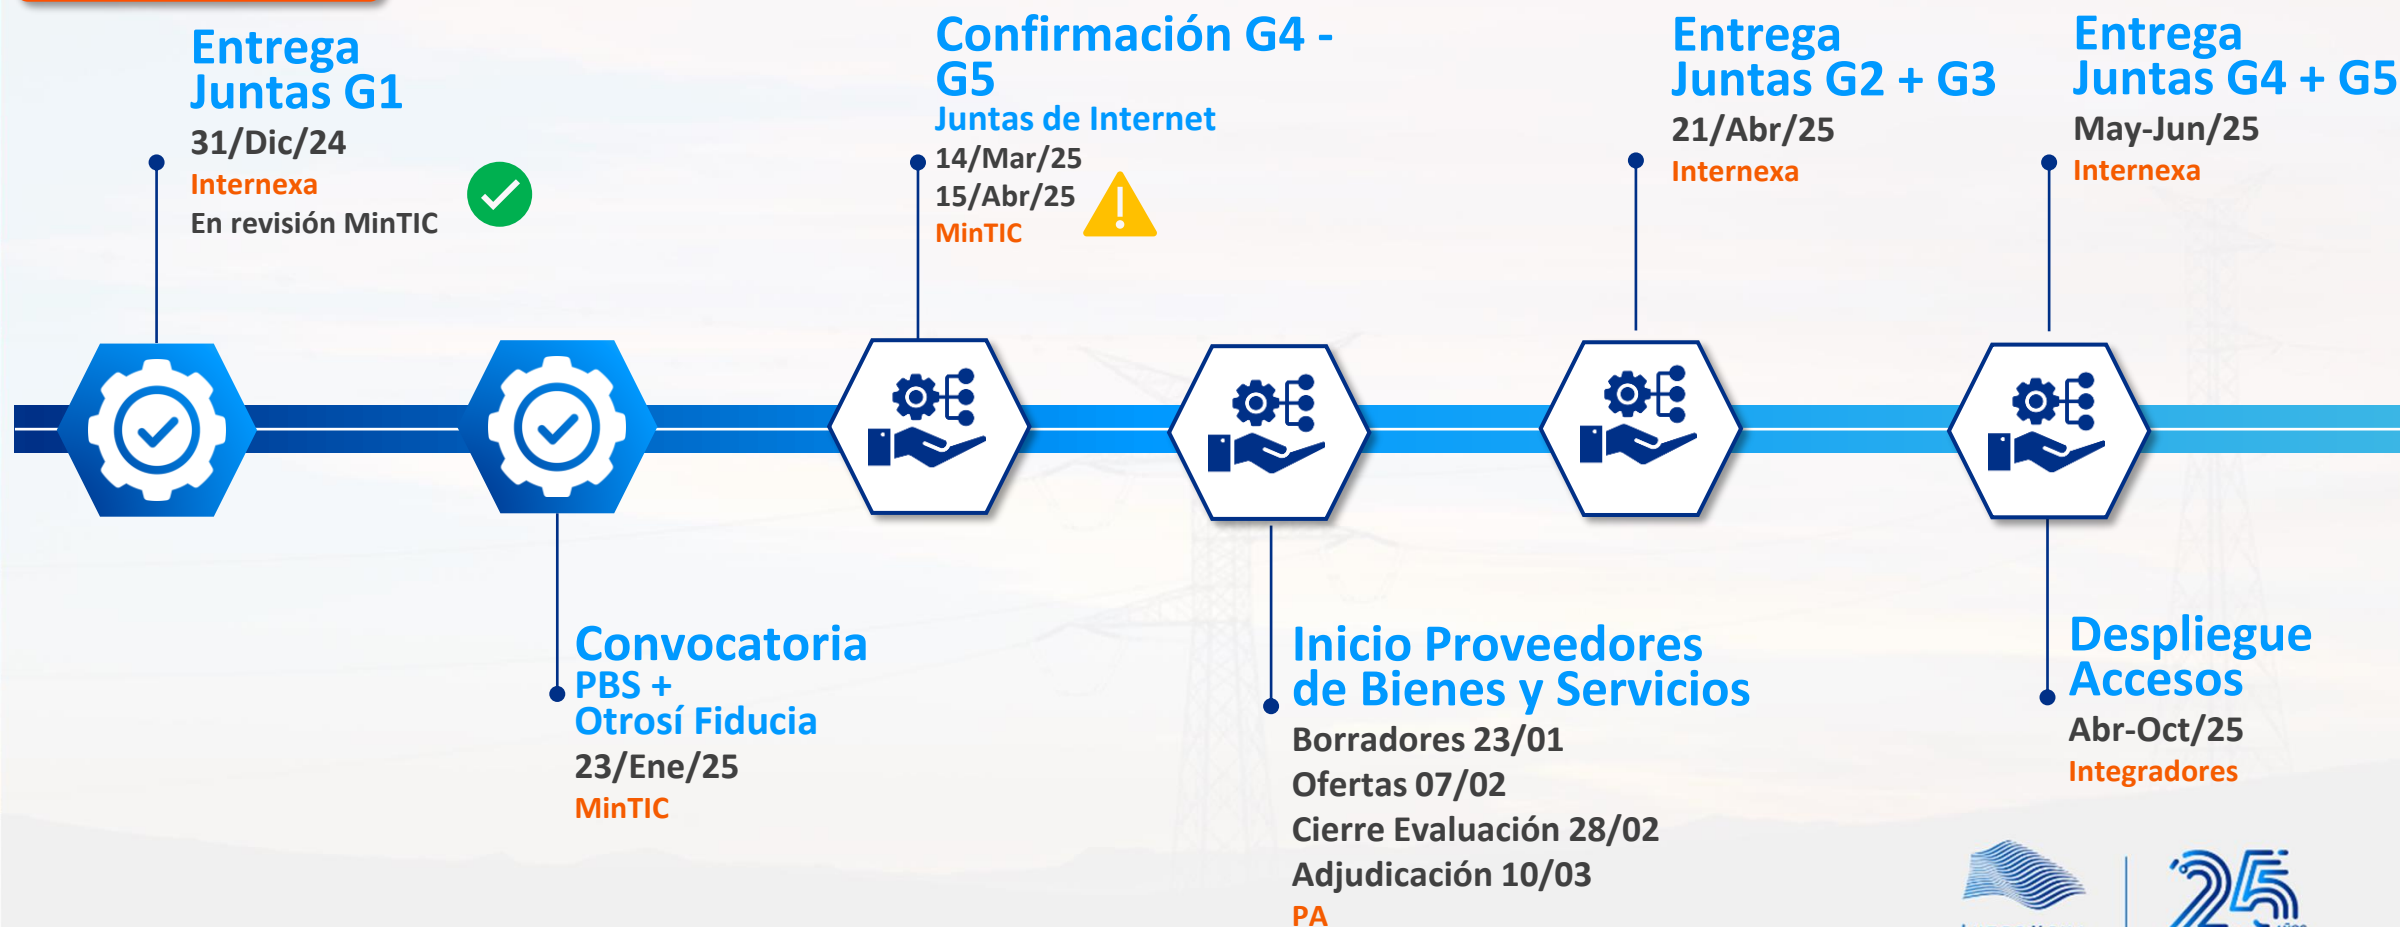

Implementación Grupo 1

► Distribución de las 59 juntas satelitales.



DEPARTAMENTO	CANTIDAD JUNTAS
Antioquia	11
Atlántico	3
Bolívar	4
Boyacá	3
Cesar	7
Córdoba	3
Cundinamarca	1
Huila	4
La Guajira	8
Magdalena	3
Quindío	3
Risaralda	6
Sucre	1
Tolima	2
Total	59



59 Juntas de 14 departamentos impactados en nuestro primer grupo de despliegue troncal.

Pendiente implementación junta Sapatí/Chimichagua por novedad en predio.



Foco principal: Contestabilidad & Coordinación líderes Juntas

► Juntas radicadas para revisión de MinTIC 31/12



Observaciones - Implementación Grupo 1


☐ Novedades en subsanación:

- ☐ Datasheet y garantía de equipos
- ☐ Marquilla de equipos (Se encuentra instalado y se validará en visitas a campo)
- ☐ Registro y georreferencia en fotografías
- ☐ Caja STP cerrada (Se tomo registro fotográfico acordé aprendizaje acuerdos previos)
- ☐ Instalación Switch

☐ Novedades no contempladas en AE:

- ☐ Diagrama STP (Se evaluará con proveedor construir modelo TIPO)
- ☐ Cuadro de cargas y diagrama unifilar (Se evaluará con proveedor construir modelo TIPO)
- ☐ Distribución Rack (Se evaluará con proveedor construir modelo TIPO)
- ☐ Respaldo de baterías en UPS (No contractual)

Ubicación Juntas (311 juntas)

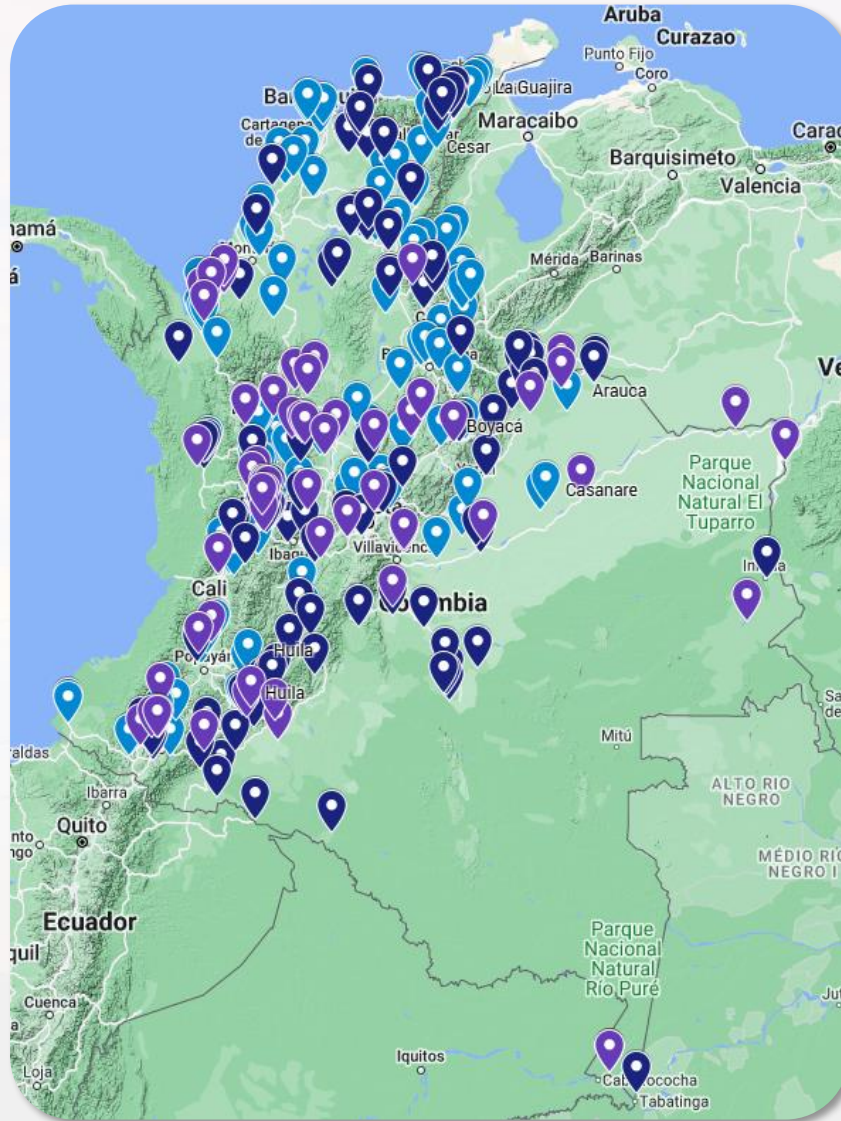

Primera Entrega (137 juntas)



Segunda Entrega (114 juntas)



Tercera Entrega (62 juntas)




Google Maps




Estado procesos abastecimiento


Estructuración

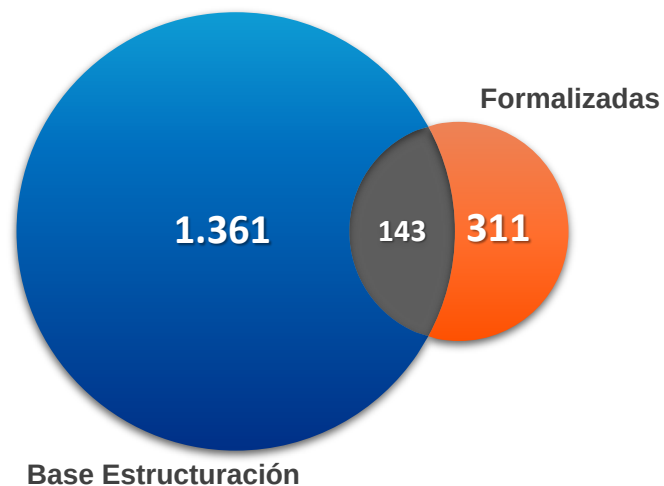

Ejecución

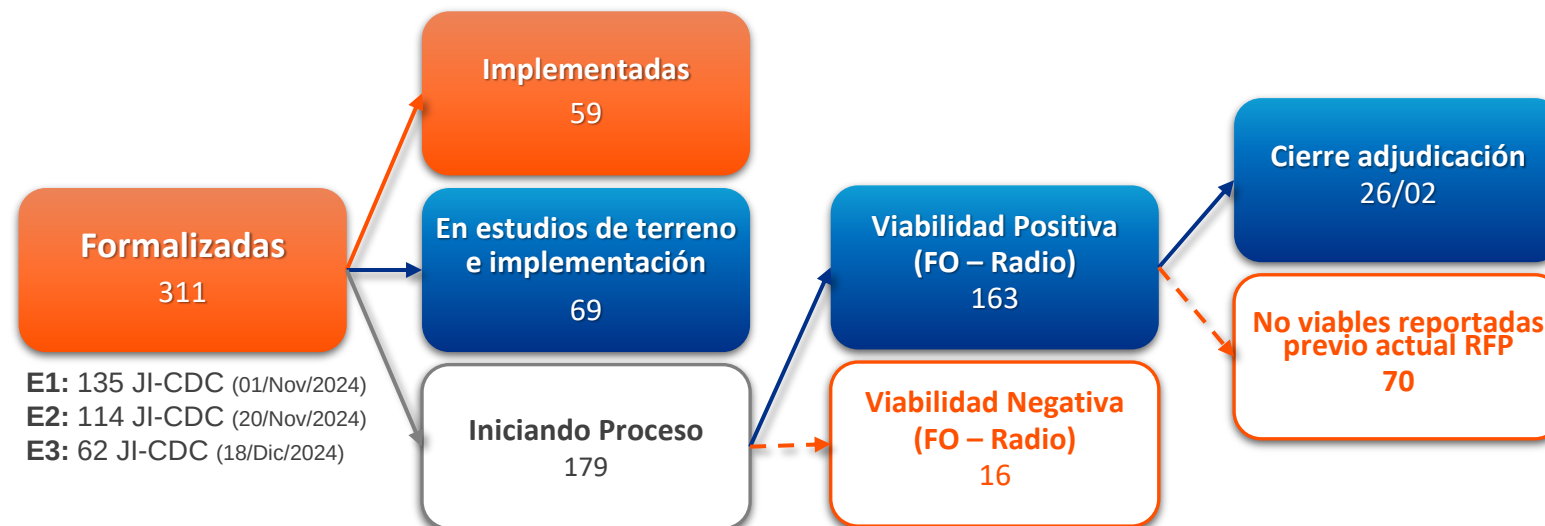

Flujo Abastecimiento



Informes de seguimiento

No.	Mes de reporte	Radicado MINTIC	Observaciones supervisión	Estado conformidad
1	Noviembre	241103096 del 05/12/2024 251001582 del 08/01/2025	Correo electrónico 30 diciembre 252027749 del 19/02/2025	Aprobado
2	Diciembre	251001898 del 09/01/2025	252029619 del 24/02/2025	En subsanación ITX
3	Enero	251013330 del 07/02/2025	252029626 del 24/02/2025	En subsanación ITX



Fiduciaria

Principales actividades

Actividades desarrolladas

- ▶ Se entregó el informe mensual de enero de 2025 (10/02/2025).
- ▶ Publicación de la respuesta a observaciones y de las condiciones definitivas de participación de la Convocatoria de Integradores del Acuerdo Especifico No 5 (05/02/2025).
- ▶ Publicación del informe de evaluación preliminar de la Convocatoria de Integradores del AE5 (24/02/2025).

Actividades en desarrollo

- ▶ Revisión Escalamiento retenciones ISP.
- ▶ Optimización de los tiempos de respuesta para la firma de contratos y aprobación de pólizas.
- ▶ Actualización del Manual Operativo y del Reglamento del Comité Asesor.

¿Qué sigue?

- ▶ Publicación respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar y publicación del informe final de evaluación de la Convocatoria de Integradores del AE5 (06/03/2025).
- ▶ Entrega del informe mensual de febrero de 2025 (10/03/2025).



Varios

- ▶ CONPES
- ▶ Actas y Firmas

¡Gracias!

!Juntos hacemos que pase!



Operador **Mayorista** de
servicios e infraestructura
de **Conectividad**

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 1516A7B2-2169-468D-84FE-DB6CA0EF45ED
Asunto: GDOTICFM007 Acta CO_AE4_008- PNC- Comite Operativo 20250227_vf.
A. Número de contrato:
B. Tipo:
C. Número de cláusula:
D. Correo del ordenador de gastos:
Sobre de origen:
Páginas del documento: 42
Páginas del certificado: 6
Firma guiada: Activado
Sello del identificador del sobre: Activado
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Estado: Completado

Autor del sobre:
KATHERINE MILENA CAMARGO CASTAÑO
Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5
Medellín, Bogota 00000
ITX_E_kcamargo@internexa.com
Dirección IP: 45.238.180.36

Seguimiento de registro

Estado: Original
13/03/2025 10:19:47
Titular: KATHERINE MILENA CAMARGO
CASTAÑO
ITX_E_kcamargo@internexa.com

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante

John Fredy Chía Ramírez
jchia@internexa.com
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 186.86.32.37

Fecha y hora

Enviado: 13/03/2025 10:30:10
Visto: 13/03/2025 11:01:47
Firmado: 13/03/2025 11:02:52

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 13/03/2025 11:01:47
ID: 03959fa7-e900-46c8-bd0d-390cede0f2e5

Luis Fernando Jiménez
ljimenez@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 186.84.4.16

Enviado: 13/03/2025 10:30:11
Reenviado: 13/03/2025 13:30:13
Reenviado: 13/03/2025 17:06:53
Reenviado: 13/03/2025 17:10:23
Reenviado: 13/03/2025 17:10:31
Visto: 14/03/2025 8:23:02
Firmado: 14/03/2025 8:24:32

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 14/03/2025 8:23:02
ID: fb4ed9df-508b-4714-98a2-372d8914e153



LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Inicial

Adopción de firma: Estilo preseleccionado
Utilizando dirección IP: 161.18.214.146

Enviado: 13/03/2025 10:30:11
Reenviado: 13/03/2025 13:30:14
Reenviado: 13/03/2025 17:06:53
Reenviado: 13/03/2025 17:10:23
Reenviado: 13/03/2025 17:10:32
Visto: 13/03/2025 17:55:07
Firmado: 13/03/2025 17:56:38

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
Aceptado: 13/03/2025 17:55:07
ID: 44d8abf3-2e4e-47c5-84d5-7ef2cd3f3477

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
MELISSA LOZANO klozano@internexa.com PMO COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.68.53.11	Enviado: 13/03/2025 10:30:11 Visto: 13/03/2025 10:31:37 Firmado: 13/03/2025 10:31:56
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  6AAA3F2A9BB14AE... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 181.59.3.91	Enviado: 14/03/2025 8:24:36 Reenviado: 14/03/2025 9:59:16 Visto: 14/03/2025 15:34:35 Firmado: 14/03/2025 15:34:53
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 14/03/2025 15:34:35 ID: 782e5be8-490c-41f9-8b1e-cf4c3f31cf0f		
DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO djaramillo@internexa.com DIRECTOR PNC COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DocuSigned by:  75AFED9F3BFE439... Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 186.30.34.188	Enviado: 14/03/2025 8:24:35 Reenviado: 14/03/2025 9:59:16 Reenviado: 17/03/2025 8:34:43 Visto: 17/03/2025 9:09:19 Firmado: 17/03/2025 9:09:34
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 190.0.240.4	Enviado: 14/03/2025 8:24:36 Reenviado: 14/03/2025 9:59:16 Visto: 14/03/2025 11:43:46 Firmado: 14/03/2025 11:44:06
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 14/03/2025 11:43:46 ID: 9c9b8b6d-00a3-491e-8a54-813667def0d9		
Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Fabian Yesid Yanquen Botia fyanquen@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Copiado	Enviado: 17/03/2025 9:09:36
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 11/02/2025 17:19:53 ID: d56d7ae1-8160-4162-aa80-fc139f7322ec		

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
---------------------	-------	--------------

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
--------------------	-------	--------------

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	13/03/2025 10:30:11
Certificado entregado	Seguridad comprobada	14/03/2025 11:43:46
Firma completada	Seguridad comprobada	14/03/2025 11:44:06
Completado	Seguridad comprobada	17/03/2025 9:09:36

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
------------------	--------	------------------

Divulgación de firma y Registro electrónicos
--

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Internexa:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com

To advise Internexa of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from Internexa

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Internexa

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum

Enabled Security Settings:	Allow per session cookies
----------------------------	---------------------------

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Internexa during the course of my relationship with you.
