

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

CÓDIGO TRD: 2120				
ACTA No. CO_AE4_013	LUGAR: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- PISO 5 y Virtual Microsoft Teams	FECHA: 30 de julio de 2025	HORA DE INICIO: 9:45 am	HORA FINAL: 11:10 am

OBJETO DE LA REUNIÓN
Adelantar COMITÉ OPERATIVO DEL AE4 - ITX – FUTIC - ACUERDO ESPECÍFICO NO. 4 DE 2023 (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1465 - 2024) – con corte al 30 julio de 2025 El objeto de la reunión es realizar seguimiento al desarrollo del proyecto, revisando el estado actual de las actividades, los avances alcanzados, los retos identificados y los próximos pasos a ejecutar.

ORDEN DEL DÍA
1. Etapas del proyecto 2. Componente Administrativo 3. Componente Técnico 4. Componente Jurídico 5. Componente Financiero 6. Varios 7. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Acordar Otrosí N° 2	En proceso (el otrosí está en proceso de formalización)
2	Emitir respuestas sobre las actas que a la fecha se encuentran en trámite (revisión, aprobación y/o firma) por parte del MinTic	Culminado (vía e-mail)
3	Emitir respuesta a la solicitud por parte de InterNexa sobre la definición solución técnica de los municipios del Litoral Chocó AE4	Culminado (radicado 251096049)
4	Elaborar matriz multicriterio para evaluar alternativas tecnológicas para los municipios del litoral pacífico	No aplica porque finalmente se definió que la solución a implementar será la satelital
5	Adelantar mesa de trabajo para revisar subsanación de los nodos de Istmina, Condoto y Medio San Juan	Culminado (realizada 01/07/2025)
6	Enviar comunicación formal frente a la solicitud del Otrosí	Culminado (realizada 01/07/2025, radicado 251080938)
7	Hacer llegar al MINTIC nueva propuesta para el litoral pacifico (Banda C)	No aplica. porque se definió previamente que la solución a implementar será la satelital



ACTA DE REUNIÓN



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de los equipos de las partes Interesadas (Ministerio, Internexa e interventoría)

La interventoría presenta la agenda para el desarrollo de la reunión. No se manifiestan observaciones por las partes interesadas.



Avance Ejecución Proyecto

Contrato de Interventoría 1421 de 2025

30 de Julio 2025



Agenda

1. Etapas del proyecto
2. Componente Administrativo
3. Componente Técnico
4. Componente Jurídico
4. Componente Financiero
5. Varios


2. Etapas del proyecto



ACTA DE REUNIÓN



Etapas del Proyecto



La Interventoría manifiesta que el proyecto puede estructurarse claramente en tres fases principales: Planeación, Ejecución y Operación. En ese sentido, se considera recomendable, realizar el seguimiento del proyecto bajo este enfoque, ya que permite una organización lógica, secuencial y funcional de las actividades. Mencionado lo anterior, se tienen los siguientes aspectos relevantes que resaltar:

- **Fase de planeación:**

Dado que la fase de Planeación fue una etapa que ya se surtió, es necesario establecer entre las partes los mecanismos que permitan formalizar adecuadamente dicha etapa. Esto implica documentar y validar el conjunto de artefactos generados como: metodologías, procedimientos, formatos y demás elementos de soporte que sustentaron el desarrollo inicial del proyecto. En este contexto, y considerando la entrada de la Interventoría como nuevo actor del proceso, se hace indispensable dejar la **debida constancia formal** de estos insumos, garantizando su trazabilidad, alineación y reconocimiento. Para llevar a cabo esta actividad, se sugiere hacer la formalización por cada uno de los componentes. **A la propuesta antes mencionada no se presenta objeción alguna.**

- **Fase de ejecución:**

La Interventoría manifiesta que se encuentra en proceso de estructuración del Plan de Calidad, el cual contempla el método formal de interventoría. Este método incluye la definición de formatos, metodologías y lineamientos que soportarán de manera sistemática y documentada el ejercicio de seguimiento y control del proyecto, asegurando la trazabilidad, consistencia y alineación con los objetivos contractuales. **Tema informativo, sin objeción por las partes.**

Adicionalmente, En esta fase del proyecto, se tienen como actividades principales la **habilitación de los nodos y de la red troncal**, elementos fundamentales para el avance operativo del proyecto. Sobre este punto, existen aspectos relevantes que deben ser considerados y que serán abordados específicamente desde el componente jurídico con el apoyo de los demás componentes. Así las cosas, la profundidad de lo analizado esta en este mismo documento en el componente jurídico. **Tema informativo, sin objeción por las partes.**


- **Fase de ejecución:**

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La fase de Ejecución contempla, entre sus componentes clave, la integración con los proveedores de servicios de internet (ISP). En este sentido, se ha dispuesto un apartado específico para mostrar el avance del seguimiento con los ISP.



Componente administrativo –Cronograma.

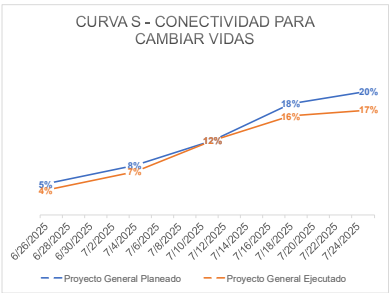

- ☐ Sistema de información
- ☐ Vistas de acompañamiento (Calidad y aprobación)
- ☐ Reuniones de seguimiento (Actas)

☐ Seguimiento ISP

La Interventoría indica que el proyecto está avanzando de manera coherente con lo proyectado (Tomando punto de partida el 26 de junio de 2025 – Fecha en la que se firmó el acta de inicio del Contrato 1421 de 2025 Contrato de Interventoría), aunque se evidencia una **brecha de 3 puntos porcentuales** al final del periodo evaluado, esta diferencia corresponde a las actividades que se están formalizando en el otro sí N°2. **Tema informativo, sin objeción por las partes.**



Componente administrativo -Actas de Seguimiento.

Componente	Totales	Elaboración	Socialización	Ajustes	Firma	Repositorio
Generales	2	✅ Completado	🔥 Próximo	🕒 En curso	🕒 En curso	🕒 En curso
Jurídico	1	✅ Completado	🔥 Próximo	🕒 En curso	🕒 En curso	🕒 En curso
Tecnico	10	✅ Completado	🔥 Próximo	🕒 En curso	🕒 En curso	🕒 En curso
Administrativo y Financiero	4	✅ Completado	🔥 Próximo	🕒 En curso	🕒 En curso	🕒 En curso

- ☐ Para la firma de las actas, para la Interventoría es viable la firma mecánica.
- ☐ Seguimiento protocolo para firma de actas.

La Interventoría indica que, a la fecha, se cuenta con un total de 17 actas elaboradas e Internexa menciona que las mismas fueron compartidas por la Interventoría entre el día de ayer y hoy respectivamente para su respectiva validación por parte de las demás partes interesadas. No obstante, Internexa manifiesta que, en varias de las reuniones realizadas (9 actas), ellos

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

continuaron con la elaboración de actas conforme al procedimiento que venían implementando previamente. En este contexto, Interventoría identificará si hay una duplicidad en el registro de algunas actas. Ante esta situación, **se acuerda realizar una comparación entre los documentos y establecer como actas oficiales aquellas previamente generadas por Internexa las cuales ya tienen ciclo de revisión del Ministerio y se requeriría la revisión y aprobación por parte de la Interventoría para dar continuidad al proceso.** Para las reuniones que no cuenten con registro documental, la Interventoría elaborará el acta correspondiente, garantizando así la trazabilidad y formalidad del proceso.

Finalmente, en relación con este punto **se acuerda** entre las partes que, para las reuniones en las que participen Internexa, el Ministerio y la Interventoría, se utilizará la herramienta **DocuSign** como medio oficial para la firma de los documentos generados. Por otro lado, en las reuniones en las que participen únicamente el Ministerio y la Interventoría, se empleará la herramienta **Integratic** para la elaboración, validación y firma de los documentos correspondientes.



Componente Técnico.

PROPUESTA DE CRONOGRAMA VISITAS PRESENCIALES						JULIO					AGOSTO					
No.	DEPTO	MUNICIPIOS	INTERVENTORIA	EQUIPO ITX	OBSERVACIÓN INTERNEXA	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
1	Chocó	RIOSUCIO	JAVIER VANEGAS	JORGE/WILLIAM	PRIORITARIO	X										
2	Nariño	SAN ANDRÉS DE TUMACO	YEISON ORTEGA	ANDRES	PRIORITARIO				X							
3	Nariño	FRANCISCO PIZARRO	YEISON ORTEGA	ANDRES	PRIORITARIO					X						
4	Chocó	BAGADO	OSCAR GAMBOA	JORGE	PRIORITARIO			X								
5	Chocó	LLORÓ	OSCAR GAMBOA	JORGE	APROBADO MINTIC				X							
6	Chocó	ATRATO(Yuto)	OSCAR GAMBOA	JORGE	APROBADO MINTIC				X							
7	Chocó	CERTEGUI	OSCAR GAMBOA	JORGE	APROBADO MINTIC					X						
8	Chocó	UNIÓN PANAMERICANA	OSCAR GAMBOA	JORGE	APROBADO MINTIC					X						
9	Chocó	TADÓ	OSCAR GAMBOA	JORGE	APROBADO MINTIC					X						
10	Chocó	SAN JOSÉ DEL PALMAR	OSCAR GAMBOA	JORGE	PRIORITARIO							X				
11	Chocó	MEDIO BAUDO	FRANCISCO RUGELES	WILLIAM	PRIORITARIO			X								
12	Chocó	RIO IRO	FRANCISCO RUGELES	WILLIAM	PRIORITARIO				X							
13	Chocó	NÓVITA	FRANCISCO RUGELES	OPCIONAL (equipo técnico)	EN APROBACIÓN MINTIC					X						
14	Chocó	CONDOTO	FRANCISCO RUGELES	OPCIONAL (equipo técnico)	APROBADO MINTIC					X						
15	Chocó	ISTMINA	FRANCISCO RUGELES	OPCIONAL (equipo técnico)	APROBADO MINTIC					X						
16	Chocó	EL CANTON DEL SAN PABLO	FRANCISCO RUGELES	OPCIONAL (equipo técnico)	APROBADO MINTIC						X					
17	Chocó	RIO QUITO	FRANCISCO RUGELES	OPCIONAL (equipo técnico)	EN APROBACIÓN MINTIC							X				

La Interventoría socializa el cronograma de visitas presenciales con fecha de corte al 1 de agosto de 2025. Frente a esta programación, el Ministerio solicita que dicha fecha de corte sea incluida de manera visible en la imagen correspondiente. De lo inicialmente programado hubo una variación de algunas rutas en el orden de las visitas, no obstante, ello no afecta el desarrollo de las visitas. Interventoría manifiesta que visitará el nodo de paso de Patía para el 31 de julio e Ipiales queda para una nueva programación de visitas.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



CONSORCIO

Componente Técnico.

NODOS DE PASO RED TRONCAL		
No.	Departamento	Municipio
1	Risaralda	La virginia
2	Choco	Quibdó
3	Choco	Carmen de atrato
4	Nariño	Ipiales
5	Cauca	Patia

- Sin necesidad de visita
- Programar visita de Interventoría

- ☐ Cronograma de visitas se tiene contemplado la visita (Patia 31 de julio de 2025)
- ☐ Ipiales se tiene contemplada para la segunda fase de visitas.

En relación con la red troncal, se hace énfasis en los nodos que serán objeto de visita, sin que exista objeción alguna por parte las partes interesadas. Adicionalmente, la Interventoría resalta que, dado que el Ministerio ya realizó visitas previas a los nodos ubicados en La Virginia, Quibdó y Carmen de Atrato, no será necesaria una nueva visita por parte de la Interventoría. En este sentido, **se acuerda liberar** estas tres visitas, las cuales pasarán a formar parte de la bolsa de visitas disponibles dentro del proyecto



CONSORCIO

Componente Técnico.

No.	Departamento	Municipio	Actividad
1	Antioquia	Vigía Del Fuerte	
2	Choco	Acandí	
3	Choco	Alto Baudó	
4	Choco	Atrato	28 de julio de 2025 Visita presencial
5	Choco	Bagadó	28 de julio de 2025 Visita presencial
6	Choco	Bahía Solano	
7	Choco	Bajo Baudó	
8	Choco	Bojayá	
9	Choco	Carmen del Darién	
10	Choco	Cértogui	29 de julio de 2025 Visita presencial
11	Choco	Condoto	28 de julio de 2025 Visita presencial
12	Choco	El Cantón del San Pablo	
13	Choco	El Litoral del San Juan	
14	Choco	Istmina	28 de julio de 2025 Visita presencial
15	Choco	Juradó	
16	Choco	Lloró	29 de Julio de 2025 Visita presencial

No.	Departamento	Municipio	Actividad
17	Choco	Medio Atrato	
18	Choco	Medio Baudó	30 de julio de 2025 Visita presencial
19	Choco	Medio San Juan	11 de julio de 2025 visita presencial
20	Choco	Nóvita	30 de julio de 2025 Visita presencial
21	Choco	Nuquí	
22	Choco	Río Iró	29 de julio de 2025 Visita presencial
23	Choco	Río Quito	
24	Choco	Riosucio	26 de julio de 2025 Visita presencial
25	Choco	San José del Palmar	
26	Choco	Sipí	
27	Choco	Tadó	30 de Julio de 2025 Visita presencial
28	Choco	Unguía	
29	Choco	Unión Panamericana	30 de Julio de 2025 Visita presencial
30	Nariño	San Andrés de Tumaco	29 de julio de 2025 Visita presencial
31	Nariño	Francisco Pizarro	30 de Julio de 2025 Visita presencial
32	Cauca	Timbiquí	

- ☐ Cronograma de visitas para 18 nodos (Socialización con las partes)
- ☐ Nodo Patia a visitar el 31/07/2025
- ☐ Equipo mínimo técnico (Interventores de campo)



ACTA DE REUNIÓN





No.	MUNICIPIOS	OBSERVACIONES CLAVES
12	EL CANTÓN DEL SAN PABLO	01/07/2025: Interventoría participa de la realización de visita virtual piloto de manera satisfactoria donde se da conformidad a la recepción del nodo.
14	ISTMINA	01/07/2025: Interventoría participa de la realización de subsanación de revisión documental a observaciones realizadas por la supervisión en el mes de Marzo de 2025.
16	LLORÓ	02/07/2025: Interventoría participa de subsanación de revisión documental virtual a observaciones por parte de la supervisión del mes de abril 2025. 07/03/2025: Interventoría participa de subsanación virtual a observaciones del 2/07/2025.
18	MEDIO BAUDÓ	03/07/2025: Sesión virtual cancelada por ausencia en sitio de energía comercial, se reagenda. 07 y 08/07/2025: Sesión virtual cancelada por ausencia en sitio de energía comercial, se reagenda. 15/07/2025: Se agendan visita presencial por parte de la interventoría.
19	MEDIO SAN JUAN	01/07/2025: Interventoría asiste a sesión de revisión documental programada para evidenciar subsanaciones a observaciones generadas por parte de la supervisión en el mes de abril y junio de 2025. 11/07/2025: Se realiza visita presencial por parte de la interventoría.
20	NOVITA	03/07/2025: Interventoría asiste a sesión de revisión documental programada para evidenciar subsanaciones a observaciones generadas por parte de la supervisión en el mes de abril de 2025. 07/07/2025: Interventoría participa de sesión de visita virtual.
22	RÍO IRÓ	07/07/2025: Interventoría asiste a sesión de revisión documental programada para evidenciar subsanaciones a observaciones generadas por parte de la supervisión en el mes de abril de 2025.
23	RIO QUITO	10/04/2025: Entrega - Radicado 251041230 24/04/2025 Sesión de Socialización documental 07/07/2025: Interventoría asiste a sesión de revisión documental programada para evidenciar subsanaciones a observaciones generadas por parte de la supervisión en el mes de abril de 2025. 09/07/2025: Interventoría asiste a visita virtual de revisión del nodo.
24	RIOSUCIO	17/07/2025: Interventoría realiza sesión programada virtual para revisión documental (presentación nodo por primera vez)
25	SAN JOSÉ DEL PALMAR	17/07/2025: Interventoría realiza sesión programada virtual para revisión documental (presentación nodo por primera vez)
29	UNIÓN PANAMERICANA	03/07/2025: Interventoría asiste a sesión de revisión documental programada para evidenciar subsanaciones a observaciones generadas por parte de la supervisión en el mes de abril de 2025.
30	SAN ANDRÉS DE TUMACO	23/07/2025: Interventoría realiza sesión programada virtual para revisión documental (presentación nodo por primera vez)
31	FRANCISCO PIZARRO	03/07/2025: Interventoría asiste a sesión de revisión documental programada .

Interventoría manifiesta que participa en la revisión documental de los nodos desde el 26 de junio que ya venían con una revisión previa de Ministerio e Internexa, posterior a ello, desde el 17 de julio, Interventoría participa en la revisión nueva de 4 nodos (Riosucio, San José del Palmar, Tumaco y Patía como nodo de paso). Internexa hace énfasis en que a nivel documental todos los nodos surtieron una revisión documental satisfactoria a excepción de Timbiquí donde se presentó un corte de fibra que ya fue subsanado y está en curso surtir unas pruebas RFC.

En relación con el nodo Timbiquí, Internexa informará en los próximos días a la interventoría para programar una sesión virtual. El objetivo es revisar la documentación del nodo Timbiquí, ya que se han superado los inconvenientes técnicos que se habían presentado

En relación con el Nodo Medio San Juan, Internexa manifiesta que desde el punto de vista técnico es satisfactorio y faltaría el aval desde el punto de vista financiero y jurídico para dar continuidad al proceso de aprobación del nodo; Interventoría manifiesta que no puede emitir un concepto de aprobación final hasta tanto no esté el otrosí formalizado y legalizado. Internexa hace énfasis en que, bajo esas condiciones, no conectaríamos más ISP's adicionales a los ya aprobados por Ministerio cuya capacidad fija ya inicio a contar, esto es para los nodos de Condoto, Cantón de San Pablo e Istmina que ya están conectados; para los restantes nodos que si bien ya tienen adjudicados ISP's, no iniciaríamos actividades de conexión hasta que no se cuente con la aprobación respectiva. En ese orden de ideas, esto se daría hasta que se formalice el otrosí. **R**especto a las observaciones de la visita presencial del 11 de julio de 2025, se acordó que Internexa presentará las subsanaciones en una sesión virtual de revisión documental. Esta sesión se solicitará y realizará previo a la visita de calidad, en los tiempos promedio tras la entrega del informe de visita por parte de la interventoría. La visita técnica al nodo fue satisfactoria, pero se identificaron novedades que requieren atención a corto plazo.

Sobre los nodos del litoral, se aclaró que los 13 nodos del litoral son actualmente **Outdoor** y utilizarán conexión satelital primaria. Algunos de estos nodos se ajustarán a configuración **Indoor**, pero todos mantendrán el acceso satelital, internexa debe suministrar dicha información resultado de los site survey que están en curso y se estiman culminar la próxima semana.

La interventoría solicitó a Internexa una aclaración sobre los posibles cambios sobre los 13 nodos del Litoral Pacífico, a lo que Internexa precisó que estos 13 nodos estaban proyectados para ser instalados en formato **Outdoor** y contarán con infraestructura de red principal a través de tecnología satelital. Internexa está finalizando la actualización de la ingeniería de detalle y los estudios de sitio (surveys); resultado de estos site surveys algunos de estos 13 nodos cambiarían de

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

configuración Outdoor a Indoor, pero todos mantendrán el acceso satelital. El Ministerio solicitó a Internexa remitir esta información de ingeniería de detalle lo antes posible para que este punto se incluya en la modificación del Otrosí No. 2.

Componente Técnico - ISP.

DPTO	MUNICIPIO	NOMBRE ISP	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO	ASIGNACIÓN DE HOGARES DEL MUNICIPIO	ZONAS WIFI CABECERA	ZONAS WIFI CENTROS POBLADOS	PLAZO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN	CAPACIDAD DE ENTREGA	COMUNICADO DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DEL PROYECTO	GERENTE	UBICACIÓN DEL REPOSITORIO DE INFORMACIÓN	PLAN DE INSTALACIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE RADICADO	NÚMERO DE RADICADO
CHOCÓ	BAGADÓ	Global Connection Tics	5/7/2025	594	2	0	20 Semanas		Entregado	Pablo Emilio Gracia Borda	Entrega Comunicado, pte validar el drive	Entregado	7/26/2025	251097950
	CERTEGUI	MAKRO SISTEM	5/21/2025	780	2	0	20 Semanas		Entregado	Marvin Cordoba Murillo	https://drive.google.com/drive/folders/1oF7vYy4fKGzeKvYnFTL5k_HQcyufoBe5	Entregado	7/26/2025	251097958
	RIO QUITO			423	2	0	16 Semanas							
	TADÓ			3082	2	0	30 Semanas							
	CONDOTO 1	AFATEL	5/8/2025	2685	2	1	30 Semanas	14 de julio le entregaron el servicio de la capacidad de ancho de banda	Entregado	Anderson Moreno Rodriguez	https://drive.google.com/drive/folders/1DVze4zc3aSq7JemZV4lglVlXHPb3Qqpi8	Entregado	7/26/2025	251097957
	NOVITA			1008	2	2	30 Semanas							
	EL CANTÓN DE SAN PABLO 1	SOLUCIONES PACIFICO	5/8/2025	825	2	2	20 Semanas	7 de julio le entregaron el servicio de la capacidad de ancho de banda	No han entregado la información					
	ISTMINA	SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL CHOCO	5/20/2025	5109	2	0	30 Semanas		Entregado	Luis Enrique Camillo	https://drive.google.com/drive/folders/1V4cnJ6RDoOUi_ogE7FPCdV2aRPSR_O7usp=sharing	Entregado	21/07/2025 24/07/2025	251093860 251096802
	MEDIO BAUDO			571	2	0	20 Semanas							
	MEDIO SAN JUAN	NARANJA	5/13/2025	713	2	1	20 Semanas		Entregado	Andres Eduardo Torres	https://drive.google.com/drive/folders/1Tb8JGltseRtLJ7z7yV03J0r38k3c2NS7u5e3d3rve-link	Entregado	No sene radicado	
	UNIÓN PANAMERICANA 1	TESERPAC	5/5/2025	858	2	0	20 Semanas		No han entregado la información					

Componente Jurídico – Financiero

Otro Si nº 2 Impacto Técnico	Nodos Outdoor a Indoor	Viable	
	Municipios Satelitales a Terrestres	Viable	
	Variación Antenas satelitales	No Viable	
Otro Si nº 2 Impacto otros componentes	Ajuste CAPEX y OPEX	Ajuste cifras en las memorias de cálculo en del otrosí (Cifras)	
	Ajuste Cronograma de implementación	Viable	
	Recursos	Recomendación	

- La Interventoría emite su concepto mediante comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0014-25 del 29 de julio de 2025

En lo que respecta al Otrosí, se hace énfasis en que se da viabilidad a lo relativo a los nodos de outdoor a indoor, a los municipios en los que se daba viabilidad de satelital a terrestre, y a los ajustes en el cronograma de implementación, sin embargo, la variación de antenas no se da por viable por parte de la interventoría. El MinTIC indica que, para ir viabilizando el trámite ante la Entidad se irán adelantando con la información que ya se tiene, y mientras tanto se vaya elaborando el nuevo cronograma. De igual manera, se propone que por parte de Internexa, que para casos de cambios de cronograma y

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

de memorias de cálculo de evalúe si dentro del otrosí que se suscribiría se deja de manera general. Internexa aclara que para las memorias de cálculo, los cambios no sólo se dan por los temas que se presenten en el despliegue sino cuando se presente a futuro indisponibilidad y/o variación de los hogares conectados a los inicialmente planeados, entonces el documento varía con el tiempo. Internexa a su vez manifiesta que revisará internamente las implicaciones de la no viabilidad para el aumento de antenas satelitales en los municipios según recomendación del concepto de Interventoría y emitirá su retroalimentación respectiva-

Se menciona por parte de Internexa que, se hace necesario verificar lo relativo a los nodos del litoral pacífico, puesto que, con el concepto de la interventoría, no se da viabilidad a las modificaciones de este, a lo que la interventoría hace mención de que, con lo indicado por Internexa se quedaba tal como estaba planteado en los inicios del proyecto. Teniendo en cuenta que, si se hace necesario un cambio, se requiere una justificación por parte de Internexa, de la cual la interventoría emitirá el concepto correspondiente.



Componente Financiero

Ejecución Financiera – Acuerdo Especifico No. 4 – Junio 2025

						SALDO	\$ 199.735.785.729,19
CONCEPTO							
MES/CONCEPTO	INTERESES LIQUIDADOS	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	PAGO TERCERO ACH	REINTEGRO RENDIMIENTO FIN	GMF RENDIMIENTOS	GMF PAGOS TERCEROS	
2024	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00					
Trim.4	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00					
2025	\$ 7.601.607.414,88		-\$ 11.712.480.429,00	-\$ 6.772.301.456,08	-\$ 27.089.205,83	-\$ 46.849.921,72	
Trim.1	\$ 3.933.985.658,79		-\$ 7.219.094.907,00	-\$ 3.014.711.335,11	-\$ 12.058.845,34	-\$ 28.876.379,63	
Trim.2	\$ 3.667.621.756,09		-\$ 4.493.385.522,00	-\$ 3.757.590.120,97	-\$ 15.030.360,49	-\$ 17.973.542,09	
abr	\$ 1.241.758.510,08			-\$ 1.277.789.787,13	-\$ 5.111.159,15		
may	\$ 1.247.961.025,10			-\$ 1.236.811.265,02	-\$ 4.947.245,06		
jun	\$ 1.177.902.220,91		-\$ 4.493.385.522,00	-\$ 1.242.989.068,82	-\$ 4.971.956,28	-\$ 17.973.542,09	
Total general	\$ 7.977.292.882,82	\$ 210.317.213.859,00	-\$ 11.712.480.429,00	-\$ 6.772.301.456,08	-\$ 27.089.205,83	-\$ 46.849.921,72	

Se informa la ejecución financiera, teniendo en cuenta la revisión y cruce de la documentación soporte de, legalización pago del 30% expansión y 70% de cuatro municipios y de los Informes Fiduciarios a corte junio 30 de 2025, en donde a la fecha el saldo pendiente de ejecución está en \$199.735.785.729,19

Se menciona que se dio conformidad a los Informes Fiduciarios en lo que corresponde al Acuerdo Especifico No. 4 según las obligaciones de la Interventoría.

Por parte del MINTIC se recomienda a la Interventoría la entrega del Comunicado de aprobación legalización de los \$4.493 millones, con el fin de dar trámite definitivo a dicha legalización, por lo que la Interventoría se compromete a enviar correo en el transcurso del día.



ACTA DE REUNIÓN



Por parte de Internexa se menciona, que el concepto de Expansión tiene una ejecución de \$11.712.480.431 con una participación del 49% y sobre el total de los recursos entregados de \$210.317.213.859 una ejecución del 6%.



Varios

- Formalización del otrosí
- Revisar memorias de calculo e ingeniería de detalle



GRACIAS

Internexa manifiesta que se están recibiendo solicitudes de modificación de actas con incorporación de información que no se mencionó en la sesión respectiva. En ese orden de ideas, la supervisión del Ministerio ratifica que la información plasmada en las actas debe corresponder a sólo lo mencionado en la sesión y que es parte de la grabación de la sesión en referencia.

NOTA:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

La Interventoría indica que, por instrucción del MinTIC, a partir de la fecha, queda bajo nuestra responsabilidad la elaboración y custodia de las actas del proyecto, con ocasión de la suscripción del Contrato de Interventoría N° 1421 de 2025 del 26 de junio de 2025. Es así como, con el fin de garantizar la continuidad documental y facilitar la trazabilidad del proceso, se acuerda entre las partes que se mantenga el consecutivo previamente establecido para las actas de reuniones. Es importante precisar que, los compromisos y acuerdos adoptados con anterioridad por las partes no constituyen responsabilidad por parte de la interventoría.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Tramitar el Otrosí	MINTIC	30/08/2025
Remitir justificación para los 13 municipios del litoral pacífico	INTERNEXA	11/08/2025
Complemento de información asociada a la legalización de los 4.493 millones	INTERVENTORIA	30/07/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Diana Milena Jaramillo Agudelo	Directora Plan Nacional de Conectividad	Internexa
Yamile Diaz Solano	Gerente de Proyecto	Internexa
Erika Johana Ferro Pardo	Gerente de Proyecto Apoyo	Internexa
Juliana Saldarriaga	Especialista jurídica	Internexa
Luis Carlos Páez Cuesta	Especialista PNC	Internexa
Angela Patricia Ríos	Especialista PNC	Internexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista PNC	Internexa
Juan Diego Bedoya	Especialista	Internexa
Daniel Fernando Gomez Vargas	Gerente de Proyecto	Internexa
Melissa Lozano	Especialista PNC	Internexa
Juan Gabriel Rojas	Analista administrativa	Internexa
Paola Ruiz	Analista administrativa	Internexa
Michell Garizabalo	Analista administrativa	Internexa
Vanessa Torres	Analista administrativa	InterNexa
Nina Pinto	Especialista compliance	InterNexa
Vannesa Pineda	Analista socioambiental	InterNexa
Roger García	PMO	InterNexa
José Ferney Mora	Especialista socioambiental	InterNexa

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

Mónica del Rosario Paz	Profesional Especializado Dirección de Infraestructura	Ministerio
Luis Fernando Jiménez	Profesional Especializado Dirección de Infraestructura	Ministerio
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de Estructuración	Ministerio
Sebastián Chaparro Jiménez	Apoyo técnico a la supervisión	Ministerio
Luis Fernando Roncancio	Apoyo Técnico a la supervisión	Ministerio
Camilo Andrés Rodríguez	Apoyo jurídico a la supervisión	Ministerio
Marco Esteven Fontecha S.	Apoyo Técnico a la supervisión	Ministerio
Julián Ayala Sierra	Apoyo a la supervisión	Ministerio
John Jairo González	Apoyo a la supervisión	Ministerio
Adriana Pardo Arias	Directora Jurídica	Interventoría CONTIC
Martha Espitia	Directora Administrativa y Financiera	Interventoría CONTIC
Paola Andrea Burbano Cadena	Directora Técnica	Interventoría CONTIC
Gustavo Adolfo Cruz Daza	Director General de la Interventoría	Interventoría CONTIC

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Directora Plan Nacional de Conectividad	DocuSigned by: <i>DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO</i> 75AFED9F3BFE439... DS <i>[Signature]</i>
Juan Manuel Guerrero	Director de Infraestructura (E)	Firmado por: <i>[Signature]</i> C99EA4CCE7F348A... Inicial <i>LM</i> Inicial <i>LFRC</i>
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por: <i>[Signature]</i> C99EA4CCE7F348A... Inicial <i>MRPS</i>
Gustavo Adolfo Cruz Daza	Director General de la Interventoría	Signed by: <i>[Signature]</i> C29B513409674D0...

Anexos
Listado de asistencia de Teams Listado de asistencia presencial

1. Resumen

Título de la reunión	Presencial JULIO - COMITÉ OPERATIVO ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DEL CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC
Participantes que asistieron	16
Hora de inicio	7/30/25, 9:39:47 AM
Hora de finalización	7/30/25, 11:18:25 AM
Duración de la reunión	1 h 38 min 38s
Tiempo medio de asistencia	53 min 36s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
MELISSA LOZANO CHAVARRO	7/30/25, 9:47:54 AM	7/30/25, 11:17:35 AM	1 h 23 min 19s	klozano@internexa.com	KLOZANO@INTERNEXA.COM	Organizador
ITX_E VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA	7/30/25, 9:39:49 AM	7/30/25, 11:11:44 AM	1 h 31 min 54s	ITX_E_vtorres@internexa.com	ITX_E_VTORRES@INTERNEXA.COM	Moderador
JUAN GABRIEL ROJAS GUACANEME	7/30/25, 9:41:01 AM	7/30/25, 11:10:49 AM	58 min 23s	jurojas@internexa.com	JUROJAS@INTERNEXA.COM	Moderador
MICHELL ANDREA GARIZABALO TORO	7/30/25, 10:13:29 AM	7/30/25, 11:11:02 AM	57 min 32s	mgarizabalo@internexa.com	MGARIZABALO@INTERNEXA.COM	Moderador
PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ	7/30/25, 10:13:57 AM	7/30/25, 11:10:48 AM	56 min 51s	pruiz@internexa.com	PRUIZ@INTERNEXA.COM	Moderador
NINA ELIZABETH PINTO QUIROZ	7/30/25, 10:14:13 AM	7/30/25, 11:10:47 AM	56 min 34s	nepinto@internexa.com	NEPINTO@INTERNEXA.COM	Moderador
DANIEL GOMEZ VANEGAS	7/30/25, 10:14:42 AM	7/30/25, 11:10:46 AM	56 min 4s	dgomez@internexa.com	DGOMEZ@INTERNEXA.COM	Moderador
Gustavo Adolfo Cruz Daza (Externo)	7/30/25, 10:16:37 AM	7/30/25, 11:08:09 AM	51 min 32s	gustavo.cruz@kbtsas.com	gustavo.cruz@kbtsas.com	Moderador
Luis Fernando Jimenez Viteri	7/30/25, 10:17:16 AM	7/30/25, 11:10:54 AM	53 min 37s	ljimenez@mintic.gov.co	ljimenez@mintic.gov.co	Moderador
ROGER ANTONIO GARCIA GONZALEZ	7/30/25, 10:18:13 AM	7/30/25, 11:10:41 AM	52 min 28s	rgarcia@internexa.com	RGARCIA@INTERNEXA.COM	Moderador
Monica del Rosario Paz Suarez	7/30/25, 10:18:36 AM	7/30/25, 11:18:24 AM	59 min 48s	mpaz@mintic.gov.co	mpaz@mintic.gov.co	Moderador
Marco Esteven Fontecha Saavedra	7/30/25, 10:20:01 AM	7/30/25, 11:18:21 AM	58 min 20s	mfontecha@mintic.gov.co	mfontecha@mintic.gov.co	Moderador
VANNESA PINEDA PRIETO	7/30/25, 10:31:15 AM	7/30/25, 11:10:53 AM	39 min 37s	vpineda@internexa.com	VPINEDA@INTERNEXA.COM	Moderador
JOSÉ FERNEY MORA SUÁREZ	7/30/25, 10:32:02 AM	7/30/25, 11:11:00 AM	38 min 57s	jmora@internexa.com	JMORA@INTERNEXA.COM	Moderador
JUAN DIEGO BEDOYA DAVID	7/30/25, 10:47:25 AM	7/30/25, 11:18:25 AM	31 min	jdbedoya@internexa.com	JDBEDOYA@INTERNEXA.COM	Moderador
ANGELA PATRICIA RIOS ALZATE	7/30/25, 10:56:32 AM	7/30/25, 11:08:17 AM	11 min 45s	arios@internexa.com	ARIOS@INTERNEXA.COM	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
MELISSA LOZANO CHAVARRO	7/30/25, 9:47:54 AM	7/30/25, 11:10:48 AM	1 h 22 min 53s	klozano@internexa.com	Organizador
MELISSA LOZANO CHAVARRO	7/30/25, 11:17:09 AM	7/30/25, 11:17:35 AM	26s	klozano@internexa.com	Organizador
ITX_E VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA	7/30/25, 9:39:49 AM	7/30/25, 11:11:44 AM	1 h 31 min 54s	ITX_E_vtorres@internexa.com	Moderador
JUAN GABRIEL ROJAS GUACANEME	7/30/25, 9:41:01 AM	7/30/25, 9:42:00 AM	59s	jurojas@internexa.com	Moderador
JUAN GABRIEL ROJAS GUACANEME	7/30/25, 10:13:24 AM	7/30/25, 11:10:49 AM	57 min 24s	jurojas@internexa.com	Moderador
MICHELL ANDREA GARIZABALO TORO	7/30/25, 10:13:29 AM	7/30/25, 11:11:02 AM	57 min 32s	mgarizabalo@internexa.com	Moderador
PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ	7/30/25, 10:13:57 AM	7/30/25, 11:10:48 AM	56 min 51s	pruiz@internexa.com	Moderador
NINA ELIZABETH PINTO QUIROZ	7/30/25, 10:14:13 AM	7/30/25, 11:10:47 AM	56 min 34s	nepinto@internexa.com	Moderador
DANIEL GOMEZ VANEGAS	7/30/25, 10:14:42 AM	7/30/25, 11:10:46 AM	56 min 4s	dgomez@internexa.com	Moderador
Gustavo Adolfo Cruz Daza (Externo)	7/30/25, 10:16:37 AM	7/30/25, 11:08:09 AM	51 min 32s	gustavo.cruz@kbtsas.com	Moderador
Luis Fernando Jimenez Viteri	7/30/25, 10:17:16 AM	7/30/25, 11:10:54 AM	53 min 37s	ljimenez@mintic.gov.co	Moderador
ROGER ANTONIO GARCIA GONZALEZ	7/30/25, 10:18:13 AM	7/30/25, 11:10:41 AM	52 min 28s	rgarcia@internexa.com	Moderador
Monica del Rosario Paz Suarez	7/30/25, 10:18:36 AM	7/30/25, 11:18:24 AM	59 min 48s	mpaz@mintic.gov.co	Moderador
Marco Esteven Fontecha Saavedra	7/30/25, 10:20:01 AM	7/30/25, 11:18:21 AM	58 min 20s	mfontecha@mintic.gov.co	Moderador
VANNESA PINEDA PRIETO	7/30/25, 10:31:15 AM	7/30/25, 11:10:53 AM	39 min 37s	vpineda@internexa.com	Moderador
JOSÉ FERNEY MORA SUÁREZ	7/30/25, 10:32:02 AM	7/30/25, 11:11:00 AM	38 min 57s	jmora@internexa.com	Moderador
JUAN DIEGO BEDOYA DAVID	7/30/25, 10:47:25 AM	7/30/25, 11:18:25 AM	31 min	jdbedoya@internexa.com	Moderador
ANGELA PATRICIA RIOS ALZATE	7/30/25, 10:56:32 AM	7/30/25, 11:08:17 AM	11 min 45s	arios@internexa.com	Moderador



Lista de Asistencia - Ayuda de Memoria

OBJETIVO: (Temas a Tratar) COMITE OPERATIVO ACUERDO ESPECIFICO N°4

FECHA: 30-VII-25 LUGAR: MINTIC

HORA INICIO: HORA FINAL: RESPONSABLE:

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	FIRMA
1	Juan Manuel Guerrero Porcero	1049616253	MINTIC	Subdirector	—	jguerrero@mintic.gov.co	[Firma]
2	Yanille Diaz Salgado	52978304	INTEREXA	G.P.	—	ydiaz@internexa.com	[Firma]
3	Falka Terno Rueda	53931618	Internexa	G.P. AEZ	—	eterno@internexa.com	[Firma]
4	Juliana Saldarriaga	43203943	Internexa	Esp. Jca	—	jsaldarriaga@internexa.com	[Firma]
5	Diana Jaramillo	52453514	Internexa	Dir. MJC	—	djaramillo@internexa.com	[Firma]
6	Luis Carlos Diaz Costa	60799477	INTEREXA	ESP. AXC	3158351141	ldiaz@internexa.com	[Firma]
7	Ana Patricia Ruiz	30338823	Internexa	ESP. PNC	3154351240	aruiz@internexa.com	[Firma]
8	Daniela Arturo Ruiz R.	90824423	Internexa	Cip. PNC	3183709410	dr Ruiz@internexa.com	[Firma]
9	Miguel Angel Espinoza Alvarez	51857911	Interconexión	Dir. Adm. y Fin.	3106975826	mospinoza@interconex.com	[Firma]
10	Adriana Parra Arias	32429506	Interconexión	Dir. Jurídica	3005536932	adriana.parra@interconex.com	[Firma]
11	Madalena Burbano	34318889	Interconexión	Dir. Técnica	3134629771	mburbano@interconex.com	[Firma]
12	Julian Aldo Sierra	74253218	MINTIC - DNP	Appl. Servis	3017542512	jsierra@mintic.gov.co	[Firma]
13	MARCO STEVEN FONTECHA S.	2968757	MINTIC - DNP	ABO G. SUPERVISOR	3124630732	mfontecha@mintic.gov.co	[Firma]
14	Juan David Gonzalez E.	300860225	MINTIC	Asesor	3122104120	jgonzalez@mintic.gov.co	[Firma]
15	Carilo Francisco	24983227	MINTIC	Coordinador	3026000334	cfrancisco@mintic.gov.co	[Firma]
16	Sebastián Chaparro Jiménez	1032485188	MINTIC	Contratista	3114661195	schaparro@mintic.gov.co	[Firma]
17	Luis F. Rodríguez	79836268	MINTIC	Contratista	—	lfroncoso@mintic.gov.co	[Firma]
18	Juan David Bedoya David	103880827	Internexa	Especialista	3007472887	jbedoya@internexa.com	[Firma]
19	David Fernando Gomez Vargas	1090483451	Internexa	G.P.	—	dgomez@internexa.com	[Firma]
20	GUSTAVO CAIT BATA	40045846	INTEREXA	SCALANTE	31136334	gustavo.cait@internexa.com	[Firma]

Certificado de finalización

Identificador del sobre: F7DC7BDC-5344-4682-BDF6-897339903EC1

Estado: Completado

Asunto: Acta del comité operativo 30 de julio de 2025 - Ajustada

A. Número de contrato:

B. Tipo:

C. Número de cláusula:

D. Correo del ordenador de gastos:

Sobre de origen:

Páginas del documento: 14

Firmas: 4

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 6

Iniciales: 4

VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA

Firma guiada: Activado

Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5

Sello del identificador del sobre: Activado

Medellín, Bogota 00000

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

ITX_E_vtorres@internexa.com

Dirección IP: 190.24.57.146

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA

Ubicación: DocuSign

15/09/2025 8:36:21

ITX_E_vtorres@internexa.com

Eventos de firmante

Firma

Fecha y hora

ERIKA JOHANA FERRO PARDO

eferro@internexa.com

GERENTE PROYECTO PNC

COLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 181.119.85.4

Enviado: 16/09/2025 9:17:49

Visto: 16/09/2025 9:34:43

Firmado: 16/09/2025 9:40:30

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de Docusign

Luis Fernando Jimenez Viteri

ljimenez@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP:

2800:484:5b73:de00:293c:9908:5ab3:3bb5

Enviado: 16/09/2025 9:20:12

Visto: 16/09/2025 9:21:14

Firmado: 16/09/2025 10:12:35

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 16/09/2025 9:21:14

ID: 3d620e4d-4de7-4125-b77d-2300c30e8c4a

Luis Fernando Roncancio Campos

lfroncancio@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 161.18.112.254

Enviado: 16/09/2025 9:20:12



Visto: 16/09/2025 9:22:12

Firmado: 16/09/2025 9:22:56

Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 16/09/2025 9:22:12

ID: 439f637e-88b4-4565-95d6-8efd9f9dd556

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Monica del Rosario Paz Suarez mpaz@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Inicial  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 191.156.150.18	Enviado: 16/09/2025 9:20:12 Visto: 16/09/2025 10:19:06 Firmado: 16/09/2025 10:22:31
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 16/09/2025 10:19:06 ID: 83fe749a-a94b-4df0-9ff8-3e72457c4cf7		
DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO djaramillo@internexa.com DIRECTOR PNC COLOMBIA Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	DocuSigned by:  Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 190.25.16.222	Enviado: 16/09/2025 9:20:12 Reenviado: 16/09/2025 10:22:35 Visto: 16/09/2025 9:22:35 Firmado: 16/09/2025 11:45:53
Divulgación de firma y Registro electrónicos: No se ofreció a través de DocuSign		
Gustavo Adolfo Cruz Daza gustavo.cruz@kbtsas.com Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Signed by:  Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 2800:486:198a:f00:e03f:fde1:19de:e0e6	Enviado: 16/09/2025 9:20:11 Reenviado: 16/09/2025 10:22:34 Visto: 16/09/2025 10:56:07 Firmado: 16/09/2025 10:56:38
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 16/09/2025 10:56:07 ID: 2ae258a1-1be7-4352-b2cb-2905d8d466fa		
Juan Manuel Guerrero jguerrero@mintic.gov.co Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	Firmado por:  Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4	Enviado: 16/09/2025 9:20:11 Reenviado: 16/09/2025 10:22:34 Visto: 16/09/2025 11:11:51 Firmado: 16/09/2025 11:12:05
Divulgación de firma y Registro electrónicos: Aceptado: 16/09/2025 11:11:51 ID: 1d21e28b-4cd4-4f3d-95b6-f367261dad4e		
Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	16/09/2025 9:17:49
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:20:10
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:20:10
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:20:10
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:20:10
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:20:10
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:20:10
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:26:37
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:26:37
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	16/09/2025 9:26:37
Certificado entregado	Seguridad comprobada	16/09/2025 11:11:51
Firma completada	Seguridad comprobada	16/09/2025 11:12:05
Completado	Seguridad comprobada	16/09/2025 11:45:53

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
Divulgación de firma y Registro electrónicos		

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Internexa:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com

To advise Internexa of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.

To request paper copies from Internexa

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Internexa

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X
Browsers:	Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above (Mac only)
PDF Reader:	Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files
Screen Resolution:	800 x 600 minimum

Enabled Security Settings:	Allow per session cookies
----------------------------	---------------------------

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and browsers are not supported.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Internexa during the course of my relationship with you.
