	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>


MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: \_\_\_\_\_ CONVENIO:   x    
 INTERVENTORÍA: \_\_\_\_\_ SUPERVISIÓN \_\_\_\_\_  
 PARCIAL   x   FINAL \_\_\_\_\_

INFORME No:	1		FECHA:		de		de					
PERIODO:	DEL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	29	de	OCTUBRE	de	2025
NO. CONTRATO O CONVENIO	CO1.PCCNTR.833	6904/3201	DE	2025	FECHA:	17	de	SEPTIEMBRE	de	2025		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 2.726.281.350,00		RPC		52325							
REGISTRO BP y P No.	2025004150020											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	DISTICON SAS ESP											

**OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO JENESANO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Edgar Felipe Buitrago Sierra		
Teléfono:	3126093900	Dirección:	CARRERA 11 No. 20-96
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO	
		dd	mm
FECHA DE INICIACIÓN		30	09
PLAZO INICIAL	12 meses		
PLAZO CON ADICIONES			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		29	09
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

**INFORME ADMINISTRATIVO**

**RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)**

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
43. Acta de Inicio Disticon Jenesano.pdf	29	09	2025	

**ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO**

CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
N.A					
N.A					
N.A					
<b>VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL</b>				<b>\$ 0,00</b>	


**MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO**

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				
	N.A				
	N.A				

**SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO**


ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Subsidios a usuarios para conexiones internas de gas (código 210101500)			X		

	<b>FORMATO</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
					<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>					<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>
Subsidios a usuarios para conexión de redes domiciliarias de gas (código 210101600)			x		

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

**INFORME TÉCNICO**

A la fecha de corte, la empresa DISTICON S.A.S ESP se encuentra realizando comercialización en la zona y a la fechase cuenta con la afiliación de 100 usuarios por medio de contrato o solicitud de servicio, posterior a esta solicitud de servicio, se inició con la primera fase, red interna para estratos 1 y 2, con la construcción de instalaciones internas en Pe-Al-Pe a la vista, teniendo un avance de 50 instalaciones de red internas domiciliarias de estrato 1 y 2, las cuales aún se encuentran sin certificación. Para la segunda fase, derechos de conexión, se contempla la instalación del centro de medición y puesta en servicio en una sola etapa, para lo cual, aun no se cuenta con avance.

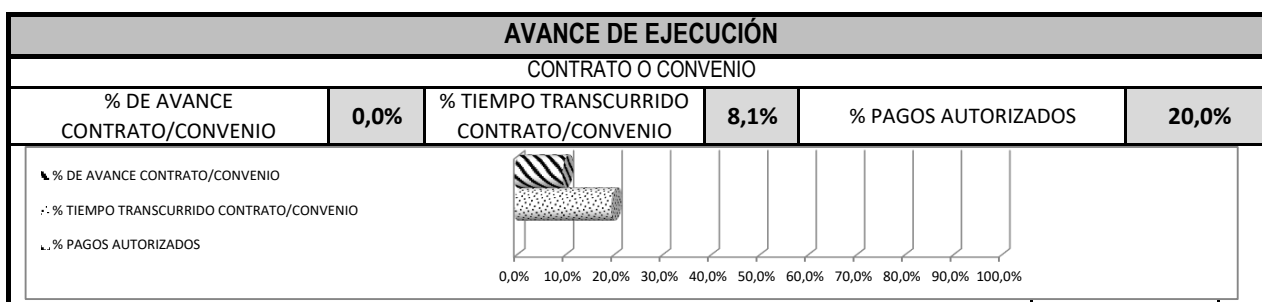


DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	1089-6991-3509	FIDUCIA No.:		BANCO:	Davivienda
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	Davivienda				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA PARCIAL No. 1	20%	21	10	2025	\$ 418.860.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 418.860.000,00</b>

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>
<b>INFORME JURÍDICO</b>		
<p><b>Garantía de Cumplimiento y Buen Manejo del Anticipo:</b> ID de la garantía CO1.WRT.17972763. Justificación: Cumplimiento contractual y buen manejo y correcta inversión del anticipo. Tipo de garantía: Contrato de seguro. Valor asegurado: \$1.918.314.742,00 COP. Emisor: Seguros del Estado S.A. Fecha de finalización: 23 de septiembre de 2031 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito). Estado: Aprobada.</p> <p><b>Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual:</b> ID de la garantía CO1.WRT.17974722. Justificación: Responsabilidad civil extracontractual. Tipo de garantía: Contrato de seguro. Valor asegurado: \$427.050.000,00 COP. Emisor: Seguros del Estado S.A. Fecha de finalización: 23 de septiembre de 2026 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito). Estado: Aprobada.</p>		
<b>OBSERVACIONES:</b>		
Se reporta avance en 0%		

  
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "**No aplica o N.A.**"
