

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------------|
| <div><div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| Principio de Procedencia:<br>4602.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 |
| Página: 1 de # 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |             |                      |
| UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 20/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |             |                      |
| Semana No 100 Del : 12/12/2025 AL: 18/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |             |                      |
| Plazo Total 922 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 697 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |             |                      |
| porcentaje del tiempo transcurrido(%) 75.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| Nombre del Supervisor : ING. ALEXANDER GARCIA BENAVIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |             |                      |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |             |                      |
| CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |             |                      |
| SANTIAGO DE TOLÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |             |                      |
| Semanal Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |             |                      |
| (%) Programado 57.01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |             |                      |
| Valor programado (\$) \$ 70.300.702.898.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |             |                      |
| Semanal Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |             |                      |
| (%) Ejecutado 59.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Valor ejecutado (\$) \$ 73.391.011.989.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |             |                      |
| Evaluación Porcentaje Adelanto 2.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Valor Adelanto \$ 3.090.309.090.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| *No se toma valor semanal en este informe, debido a que se retoma con la reprogramacion actualizada a la prorroga hasta 31 de julio de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| * Se toma valor de la reprogramacion a la fecha del presente informe, de acuerdo con el Plan de Trabajo ajustado, entregado por el contratista mediante el comunicado 2025-ATSC-CENV-901 del 10 de diciembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |             |                      |
| DATOS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |             |                      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |             |                      |
| Contratista: CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |             |                      |
| Contratista: CONSORCIO EPSILON TOLÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| Contrato No: 23000821 H4 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |             |                      |
| Contrato No: 23000882 H3 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |             |                      |
| Valor Inicial: \$ 123.318.228.742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |             |                      |
| Valor Inicial: \$ 9.946.006.472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |             |                      |
| Valor Anticipo: \$ 40.325.952.273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |             |                      |
| Valor Anticipo: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| Valor Actualizado al modificadorio : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |             |                      |
| Valor actualizado al modificadorio : \$ 14.454.828.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| Valor actualizado 2: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |             |                      |
| Valor actualizado 2: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |             |                      |
| Plazo Inicial: Hasta 15 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| Plazo Inicial: Hasta 15 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| Plazo actualizado: Hasta 31 de julio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| Plazo actualizado: Hasta 31 de julio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| Fecha de iniciación: 22 de enero 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |             |                      |
| Fecha de iniciación: 22 de enero 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |             |                      |
| Fecha de vencimiento: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |             |                      |
| Fecha de vencimiento: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |             |                      |
| Modificadorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable componedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Modificadorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) items no previstos, sin adición ni prorroga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |             |                      |
| Modificadorio No. 3 - Inclusión de un (1) ítem no previsto, sin adición ni prorroga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Modificadorio No.4 -Prorroga hasta el 31 de julio de 2026, modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |             |                      |
| Clausula 6 – Anticipo, integración en el Formato 1 A – Anexo al presupuesto oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| (Creación bolsa de ajustes de precios y desagregar los ítems del capítulo eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| 13.13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5; 13.8; 13.9; 13.10; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14;13.16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                        |             |                      |
| 13.18; 13.26; 13.27; 13.30; 13.32 y 13.33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |             |                      |
| Modificadorio N°1 - Prórroga hasta el 31 de julio de 2026, adición por la suma de \$4.508.822.508,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Incluido IVA y modificación al formulario 1 – Propuesta económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| Fecha de Terminación Según Prórroga No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |             |                      |
| Fecha de Terminación Según Prórroga No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |             |                      |
| Suspensión No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| Suspensión No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| Periodo de Suspensión No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |             |                      |
| Periodo de Suspensión No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |             |                      |
| Levantamiento de la suspensión No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| Levantamiento de la suspensión No. N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| Nueva fecha de terminación 31-jul-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Nueva fecha de terminación 31-jul-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| Valor total actual del contrato \$ 123.318.228.742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| Valor total actual del contrato \$ 14.454.828.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |             |                      |
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |             |                      |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-772-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-835 del 14 de noviembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-620-2025, con asunto: Recolección y acopio de madera comercial, no comercial y tocones que se encuentran dispersos en la franja de seguridad de Hito 2'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |             |                      |
| El día 12 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-577-2025 con asunto Respuesta al Comunicado N° 2025262000061955 cuyo asunto es: "Solicitud de complementación al concepto de Interventoría frente a la solicitud de prórroga del Contratista mediante comunicado 2025-ATSC-CENV-892 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto: "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra" y alcance al Comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-565-202 del 06 de Diciembre del 2025, cuyo asunto es "Traslado y concepto de la interventoría a la solicitud de prórroga del Contratista mediante comunicado 2025-ATSC-CENV-892 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto: "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra."                                                                               |  |                        |             |                      |
| El día 12 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-578-2025 con asunto Alcance al comunicado EPSILON-TOLU-BTA-23000882H3-565-2025, con asunto "Traslado y concepto de la Interventoría a la solicitud de prórroga del Contratista mediante comunicado 2025-ATSC-CENV-892 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto: "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |             |                      |
| El día 12 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-579-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-903, con asunto, "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-892 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| El día 12 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-580-2025 con asunto Alcance comunicado EPSILON_TOLU BTA-23000882H3-567-2025, con asunto: "Solicitud de prórroga y adición para el contrato de Interventoría No. 23000882 H3 DE 2023"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| El día 12 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-581-2025 con asunto Remisión de Acta de Cobro No. 11 Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |             |                      |
| El día 13 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-582-2025 con asunto Justificación para el reajuste de precios al Contrato de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-583-2025 con asunto Remisión Informe semanal de interventoría No. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-773-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-831 con asunto: Presentación de personal – Especialista de Diseño Geométrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-774-2025 con asunto Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-890 de 5 de diciembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-741-2025, con asunto: "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-819 del 8/11/2025 con asunto: Presentación auxiliar ambiental"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-775-2025 con asunto Reiteración comunicado No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-522-2025 del 10 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-807 del 4 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Remisión del MEMORANDO TÉCNICO MT-F3-PAV-APC-565-00-863-26-V0 con alcance "Alcance memorando técnico MT-F3-PAV-APC-565-00-807-25 para la evaluación de alternativas orientadas a optimizar el diseño de la estructura de pavimento para la ampliación de la pista del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, ubicado en el municipio de Tolú, departamento de Sucre, mediante la incorporación de dos alternativas constructivas: la primera considerando el uso de geoceldas como reemplazo del ítem P-209 correspondiente a la base granular triturada, y la segunda contemplando la implementación de una capa tipo BTC conforme al ítem P-304 de las especificaciones de la FAA". |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-776-2025 con asunto Reiteración comunicado No. EPSILON TOLU-23000882H3-739-2025 del 21 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-815 del 7 de noviembre de 2025, cuyo asunto es: "Remisión de APU No Previsto para Base Granular estabilizada con Cemento de acuerdo con Alternativa No. 3 para la ampliación de pista".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-777-2025 con asunto Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-885 del 4 de diciembre de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-619-2025 con asunto "Observaciones Material Tipo FAA P-209," y respuesta a comunicado EPSILON TOLU23000882H3-736-2025 con asunto "Observaciones Material Tipo FAA P-154".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-778-2025 con asunto Solicitud de espacios de sensibilización para el personal concerniente al Riesgo Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-779-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-891 del 5 de diciembre de 2025 con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-653-2025 y EPSILON TOLU-23000882H3-718-2025, relacionados con la recolección de madera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |             |                      |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-780-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-888 con asunto: Presentación de personal – Especialista de Diseño Geométrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |             |                      |
| El día 18 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-781-2025 con asunto Reiteración No. 3 a la respuesta del comunicado No. EPSILON TOLU-23000882H3-599-2025 con asunto "Solicitud presentación de fecha para la entrega del Informe correspondiente a la prospección intensiva adelantada por el Consorcio Aeropuerto del 13 de agosto al 1 de octubre de 2025 de fecha 9 de octubre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |             |                      |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <div><div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div><div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |                             |                          |
| <b>Principio de Procedencia:</b><br>4602.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Clave:</b> GSAP 1.0-12-028 | <b>Versión:</b> 01 | <b>Fecha:</b> 01/MARZO/2020 | <b>Página:</b> 1 de # 10 |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-785-2025 con asunto Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-702 del 22 de agosto de 2025 con asunto: Notificación de actualización de precio para la prestación del servicio de recolección de residuos ordinarios por parte del gestor autorizado ECOSERVICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-786-2025 con asunto Seguimiento permanente actividad de excavación con chequeo de niveles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-787-2025 con asunto Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-883 del 02 de diciembre de 2025. Remisión del Plan de Trabajo. Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-876 y respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-552-2025 con asunto "Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-869 con asunto "Solicitud de emisión de NOTAM".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-788-2025 con asunto Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-855 del 25/01/2025 referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-719-2025 con asunto: "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-808 del 4/11/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-651-2025, con asunto: "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-757 del 20/10/2025, referente a: Respuesta a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-593-2025, con asunto: "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-696 del 30/09/2025, referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-548-2025 con asunto: "Solicitud de orden y aseo en el área donde se ubica el tanque cisterna, en conjunto con el manejo y disposición de residuos líquidos peligrosos en campamento, en atención al cumplimiento de las obligaciones ambientales fijadas en la Resolución No 1074 de 2023".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-584-2025 con asunto Alcance al Oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-581-2025 con asunto "Remisión de Acta de Cobro No. 11 Interventoría"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-585-2025 con asunto Acta Parcial Corte No 17 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-789-2025 con asunto Solicitud de información sobre iluminación portátil, disposición de material de excavación y personal de monitoreo arqueológico para trabajos nocturnos en Arqueología durante la implementación del PMA aprobado en la Resolución No. 0878 de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-790-2025 con asunto Solicitud de implementación de medidas establecidas en el PMA, para el manejo de material de descapote y material de excavación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                    |                             |                          |
| El día 15 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-791-2025 con asunto Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-897 Con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-740-2025, con asunto: "Solicitud de cumplimiento medidas de manejo ambiental, establecidas en la ficha PMA-MAS-6 MANEJO DE RESIDUOS CONVENSIONALES Y MATERIALES SOBANTES/ Acción 3, Recolección y almacenamiento"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |                          |
| El día 16 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-586-2025 con asunto Traslado de los comunicados mediante comunicados 2025-ATSC-CENV-877 del 01 de diciembre de 2025 y comunicado 2025-ATSC-CENV-889 del 04 de diciembre de 2025 , referente a reconocimiento del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a cargo del Fondo de Compensaciones – BMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-587-2025 con asunto Remisión Informe semanal de interventoría No. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-792-2025 con asunto Respuesta a oficio 2025-ATSC-CENV-879 con asunto "Solicitud de recursos con cargo a la BMA para refrigerios en reunión con los emprendedores que asistirán a la feria".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-793-2025 con asunto Respuesta a los oficios 2025-ATSC-CENV-801 con asunto "Solicitud de reconocimiento de los conceptos correspondientes con cargo al Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA)." y el oficio 2025-ATSC-CENV-812 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-801 con asunto "Solicitud de reconocimiento de los conceptos correspondientes con cargo al Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA)."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-794-2025 con asunto Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-894 con asunto "Solicitud aprobación de gastos imprevistos para la feria de emprendimiento - Ficha MGS-3 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" y Traslado comunicado 2025262020062369 Id: 2423735 con asunto "Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-566-2025 del 06 de diciembre de 2025 – Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-894 con asunto "Solicitud aprobación de gastos imprevistos para la feria de emprendimiento - Ficha MGS-3 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-795-2025 con asunto Solicitud de intervención forestal para el cumplimiento de la reglamentación sobre Superficies Limitadoras de Obstáculos (SLO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-796-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-893 con asunto: Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-886 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC CENV-884 con asunto "Equipos para la ejecución del contrato."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-797-2025 con asunto Respuesta a los comunicados N° 2025-ATSC-CENV-861, con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra." - N° 2025-ATSC-CENV-868, con asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-532-2025 con asunto "Respuesta al comunicado N° 2025-ATSC-CENV-826, con asunto "Seguimiento al oficio 2025-ATSC-CENV-774 mediante el cual se solicitó a la Entidad una reunión, con el fin de darle trámite a la prórroga del plazo que requiere el Contrato." - N° 2025-ATSC-CENV-892, con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra." - N° 2025-ATSC-CENV-903, con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-892 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-798-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-898 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-767-2025 con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-884 con asunto: Equipos para la ejecución del contrato, y al Oficio N° 2025-ATSC-CENV-886 con asunto: Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-884 con asunto "Equipos para la ejecución del contrato."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                    |                             |                          |
| El día 17 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-588-2025 con asunto Respuesta a los siguientes oficios: 2025-ATSC-CENV-901 con asunto "Remisión del Plan de Trabajo al 31 de Julio de 2026. Alcance al comunicado 2025-ATSC CENV-892 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-861 con asunto "Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra." y 2025-ATSC-CENV-902 con asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-503-2025 con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-523 que tiene como asunto "Trazabilidad de la presentación y actualización del Plan de Trabajo y respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-150 "Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025 con asunto "Alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 que tiene como asunto "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero" y Alcance al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 con asunto "Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU 23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                             |                          |
| El día 18 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-799-2025 con asunto Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-887 del 4 de diciembre de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-469-2025 con asunto "Respuesta al comunicación No. 2025-ATSC-CENV-347-2025, cuyo objeto es: "Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-206-2025 con asunto "Observaciones Proceso Constructivo en la instalación de Mezcla asfáltica – Tramo K0+885 y el K0+875, Calle Bravo y la ampliación de pista entre la Calle Bravo y la Calle Alpha", así como a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-203-2025, EPSILON TOLU23000882H3-198-2025, EPSILON TOLU-23000882H3-197-2025 y EPSILON TOLU23000882H3-193-2025" y EPSILON TOLU-23000882H3-602-2025 con asunto "Identificación de deterioros puntuales tipo exudación en el pavimento asfáltico".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                    |                             |                          |
| El día 18 de diciembre de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-800-2025 con asunto Observaciones al comunicado 2025-ATSC-CENV-839, cuyo asunto es: "Remisión del Acta de Obra No.17".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                    |                             |                          |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                    |                             |                          |
| El día viernes 12 de diciembre de 2025 se realizó reunion en obra con participación de Contraloría, Aerocivil, Contratista e Interventoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                    |                             |                          |
| ACTIVIDADES TECNICAS - REPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                    |                             |                          |
| <b>viernes, 12 de diciembre de 2025</b><br><br>Excavación ampliación pista margen izquierdo K0+630 al K0+660<br>Nivelación sbg ampliación pista margen izquierdo<br>Lleno franja de seguridad con P152 margen izquierdo hito 1<br>Limpieza descole canal, parte interna del aeropuerto<br>Extendido de material granular P 152 K1+820 a mayores margen derecha franjas de seguridad<br>Suministro y extendido de material granular P 154 k1+590 a mayores margen derecha franja de seguridad<br>Excavación k1+880 a mayores ordenadas 35-75 margen derecha franja de seguridad<br>Suministro e instalación de subbase granular 2capa de K0+645 aK0+830, costado izquierdo, entre ordenadas -12 a -23.85<br>Suministro e instalación de material de mejoramiento en franja de seguridad de K1+840 a K1+870, costado derecho, entre ordenada 40 a 75<br><br><b>Estado del clima:</b> Día seco<br><b>Topografía</b><br>* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de ampliación de pista de K0+640.00 a K0+660.00, costado izquierdo; entre ordenadas -12.00 a -23.90.<br>* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K+520.00 a K0+560.00, costado izquierdo; entre ordenadas -58.00 a -65.00.<br>* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K0+830.00 a K0+870.00; costado derecho; entre ordenadas 40.00a 75.00.<br><b>sábado, 13 de diciembre de 2025</b><br><br>Tome muestra de materiales granulares para ensayos de laboratorio<br>Extendido de material granular P 152 k1+870 a mayores margen derecha franjas de seguridad ordenadas 35-75<br><br><b>Estado del clima:</b> Día seco<br><b>Topografía</b><br>* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de ampliación de pista de K0+610.00 a K0+630.00;costado izquierdo; entre ordenadas -12.00 a -23.90.<br>* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K1+870.00 a K1+920.00; costado derecho; entre ordenadas 40.00 a 75.00.<br><b>domingo, 14 de diciembre de 2025</b><br><br>No se realizaron actividades por ser día festivo.<br><br><b>Estado del clima:</b> Día seco<br><b>Topografía</b><br>No se realizaron actividades. |                               |                    |                             |                          |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| <div>  <div> AERONÁUTICA CIVIL<br/> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL </div> </div> <div> <div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |             |                      |
| Principio de Procedencia:<br>4602.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 |
| Página: 1 de # 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |                      |
| <div> <div>lunes, 15 de diciembre de 2025</div> <div> Retiro rampa provisional k1+020 costado derecho<br/> Sbg f.s. costado derecho k1+590 al k1+700, ancho completo<br/> P152 f.s. costado derecho k1+590 al k1+830, ancho completo<br/> Excavación f.s. costado derecho k1+590 al k1+990 ancho completo<br/> Excavación k0+700 a menores ordenadas 12-23.9 margen derecha ampliación de pista<br/> Excavación franja seguridad costado derecho </div> <div> Estado del clima: Día seco. </div> <div> Topografía <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franjas de seguridad de K0+930.00 a K0+980.00; costado derecho; entre ordenadas 35.00 a 75.00. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de material de mejoramiento P152 en zona de franjas de seguridad de K1+710.00 a K1+810.00; costado derecho; entre ordenadas 35.00 a 75.00. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza levantamiento topográfico de secciones de terreno natural de K0+540.00 a K0+640.00, costado derecho; entre ordenadas 50.00 a 80.00. </div> </div> </div> <div> <div>martes, 16 de diciembre de 2025</div> <div> Suministro y extensión del K1 +950 hacia mayores de P-152 margen derecho en franja de seguridad<br/> Cereo y compactación corona de P-152 en franja de seguridad margen derecho del K1+920 hacia menores<br/> Excavación ampliación de pista margen derecha del K1+710 hacia menores.<br/> Cereo corona de sub base margen izquierda en ampliación de pista<br/> Suministro de P152 en franja de seguridad margen izquierda al K0+460<br/> Limpieza de canal existente<br/> Extensión de sub base granular. Ampliación de pista margen margen derecho en tramo liberado de excavación<br/> Suministro de sub base granular del K0+700 hacia menores. Ampliación de pista margen derecho<br/> Suministro de P-154 en franja de seguridad Margen derecha en el K1+700 </div> <div> Estado del clima: Se presentó leves lluvias desde las 6:00 pm hasta las 6:30 pm en obra </div> <div> Topografía <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de ampliación de pista de K0+660.00 a K0+700.00, costado derecho; entre ordenadas 12.00 a 23.90. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franja de seguridad de K0+460.00 a K0+480.00; costado izquierdo; entre ordenadas -58.00 a -65.00. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza levantamiento topográfico de secciones de terreno natural de K0+000.00 a K0+290.00, costado derecho; entre ordenadas 47.00 a 80.00. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franja de seguridad de K1+980.00 a K2+020.00; costado derecho; entre ordenadas 35.00 a 75.00. </div> </div> </div> <div> <div>miércoles, 17 de diciembre de 2025</div> <div> Drenaje calle bravo<br/> Suministro, extensión y compactación de P-154 franja de seguridad margen derecha del K1+700 hacia mayores<br/> Humectación corona de P-152 margen derecha franja de seguridad del K1+800 hacia mayores<br/> Excavación franja de seguridad margen derecho del K2+050 hacia mayores<br/> Suministro y extendido de material granular P 152 k0+480 - k0+460 ordenadas 58-65 margen izquierda franja de seguridad<br/> Suministro y extensión de sub base granular en franja de seguridad margen derecha del K1+730 hacia mayores </div> <div> Estado del clima: Día seco </div> <div> Topografía <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación en zona de franja de seguridad de k2+020.00 a K2+070.00; costado derecho; entre ordenadas 40.00 a 75.00. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de material de mejoramiento P152 en zona de franja de seguridad de K2+860.00 a K2+930.00; costado derecho; entre ordenadas 35.00 a 75.00. </div> </div> </div> <div> <div>jueves, 18 de diciembre de 2025</div> <div> Extensión de sub base granular en franja de seguridad margen izquierda del K1+700 hacia mayores ord 70-75<br/> Excavación del K2+070 hacia mayores franja de seguridad margen derecha<br/> Compactación de corona de P-152 margen derecha del K1+810 al K1+930. (Tramo pendiente por densidades)<br/> Cereo corona de sub base granular margen izquierdo del K0+950 hacia menores. Ampliación de pista<br/> Excavación ampliación de pista margen derecho del K0+660 hacia menores </div> <div> Estado del clima: Día seco </div> <div> Topografía <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de excavación en zona de franjas de seguridad de K2+070.00 a K2+200.00.; costado derecho; entre ordenadas 40.00 a 75.00. </div> <div> * La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de cereo de segunda capa de sub base granular en zona de ampliación de pista de K0+800.00 a K0+950.00: costado izquierdo; entre ordenadas -12.00 a -23.80. </div> </div> </div> |                        |             |                      |

| COMPONENTE AMBIENTAL:  Durante la semana No 100 se desarrollaron las siguientes actividades:  viernes, 12 de diciembre de 2025  \*Seguimiento y verificación del proceso de donación de madera repicada 1m3  \*Seguimiento y verificación del proceso de donación de madera comercial 1m3  \*Mesa de trabajo de revisión de códigos y alturas de las especies arbóreas que se intervinieron a la fecha en el proyecto  sábado, 13 de diciembre de 2025  \*EPSILON TOLU-23000882H3-774-2025 Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-890 de 5 de diciembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-741-2025, con asunto: "Respuesta comunicado 2025- ATSC-CENV-819 del 8/11/2025 con asunto: Presentación auxiliar ambiental"  \*EPSILON TOLU-23000882H3-779-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-891 del 5 de diciembre de 2025 con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-653-2025 y EPSILON TOLU-23000882H3-718-2025, relacionados con la recolección de madera.  \*Seguimiento y verificación en campo  \*1. Proceso de humectación de vías de acceso  \*2.Seguimiento y verificación del proceso de transporte de material pétreo  \*3.Verificación del estado y mantenimiento de unidades sanitarias  \*4.Seguimiento al proceso de repique de madera  domingo, 14 de diciembre de 2025  Día no Laborado  lunes, 15 de diciembre de 2025  \*EPSILON TOLU-23000882H3-772-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-835 del 14 de noviembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-620-2025, con asunto: "Recolección y acopio de madera comercial, no comercial y tocones que se encuentran dispersos en la franja de seguridad de Hito 2".  \* Revisión de informe del mes de octubre presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolí  \*Seguimiento y verificación en campo  \*1. Proceso de humectación de vías de acceso  \*2. Verificación del estado de puntos de segregación y separación de residuos  \*3. Seguimiento al proceso de transformación de madera en estacas para fines del proyecto  \*EPSILON TOLU-23000882H3-785-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-702, 2025-ATSC-CENV-877, 2025-ATSC-CENV-889 "Reiteración de la solicitud realizada mediante oficio 2025-ATSCCENV-702 con asunto "Notificación de actualización de precio para la prestación del servicio de recolección de residuos ordinarios por parte del gestor autorizado ECOSERVICIOS.""  EPSILON TOLU-23000882H3-787-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-883 del 02 de diciembre de 2025. Remisión del Plan de Trabajo. Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-876 y respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA23000882H3-552-2025 con asunto "Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-869 con asunto "Solicitud de emisión de NOTAM". |  |  |  |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| <div><div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div><div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                      |                   |
| Principio de Procedencia:<br>4602.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 | Página: 1 de # 10 |
| <p>*EPSILON TOLU-23000882H3-791-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-897 Con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-740-2025, con asunto: "Solicitud de cumplimiento medidas de manejo ambiental, establecidas en la ficha PMA-MAS-6 MANEJO DE RESIDUOS CONVENSIONALES Y MATERIALES SOBRANTES/ Acción 3, Recolección y almacenamiento"</p> <p><b>martes, 16 de diciembre de 2025</b></p> <p>*EPSILON TOLU-23000882H3-788-2025 con asunto: "Solicitud de orden y aseo en el área donde se ubica el tanque cisterna, en conjunto con el manejo y disposición de residuos líquidos peligrosos en campamento, en atención al cumplimiento de las obligaciones ambientales fijadas en la Resolución No 1074 de 2023".</p> <p>*EPSILON TOLU BTA-23000882H3-558-2025 Traslado del comunicado No 2025-ATSC-CENV-858 del 26/11/2025, con asunto: Traslado de los hallazgos relacionados con el control de fauna en la pista del aeropuerto Golfo de Morrosquillo</p> <p>*EPSILON TOLU BTA-23000882H3-574-2025 Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-851 del 28/11/2025, referente a: Presentación de los proponentes para el Monitoreo de calidad de aire para el año 2025</p> <p>*Recorrido de verificación ambiental en campo;</p> <p>*1. Verificación del estado de los canales perimetrales</p> <p>*2. Seguimiento al proceso de disposición de material de RCD Mandalay, corregimiento de Porvenir</p> <p><b>miércoles, 17 de diciembre de 2025</b></p> <p>*EPSILON TOLU-23000882H3-795-2025 Solicitud de intervención forestal para el cumplimiento de la reglamentación sobre Superficies Limitadoras de Obstáculos (SLO)</p> <p>*Participación de mesa de trabajo revisión e medidas para el PSO, formalizada mediante acta CET-CAT-404</p> <p>*Recorrido de verificación en campo, condición del canal arroyo pechelin</p> <p>*Recorrido de verificación en campo</p> <p>*1. Seguimiento al proceso de humectación de vías de acceso</p> <p>*2. Seguimiento y verificación del ingreso de material pétreo</p> <p>*EPSILON TOLU BTA-23000882H3-586-2025 Traslado de los comunicados mediante comunicados 2025-ATSC-CENV-877 del 01 de diciembre de 2025 y comunicado 2025-ATSC-CENV-889 del 04 de diciembre de 2025 , referente a reconocimiento del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a cargo del Fondo de Compensaciones – BMA.</p> <p><b>jueves, 18 de diciembre de 2025</b></p> <p>*Recorrido de verificación en campo</p> <p>* 1. Seguimiento al proceso de humectación de vías de acceso Hito 1</p> <p>*2. Seguimiento y verificación del estado de puntos de segregación y clasificación de residuos</p> <p>*3. Seguimiento al proceso de limpieza de unidades sanitarias</p> <p>* Revisión de la información presentada en el informe #97 por el Consorcio Aeropuerto Tolu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |                      |                   |
| <b>COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |             |                      |                   |
| <p>Durante la semana No 100 se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p><b>viernes, 12 de diciembre de 2025</b></p> <p>Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>* 1. Acompañamiento en las actividades de sensibilización y prevención a los riesgos apoyada por la ARL en campamento.</p> <p>* 2. Se realiza inspección, observación y seguimiento de las actividades de instalación de material en los laterales de la pista, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en los procedimientos, uso de EPP conforme a la Seguridad Operacional.</p> <p>* 3. Se solicita revisión y limpieza de pista garantizando la seguridad operacional sin la presencia de FOD</p> <p><b>sábado, 13 de diciembre de 2025</b></p> <p>Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>* 1. Se realiza inspección, observación y seguimiento en el cumplimiento de las medidas de seguridad en los procedimientos, uso de EPP en las actividades de obra. Se solicita la limpieza de pista luego de actividades.</p> <p><b>domingo, 14 de diciembre de 2025</b></p> <p>Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>DIA NO LABORAL</p> <p><b>lunes, 15 de diciembre de 2025</b></p> <p>Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>* 1. Seguimiento a la maquinaria mínima operando en las actividades constructivas. Se realiza la comparación del Anexo 1 - Anexo Tecnico identificando los equipos definidos y los que realizan operación en campo.</p> <p>* 2. Se hace inspección visual de las actividades de obra, se verifica el uso de EPP, uso de chalecos y estado de la pista referentes a FOD</p> <p>* 3. Inspección y seguimiento en las actividades de arqueología, se realiza observación de los procedimientos bajos las estrictas condiciones que se tienen por la cercanía del frente de obra a la pista.</p> <p>EPSILON TOLU-23000882H3-780-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-888 con asunto: Presentación de personal – Especialista de Diseño Geométrico.</p> <p>EPSILON TOLU-23000882H3-778-2025 con asunto: Solicitud de espacios de sensibilización para el personal concerniente al Riesgo Operacional</p> <p>EPSILON TOLU-23000882H3-774-2025 con asunto: Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-890 de 5 de diciembre de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-741-2025, con asunto: "Respuesta comunicado 2025 ATSC-CENV-819 del 8/11/2025 con asunto: Presentación auxiliar ambiental"</p> <p>EPSILON TOLU-23000882H3-773-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-831 con asunto: Presentación de personal – Especialista de Diseño Geométrico.</p> <p><b>martes, 16 de diciembre de 2025</b></p> <p>* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>* 1. Inspección de puntos de cierres sobre la Ruta 9004. Se realiza observación del control de acceso hacia ingreso en el aeropuerto por el tramo del muelle Compas, se observa paleta y maletines como apoyo en sitio. En el otro punto se evidencia a paleta y control con apoyo de maletines.</p> <p>* 2. Se realiza seguimiento de las actividades de humectación para evitar material particulado</p> <p>* 3. Inspección y seguimiento de preoperacionales de vehículos que operan en campo.</p> <p><b>miércoles, 17 de diciembre de 2025</b></p> <p>Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>* 1. Se realiza inspección y seguimiento en las actividades del frente de trabajo de arqueología, se verifica uso de chalecos y EPP, procedimiento seguro dentro del frente debido a la cercanía que se tiene con la pista de aterrizaje.</p> <p>* 2. Se realiza comité de Seguridad Operacional con la participación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Area Operativa del Aeropuerto, Contratista e Interventoría para tratar temas referentes a el aterrizaje que se tuvo el martes 16 donde varias volquetas entre otros equipos se encontraban operando muy cerca a la pista sobre las distancias no permitidas en los horarios de operación del aeropuerto. Se levanta el acta CET CAT 404</p> <p>* 3. Inspección en campamento. Se realiza observación de medidas preventivas en las actividades que se realizan en campamento en cuanto a mantenimiento, puntos de acopio temporal de RESPEL y demas.</p> <p>EPSILON TOLU-23000882H3-798-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-898 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-884 con asunto: Equipos para la ejecución del contrato, y al Oficio N° 2025-ATSC-CENV-886 con asunto: Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-884 con asunto "Equipos para la ejecución del contrato."</p> <p>EPSILON TOLU-23000882H3-796-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-893 con asunto: Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV 886 con asunto "Alcance al oficio 2025-ATSC CENV-884 con asunto "Equipos para la ejecución del contrato."</p> <p><b>jueves, 18 de diciembre de 2025</b></p> <p>Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:</p> <p>* 1. Actividades con apoyo de la ARL para el personal de Interventoría.</p> <p>* 2. Se hace acompañamiento a la capacitación de Seguridad Operacional en las instalaciones del Aeropuerto.</p> |                        |             |                      |                   |
| <b>COMPONENTE ARQUEOLOGIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |                      |                   |
| <p>Durante la semana No.100 se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p><b>viernes, 12 de diciembre de 2025</b></p> <p>* Seguimiento al centésimo noveno (109) día de los trabajos en terreno. Los profesionales del área de arqueología del Consorcio Aeropuerto Tolu SC continuaron las labores arqueológicas bajo las nuevas normativas de los horarios del servicio del aeropuerto (ventana operacional y seguridad aeroportuaria), para adelantar la excavación de las cuadrículas del nivel 9 (80-90 cm), interviniendo un total de 15 cuadrículas en los ejes C, D, E, F, G, H, I y J, donde se evidenció alta concentración de material cultural y todas las cuadrículas intervenidas tuvieron vestigios arqueológicos, por lo que fueron registradas como positivas. El equipo de trabajo estuvo conformado por 2 profesionales (Deyber Hernández y Janine Núñez) y 11 ayudantes de obra. No hubo jornada extendida, solo laboraron las horas reglamentarias (no hay horas extras para este día). Seguimiento al monitoreo de la Unidad de Verificación (UV) No. 1667 (franja de seguridad).</p> <p>* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de salvamento (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |                      |                   |









FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


|                                       |                        |             |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Principio de Procedencia:<br>4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 | Página: 1 de # 10 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Personal de Interventoría | 36  |
| Personal del Contratista  | 109 |
| Total Personal en Obra    | 145 |


RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

| PERFIL                                            | PROFESIONAL                     | ESTADO                 | RESPUESTA DEL COMUNICADO              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Director de Interventoría                         | Wilson Giovanni Urrea Urrea     | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Residente de Interventoría                        | Claudia Lorena Losada Plazas    | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista en vías y Pavimentos                 | Mario Hernández Valencia        | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista Ambiental                            | Isis Patricia Herrera Pérez     | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Residente Ambiental                               | Danny Paola Losada Plazas       | Aprobado               | 2024262020006831 (14/03/2024)         |
| Especialista Diseño Geométrico                    | Edgar Rene Urrea Urrea          | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista Hidráulico                           | Roberto Anderson Jaimés Silva   | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista en Electromecánico o Eléctrico       | Iván Jaramillo Jaramillo        | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista en Geotecnia                         | José Armando Ruiz Angarita      | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista Aeroportuario o Aeropistas           | Javier Augusto Moscoso          | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Especialista Profesional en costos y presupuestos | Henry Alexander Urrea Urrea     | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Ingeniero Apoyo                                   | Erika Johanna Caro Rojas        | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Ingeniero Apoyo                                   | Andrés Mauricio Urrea Rivera    | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Inspector SST                                     | Yarelis campo Villero           | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Cadenero 1 (1)                                    | José Aurelio Díaz Velásquez     | Aprobado               | 202432185245113 (02/04/2024)          |
| Cadenero 2                                        | Juan Camilo Ospina Chávez       | Aprobado               | 2024262020004866 (26/02/2024)         |
| Auxiliar servicios generales de interventoría     | Leonela Velásquez Cuadrado      | No requiere aprobación | N/A                                   |
| Profesional social                                | Amarylis Isabel Bojato Reales   | Aprobado               | 2024262020006830. (15/05/24)          |
| Cadenero 2 (2)                                    | Víctor Salgado Morillo          | Aprobado               | 2024262020006830. (15/05/24)          |
| Residente Ambiental                               | Hernán Guillermo Lamadrid Ariza | Aprobado               | 2024262020019900. (21/06/24)          |
| Inspector SST                                     | Jairo Luis Narváez Hernández    | Aprobado               | 2024262020019900. (21/06/24)          |
| Arqueólogo                                        | Candelaria Carriazo Lamadrid    | Aprobado               | 2024262020019900. (21/06/24)          |
| Ingeniero Forestal                                | Iván Javier Valencia Tovar      | Aprobado               | 2024262020019900. (21/06/24)          |
| Profesional social                                | Luisa Fernanda Barragan Vilora  | Aprobado               | 2024262020024102. (23/07/24)          |
| Topógrafo 1                                       | Diego Javier Vanegas Rivera     | Aprobado               | 2024262020027437. (13/08/24)          |
| Abogado                                           | Paola Andrea Serna Zapata       | Aprobado               | 2024262020024558. (26/07/24)          |
| Ingeniero residente                               | Willian Pérez Santana           | Aprobado               | 2024262020048449 (16/10/2024)         |
| Ingeniero de apoyo 3                              | Paula Viviana Afanador Ortiz    | En revisión            | EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024  |
| Ingeniero de apoyo 4                              | Licena Patricia Paternina Muñoz | En revisión            | EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024  |
| Coordinador de Interventoría                      | Juan Carlos Muñoz Muñoz         | Aprobado               | 2025262000000376 (08/01/25)           |
| Especialista en Gerencia de Proyectos             | Harold Urrea Urrea              | Aprobado               | 2025262020010505. (14/03/25)          |
| Conductor 1                                       | Juan Hernandez Cueto            | No requiere aprobación | N/A                                   |
| Conductor 2                                       | Diler Oyola Diaz                | No requiere aprobación | N/A                                   |
| Cadenero 2 (2)                                    | Jean Pier Salcedo Peinado       | Aprobado               | 2347593 (2025262020045300) 22/09/2025 |
| Apoyo Social / Arqueología                        | Ricardo Romero Velasquez        | No requiere aprobación | N/A                                   |
| Topógrafo 2                                       | Jose Sebastian Arroyo Mendez    | En revisión            | -                                     |

GRÁFICA RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO CONTRACTUAL OBRA Y PERSONAL INTERVENTORÍA

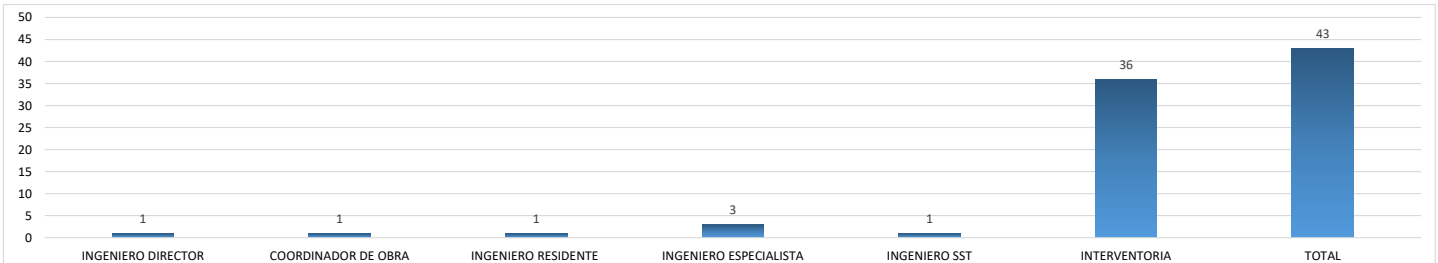

GRÁFICA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA BMA

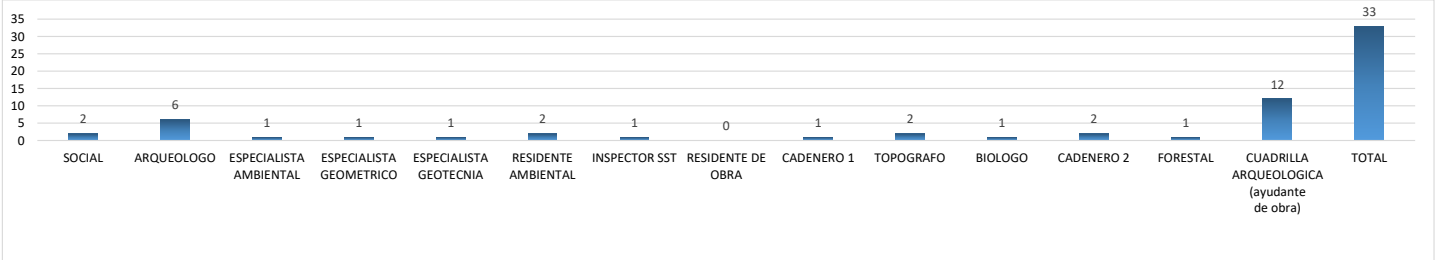

GRÁFICA RELACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO OBRA

## FORMATO






**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

|                                       |                        |             |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Principio de Procedencia:<br>4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 | Página: 1 de # 10 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|

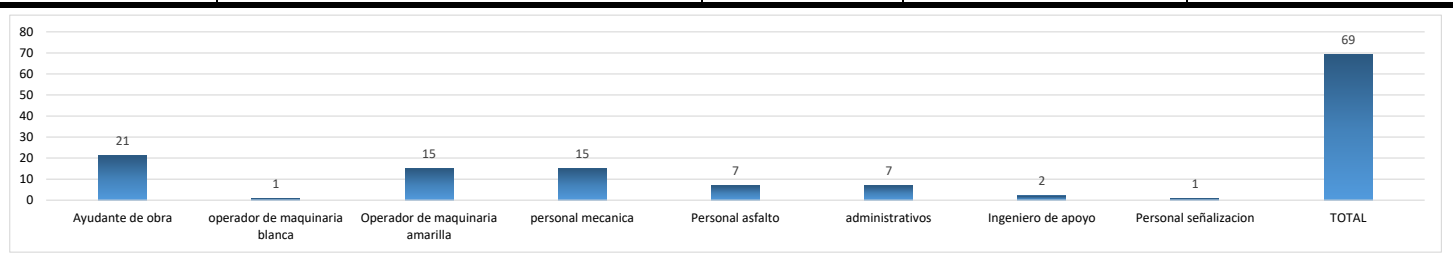

| RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA |  |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| Cantidad | Equipo                                                  | Observación                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Camioneta Chevrolet Dmax                                | Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)      |
| 2        | Estación de topografía marca TOPCON con sus componentes | Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)      |
| 2        | Primas Topográfico                                      | Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)      |
| 2        | Radios de comunicación                                  | No requiere aprobación                                                          |
| 1        | Camioneta Colorado                                      | Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión) |
| 2        | Bastones                                                | Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)      |
| GR       | Equipos de cómputo                                      | aprobación                                                                      |

## AVANCE FINANCIERO DE OBRA

| Acta Parcial de Obra No.     | Periodo                         | Costo Total           | Estado           |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1                            | ENERO - MAYO 2024               | \$ 249.033.980,00     | Pagada           |
| 2                            | MAYO - AGOSTO 2024              | \$ 839.424.223,00     | Pagada           |
| 3                            | AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024        | \$ 1.408.084.822,00   | Pagada           |
| 4                            | SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024       | \$ 1.472.170.594,00   | Pagada           |
| 5                            | OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024          | \$ 1.597.544.387,00   | Pagada           |
| 6                            | NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024        | \$ 3.601.397.645,00   | Pagada           |
| 7                            | DICIEMBRE -ENERO 2025           | \$ 2.261.245.301,00   | Pagada           |
| 8                            | ENERO -FEBRERO 2025             | \$ 2.597.408.192,00   | Pagada           |
| 9                            | FEBRERO - MARZO 2025            | \$ 5.246.238.139,00   | Pagada           |
| 10                           | MARZO - ABRIL 2025              | \$ 4.115.676.723,00   | Pagada           |
| 11                           | ABRIL - MAYO 2025               | \$ 1.954.052.623,00   | Pagada           |
| 12                           | MAYO-JUNIO 2025                 | \$ 3.092.569.629,00   | Pagada           |
| 13                           | JUNIO - JULIO 2025              | \$ 5.241.099.669,00   | Pagada           |
| 14                           | JULIO - AGOSTO 2025             | \$ 7.594.708.580,00   | Pagada           |
| 15                           | 15 AGOSTO - 15 SEPTIEMBRE 2025  | \$ 6.575.139.155,00   | Pagada           |
| 16                           | 16 SEPTIEMBRE - 15 OCTUBRE 2025 | \$ 4.056.374.129,00   | Pagada           |
| 17                           | 16 OCTUBRE - 15 DICIEMBRE 2025  | \$ 18.126.768.361,00  | Tramite de pago. |
| Total Acumulado              |                                 | \$ 70.028.936.152,00  |                  |
| Valor Total Contrato Obra    |                                 | \$ 123.318.228.742,00 |                  |
| % Avance facturado Acumulado |                                 | 56,79%                |                  |

NOTA: A la fecha del presente informe se ha efectuado el pago de las actas N°1 a la N°16. El acta 17 está en trámite de pago.

## AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

| Acta Parcial de interventoría No.         | Periodo                                 | Costo Total         | Estado          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1                                         | 22 de enero al 22 de mayo del 2024      | \$ 344.804.149,00   | Pagada          |
| 2                                         | 23 de mayo al 22 de diciembre 2024      | \$ 1.855.765.433,00 | Pagada          |
| 3                                         | 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 | \$ 250.453.450,00   | Pagada          |
| 4                                         | 23 de febrero al 22 de marzo de 2025    | \$ 256.759.983,00   | Pagada          |
| 5                                         | 23 de marzo al 22 de abril de 2025      | \$ 301.015.596,00   | Pagada          |
| 6                                         | 23 de abril al 22 de mayo de 2025       | \$ 182.608.248,00   | Pagada          |
| 7                                         | 23 de mayo al 17 de julio de 2025       | \$ 595.382.190,00   | Pagada          |
| 8                                         | 17 de julio al 22 de agosto de 2025     | \$ 471.666.995,00   | Pagada          |
| 9                                         | 22 agosto al 22 de septiembre 2025      | \$ 414.995.759,00   | Trámite de pago |
| 10                                        | 23 septiembre al 22 de octubre 2025     | \$ 303.669.267,00   | Trámite de pago |
| <b>Total Acumulado</b>                    |                                         | \$ 4.977.121.070,00 |                 |
| <b>Valor Total Contrato interventoría</b> |                                         | \$ 9.946.006.472,00 |                 |
| <b>% Avance facturado Acumulado</b>       |                                         | 50,04%              |                 |

NOTA: A la fecha del presente informe se ha efectuado el pago de las actas N°1 a la N°8 . Las actas N°9 y N°10 se encuentra en tramite de pago. El acta 11 se encuentra radicada a la entidad.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| OBSERVACIONES | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---------------|---------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo cuadro de correspondencia enviada.</li> <li>• Anexo cuadro de correspondencia recibida.</li> <li>• Anexo Actas de comité de obra</li> <li>• Anexo Registro fotográfico.</li> <li>• Anexo Avance en Project.</li> <li>• Anexo Presentacion y video semanal</li> </ul> | <div style="text-align: right;">  <p>             i) Firmado digitalmente<br/>             por WILSON GIOVANNI<br/>             URREA URREA<br/>             Fecha: 2025.12.24<br/>             09:49:54 -05'00' </p> </div> |
| <b>ING: WILSON GIOVANI URREA URREA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
