

	FORMATO	Código: FOM-13-P-4-011 *2026020001929* Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37 Versión: 2
		Informe de supervisión del contrato o convenio
		Fecha Aprobación: 2025/12/31

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 2	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/01/2026	Hasta:	31/03/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/01/2026	Hasta:	31/03/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				FUSIONWELD S.A.S			
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				901.588.360-9			
CONTRATO/CONVENIO		NÚMERO:		4600018208			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		21/07/2025			
		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		21/07/2025			
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y FABRICACION DE PLATAFORMA Y TANQUES PARA LA ZONA DE PREPARACIÓN DE RONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.						
VALOR [\$]:	INICIAL:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO M/L. (\$136'266.105), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA					
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN			
		N/A	N/A	N/A			
	VALOR TOTAL:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO M/L. (\$136'266.105), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA					
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A					
PLAZO:	INICIAL	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN			
		21/07/2025		31/12/2025			
	PRÓRROGAS	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
		1	TRES MESES	31/03/2026			
	PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE MARZO DE 2026					
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN			
		N/A	N/A	N/A			

	FORMATO	Código: FOM-3-F-4-011 *2026020001929* Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37 Versión: 2
		Informe de supervisión del contrato o convenio

		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011772	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	17/07/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100872	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)			
No. Modificación	Tipo de Modificación		Fecha
01	Prorroga No. 1: Prorrogar el contrato por un plazo de Tres (3) meses, hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta agotar el presupuesto		22/12/2025

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	EDISON ARIAS OTALVARO
	CARGO Y ÁREA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020003179

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	\$ 136.266.105,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 136.266.105,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 109.012.883,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 109.012.883,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 27.253.220,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 136.266.103,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 2,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	0%

	FORMATO	Código: FOM3-P-4.011 *2026020001929* Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37 Versión: 2
		Informe de supervisión del contrato o convenio
		Fecha Aprobación: 2025/12/31

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	Pago No.2	FE 231	2026010002390	27/03/2026	\$ 27.253.220
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					\$ 27.253.220

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor autoriza el pago **No. 2** al contratista, por valor de: (**\$ 27.253.220**) Veintisiete millones doscientos cincuenta y tres mil doscientos veinte pesos, el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

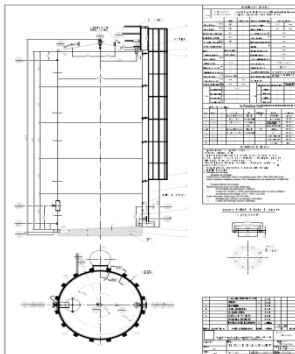
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	21/07/2025	\$ 136'266.105		\$ 136'266.105
Pago No. 1	16/12/2025		\$ 109.012.883	\$ 27.253.222
Pago No. 2	27/03/2026		\$ 27.253.220	\$ 2
TOTALES		\$ 136'266.105	\$ 136.266.103	\$ 2

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
1.Revisar los diseños y la fabricación de los tanques bajo las normas API/ASME para el diseño de tanques.	Se validaron los diseños y fabricación de los tanques de acuerdo con las normas.	



FORMATO

Código: FOM-03-F-4-01-1

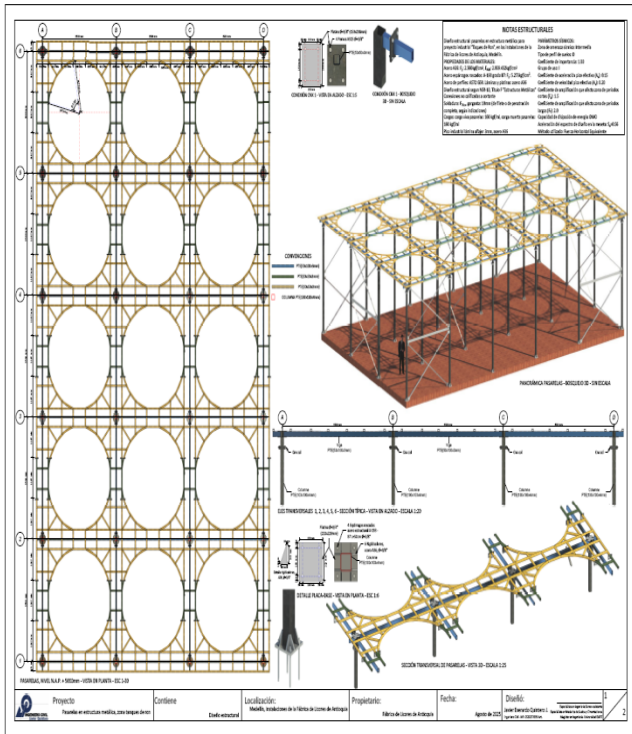
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<p>2.Verificar los tanques, sus diseños y fabricación con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quince (15) tanques en acero inoxidable para la zona de preparación de rones con capacidad de 27.000 litros.• Plataforma pasarela superior en tubería inoxidable de 1 ½" de diámetro y lámina antideslizante de acero inoxidable calibre 1/8", que permita el acceso a lo largo de los tanques e interconexión entre los tanques de distribución, para mantenimiento y limpieza.• Un (1) tanque en acero inoxidable para la zona de preparación de rones con capacidad de 50.000 litros, con sistema de acceso superior conforme a la normativa colombiana de SST.• Un (1) tanque en acero inoxidable para la zona de preparación de rones con capacidad de 100.000 litros, con sistema de acceso superior	<p>Se validaron los diseños y fabricación de los tanques teniendo en cuenta las características mencionadas en la descripción de la obligación, así mismo todas las demás características</p>	<div><p>Fotos 49 a 52. Muestra pruebas de medición de rugosidad.</p></div> <div><p>Diseño técnico de la estructura de los tanques y pasarelas, incluyendo detalles de soldadura y especificaciones de materiales.</p></div>



FORMATO

Código: FOM-3-F-4-011

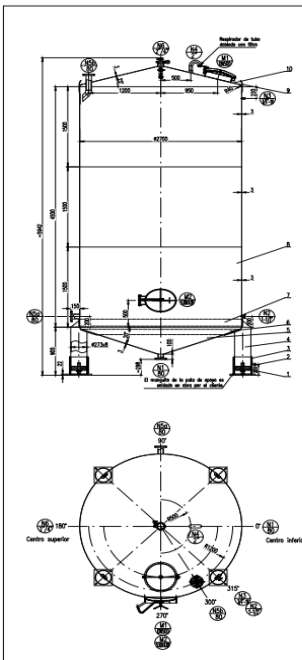
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE																																																																																																												
<p>conforme a la normativa colombiana de SST.</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisar los cálculos estructurales de cada tanque y entregar observaciones sobre especificaciones, dimensiones, geometría, planos de fabricación y montaje, incluyendo detalles, cotas y dimensiones finales, consignadas en la información técnica suministrada a la FLA.• Verificar cumplimiento normativo en almacenamiento de alcohol (INVIMA, BPM, API/ASME) y en seguridad de procesos (válvulas y alivios).• Verificar que los tanques estén fabricados con materiales aptos para contacto con alimentos (acero inoxidable AISI 304).• Verificar que la soldadura sea tipo TIG o MIG, realizada por personal calificado y libre de porosidades o defectos.• Verificar que las soldaduras estén limpias y sin imperfecciones.		<div><table border="1" data-bbox="1192 455 1362 711"><caption>VERIFICACIÓN DE MATERIALES</caption><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>VERIFICADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ACERO INOXIDABLE AISI 304</td><td>KG</td><td>1000</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>2</td><td>ACERO INOXIDABLE AISI 304</td><td>KG</td><td>500</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>3</td><td>ACERO INOXIDABLE AISI 304</td><td>KG</td><td>200</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>4</td><td>ACERO INOXIDABLE AISI 304</td><td>KG</td><td>100</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>5</td><td>ACERO INOXIDABLE AISI 304</td><td>KG</td><td>50</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr></tbody></table><table border="1" data-bbox="1192 722 1362 974"><caption>VERIFICACIÓN DE SOLDADURA</caption><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>VERIFICADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SOLDADURA TIG</td><td>M</td><td>100</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>2</td><td>SOLDADURA MIG</td><td>M</td><td>50</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>3</td><td>SOLDADURA TIG</td><td>M</td><td>20</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>4</td><td>SOLDADURA MIG</td><td>M</td><td>10</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>5</td><td>SOLDADURA TIG</td><td>M</td><td>5</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr></tbody></table><p>Detalle de soldadura de tipo TIG</p><p>No proporcional</p><p>2-814</p><p>1-22</p><table border="1" data-bbox="1192 984 1362 1110"><caption>VERIFICACIÓN DE SOLDADURA</caption><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>VERIFICADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SOLDADURA TIG</td><td>M</td><td>100</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>2</td><td>SOLDADURA MIG</td><td>M</td><td>50</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>3</td><td>SOLDADURA TIG</td><td>M</td><td>20</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>4</td><td>SOLDADURA MIG</td><td>M</td><td>10</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr><tr><td>5</td><td>SOLDADURA TIG</td><td>M</td><td>5</td><td>1.4301</td><td>SI</td></tr></tbody></table></div> <div></div>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VERIFICADO	1	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	1000	1.4301	SI	2	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	500	1.4301	SI	3	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	200	1.4301	SI	4	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	100	1.4301	SI	5	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	50	1.4301	SI	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VERIFICADO	1	SOLDADURA TIG	M	100	1.4301	SI	2	SOLDADURA MIG	M	50	1.4301	SI	3	SOLDADURA TIG	M	20	1.4301	SI	4	SOLDADURA MIG	M	10	1.4301	SI	5	SOLDADURA TIG	M	5	1.4301	SI	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VERIFICADO	1	SOLDADURA TIG	M	100	1.4301	SI	2	SOLDADURA MIG	M	50	1.4301	SI	3	SOLDADURA TIG	M	20	1.4301	SI	4	SOLDADURA MIG	M	10	1.4301	SI	5	SOLDADURA TIG	M	5	1.4301	SI
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VERIFICADO																																																																																																									
1	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	1000	1.4301	SI																																																																																																									
2	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	500	1.4301	SI																																																																																																									
3	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	200	1.4301	SI																																																																																																									
4	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	100	1.4301	SI																																																																																																									
5	ACERO INOXIDABLE AISI 304	KG	50	1.4301	SI																																																																																																									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VERIFICADO																																																																																																									
1	SOLDADURA TIG	M	100	1.4301	SI																																																																																																									
2	SOLDADURA MIG	M	50	1.4301	SI																																																																																																									
3	SOLDADURA TIG	M	20	1.4301	SI																																																																																																									
4	SOLDADURA MIG	M	10	1.4301	SI																																																																																																									
5	SOLDADURA TIG	M	5	1.4301	SI																																																																																																									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	VERIFICADO																																																																																																									
1	SOLDADURA TIG	M	100	1.4301	SI																																																																																																									
2	SOLDADURA MIG	M	50	1.4301	SI																																																																																																									
3	SOLDADURA TIG	M	20	1.4301	SI																																																																																																									
4	SOLDADURA MIG	M	10	1.4301	SI																																																																																																									
5	SOLDADURA TIG	M	5	1.4301	SI																																																																																																									



FORMATO

Código: FOM-13-F-4-011

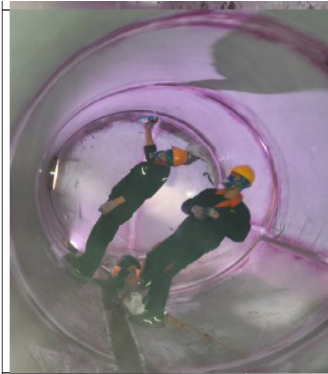
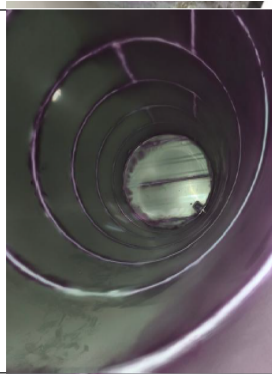
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<ul style="list-style-type: none">• Verificar que el 100 % de las soldaduras hayan sido sometidas a prueba con líquidos penetrantes.• Verificar que las superficies internas sean lisas y pulidas para evitar acumulación de residuos y facilitar la limpieza.• Validar sistemas de drenaje que aseguren el vaciado completo del contenido.• Verificar que los tanques cuenten con manholes para inspección y limpieza.• Verificar el diseño de estructuras metálicas que faciliten acceso, mantenimiento y limpieza por parte de los operarios, incluyendo escaleras tipo avión y anclajes, en baterías de tanques y en los tanques individuales de 50.000 y 100.000 litros.• Verificar el acceso superior certificado conforme a normas SST para tanques de 50.000 y 100.000 litros. Entregar diseño con evidencia del cumplimiento normativo.		     



FORMATO

Código: FOM-13-F-4-011

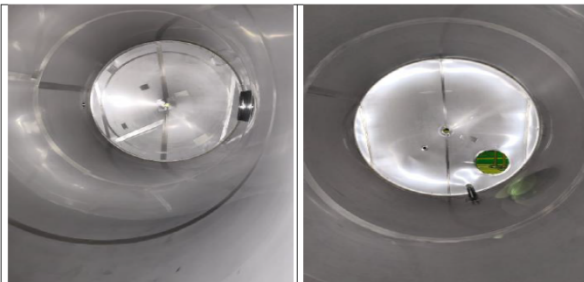
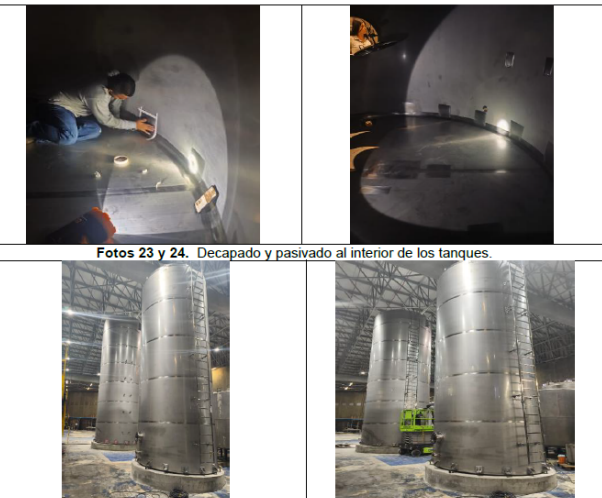
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<ul style="list-style-type: none">• Verificar la certificación de materiales: láminas de acero inoxidable 304, soldaduras, manholes, boquillas, agitadores, ensayos radiográficos y por tintas, rugosidad y acabados.• Verificar el diseño del sistema de agitación del tanque de 50.000 litros. El diseño de los agitadores debe ser explícito, en acero inoxidable, con mezcla eficiente y acabados sanitarios.• Validar procesos constructivos eficientes y rápidos para la ejecución del proyecto.• Validar el plan de trabajo, plan de calidad, cronograma e informes periódicos de avance de fabricación.• Verificar salidas de alimentación y descarga para tubería sanitaria, soldada y bridada.• Verificar el sistema de fondo para drenado total.• Verificar que los tanques estén soportados en bases de acero inoxidable, con lámina de refuerzo en el punto de fijación.		<div><p>Fotos 25 y 26. Muestran acabado superficial al interior de los tanques de 27 kL.</p><p>Fotos 23 y 24. Decapado y pasivado al interior de los tanques.</p><p>Fotos 25 y 26. Instalación de escaleras de acceso a parte superior de los tanques.</p></div>



FORMATO

Código: FOM-3-4-011

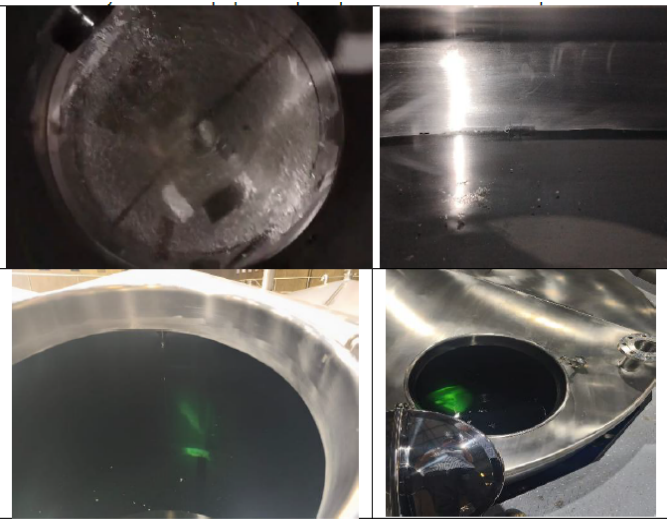
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<ul style="list-style-type: none">• Garantizar sistemas de seguridad para evitar colapsos por vacío.• Garantizar orificios adecuados para instalación de transmisores de presión, suiches de nivel y otros elementos de control.• Verificar que el sistema de acceso para mantenimiento cumpla con la normativa SST.• Verificar y avalar que el acabado sanitario sea pulido 2B.• Verificar que los puntos de anclaje fijos soporten mínimo 5.000 libras por trabajador, con acceso seguro y fácil desde la parte superior.• Garantizar pruebas hidrostáticas para validar la integridad estructural y estanqueidad de los tanques.		 <p>Fotos 29 a 33. Muestran cubre hombres e instalación en tanques.</p>  <p>Fotos 29 a 32. Muestran llenado y prueba de estanqueidad de los tanques de 27kL.</p>



FORMATO

Código: FOM-03-F-4-011

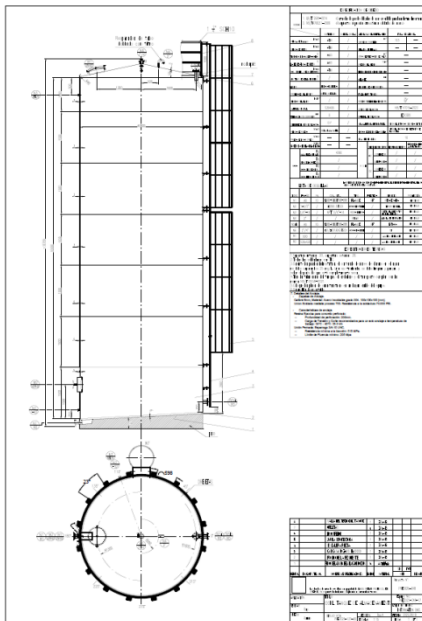
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<p>3. Garantizar la entrega de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manual de operación en español, con información detallada sobre operación y mantenimiento.• Lista de piezas de repuesto.• Planos generales por tipo de tanque, conexiones y componentes principales.	<p>Se verificaron los planos generales correspondientes a los tanques, detallando sus conexiones y componentes principales, de igual forma los demás compromisos de la obligación</p>	
<p>4. Garantizar el montaje conforme a los siguientes lineamientos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar el desmonte de tinas existentes y adecuaciones temporales según indicaciones del cliente, considerando que no se pueden suspender operaciones de planta.• Ejecutar el proyecto en paralelo a la operación, mediante un plan de trabajo concertado con la FLA para minimizar el impacto.• Ejecutar las maniobras necesarias	<p>Se garantizo el desmonte y el montaje de todos los tanques teniendo en cuenta todos los lineamientos de la obligación</p>	



FORMATO

Código: FOM-3-F-4-011

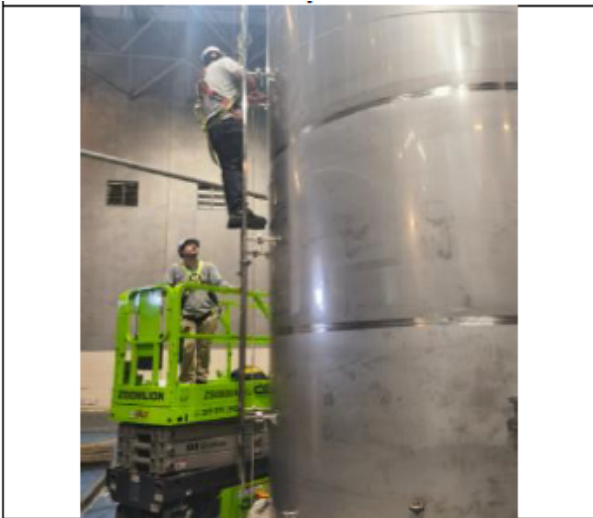
2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<p>para ingreso de los tanques, asumiendo reparaciones por daños o modificaciones requeridas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con personal idóneo: un coordinador (ingeniero electromecánico o eléctrico) y dos técnicos o tecnólogos (electromecánicos o eléctricos). 		 <p>Fotos 9 a 12. Izaje y posicionamiento de tanque de 100kL.</p>  <p>Fotos 13 y 14. Posición final tanque de 100 kL y verificación de nivel.</p>
<p>5. Revisar y garantizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas de instalación en buen estado. • Personal afiliado al sistema de salud obligatorio y a una ARP. • Dotación completa de EPP necesarios. • Cumplimiento de lineamientos de seguridad de la FLA: Resolución 4272 de 2021, Resolución 0491 de 2020 y Decreto 1072 de 2015. 	<p>Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento con lo mencionado en la obligación</p>	
<p>6. Considerar y cumplir las siguientes medidas ambientales:</p>	<p>Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento con lo</p>	



FORMATO

Código: FOM-3-P-4-011

2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
<ul style="list-style-type: none">• Disposición de materiales sobrantes en zonas asignadas por el coordinador designado por la FLA dentro de las instalaciones del contratante.	mencionado en la obligación	
<p>7. Cumplir con las siguientes actividades de seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hacer seguimiento documentado al cumplimiento del contrato dentro de los términos pactados.• Recomendar ajustes o modificaciones por escrito y bajo responsabilidad propia.• Tomar decisiones para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.• Evaluar y emitir concepto sobre calidad y cantidad de los productos entregados.• Identificar oportunamente dificultades en la ejecución o en la entrega de resultados.• Informar hechos constitutivos de incumplimiento para la aplicación de sanciones.• Elaborar informes mensuales de avance	Se recibieron todos los informes durante toda la ejecución de la interventoría, además se dio cumplimiento a los demás requerimientos de la obligación	Se anexan la totalidad de los informes con todos los detalles y el cumplimiento de las obligaciones durante toda la ejecución del contrato



FORMATO

Código: FOM-3-F-4-011

2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
y un informe final sobre la ejecución. • Servir de enlace entre el contratante y el ejecutor en la gestión de información del contrato		

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	Con el 100% de la ejecución y teniendo en cuenta las actividades de seguimiento, inspección y verificación realizadas durante el desarrollo del proyecto, se concluye que las actividades de interventoría técnica han sido culminadas, evidenciándose que los tanques y las plataformas asociadas se encuentran en condiciones adecuadas de operación, de acuerdo con las verificaciones efectuadas, las pruebas realizadas y las intervenciones correctivas implementadas. Los equipos quedan en condiciones de ser operados conforme a su propósito.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

**FORMATO**

Código: FOM-3-P-4-011

2026020001929

Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37

Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio

Fecha Aprobación: 2025/12/31

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			SÍ	X	
			NO		
PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA	SÍ	NO
Planilla número			Certificado de Representante Legal		X
Período de Cotización			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Fecha de pago			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal	X	
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Periodo de Cotización 02/2026 – 03/2026	Periodo Salud	Periodo Pensión
				X	X

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
	N°	M-100270697	M-100270697
	FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2025	29/12/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA APROBACIÓN	21/07/2025	29/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N°	M-100068455	M-100068455
	FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2025	29/12/2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA APROBACIÓN	21/07/2025	29/12/2025

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	(10%)	23	12	2025	30	09	2026
Calidad de los Bienes y Equipos Suministrados	(10%)	23	12	2025	30	09	2026

	FORMATO	Código: FOM-3-P-4-011 *2026020001929* Fecha Radicado: 2026-03-31 17:11:37 Versión: 2
		Informe de supervisión del contrato o convenio
		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Pagos de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	(5%)	23	12	2025	30	09	2026
AMPAROS	SMLMV	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
RCE CONTRATOS	200	19	07	2025	31	03	2026

7. ANEXOS.

- Diseño tanques FLA dispositivo de anclaje
- Informe interventoría 7
- Informe interventoría 8
- Informe interventoría 9
- Material thickness measurement report
- Penetration test report
- Plano 50.000 I
- Plano 100.000 I
- Surface roughness test record

Atentamente,



EDISON ARIAS OTALVARO
SUPERVISOR
