

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

CONTRATO DE OBRA No. 3743 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025

**“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN
FELIPE – FALAN – PALOCABILDO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”**



CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

<p align="center">ENTREGADO A:</p>	<p align="center">INTERVENTORIA CONSORCIO PUNTOS VIALES CONTRATO4258 DE 2025</p>
<p align="center">ENTREGADO POR:</p>	<p align="center">Kely Johana Avila Vargas</p>
	<p align="center">Residente Social</p>

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

Tabla de contenido

1	Introducción	5
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo general	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
3.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
1.1	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	7
4	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	7
5	Programa 6. Gestión social.....	8
5.1	Subprograma 6.1. Atención a la comunidad PGS-6.1-21	8
5.1.1	Instalación del Sistema de atención al Usuario	8
5.1.2	Atención a la comunidad -PQRS	12
5.2	Subprograma 6.1. Seguimiento y control a la atención de la comunidad SM- PGS – 6.1-21.	16
5.2.1	Seguimiento y control en la gestión para el cierre de PQRS	16
5.3	Subprograma 6.2. Información y divulgación PGS – 6.2-22	16
5.3.1	Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y divulgación, donde se utilice un lenguaje incluyente, accesible y comprensible para todas las personas de la comunidad.....	16
5.3.2	Reuniones con la comunidad.....	17
5.3.3	Canales de información tecnológicos	17
5.4	Subprograma 6.2. Seguimiento y control a la información y la divulgación SM-PGS – 6.2-22	18
5.4.1	Verificación de cumplimiento del mínimo requerido de reuniones con comunidades y autoridades locales	18
5.4.2	Revisión de los comprobantes y registros de entrega de elementos resultantes de la estrategia publica de divulgación.....	18
5.5	Subprograma 6.3: infraestructura de predios y servicios públicos.	19
5.5.1	Infraestructura de predios y servicios públicos	19
5.6	Subprograma 6.3: Seguimiento y control Infraestructura de predios y servicios públicos SC- PGS – 6.3-20.....	20
5.6.1	Verificación del levantamiento del 100% de Actas de Vecindad programadas	

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

para el periodo	20
5.6.2 Verificación del 100% de Actas de Compromiso programadas para el periodo 20	
5.7 Subprograma 6.5: cultura vial y participación comunitaria PGS – 6.5-25...	20
5.8 subprograma 6.5 seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria SM- PGS – 6.5-25.....	21
5.8.1 Verificación de las estrategias de apropiación del proyecto implementadas mediante procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, población en general, líderes del AD y con el comité de Participación comunitaria con enfoque de género, diferencial y de derechos.....	21
5.8.2 Validación de la promoción de espacios para la participación y control social a través de la conformación del Comité de Participación Comunitaria y/o las posibles veedurías ciudadanas conformadas en el marco del proyecto.....	22
5.9 Subprograma 6.6: mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial. PGS – 6.6-26	22
5.10 Subprograma 6.6. Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoques de género, de derecho y diferencial SM- PGS – 6.6-26.	24
5.10.1 Verificación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básicos, técnicos, profesionales y especializados de la región.....	24
5.10.2 Validación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básicos, técnicos, profesionales y especializado de la región perteneciente a grupos vulnerables	24
5.11 Subprograma 6.14: acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades étnicas PGS – 6.14-34.	25
5.12 Subprograma 6.15: inclusión social con perspectiva de género y transversalización PGS-6.15-35.	25
5.13 Subprograma 6.15. Seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización SM-PGS-6.15-35.....	26
5.13.1 Verificación de horarios laborales flexibles y alianzas orientadas a madres y padres cabeza de familia, madres lactantes, entre otros grupos poblacionales.....	26

Tablas

Tabla 1. Datos Generales del contrato de obra	7
Tabla 2. Datos Generales del Contrato de Interventoría	7
Tabla 3. Subprogramas	8
Tabla 4. PQRS del mes de marzo	12
Tabla 5. PQRS cerradas en el mes de marzo	14
Tabla 6. PQRS mes de marzo	16
Tabla 7. PQRS acumulativas.....	16
Tabla 7. Reuniones	18
Tabla 8. Estrategia de divulgación público	18

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

Tabla 9. Levantamiento actas de vecindad	20
Tabla 10. Levantamiento actas de compromiso	20
Tabla 11. Estrategias	21
Tabla 12. Acercamientos.....	22
Tabla 13. Personal de obra contrato 3743 de 2025, mes de marzo	22
Tabla 14. Generación de empleo mes de marzo	23
Tabla 15. Vinculación acumulativa.....	24
Tabla 16. Vinculación	24
Tabla 17. Flexibilización	26

Fotografías

Fotografía 1. Oficina – SAU.....	9
Fotografía 2. Cartelera informativa	9
Fotografía 3. Atención JAC.....	10
Fotografía 4. Acompañamiento social.....	10
Fotografía 5. Acompañamiento social.....	10
Fotografía 6. Acompañamiento social.....	10
Fotografía 7. Gestión cierre vial	11
Fotografía 8. Revisión Buzón de sugerencias	12
Fotografía 9. Atención PQRS	15
Fotografía 10. Cierre PQRS	15
Fotografía 11. Atención y cierre PQRS	15
Fotografía 12. Cierre de PQRS.....	15
Fotografía 13. Cierre de PQRS.....	15
Fotografía 14. Entrega de volantes.....	17
Fotografía 15. Socialización nuevo frente	17
Fotografía 16. Entrega de volantes.....	18
Fotografía 17. Volante.....	18
Fotografía 18. Acta de vecindad	19
Fotografía 19. Acta de vecindad	19
Fotografía 20. Acta de vecindad	19
Fotografía 21. Reunión Veeduría.....	21
Fotografía 22. Reunión Veeduría.....	21
Fotografía 23. Capacitación	26
Fotografía 24. Capacitación	26

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

1 Introducción

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 3743 de 2025, cuyo objeto es el “Mejoramiento vial y atención a puntos críticos de la vía San Felipe – Falan – Palocabildo”, se presenta el informe mensual correspondiente al componente social del proyecto, en el cual se describen las actividades desarrolladas durante el periodo reportado en cumplimiento de las obligaciones contractuales y los lineamientos establecidos.

En este contexto, se da aplicación al Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, específicamente en su componente social, como herramienta orientada a promover la adecuada interacción entre el proyecto y las comunidades del área de influencia. A través de este programa se implementan acciones de información, socialización, atención a la comunidad, acompañamiento permanente y atención a PQRS, con el propósito de prevenir, mitigar y gestionar posibles impactos sociales derivados de la ejecución de la obra, fortaleciendo la participación comunitaria y garantizando un desarrollo armónico del proyecto en el territorio.

A continuación, se presenta el informe de las actividades desarrolladas por el área social durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026, en el marco del Contrato de Obra No. 3743 de 2025. El presente documento tiene como finalidad dar cumplimiento a las fichas y lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, evidenciando las acciones implementadas y su respectivo seguimiento.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Presentar el informe mensual de las actividades desarrolladas por el componente social durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026, en el marco del Contrato de Obra No. 3743 de 2025, dando cumplimiento a las fichas y lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, con el fin de evidenciar la gestión social realizada y el seguimiento a las acciones implementadas en el área de influencia del proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Reportar las acciones adelantadas en relación con la vinculación de mano de obra local, conforme a los lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.
- Describir las actividades desarrolladas en materia de atención a la comunidad dentro

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

del área de influencia del proyecto.


- Registrar y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas durante el periodo reportado, dejando constancia de su gestión o, en su defecto, de la no recepción de solicitudes.
- Evidenciar el cumplimiento de las fichas del componente social del PAGA aplicables al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el departamento del Tolima, en la vía que conecta a los municipios de Armero/Guayabal, Falan y Palocabildo. La obra se desarrolla en tres tramos, el primero en el corregimiento de San Felipe municipio de Armero/Guayabal, el segundo en el municipio de Falan y el tercero en el municipio de Palocabildo.

Ilustración 1. Localización del proyecto

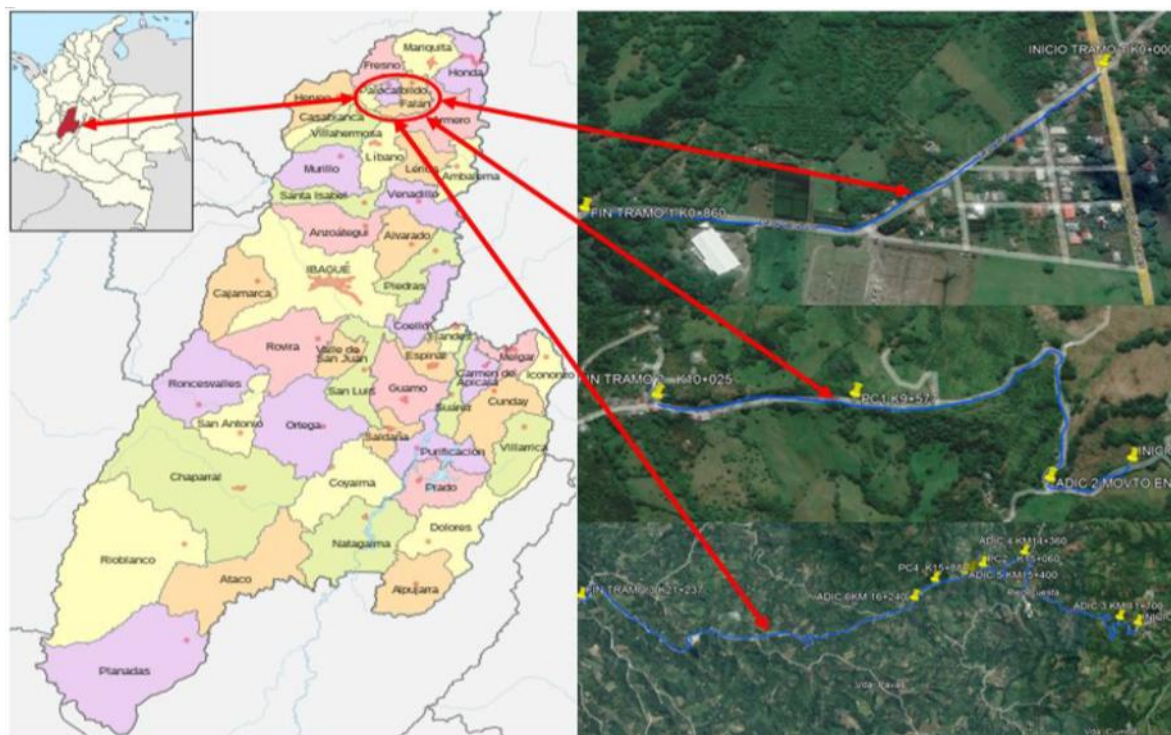

Fuente. Contrato de Consultoría 4200, 2022

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Datos Generales del contrato de obra

Contrato de Obra N°	3743 de 2025
Contratista.	UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
Objeto.	MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Orden de Inicio	11 de diciembre de 2025
Valor del contrato	\$ 19.039.682.163
Fecha de finalización	3 de junio de 2027

Fuente. Union Temporal Vial Tolima 2026

4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 2. Datos Generales del Contrato de Interventoría

Contrato N°	4258 de 2025
Contratista.	CONSORCIO PUNTOS VIALES
Objeto.	“INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Orden de Inicio	11 de diciembre de 2025
Valor del contrato	\$ 1.489.448.487
Fecha de finalización	3 de junio de 2027

Fuente. Union Temporal Vial Tolima 2026

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

5 Programa 6. Gestión social

El Programa de Gestión Social tiene como propósito promover una adecuada articulación entre el proyecto y las comunidades del área de influencia, mediante la implementación de estrategias de información, participación y acompañamiento social, orientadas a prevenir, mitigar y atender posibles impactos derivados de la ejecución de las obras, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

A continuación, se describen cada uno de los programas de Gestión Social que conforman el documento PAGA, así como los proyectos y actividades de Gestión Social realizadas en el periodo reportado.

Tabla 3. Subprogramas

PROGRAMA	PROYECTO	APLICA		CÓDIGO
		SI	NO	
Programa 6. Gestión social	Subprograma 6.1. Atención a la comunidad	X		PGS – 6.1-21
	Subprograma 6.2. Información y divulgación	X		PGS – 6.2-22
	Subprograma 6.3. Infraestructura de predios y servicios públicos		X	PGS – 6.3-23
	Subprograma 6.5. Cultura vial y Participación Comunitaria	X		PGS – 6.5-25
	Subprograma 6.6. Mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial.	X		PGS – 6.6-26
	Subprograma 6.14. acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades étnicas	X		PGS – 6.14-34
	Subprograma 6.15. Inclusión social con perspectiva de género y transversalización	X		PGS-6.15-35

5.1 Subprograma 6.1. Atención a la comunidad PGS-6.1-21

5.1.1 Instalación del Sistema de atención al Usuario

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y la importancia del sistema de atención al usuario, para la vigencia la oficina de servicio de atención S.A.U continua en funcionamiento, encontrándose ubicada en el corregimiento San Felipe, del municipio de Armero Guayabal Tolima, por la vía principal a 90 metros de la entrada a San Felipe, la cual, es atendida en horario establecido

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. La oficina se encuentra adaptada con todos los implementos requeridos para atender todas las manifestaciones sociales. Actividad que se puede validar en la Fotografía 1.



Fotografía 1. Oficina – SAU
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Para la vigencia se continua con la cartelera informativa, donde se encuentran los medios de contacto establecidos, para el mes de marzo se promocionó un folleto informativo sobre la Igualdad de género en el trabajo. Actividad que se puede validar en la Fotografía 2.



Fotografía 2. Cartelera informativa
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

Asimismo, para la vigencia se realizó acompañamiento social a los diferentes frentes de trabajo con el fin de prevenir y mitigar posibles conflictos con la comunidad del área de influencia. De igual manera, se brindó acompañamiento a los distintos grupos de interés vinculados al proyecto, tales como la Junta de Acción Comunal de Falan, Tolima, y la comunidad en general del área de influencia.

Lo anterior, con el propósito de verificar y socializar las actividades ejecutadas en el marco del proyecto, gestionar el cierre vial realizado por el gremio de los volqueteros e identificar la posible incidencia de estas acciones en el desarrollo de sus actividades. Información que se puede validar las Fotografía 3, Fotografía 4, Fotografía 5, Fotografía 6, Fotografía 7 y en el **Anexo 1. Subprograma 6.1. Atención a la comunidad.**



*Fotografía 3. Atención JAC
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*



*Fotografía 4. Acompañamiento social
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*



*Fotografía 5. Acompañamiento social
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*



*Fotografía 6. Acompañamiento social
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	



Fotografía 7. Gestión cierre vial
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

5.1.1.1 Instalación buzón de sugerencias.

Para la vigencia se dio continuidad al buzón de sugerencias instalado en la oficina SAU, asimismo, se activaron los canales de comunicación dispuestos para la ciudadanía, número de teléfono, WhatsApp: 3144664887 y correo electrónico: socialfalan2026@gmail.com , los cuales son atendidos por la residente social del proyecto de manera inmediata, la atención está disponible de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 meridiano y de 1:00 pm a 4:00 pm.

En el periodo comprendido, se llevó a cabo la revisión periódica del buzón de sugerencias que se encuentran ubicado en la oficina SAU, dirigido a toda la comunidad de influencia del proyecto, lo anterior, con el objetivo de identificar las PQRS de manera rápida y así dar respuesta oportuna a las mismas. Información que se puede validar la Fotografía 8.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	



Fotografía 8. Revisión Buzón de sugerencias
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

5.1.2 Atención a la comunidad -PQRS

Para la vigencia se cuenta con un sistema de atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), dirigido a la comunidad en general, con este sistema se busca brindar respuesta oportuna a las PQRS que se presenten por parte de los actores sociales mediante atención personalizada, telefónica, escrita o virtual a la población del área de influencia del Proyecto.

En el mes de marzo se recibió en el SAU un total de seis (6) PQRS, cuatro (4) peticiones, una (1) queja y un (1) reclamo por parte de la comunidad, las cuales fueron receptadas por medio del punto de atención, correo electrónico y medio telefónico, siendo atendidas de manera inmediata por la residente social, realizando su debido proceso de seguimiento y respuesta, información que se puede validar en la Tabla 4 y en el **Anexo 1. Subprograma 6.1. Atención a la comunidad**

Tabla 4. PQRS del mes de marzo

Código	Fecha Recibido	Comunidad	Tipo	Descripción General	Estado	Fecha de respuesta	Observaciones
PQRS_006	03/03/2026	Junta de Acción Comunal	Petición	Solicitan información sobre la cantidad de viajes que han sido	Cerrada	11/03/2026	Se cierra a satisfacción

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

				entregados a la Alcaldía de Armero Guayabal			
PQRS_007	11/03/2026	Comunidad área de influencia	Queja	El carro que transporta el cemento para la obra al retroceder partió una teja y doblo una cercha, solicitan el arreglo.	En proceso		Continúa abierta, ya que, se está validando y gestionando el arreglo.
PQRS_008	11/03/2026	Minerales Santa Ana	Petición	Solicitan información diaria o semanal acerca de la programación de cierres viales, así mismo considerar mover el pare y siga para mejorar la movilidad.	Cerrada	31/03/2026	Se da cierre a satisfacción.
PQRS_009	13/03/2026	Comunidad San Felipe	Petición	Solicita una visita a su predio, ya que, considera que la canalización de la alcantarilla realizada perjudica su predio con inundaciones.	Cerrada	20/03/2026	Se da cierre
PQRS_010	17/03/2026	Comunidad de Falan	Petición	Manifiesta que una alcantarilla que esta mas arriba de su casa se encuentra tapada y que cuando llueve se esta viendo perjudicado, ya que, su vivienda se inunda, por lo	Cerrada	19/03/2026	Se da cierre

	“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”	
CONTRATO 3743 DE 2025	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	

				tanto solicita que le hagan un mantenimiento o limpieza y así poder solucionar dicho problema.			
PQRS_011	19/03/2026	Comunidad de San Felipe	Reclamo	Debido a las condiciones actuales de altura de la vía en el acceso a su vivienda, no puede sacar su vehículo, y al momento de retirarlo se presentó una afectación en el bumper, solicita el pago del daño.	En proceso		Continúa abierta, ya que, se está validando el reclamo.

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Tabla 5. PQRS cerradas en el mes de marzo

Código	Fecha Recibido	Comunidad	Tipo	Descripción General	Estado	Fecha de respuesta	Observaciones
PQRS_001	13/02/2026	Vereda San Felipe	Solicitud	Solicitud de donación de material	Cerrada	17/03/2026	Cerrada a satisfacción
PQRS_002	02/02/2026	Alcaldía de Armero Guayabal	Solicitud	Donación de material tipo fresado	Cerrada	26/03/2026	Cerrada a satisfacción
PQRS_003	02/02/2026	Alcaldía de Armero Guayabal	Solicitud	Donación de material tipo fresado	Cerrada	26/03/2026	Cerrada a satisfacción
PQRS_005	25/02/2026	Comunidad Vereda la Lajosa	Solicitud	Donación de material tipo fresado para la adecuación de una vía de la vereda la Lajosa.	Cerrada	11/03/2026	Cerrada a satisfacción

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

A continuación, se evidencia el registro fotográfico de las atenciones a las PQRS. Fotografía 9, Fotografía 10, Fotografía 11, Fotografía 12 y Fotografía 13.



Fotografía 9. Atención PQRS
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 10. Cierre PQRS
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 11. Atención y cierre PQRS
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 12. Cierre de PQRS
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 13. Cierre de PQRS
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

5.2 Subprograma 6.1. Seguimiento y control a la atención de la comunidad SM- PGS – 6.1-21.

5.2.1 Seguimiento y control en la gestión para el cierre de PQRS

Tabla 6. PQRS mes de marzo

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	$(x/y) * 100 = \%$	
Actividades PQRS cerradas	Actividades PQRS presentadas	$(4/6) * 100 = 66\%$	66%
4	6		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: En el mes de marzo se dio cierre a 4 PQRS que se encontraban en proceso del mes de enero y febrero, dando cierre en su totalidad para esa vigencia.

Tabla 7. PQRS acumulativas

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	$(x/y) * 100 = \%$	
Actividades PQRS cerradas	Actividades PQRS presentadas	$(9/11) * 100 = 81\%$	81%
9	11		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Durante toda la ejecución del proyecto se han recibido un total de 11 PQRS y se le ha dado cierre a 9 PQRS, quedando 2 PQRS abiertas, que se encuentran en proceso.

5.3 Subprograma 6.2. Información y divulgación PGS – 6.2-22

Las actividades de información y divulgación están orientadas a fortalecer la comunicación entre el proyecto y las comunidades del área de influencia, mediante espacios de diálogo claros y oportunos. A través de estas acciones se busca brindar información transparente, atender inquietudes y promover una relación de confianza que contribuya a la prevención de posibles conflictos durante la ejecución del proyecto.

5.3.1 Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y divulgación, donde se utilice un lenguaje incluyente, accesible y comprensible para todas las personas de la comunidad

Durante la presente vigencia se dio continuidad a los procesos de articulación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios, veedurías y demás actores estratégicos del área de influencia, se actualiza el directorio de contactos, el cual, facilita la difusión de información clara, oportuna y veraz sobre el avance y desarrollo del proyecto.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

5.3.2 Reuniones con la comunidad

Para la vigencia no se tienen programadas reuniones con la comunidad ni se han solicitado reuniones extraordinarias.

5.3.3 Canales de información tecnológicos

Reconociendo la importancia de los canales de información para garantizar una comunicación oportuna, transparente y de doble vía, durante la presente vigencia se continuo con la implementó un mecanismo tecnológico mediante la creación de un chat ciudadano por medio de grupos a través de WhatsApp. Este espacio permite difundir información relevante sobre el desarrollo del proyecto y atender de manera ágil las inquietudes o manifestaciones de la comunidad, fortaleciendo la relación directa y permanente con los grupos de interés.

El día 09 de marzo del 2026, se llevó a cabo la entrega de volantes informativos, socializando a la comunidad en general la apertura del nuevo frente de obra en el tramo 2 del municipio de Falan Tolima, esta acción tuvo como propósito socializar el área de actividades, horarios y tiempos de cierre para garantizar el acceso oportuno a la información, fortalecer los procesos de comunicación y promover el conocimiento del proyecto entre la población del área de influencia. Actividad que se puede verificar en la Fotografía 14, Fotografía 15, Fotografía 16 y Fotografía 17.



*Fotografía 14. Entrega de volantes
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*



*Fotografía 15. Socialización nuevo frente
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	



Fotografía 16. Entrega de folletos
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 17. Folleto
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

5.4 Subprograma 6.2. Seguimiento y control a la información y la divulgación SM-PGS – 6.2-22

5.4.1 Verificación de cumplimiento del mínimo requerido de reuniones con comunidades y autoridades locales

Tabla 8. Reuniones

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	$(x/y) * 100 = \%$	
Reuniones realizadas	Reuniones Convocadas	$(0/0) * 100 = 0\%$	0%
0	0		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: Para la vigencia no se tienen programadas reuniones con la comunidad.

5.4.2 Revisión de los comprobantes y registros de entrega de elementos resultantes de la estrategia publica de divulgación

Tabla 9. Estrategia de divulgación público

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	$(x/y) * 100 = \%$	
No. Elementos de divulgación implementados	No. Elementos de divulgación proyectados	$(1/1) * 100 = 100\%$	100%
1	1		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

5.5 Subprograma 6.3: infraestructura de predios y servicios públicos.

5.5.1 Infraestructura de predios y servicios públicos

El programa de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos tiene como propósito identificar y gestionar posibles afectaciones a predios y redes de servicios públicos ubicados en el área de influencia del proyecto, con el fin de prevenir, mitigar y atender oportunamente cualquier impacto derivado de las actividades constructivas, garantizando la protección de bienes y la continuidad en la prestación de los servicios conforme a la normatividad vigente.

Para la vigencia se proyectó el levamiento de 24 Actas de vecindad, actividad que se realizó durante los días 2,3 y 4 de marzo del 2026, pertenecientes a las viviendas e infraestructura del tramo dos, perteneciente al municipio de Falan Tolima, vereda La Lajosa. Durante el periodo no se realizaron cierres de Actas de vecindad. Actividad que se puede verificar en la Fotografía 18, Fotografía 19 y Fotografía 20 y en el **Anexo 2. Subprograma 6.3: infraestructura de predios y servicios públicos.**



Fotografía 18. Acta de vecindad
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 19. Acta de vecindad
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 20. Acta de vecindad
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

5.6 Subprograma 6.3: Seguimiento y control Infraestructura de predios y servicios públicos SC- PGS – 6.3-20

5.6.1 Verificación del levantamiento del 100% de Actas de Vecindad programadas para el periodo

Tabla 10. Levantamiento actas de vecindad

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= _ %	
No de Actas De Vecindad Levantadas	No de Actas De Vecindad requeridas para el proyecto	(24/24) *100=100%	100%
24	24		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: Las Actas de vecindad requeridas para el tramo dos (2) están en su totalidad, las Actas del tramo tres (3) están programadas para dar inicio en el mes de abril.

5.6.2 Verificación del 100% de Actas de Compromiso programadas para el periodo

Tabla 11. Levantamiento actas de compromiso

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= _ %	
No de Actas de compromiso Levantadas	No Actas de compromiso requeridas para el proyecto	(0/0) *100=0%	0%
0	0		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: Para la vigencia no se levantaron actas de compromiso.

5.7 Subprograma 6.5: cultura vial y participación comunitaria PGS – 6.5-25.

Las acciones del subprograma están orientadas a fortalecer la apropiación social y la participación comunitaria en el marco del proyecto, mediante procesos de educación, sensibilización y espacios de diálogo con los diferentes actores del área de influencia. Así mismo, buscan promover la corresponsabilidad en el cuidado del entorno y consolidar mecanismos de participación y control social que contribuyan al seguimiento, la

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

transparencia y el adecuado cumplimiento de las actividades del proyecto.

Dando cumplimiento al Subprograma cultura vial y participación comunitaria, hasta la vigencia se han conformado 3 veedurías ciudadanas, una en el municipio de Palocabildo Tolima, otra en el municipio de Falan Tolima y una en el municipio de Armero Guayabal – San Felipe.

El día 27 de marzo del 2026, a las 3:30 p.m. en las instalaciones de la Casa de la cultura del municipio de Falan Tolima, se llevó a cabo reunión mensual con las tres veedurías ciudadanas del corregimiento de San Felipe, el municipio de Falan Tolima y Palocabildo Tolima, contando con la participación de once (11) personas, grupo técnico del contratista, Interventoría y participantes de la Veeduría. Información que se puede verificar en la Fotografía 21 y Fotografía 22 y en el **Anexo 3. Subprograma 6.5: cultura vial y participación comunitaria.**



*Fotografía 21. Reunión Veeduría
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*



*Fotografía 22. Reunión Veeduría
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.*

5.8 subprograma 6.5 seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria SM- PGS – 6.5-25.

5.8.1 Verificación de las estrategias de apropiación del proyecto implementadas mediante procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, población en general, líderes del AD y con el comité de Participación comunitaria con enfoque de género, diferencial y de derechos.

Tabla 12. Estrategias

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= %	
Estrategias implementadas	Estrategias proyectadas	(0/0) *100=100%	0%
0	0		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

Nota: Para la vigencia no se tienen programadas estrategias

5.8.2 Validación de la promoción de espacios para la participación y control social a través de la conformación del Comité de Participación Comunitaria y/o las posibles veedurías ciudadanas conformadas en el marco del proyecto.

Tabla 13. Acercamientos

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= %	
Reuniones realizadas	Reuniones Convocadas	(1/1) *100=100%	100%
1	1		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

5.9 Subprograma 6.6: mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial. PGS – 6.6-26

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y reconociendo la importancia de promover oportunidades laborales en el área de influencia del proyecto, se prioriza la vinculación de mano de obra local bajo un enfoque de género, derechos y diferencial, garantizando condiciones de equidad e inclusión.

En este sentido, para el periodo reportado se cuenta con la contratación de catorce (14) personas, dos (2) de ellas de género femenino y doce (12) personas de género masculino, seis (6) personas de la zona de influencia, tres (3) personas de la región y cinco (5) personas de otro lugar, contribuyendo al fortalecimiento socioeconómico de las comunidades beneficiarias y al desarrollo integral del territorio donde se ejecuta el Contrato de Obra No. 3743 de 2025. Se puede verificar el cumplimiento de esta actividad en la Tabla 14 y en el **Anexo 4. Subprograma 6.6: mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial.**

Tabla 14. Personal de obra contrato 3743 de 2025, mes de marzo

Contratista	Fecha de ingreso	Nombre completo	Documento de Identidad	Edad	Sexo	Cargo / Oficio	Mano de obra calificada SI/NO	Pertenece a la comunidad, región u otro lugar
Construccion	2/03/20	OLIVERO	9694667	46	Masculino	Ayudante	NO	REGION

	“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”				
CONTRATO 3743 DE 2025	INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026				

nes la roca	26	LEONARDO				de obra		
Construcciones la roca	5/03/2026	LEGARDA VALENCIA JHOHAN	1192907750	26	Masculino	Ayudante de obra	NO	REGION
Construcciones la roca	5/03/2026	ARDILA RAMIREZ KEVIN GEOVANNY	1069432245	22	Masculino	Ayudante de obra	NO	Comunidad
Unión temporal vial Tolima 2026	5/03/2026	Jonathan Eduardo Olarte Vargas	1111200476	32	Masculino	Oficios varios	No	Comunidad
Unión temporal vial Tolima 2026	6/03/2026	Víctor Alfonso Vanegas Camelo	1111196031	36	Masculino	Oficios varios	No	Comunidad
Unión temporal vial Tolima 2026	6/03/2026	Weiner Lozada Robles	93453772	46	Masculino	Tornillero	Si	Región
Unión temporal vial Tolima 2026	6/03/2026	Luisa Fernanda Velez Hernández	1106333506	34	Femenino	Oficios varios	No	Comunidad
Unión temporal vial Tolima 2026	19/03/2026	Edwin Osorio Salazar	1111201413	33	Masculino	Oficios varios	No	Comunidad
Unión temporal vial Tolima 2026	19/03/2026	Abelardo David Torres	13057539	50	Masculino	Topógrafo	Si	Otro lugar
Construcciones la roca	2/03/2026	Marcos Fidel Suarez Vargas	1090377497	36	Masculino	Ayudante de obra	NO	Comunidad
Construcciones la roca	5/03/2026	Kevin Geovanny Ardila Ramírez	1069432245	22	Masculino	Ayudante de obra	NO	Otro lugar
Construcciones la roca	6/03/2026	Cristian David Rodríguez Hernández	1007153455	25	Masculino	Ayudante de obra	NO	Otro lugar
Construcciones la roca	6/03/2026	Sussan Daniela Morales Teuta	1106741465	30	Femenino	Inspector a sst	SI	Otro lugar
Construcciones la roca	10/03/2026	Wilson José Flórez Bohorquez	1005649922	31	Masculino	Ayudante de obra	NO	Otro lugar

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Tabla 15. Generación de empleo mes de marzo

GENERACIÓN DE EMPLEO			
OBRA	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFIC	Total

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

CONTRATO 3743 de 2025				ADA			Empleo
	Local	Externa	Sub Total	Lo cal	Externa	Sub total	
01 – 31 marzo de 2026	0	3	3	6	5	11	14

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

5.10 Subprograma 6.6. Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoques de género, de derecho y diferencial SM- PGS – 6.6-26.

5.10.1 Verificación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básicos, técnicos, profesionales y especializados de la región

Tabla 16. Vinculación acumulativa

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= _ %	
MO de la región contratada	Total mano de obra del proyecto	(35/60) *100=58%	58%
35	60		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: El dato de la mano de obra de la región contratada, según el factor x hace referencia al personal contratado del departamento del Tolima.

5.10.2 Validación de la vinculación laboral de mano de obra con perfiles básicos, técnicos, profesionales y especializado de la región perteneciente a grupos vulnerables

Tabla 17. Vinculación

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= _ %	
MO perteneciente a grupos vulnerables	Total personal proyecto	(0/60) *100=0%	0%
0	60		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: Hasta la vigencia no se han contratado personas en condición de vulnerabilidad.

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	

5.11 Subprograma 6.14: acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades étnicas PGS – 6.14-34.

De acuerdo con las actividades proyectadas sobre la vía existente San Felipe – Falan – Palocabildo, correspondientes al mejoramiento vial y atención a puntos críticos, las acciones a ejecutar están orientadas a dar cumplimiento al régimen legal y a los lineamientos establecidos en materia de determinación de procedencia de Consulta Previa.

Teniendo en cuenta que el proyecto es adelantado por el Consorcio Unión Temporal Tolima Vial 2026, para el presente periodo se continua con la gestión para radicar ante el Ministerio del Interior con el fin de solicitar información sobre la procedencia de la Consulta Previa con comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, conforme a la normatividad vigente.

5.12 Subprograma 6.15: inclusión social con perspectiva de género y transversalización PGS-6.15-35.

Durante la presente vigencia, se dio aplicación al enfoque diferencial, de género y de derechos en el desarrollo de las actividades del proyecto, reconociendo su importancia para garantizar condiciones de equidad e inclusión. Esta orientación ha permitido identificar y mitigar posibles barreras que puedan afectar la participación de mujeres y personas con discapacidad, promoviendo el acceso igualitario a la información, a los espacios de participación y a los beneficios derivados del proyecto. A la fecha, esta acción se encuentra en proceso de implementación

Para la vigencia se contó con la contratación de 2 mujeres, no se identifican madres y padres cabeza de hogar y no se presentaron casos de acoso en el ámbito laboral ni con la población de las áreas de influencia.

El 27 de marzo del 2026, se llevó a cabo Capacitación y sensibilización sobre convivencia laboral e igualdad de género en el trabajo, dirigida a todo el personal vinculado del proyecto, con el objetivo de fortalecer la convivencia laboral mediante la promoción del respeto, la igualdad de género y la prevención de conductas inadecuadas, fomentando un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y libre de discriminación. Se puede verificar el cumplimiento de esta actividad en la Fotografía 23 y Fotografía 24 y en el **Anexo 5. Subprograma 6.15: inclusión social con perspectiva de género y transversalización.**

	<p align="center">“MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</p>	
<p>CONTRATO 3743 DE 2025</p>	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026</p>	



Fotografía 23. Capacitación
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.



Fotografía 24. Capacitación
Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

5.13 Subprograma 6.15. Seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización SM-PGS-6.15-35.

5.13.1 Verificación de horarios laborales flexibles y alianzas orientadas a madres y padres cabeza de familia, madres lactantes, entre otros grupos poblacionales.

Tabla 18. Flexibilización

INDICADORES		Relación	Cumplimiento
Factor x	Factor y	(x/y) *100= _ %	
Numero de padres o madres cabeza de hogar incluidos en los programas de flexibilización	Estrategias proyectadas	(0/0) *100=0%	0%
0	0		

Fuente: Union Temporal Tolima vial 2026.

Nota: a la vigencia no se cuenta con personal padre o madre cabeza de familia y lactantes.
