



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL SUR
NIT: 900.043.331-2**

Santa Rosa del Sur, Bolívar, 11 Mayo de 2026

**Señores
MINISTERIO DE CULTURA**


Asunto: Informe de avance de alternativas para la mejora del servicio del sector, Proyecto Casa de la Cultura Santa Rosa del Sur Bolívar.

Cordial saludo,

En seguimiento al Acta de Reunión suscrita el 13 de marzo de 2026 y al informe de avance remitido con anterioridad, la **ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL SUR "AAA-SUR"** se permite informar el estado de avance de las dos (2) alternativas para garantizar la continuidad y mejoramiento del servicio de acueducto en el sector donde se desarrolla la obra CASA DE LA CULTURA SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR, ubicada en la calle 5 N.º 12-62, barrio El Carmen.

1. Cambio de equipos de bombeo (captación 150 HP a 250 HP):

Los equipos de bombeo fueron adquiridos, instalados y puestos en operación de manera satisfactoria dentro del plazo establecido. Con la implementación del nuevo sistema de bombeo de 250 HP, se ha logrado aumentar el caudal captado, mejorando de forma significativa la presión y la continuidad del servicio de acueducto en el sector del proyecto.

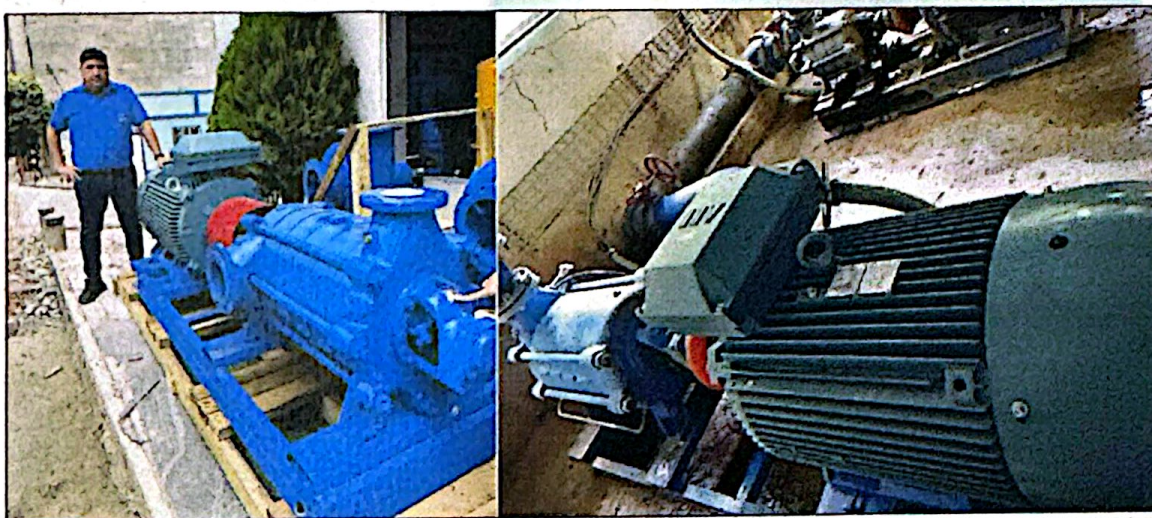

2. Construcción de pozo profundo:

La construcción del pozo profundo se encuentra actualmente en ejecución. A la fecha se han perforado 136 metros de profundidad, obteniendo un caudal de 0.6 l/s. Se estima avanzar
POR UNA COMUNIDAD CON SENTIDO DE PERTENENCIA ;

CALLE 9 N° 10A - 80. EMAIL. tripleasur@gmail.com - gerencia@aaasur.com -
contabilidad@aaasur.com CEL. 318 843 0097 – 569 78 29
Santa Rosa del Sur, (Bol)



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA
ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL SUR
NIT: 900.043.331-2**

aproximadamente 50 metros adicionales con el fin de incrementar el caudal obtenido y garantizar la sostenibilidad del suministro. Se espera culminar esta alternativa en un plazo de 40 días hábiles a partir de la fecha.



La AAA del Sur reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo del servicio e informa que la primera alternativa ha sido cumplida en su totalidad, mientras que la segunda alternativa se encuentra en avance, con culminación prevista en un plazo de 40 días hábiles

Atentamente,



FREDY ADOLFO QUIROGA PUENTES
GERENTE AAA SUR.

Proyecto: Victoria Bermúdez-Aux Administrativo

POR UNA COMUNIDAD CON SENTIDO DE PERTENENCIA ;

**CALLE 9 N° 10A - 80. EMAIL. tripleasur@gmail.com - gerencia@aaasur.com -
contabilidad@aaasur.com CEL. 318 843 0097 – 569 78 29
Santa Rosa del Sur, (Bol)**
