


Contrato ETB

martes, 9 de diciembre de 2025 2:13 p. m.

Abril 13 y 21 de 2026

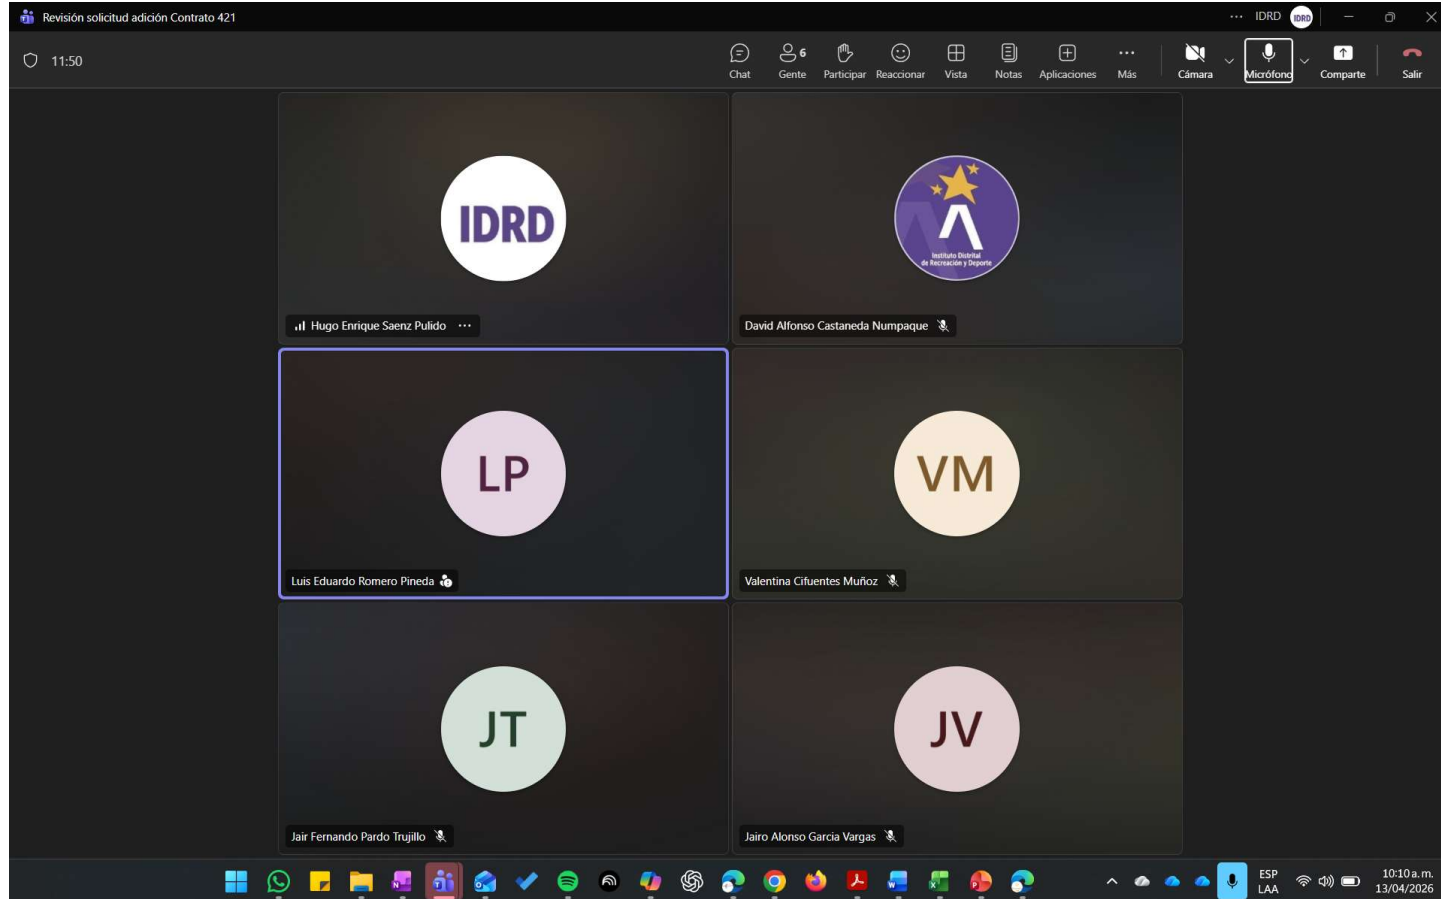

Seguimiento por el supervisor

Prorroga y adición contrato anexo 31

Revisar estado de avance de ejecución

- Pagos 1 y 2, están radicados en financiera
- Pago 3 -
- Prorroga, ya está en contratación
- Ítems nuevos - Se requiere empujar en oficina de costos
- Obra civil Fontanar y Tunal se debe financiar con la adición
 - Tunal -
 - Fontanar -
- Obra San Cristóbal
 - Se debe terminar para el 1 de mayo
- Pantallas

Temas relevantes

- Prórroga hasta julio 26 de 2026
- Adición presupuestal para ítems nuevos en proceso
- Nuevo alcance para parque El Porvenir
