




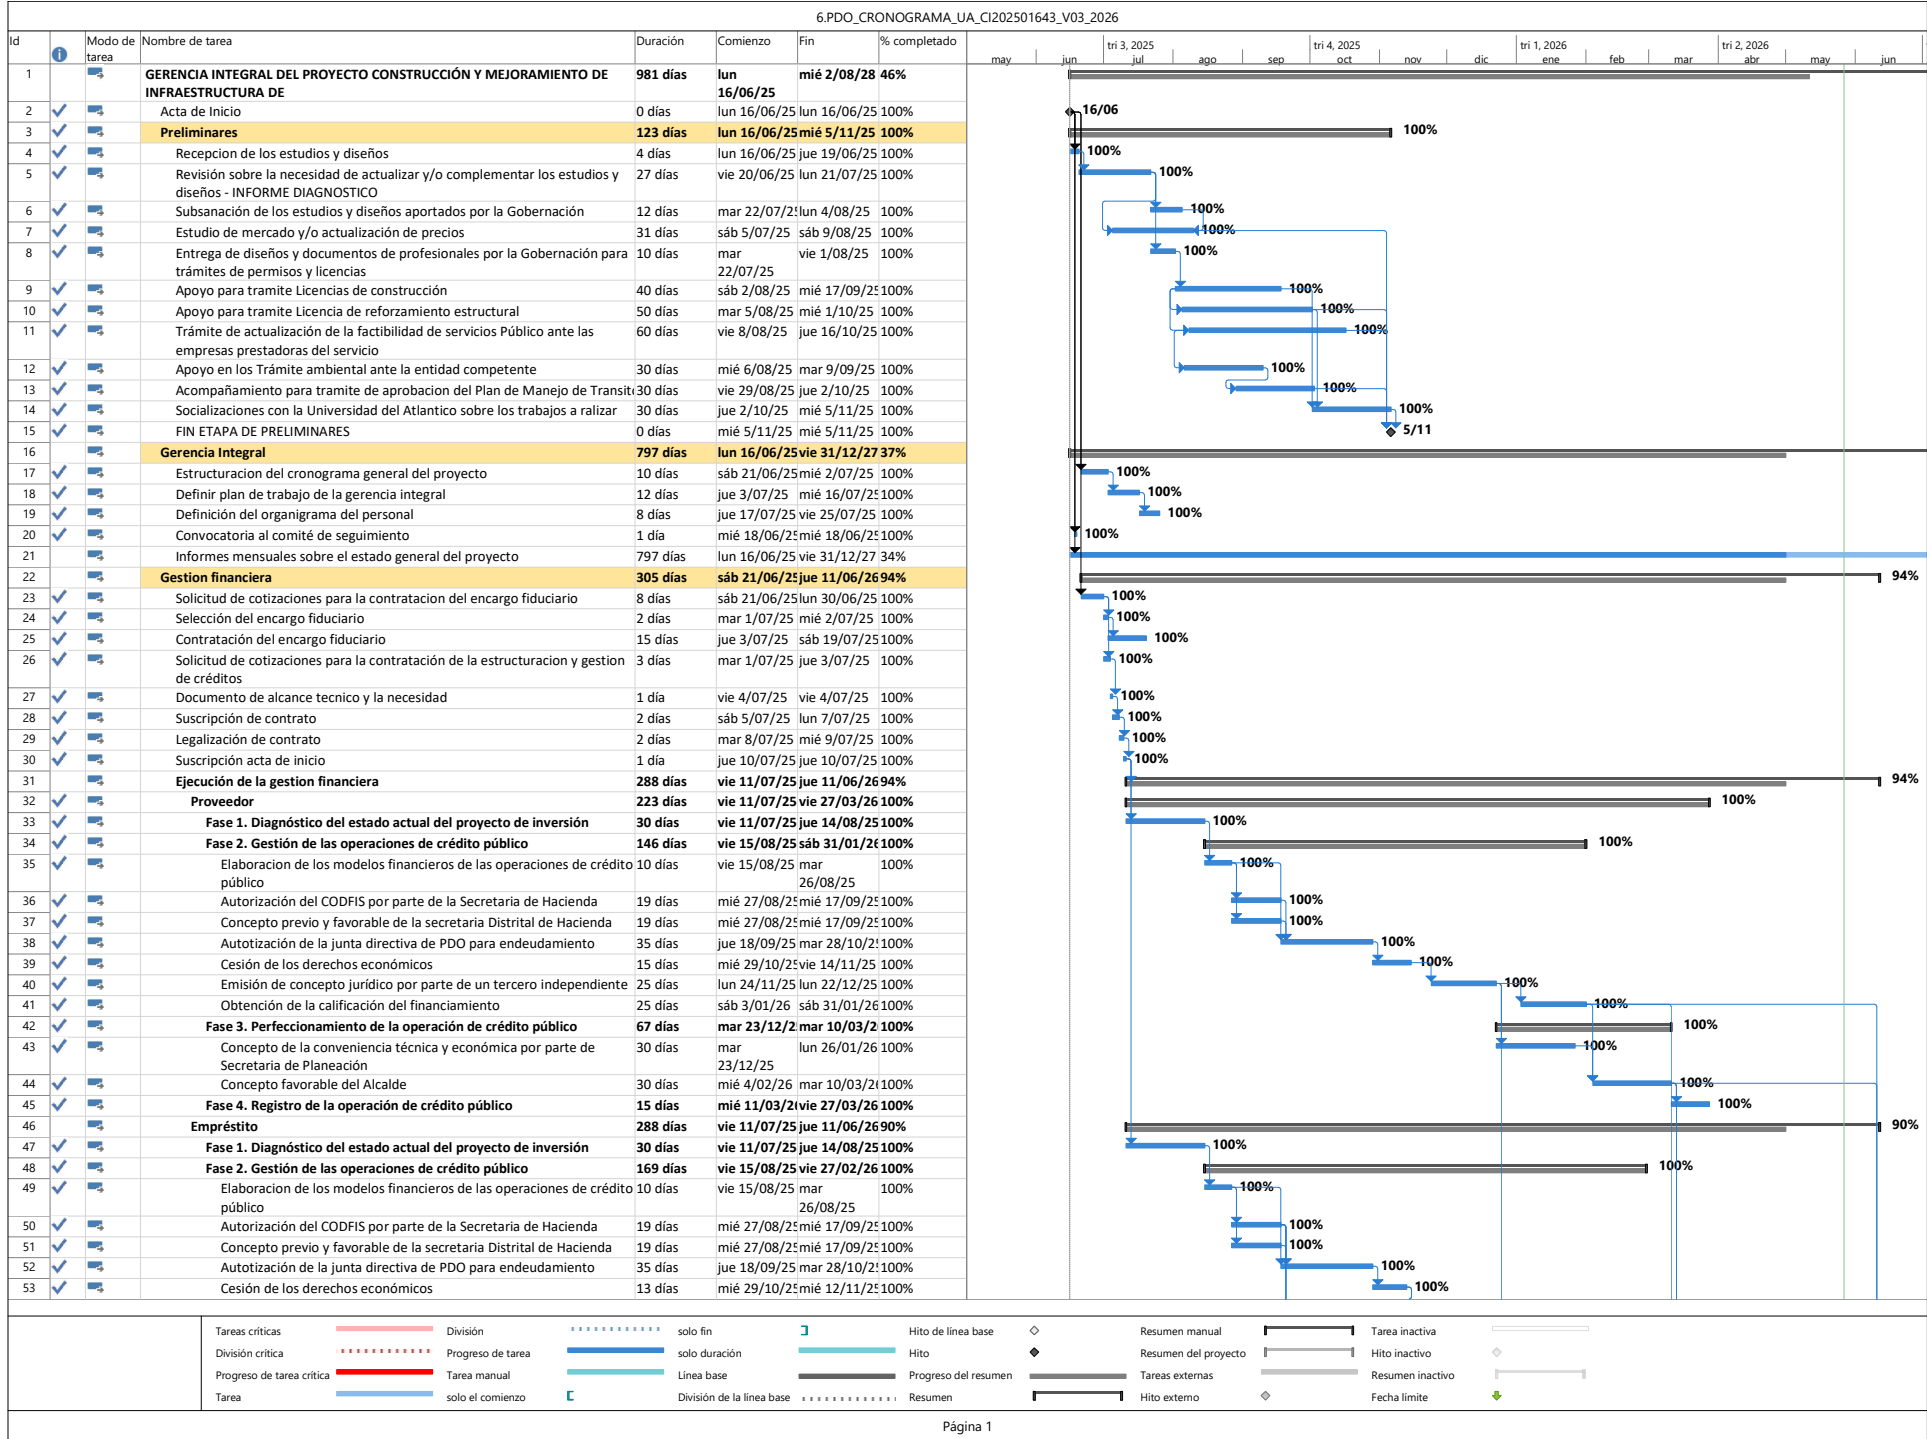

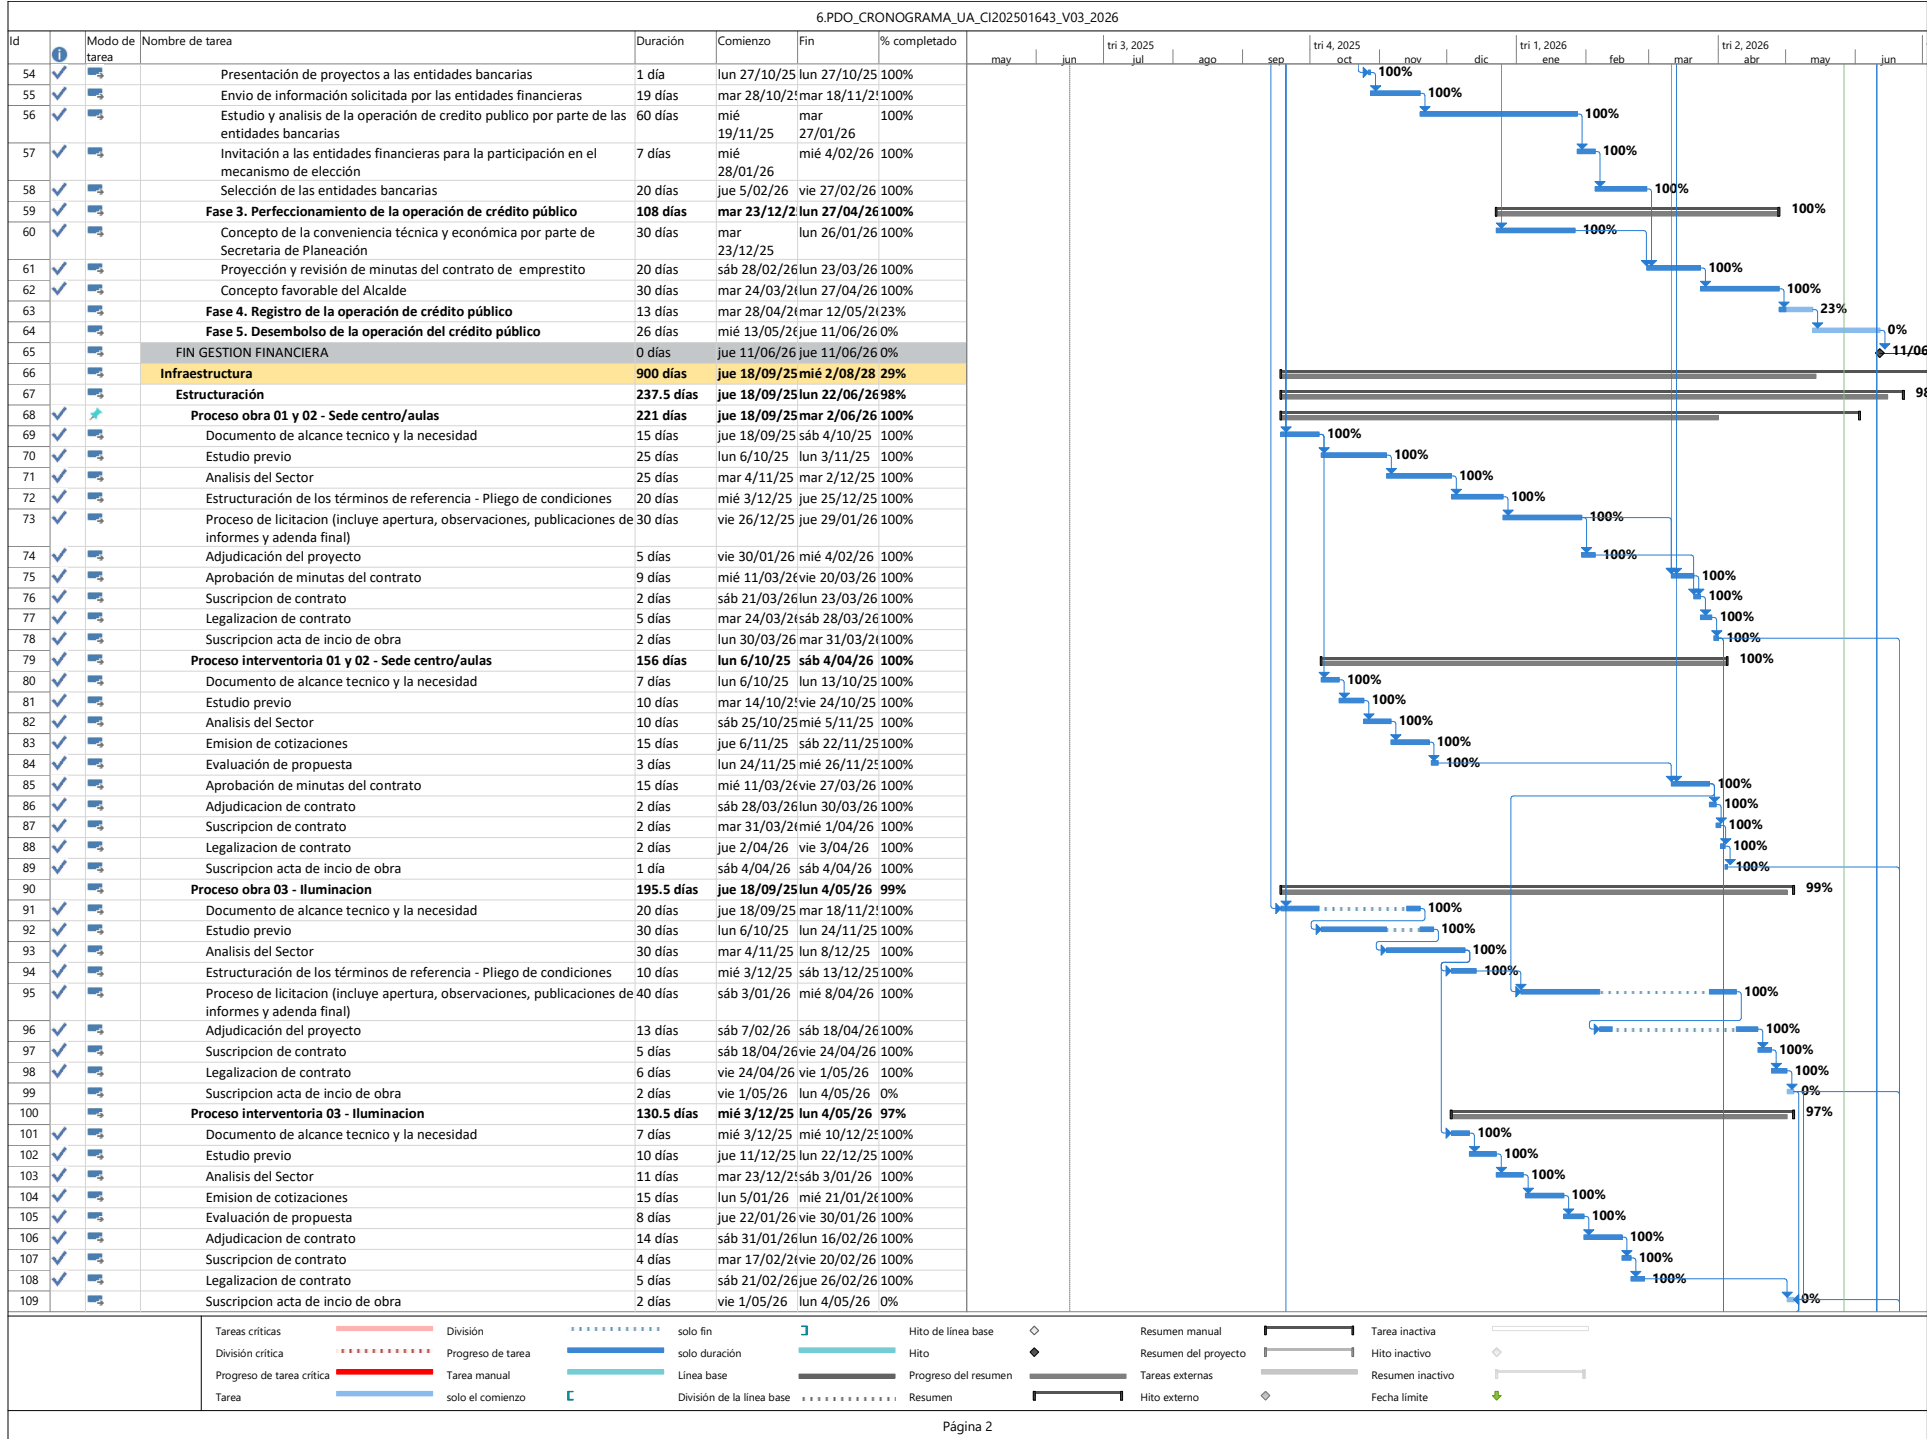

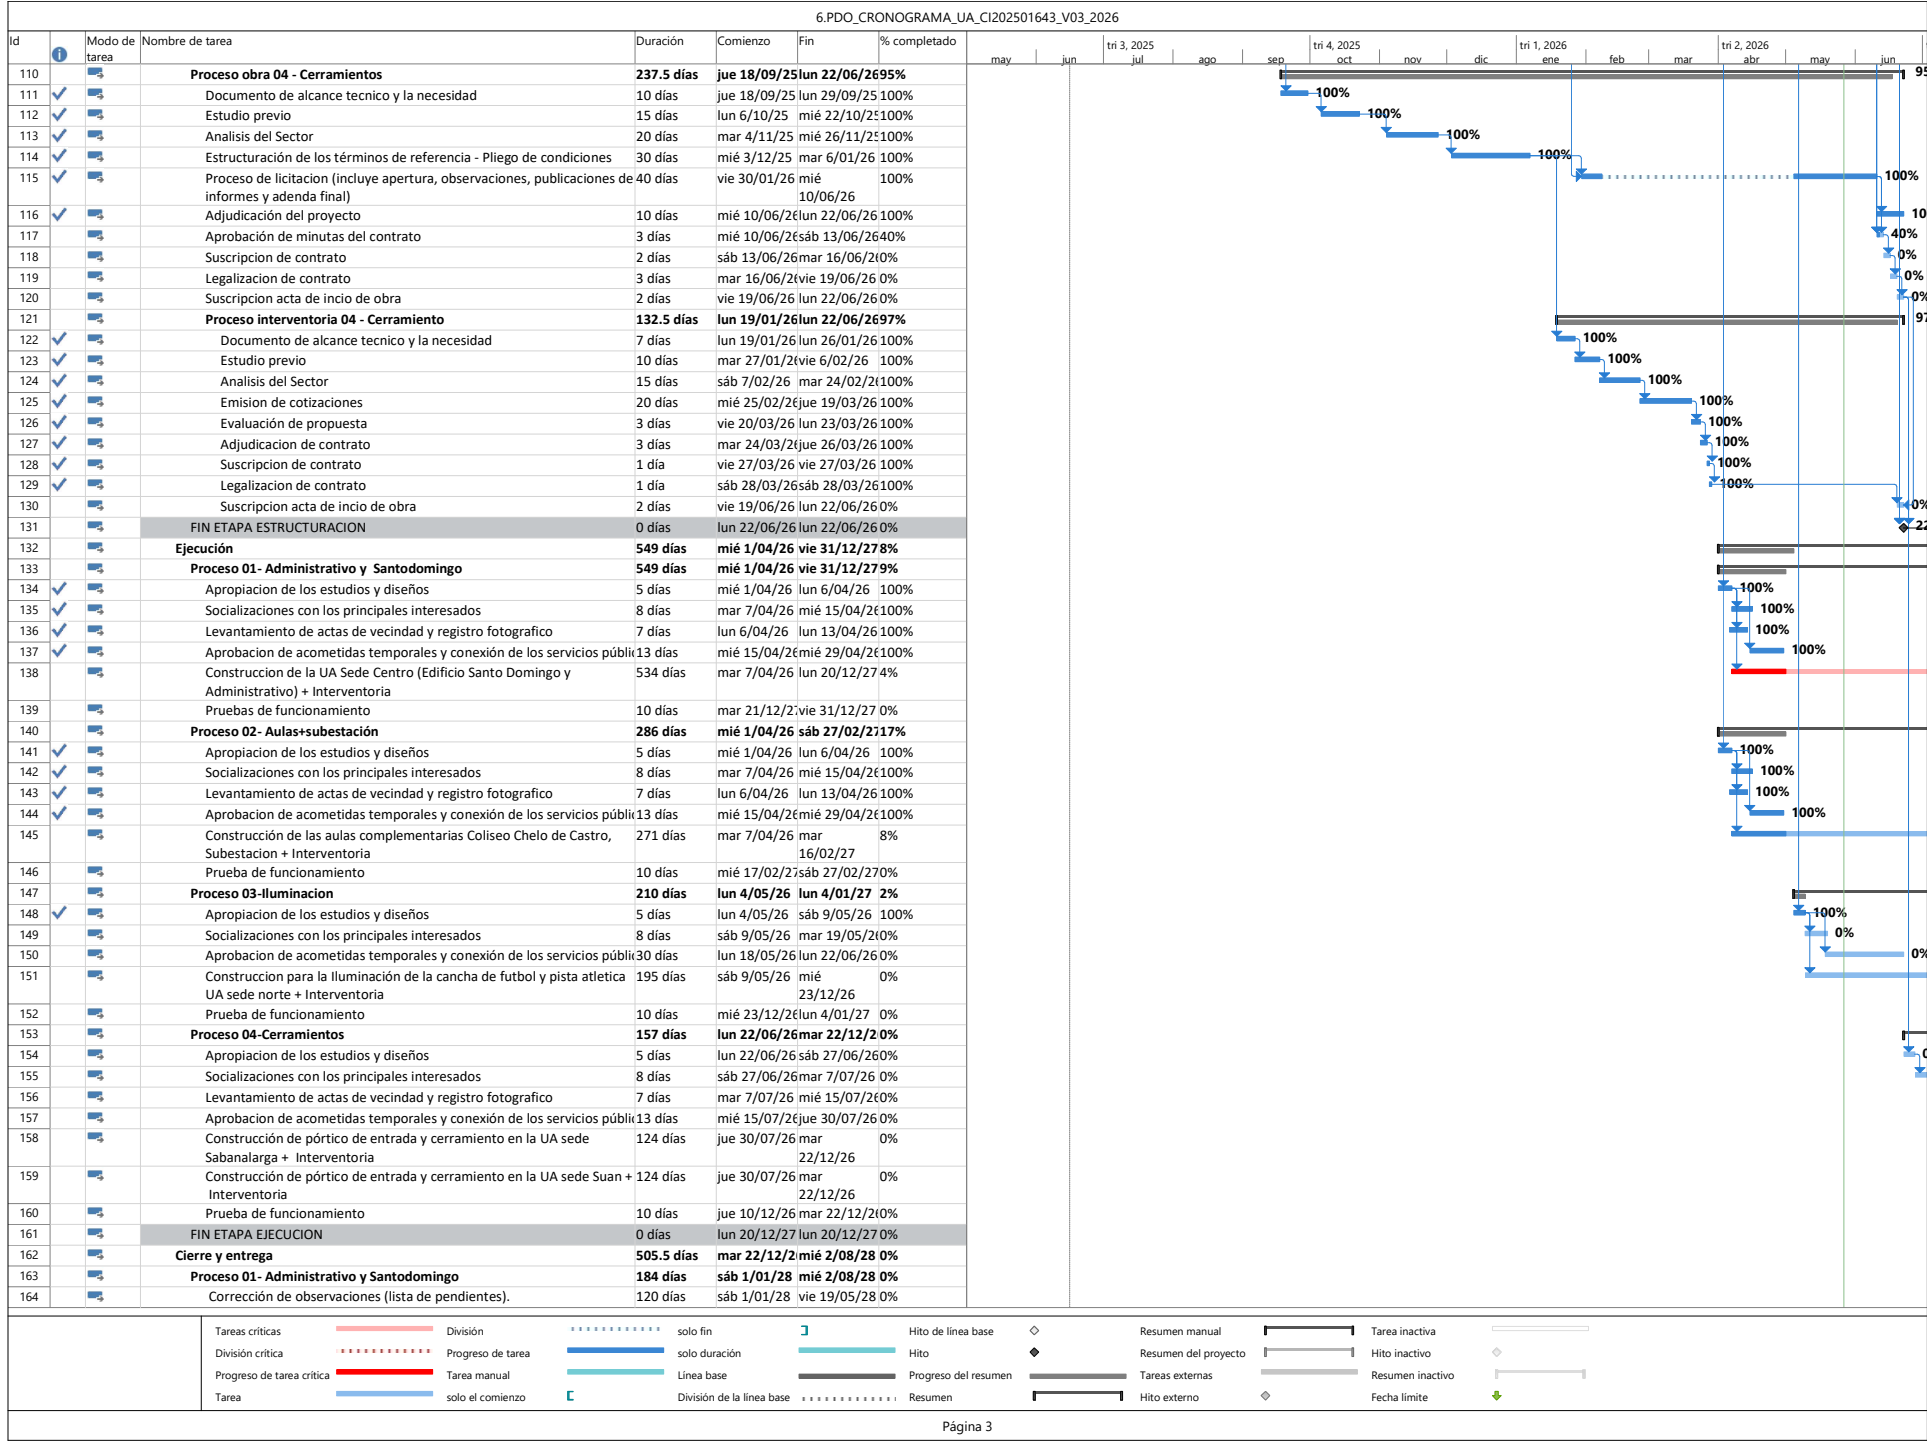

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado												
							may	jun	tri 3, 2025	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene	feb
165		Recepción oficial de obra.	30 días	sáb 20/05/28	vie 23/06/28	0%												
166		Entrega de planos “as built” y garantías.	7 días	sáb 24/06/28	sáb 1/07/28	0%												
167		Suscripción de actas de entregas	7 días	lun 3/07/28	lun 10/07/28	0%												
168		Liquidación del contrato.	5 días	mar 11/07/28	sáb 15/07/28	0%												
169		Certificados de finalización o experiencia	15 días	lun 17/07/28	mié 2/08/28	0%												
170		Proceso 02- Aulas + subestacion	100 días	mié 17/02/28	sáb 12/06/28	0%												
171		Corrección de observaciones (lista de pendientes).	60 días	mié 17/02/28	mar 27/04/28	0%												
172		Recepción oficial de obra.	10 días	mié 28/04/28	sáb 8/05/28	0%												
173		Entrega de planos “as built” y garantías.	5 días	lun 10/05/27	vie 14/05/27	0%												
174		Suscripción de actas de entregas	5 días	sáb 15/05/27	jue 20/05/27	0%												
175		Liquidación del contrato.	5 días	vie 21/05/27	mié 26/05/27	0%												
176		Certificados de finalización o experiencia	15 días	jue 27/05/27	sáb 12/06/27	0%												
177		Proceso 03- Iluminación	80 días	lun 4/01/27	mié 7/04/27	0%												
178		Corrección de observaciones (lista de pendientes).	20 días	lun 4/01/27	mié 27/01/27	0%												
179		Recepción oficial de obra.	30 días	mié 27/01/27	mié 3/03/27	0%												
180		Entrega de planos “as built” y garantías.	5 días	mié 3/03/27	mar 9/03/27	0%												
181		Suscripción de actas de entregas	5 días	mar 9/03/27	lun 15/03/27	0%												
182		Liquidación del contrato.	5 días	lun 15/03/27	sáb 20/03/27	0%												
183		Certificados de finalización o experiencia	15 días	sáb 20/03/27	mié 7/04/27	0%												
184		Proceso 04- Cerramientos	80 días	mar 22/12/27	jue 25/03/27	0%												
185		Corrección de observaciones (lista de pendientes).	20 días	mar 22/12/27	jue 14/01/27	0%												
186		Recepción oficial de obra.	30 días	jue 14/01/27	jue 18/02/27	0%												
187		Entrega de planos “as built” y garantías.	5 días	jue 18/02/27	mié 24/02/27	0%												
188		Suscripción de actas de entregas	5 días	mié 24/02/27	mar 2/03/27	0%												
189		Liquidación del contrato.	5 días	mar 2/03/27	lun 8/03/27	0%												
190		Certificados de finalización o experiencia	15 días	lun 8/03/27	jue 25/03/27	0%												
191		FIN ETAPA CIERRE Y ENTREGA	0 días	mié 2/08/28	mié 2/08/28	0%												
192		FIN PROYECTO	0 días	mié 2/08/28	mié 2/08/28	0%												

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Tarea manual

solo el comienzo

solo fin

solo duración

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Fecha limite

Página 4
