



ACTA DE REUNIÓN



CÓDIGO TRD: 2100

ACTA No. 16	LUGAR: Google Meet	FECHA: 29/05/2026	HORA DE INICIO: 2:00 PM	HORA FINAL: 2:25 PM
----------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	------------------------

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento entre responsable MINTIC e interventoría Consorcio Interlineas 2.0, contrato de interventoría No. 2169-2024 cuyo objeto es: *“Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico”.*

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación
2. Seguimiento compromisos anteriores
3. Estado documental
4. Informes de interventoría
5. Estado pago interventoría
6. Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
7. Finalización operación metas
8. Liquidación resoluciones
9. Finalización resoluciones
10. Estado revisión informes mensuales ejecutores
11. Informes de posible incumplimiento
12. Varios
13. Cierre

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
	N/A	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación

Se realiza la reunión de seguimiento por medio de la plataforma Google Meet, con presencia del equipo de interventoría Consorcio Inter-líneas 2.0 y responsable MINTIC.

La vocería de la reunión estuvo a cargo del equipo de interventoría Consorcio Inter-Líneas 2.0

2. Seguimiento a compromisos anteriores

Se realizó verificación a seguimiento de compromisos anteriores, estando al día entre la supervisión e interventoría con lo acordado en el Acta No.15.

3. Estado documental

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Frente al estado actual de las actas de comité operativo y de seguimiento del año 2025 (enero- diciembre) y 2026 (enero- abril), a continuación, se relaciona el estado por región

Región	Ene a Dic 25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26
4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
8	Firmada	Firmada	Firmada	Pte. Firmas	Ejecutada
14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

De igual forma, se relaciona el estado documental de las actas de seguimiento entre la interventoría y responsable MINTIC

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	15/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	28/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero - 26	29/01/2026	Firmado	
Febrero-26	26/02/2026	Firmado	
Marzo-26	26/03/2026	Firmado	
Abril-26	24/04/2026	Firmado	
Mayo-26	29/05/2026	Programada	

4. Informes de interventoría

Con relación a los informes mensuales de interventoría, se informa acerca de la fecha de entrega de estos.

Mes	Radicado	Fecha radicación	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v2	251095869	22/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	31/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2025	Aprobado	262026687
Enero-26-v2	261022384	04/03/2026	Aprobación	262052796
Febrero-26-v2	261030402	26/03/2026	Aprobación	262068069
Marzo-26-v2	261042576	24/04/2026	Aprobación	262078103
Abril-26-v1	261047610	08/05/2026	Con observaciones	262088345
Abril-26-v2	261055486	27/05/2026	En revisión	

5. Estado pago interventoría

Conforme al estado actual de pagos a la interventoría se relaciona la información consignada en la siguiente tabla, en donde se indica los pagos a realizar para el contrato de interventoría 2169-2024. Asimismo, se relaciona el estado de cada uno referente al trámite surtido.

VALOR HASTA	%	CONCEPTO	ESTADO
\$.117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925
\$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
\$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
\$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
\$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
\$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 75090126 2026-03-16
\$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PAGADO CE 177680626 2026-05-22
\$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
\$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE



ACTA DE REUNIÓN



\$5.143.899.395

100%

El director de interventoría informa que el periodo número ocho comprende los informes correspondientes a los meses de marzo y abril 2026. Indica que, una vez sea aprobado el informe de abril, se procederá con la radicación del pago correspondiente a dicho periodo.

Por su parte, **el líder del equipo MinTIC** manifiesta que el equipo se encuentra culminando la revisión de las subsanaciones del informe y que este será remitido a la mayor brevedad posible. Así mismo, refiere que es importante contar con la última línea de pago cargada en SECOP, documento que actualmente está siendo solicitado, con el fin de mantener al día los pagos y poder tramitar el siguiente desembolso. Señala además que este requisito resulta necesario para gestionar el penúltimo pago.

El director de interventoría informa que el pago número siete ya se encuentra cargado y consulta si se requiere algún soporte o pantallazo por parte del equipo.

El líder del equipo MinTIC responde que la verificación será realizada internamente a través de la persona encargada; no obstante, recalca la importancia de que, para el próximo pago que está próximo a radicarse, se tenga al día la línea de pago anterior.

6. Fase planeación

En cuanto a la fase de planeación, a continuación, se expone el estado actual por región frente a documentos de planeación requeridos:

- ✓ Repositorio de información
- ✓ IDIO
- ✓ Plan de comercialización
- ✓ Plan de instalación
- ✓ Plan de mantenimiento

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒

6.1 Fase instalación

Con respecto a la fase de instalación, se relaciona la cantidad de accesos en estado aprobado, rechazado, en subsanación y en revisión por la interventoría con respecto a la meta total para cada región.

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3.142	3.142	0	81	0	0	3.142
Región 5	2.706	2.571	135	4	0	0	2.706
Región 6	2.133	2.133	0	2	0	0	2.133
Región 7	1.027	0	1.027	1	0	0	1.027
Región 8	3.701	3.699	0	2	2	0	3.701
Región 14	1.330	665	665	11	0	0	1.330
Región 15	2.325	0	2.325	4	0	0	2.325
Región 16	2.279	0	2.279	13	0	0	2.279
Región 17	2.420	1.210	1.210	50	0	0	2.420
Región 18	4.249	4.249	0	14	0	0	4.249
Región 19	2.134	2.027	107	1	0	0	2.134
Región 20	3.029	2.878	151	1	0	0	3.029
Región 21	2.146	0	2.146	9	0	0	2.146
Región 22	3.909	3.714	195	71	0	0	3.909
Región 23	2.310	0	2.310	11	0	0	2.310
Región 24	2.543	0	2.543	5	0	0	2.543
Región 25	1.413	0	1.413	9	0	0	1.413
Región 26	1.391	1.391	0	52	0	0	1.391
Región 27	1.279	1.279	0	40	0	0	1.279
Región 29	2.567	2.439	128	84	0	0	2.567
Región 30	763	0	763	3	0	0	763
Región 32	2.621	2.490	131	20	0	0	2.621
Región 36	1.346	1.346	0	22	0	0	1.346
Región 37	1.601	1.521	80	0	0	0	1.601
Región 39	644	0	644	1	0	0	644
TOTAL	55.008	36.754	15.252	511	2	0	55.008

6.2 Fase operación

En cuanto a la fase de operación, se expone el estado de avance de cada región en relación con el cumplimiento de las metas y la fecha de inicio de operación.

Región	Meta total	Meta 1	Inicio operación Meta 1	Meta 2	Inicio operación Meta 2	Meta 3	Inicio operación Meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025

Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
TOTAL	55.008	2.748		24.754		27.506	

7. Finalización operación metas

Con relación al cumplimiento de metas desde la interventoría se indica el estado actual de las regiones que presentan finalización de operación de metas (1-2-3) en la actualidad

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con compensación meta 2
Región 5	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG06-04913-26 / 261053902
Región 6	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960
Región 7	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG07-04686-26 / 261042651 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG07-04714-26 / 261044079
Región 8	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas meta 1 Pendiente entrega de facturas meta 2
Región 14	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG14-04239-26 / 261018671 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG14-04695-26 / 261043278
Región 15	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin metas 1 y 2: LFF2-INTV-REG15-04190-26 / 261016577 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG15-04751-26 / 261045437
Región 16	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG16-04488-26 / 261030576 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG16-04562-26 / 261034203
Región 17	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG17-04354-26 / 261021883 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG17-04619-26 / 261039180 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG17-04972-26 / 261055877
Región 18	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 19	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG19-04228-26 / 261017959 Pendiente entrega de facturas con compensación meta 2
Región 20	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201 Pendiente entrega de facturas reposición y con compensación meta 2

Región 21	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG21-04674-26 / 261042571 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG21-04675-26 / 261042572
Región 22	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG22-04736-26 / 261044741 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 23	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG23-04707-26 / 261043724 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG23-04731-26 / 261044627 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG23-04732-26 / 261044628
Región 24	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03781-25 / 251156256 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG24-04430-26 / 261025942 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG24-04733-26 / 261044627
Región 25	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG25-04781-26 / 261046365 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG25-04782-26 / 261046364 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG25-04783-26 / 261046362
Región 26	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1
Región 27	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1
Región 29	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG29-04730-26 / 261044626 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG25-04914-26 / 261053904 Pendiente entrega de facturas con reposición meta 3
Región 30	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG30-04789-26 / 261046557 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG30-04790-26 / 261046558 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG30-04791-26 / 261046559
Región 32	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG32-04685-26 / 261042589 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 36	Con concepto finalización	Con concepto finalización	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG36-04892-26 / 261053402 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG36-04917-26 / 261054357
Región 37	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG37-04227-26 / 261017958 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 39	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG39-04808-26 / 261047859 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG39-04809-26 / 261047861 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG39-04810-26 / 261047862

Finalizadas: 60
En Operación: 15
Finalizadas formalmente: 43

8. Liquidación de resoluciones

En relación con el estado de avance de las resoluciones, se presenta el estado actual de los hitos de cumplimiento dentro del proceso de liquidación en las distintas regiones.

Informe de cumplimiento	
P: Proceso de elaboración:	4
OK: COMPLETO:	8

Informe final	
S: En subsanación:	1
R: En revisión:	0
SE: Sin entregar:	0
OK: APROBADO:	3

Documentación digital	
P: Proceso de certificación:	0
OK: APROBADO:	3
	7

Metas	
F: Meta finalizada sin concepto:	17
C: Meta finalizada con concepto:	43

Región	Fecha fin resolución	Informe final	Informe Cumplimiento	Doc. digital	Meta 1		Meta 2		Meta 3	
					Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado
Región 4	30/06/26				28/11/2025	F	10/03/2026	F	18/06/2026	
Región 5	30/06/26				31/01/2026	C	01/05/2026	F	30/06/2026	
Región 6	31/07/26				02/03/2026	C	06/06/2026		31/07/2026	
Región 7	30/04/26		OK	OK	28/11/2025	C	06/03/2026	C	28/04/2026	C
Región 8	30/09/26				28/11/2025	F	31/03/2026	F	29/9/2026	
Región 14	31/03/26		OK	OK	6/12/2025	C	23/02/2026	C	31/03/2026	F

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Región 15	31/03/26	R	OK	OK	30/11/2025	C	30/11/2025	C	31/03/2026	C
Región 16	28/02/26	OK	OK	OK	29/07/2025	C	4/11/2025	C	27/01/2026	C
Región 17	30/04/26		OK		20/12/2025	C	20/12/2025	C	07/04/2026	C
Región 18	31/07/26				2/12/2025	F	29/04/2026	F	31/07/2026	
Región 19	30/06/26				5/12/2025	C	31/03/2026	F	24/06/2026	
Región 20	30/06/26				28/11/2025	C	29/04/2026	F	26/06/2026	
Región 21	15/05/26		OK	OK	28/07/2025	C	23/12/2025	C	28/02/2026	C
Región 22	30/06/26				2/12/2025	C	11/05/2026	F	17/07/2026	
Región 23	31/03/26	OK	OK	OK	03/08/2025	C	11/01/2026	C	28/02/2026	C
Región 24	15/02/26	OK	OK	OK	28/07/2025	C	25/11/2025	C	31/01/2026	C
Región 25	31/03/26		P		31/01/26	C	06/03/2026	C	31/03/2026	C
Región 26	30/06/26				10/03/2026	F	11/06/2026		29/10/2026	
Región 27	31/08/26				10/03/2026	F	23/06/2026		26/10/2026	
Región 29	30/04/26		P		9/11/2025	C	27/01/2026	C	26/04/2026	F
Región 30	30/04/26		P		31/01/2026	C	06/03/2026	C	28/04/2026	C
Región 32	31/07/26				2/12/2025	C	19/05/2026	F	29/07/2026	
Región 36	31/03/26				06/02/2026	C	02/04/2026	C	13/06/2026	
Región 37	30/04/26				6/12/2025	C	12/03/2026	F	24/04/2026	F
Región 39	30/04/26		P		20/02/2026	C	10/03/2026	C	28/04/2026	C

9. Finalización de las resoluciones

Se hace importante reportar desde la interventoría la fecha en la que se termina cada una de las 25 resoluciones objeto del proyecto de interventoría así:

ENERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
14	31/03/26	2 meses
15	31/03/26	1 mes
25	31/03/26	2.5 meses

ABRIL 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
7	30/04/26	3 meses
29	30/04/26	3 meses
30	30/04/26	1 mes
37	30/04/26	5 meses
39	30/04/26	1 mes

JUNIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
4	30/06/26	2 meses
5	30/06/26	1 mes

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

19	30/06/26	1 mes
20	30/06/26	1.5 meses
36	31/05/25 (13/06/26) *	3 meses

JULIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26) *	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
26	30/06/25 (29/10/26) *	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26) *	Pendiente

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

10. Llamadas telefónicas

Con corte al presente comité, la interventoría ha llevado a cabo un total de **67.717** llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

11. Estado revisión informes mensuales ejecutores

Referente al estado actual de los documentos requisitos de pago se indica el estado actual de cumplimiento de cada región frente al o los pagos pendientes por tramitar

RESUMEN	
S: En subsanación	2
R: En revisión	6
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	462

Región	Informes					
	oct- dic 24	ene-dic 25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK


12. Informes de posible incumplimiento

El componente jurídico de la interventoría expone la relación de Informes de posible incumplimiento que se han emitido, indicando región, numero de comunicado fecha, tema y tasación tal como se evidencia a continuación

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00019-26 (261044078)	29/04/2026	Respuesta a Requerimiento	\$20.442.071,22	\$20.442.071,22	No superado*

* A la fecha se encuentran en trámite radicación de documento de superación de los hechos

TOTAL IPIS SUPERADOS

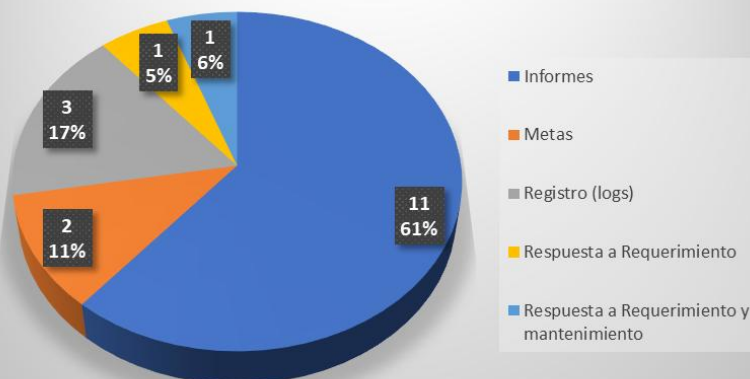

SUPERADOS	INFORMES MENSUALES					METAS		REGISTRO (LOGS)			RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTOS
REGIÓN	8	26	27	29	36	26	27	26	27	36	8	29
NO. INFORMES	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1

El señor Roberto Rubio, en vocería de la supervisión, manifiesta que, frente al Acta No. 18, actualmente en revisión por parte del ejecutor, consulta si, en caso de que el día lunes no se hayan remitido las observaciones pertinentes, sería conveniente levantar de manera preventiva una alerta de posible incumplimiento, con el fin de ejercer mayor control y evitar que continúen acumulándose actas correspondientes a la Región 8. Adicionalmente, consulta qué medidas pretende adoptar la interventoría para el manejo de estas situaciones en adelante, teniendo en cuenta que ya se tiene mayor claridad frente al mecanismo y la competencia del Ministerio respecto a los presuntos incumplimientos.

Por su parte, **el director de interventoría** indica que, en aras de respetar el debido proceso, considera pertinente iniciar inicialmente con una acción correctiva, la cual podría ser radicada la próxima semana. Señala que, en caso de no obtener respuesta dentro del plazo estimado de tres días posteriores a la radicación, se procedería entonces con la emisión de la alerta de posible incumplimiento. Finalmente, manifiesta que este mismo procedimiento se aplicará para las próximas actas de comité.

13. Varios

13.1 Socialización de PQRS

El director de interventoría refiere que, frente a las PQR pendientes, se encuentra la correspondiente a la Región 22, respecto de la cual se suscribió un acuerdo. Indica que sostuvo conversaciones con el señor Federico y con Julio, acordándose que la Región 22 realizaría el pago total de las obligaciones pendientes con el señor Federico a más tardar el 20 de junio 2026. Señala que esta sería una de las PQR pendientes y, adicionalmente, se tendría pendiente la correspondiente a la Región 39.

Por su parte, **el líder del equipo MinTIC** manifiesta que, efectivamente, también se encuentra pendiente la PQR relacionada con la usuaria que solicita claridad sobre el tema de Cundinamarca – Anolaima, la cual fue trasladada al ejecutor para que emitiera respuesta, con copia a la interventoría y al Ministerio. Indica que,

aunque el Ministerio emitirá una respuesta institucional sobre el proyecto, resulta importante que el ejecutor responda directamente el derecho de petición presentado por la usuaria.

Así mismo, señala que continúa pendiente la respuesta al derecho de petición presentado por HIZ Telecomunicaciones, con el fin de suministrar dicha información a la firma Osorio y Moreno y así complementar la respuesta dentro de los términos previstos. Adicionalmente, informa que el día anterior fue recibida la solicitud formal relacionada con la fórmula de compensación, mediante la cual se requiere información sobre la metodología utilizada para realizar el cálculo correspondiente. En ese sentido, precisa que actualmente se encuentran pendientes esas tres PQR.

El director de interventoría informa que, frente a la PQR de la Región 39, ya se realizó el respectivo traslado y actualmente se encuentran a la espera de la respuesta correspondiente. Respecto a la solicitud presentada por la Región 8 frente al derecho de petición relacionado con la operación, indica que los insumos para la respuesta serán radicados el próximo lunes.

De igual manera, manifiesta que, frente a la solicitud elevada por la Región 8 sobre el cálculo de los indicadores, en el último comité operativo William (Profesional técnico de la interventoría) sostuvo una conversación con la gerente de proyectos de dicha región, en la cual se ofreció realizar una mesa de trabajo para explicar la metodología utilizada en el cálculo de la compensación. Sin embargo, señala que la región manifestó su preferencia por radicar formalmente el oficio, razón por la cual la respuesta se emitirá por escrito, explicando la forma en que se calculan los indicadores y la compensación, conforme al anexo técnico.

Por otra parte, **el abogado Juan Carlos de la dirección de infraestructura** indica que también se encuentra pendiente el informe correspondiente a la Región 36, por lo cual solicita realizar el respectivo seguimiento, teniendo en cuenta que posteriormente deberá efectuarse la verificación y remisión a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.

Frente a lo anterior, **el director de interventoría** informa que dicho informe fue radicado el día de hoy. Así mismo, manifiesta que permanecerán atentos a cualquier requerimiento adicional relacionado con la Región 36 y recuerda que, conforme a lo manifestado por el ejecutor en el comité operativo y en conversaciones previas, este indicó que continuará cumpliendo con la operación de la Meta 3.

13.2 Trámite de las Prórrogas R4, R5, R19, R20, R22 y R26

El director de interventoría refiere que, con relación al trámite de las prórrogas, actualmente se tienen algunas regiones cuyos términos vencen el próximo 30 de junio, por lo cual resulta necesario adelantar oportunamente las respectivas solicitudes de prórroga.

Por su parte, **el líder del equipo MinTIC** informa que ya se ha venido trabajando este tema con el equipo correspondiente y que las solicitudes se encuentran actualmente en proceso de revisión. En ese sentido, manifiesta que esperan contar con una pronta respuesta para proceder con la modificación de las resoluciones respectivas.

Finalmente, **el director de interventoría** indica que permanecerán atentos para iniciar las gestiones necesarias relacionadas con la actualización de las garantías.

13.3 Seguimiento a plan de mejoramiento y acciones correctivas derivadas de auditoría interna

El líder del equipo de apoyo a la supervisión informa que, por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio, fue remitido un plan de mejoramiento relacionado con dos acciones correctivas correspondientes a la interventoría No. 2169. Indica que dichas acciones derivan de situaciones presentadas en el desarrollo del proyecto y que, aunque entiende que actualmente ya se encuentran subsanadas, posteriormente se informará de manera interna el avance correspondiente frente al tema.

Así mismo, señala que uno de los compromisos adquiridos consiste en adicionar, dentro del informe mensual, un documento soporte que evidencie que las acciones correctivas efectivamente fueron implementadas. De manera preliminar, se estableció como fecha tentativa el 31 de julio 2026, conforme a la solicitud interna relacionada con el plazo para la implementación de las acciones correctivas. No obstante, aclara que hasta tanto no se apruebe formalmente dicha fecha y las acciones propuestas, no se realizará un requerimiento formal a la interventoría. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que es importante mantener el tema en el radar, teniendo en cuenta que deberá anexarse dicho soporte adicional en el informe mensual del siguiente periodo.

Frente a lo anterior, **el director de interventoría** consulta cuál fue el requerimiento específico al que hace referencia.

En respuesta, **el líder del equipo MinTIC** informa que se identificaron dos hallazgos principales. El primero corresponde a incumplimientos en los tiempos de revisión y aprobación de documentos de planeación e informes mensuales del ejecutor, así como demoras en la atención de requerimientos elevados por la supervisión. El segundo hallazgo se relaciona con inconsistencias en la información reportada en el sistema, la cual no reflejaba correctamente los datos asociados a los accesos que habían culminado la etapa de operación obligatoria.

Adicionalmente, manifiesta que el señor Roberto Rubio le informó que en su momento se adelantaron las acciones pertinentes dentro del marco del proyecto; sin embargo, resulta necesario soportar documentalmente dichas acciones y presentarlas ante Control Interno para efectos del cierre formal de los hallazgos. Precisa que, respecto al segundo hallazgo, relacionado con los accesos finalizados en operación, el equipo de supervisión había solicitado el año anterior las respectivas correcciones, las cuales fueron implementadas y cargadas en la plataforma SCAIN y en los reportes correspondientes. En ese sentido, indica que dichas acciones deben quedar debidamente soportadas para el cierre definitivo dentro de la muestra aleatoria realizada por Control Interno a los proyectos de la Dirección de Infraestructura.

Por su parte, **el director de interventoría** manifiesta que, frente al informe de auditoría realizado en junio de 2025, la interventoría presentó oportunamente el informe de cierre de los respectivos hallazgos. Indica que revisará el tema con Adriana (Profesional de calidad de la interventoría) y que, de ser necesario, le solicitará que se comunique con el equipo del Ministerio para explicar el contexto y la trazabilidad completa del proceso adelantado para el cierre de dichos hallazgos. Así mismo, señala que mantuvieron comunicación permanente con Oscar y Paola Mora, a quienes se les remitió el informe de cierre de las acciones implementadas, documentación que se encuentra debidamente soportada y radicada. Finalmente, pone a disposición toda la información, informes y radicaciones relacionadas con la auditoría adelantada el año anterior.

El señor Roberto Rubio complementa la información indicando que, efectivamente, los acontecimientos señalados ocurrieron y que el hallazgo surgió precisamente a partir de los controles implementados por el equipo de apoyo a la supervisión. Señala que, aunque en el informe preliminar se presentaron las respectivas explicaciones, en el informe final se decidió mantener el hallazgo. En consecuencia, aclara que actualmente no se trata de reabrir la discusión ni reiterar explicaciones ya suministradas, sino de demostrar, mediante un nuevo informe para el periodo correspondiente, que las situaciones fueron superadas y que las acciones implementadas derivaron en mejoras efectivas.

En ese sentido, indica que para el hallazgo relacionado con el sistema de información se evidenciarán las mejoras implementadas y, respecto al hallazgo asociado a los tiempos de revisión y aprobación, se demostrará que actualmente los informes de planeación y los informes mensuales se encuentran al día gracias a los controles aplicados. Finalmente, manifiesta que se coordinarán las actividades correspondientes entre el Ministerio, la interventoría y Adriana, una vez la Oficina de Control Interno apruebe formalmente las acciones



ACTA DE REUNIÓN



correctivas propuestas, resaltando que los controles implementados han resultado efectivos y actualmente se encuentran funcionando adecuadamente dentro del proyecto.

14. Cierre

En la presente acta se deja constancia de la reunión que se llevó a cabo entre la interventoría y responsable MINTIC, como consta la PPT presentada

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Radicación de Acción Correctiva para Región 8 por acta de comité operativo abril 2026	Interventoría	2/06/2026

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
María Carolina Zúñiga Hernández	Directora Infraestructura	
Cesar Polo	Líder del equipo del MinTIC	
Juan Barrero	Director de Interventoría	

Anexos

- PPT Reunión de seguimiento No 16



TIC





TIC



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2169 -2024

**REUNIÓN
SEGUIMIENTO No. 16
Mayo 2026**


CONSORCIO INTER-LÍNEAS 2.0

www.mintic.gov.co

Temas



- Seguimiento compromisos anteriores
- Estado documental
- Informes de interventoría
- Estado pago interventoría
- Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
- Finalización operación metas
- Liquidación resoluciones
- Finalización resoluciones
- Llamadas realizadas
- Estado revisión informes mensuales ejecutores
- Informes de posible incumplimiento
- Varios



“Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico”

- Firma Contrato: 27 de diciembre de 2024
- Acta de Inicio: 31 de diciembre de 2024
- Inicio de Actividades: 31 de diciembre de 2024
- Fecha Terminación: 31 de julio de 2026
- Otrosí No 2: 01 de enero de 2026
- Valor: \$5.143.899.395
- Estado: Activo y en ejecución



Seguimiento compromisos anteriores

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
N/A	N/A	N/A

www.mintic.gov.co

Estado documental – Actas comités operativos

Región	Ene- Dic 25	Ene-2026	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26
Región 4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 8	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Pte. Firmas	Ejecutada
Región 14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

Estado documental – actas de seguimiento

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	14/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	29/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero-26	29/01/2026	Firmado	
Febrero-26	26/02/2026	Firmado	
Marzo-26	26/03/2026	Firmado	
Abril-26	24/04/2026	Firmado	
Mayo-26	29/05/2026	Programada	

Informes de interventoría

Mes	Radicado	Fecha radicado	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v2	251095869	28/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687
Enero-26-v2	261022384	04/03/2026	Aprobación	262052796
Febrero-26-v2	261030402	26/03/2026	Aprobación	262068069
Marzo-26-v2	261042576	24/04/2026	Aprobación	262078103
Abril-26-v1	261047610	08/05/2026	Con observaciones	262088345
Abril-26-v2	261055486	27/05/2026	En revisión	

Estado pagos de interventoría



VALOR HASTA	PORCENTAJE	CONCEPTO	ESTADO
\$ 1.117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925 2025-07-11
\$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
\$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
\$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
\$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
\$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 75090126 2026-03-16
\$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PAGADO CE 177680626 2026-05-22
\$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
\$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
\$5.143.899.395	100%		

Fase de planeación

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒	Aprobado ☒

Fase de instalación

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3.142	3.142	0	81	0	0	3.142
Región 5	2.706	2.571	135	4	0	0	2.706
Región 6	2.133	2.133	0	2	0	0	2.133
Región 7	1.027	0	1.027	1	0	0	1.027
Región 8	3.701	3.699	0	2	2	0	3.701
Región 14	1.330	665	665	11	0	0	1.330
Región 15	2.325	0	2.325	4	0	0	2.325
Región 16	2.279	0	2.279	13	0	0	2.279
Región 17	2.420	1.210	1.210	50	0	0	2.420
Región 18	4.249	4.249	0	14	0	0	4.249
Región 19	2.134	2.027	107	1	0	0	2.134
Región 20	3.029	2.878	151	1	0	0	3.029
Región 21	2.146	0	2.146	9	0	0	2.146
Región 22	3.909	3.714	195	71	0	0	3.909
Región 23	2.310	0	2.310	11	0	0	2.310
Región 24	2.543	0	2.543	5	0	0	2.543
Región 25	1.413	0	1.413	9	0	0	1.413
Región 26	1.391	1.391	0	52	0	0	1.391
Región 27	1.279	1.279	0	40	0	0	1.279
Región 29	2.567	2.439	128	84	0	0	2.567
Región 30	763	0	763	3	0	0	763
Región 32	2.621	2.490	131	20	0	0	2.621
Región 36	1.346	1.346	0	22	0	0	1.346
Región 37	1.601	1.521	80	0	0	0	1.601
Región 39	644	0	644	1	0	0	644
	55.008	36.754	15.252	511	2	0	55.008

Fase de operación

Región	Accesos meta	Accesos meta 1	Inicio operación meta 1	Accesos meta 2	Inicio operación meta 2	Accesos meta 3	Inicio operación meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
	55.008	2.748		24.754		27.506	

Finalización operación metas



Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con compensación meta 2
Región 5	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG06-04913-26 / 261053902
Región 6	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960
Región 7	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG07-04686-26 / 261042651 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG07-04714-26 / 261044079
Región 8	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas meta 1 Pendiente entrega de facturas meta 2
Región 14	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG14-04239-26 / 261018671 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG14-04695-26 / 261043278
Región 15	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin metas 1 y 2: LFF2-INTV-REG15-04190-26 / 261016577 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG15-04751-26 / 261045437
Región 16	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG16-04488-26 / 261030576 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG16-04562-26 / 261034203
Región 17	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG17-04354-26 / 261021883 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG17-04619-26 / 261039180 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG17-04972-26 / 261055877
Región 18	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 19	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG19-04228-26 / 261017959 Pendiente entrega de facturas con compensación meta 2
Región 20	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201 Pendiente entrega de facturas reposición y con compensación meta 2

Finalizadas: 60
En Operación: 15
Finalizadas con concepto: 43

Finalización operación metas



Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 21	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG21-04674-26 / 261042571 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG21-04675-26 / 261042572
Región 22	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG22-04736-26 / 261044741 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 23	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG23-04707-26 / 261043724 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG23-04731-26 / 261044627 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG23-04732-26 / 261044628
Región 24	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03781-25 / 251156256 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG24-04430-26 / 261025942 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG24-04733-26 / 261044627
Región 25	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG25-04781-26 / 261046365 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG25-04782-26 / 261046364 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG25-04783-26 / 261046362
Región 26	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1
Región 27	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1
Región 29	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG29-04730-26 / 261044626 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG25-04914-26 / 261053904 Pendiente entrega de facturas con reposición meta 3
Región 30	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG30-04789-26 / 261046557 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG30-04790-26 / 261046558 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG30-04791-26 / 261046559

Finalizadas: 60
En Operación: 15
Finalizadas con concepto: 43

Finalización operación metas



Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 32	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG32-04685-26 / 261042589 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 36	Con concepto finalización	Con concepto finalización	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG36-04892-26 / 261053402 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG36-04917-26 / 261054357
Región 37	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG37-04227-26 / 261017958 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 39	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG39-04808-26 / 261047859 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG39-04809-26 / 261047861 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG39-04810-26 / 261047862

Finalizadas: 60
En Operación: 15
Finalizadas con concepto: 43

Cierre de resoluciones



Región	Fecha fin resolución	Informe final	Informe Cumplimiento	Documentación digital	META 1		META 2		META 3	
					Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado
Región 4	30/06/26				28/11/2025	F	10/03/2026	F	18/06/2026	
Región 5	30/06/26				31/01/2026	C	01/05/2026	F	30/06/2026	
Región 6	31/07/26				02/03/2026	C	06/06/2026		31/07/2026	
Región 7	30/04/26	Pendiente	OK	OK	28/11/2025	C	06/03/2026	C	28/04/2026	C
Región 8	30/09/26				28/11/2025	F	31/03/2026	F	29/9/2026	
Región 14	31/03/26		OK	OK	6/12/2025	C	23/02/2026	C	31/03/2026	F
Región 15	31/03/26	R	OK	OK	30/11/2025	C	30/11/2025	C	31/03/2026	C
Región 16	28/02/26	OK	OK	OK	29/07/2025	C	4/11/2025	C	27/01/2026	C
Región 17	30/04/26	Pendiente	OK		20/12/2025	C	20/12/2025	C	07/04/2026	C
Región 18	31/07/26				2/12/2025	F	29/04/2026	F	31/07/2026	
Región 19	30/06/26				5/12/2025	C	31/03/2026	F	24/06/2026	
Región 20	30/06/26				28/11/2025	C	29/04/2026	F	26/06/2026	
Región 21	15/05/26	R	OK	OK	28/07/2025	C	23/12/2025	C	28/02/2026	C
Región 22	30/06/26				2/12/2025	C	11/05/2026	F	17/07/2026	
Región 23	31/03/26	OK	OK	OK	03/08/2025	C	11/01/2026	C	28/02/2026	C
Región 24	15/02/26	OK	OK	OK	28/07/2025	C	25/11/2025	C	31/01/2026	C
Región 25	31/03/26	Pendiente	Pendiente		31/01/26	C	06/03/2026	C	31/03/2026	C
Región 26	30/06/26				10/03/2026	F	11/06/2026		29/10/2026	
Región 27	31/08/26				10/03/2026	F	23/06/2026		26/10/2026	
Región 29	30/04/26				9/11/2025	C	27/01/2026	C	26/04/2026	F
Región 30	30/04/26	Pendiente	Pendiente		31/01/2026	C	06/03/2026	C	28/04/2026	C
Región 32	31/07/26				2/12/2025	C	19/05/2026	F	29/07/2026	
Región 36	31/03/26	Pendiente	Pendiente		06/02/2026	C	02/04/2026	C	13/06/2026	
Región 37	30/04/26				6/12/2025	C	12/03/2026	F	24/04/2026	F
Región 39	30/04/26	Pendiente	Pendiente		20/02/2026	C	10/03/2026	C	28/04/2026	C

C: Finalizada con concepto
F: Finalizada sin concepto

Finalización resoluciones

ENERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
14	31/03/26	2 meses
15	31/03/26	1 mes
25	31/03/26	2.5 meses
36	31/03/26 (13/06/26)	3 meses

ABRIL 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
7	30/04/26	3 meses
29	30/04/26	3 meses
30	30/04/26	1 mes
37	30/04/26	5 meses
39	30/04/26	1 mes


JUNIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
4	30/06/26	2 meses
5	30/06/26	1 mes
19	30/06/26	1 mes
20	30/06/26	1.5 meses
22	30/06/26 (17/07/26)	1 mes
26	30/06/26 (29/10/26)	5 meses

JULIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

AGOSTO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
27	31/08/26 (26/10/26)	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
8	30/09/26	Pendiente

Llamadas Realizadas

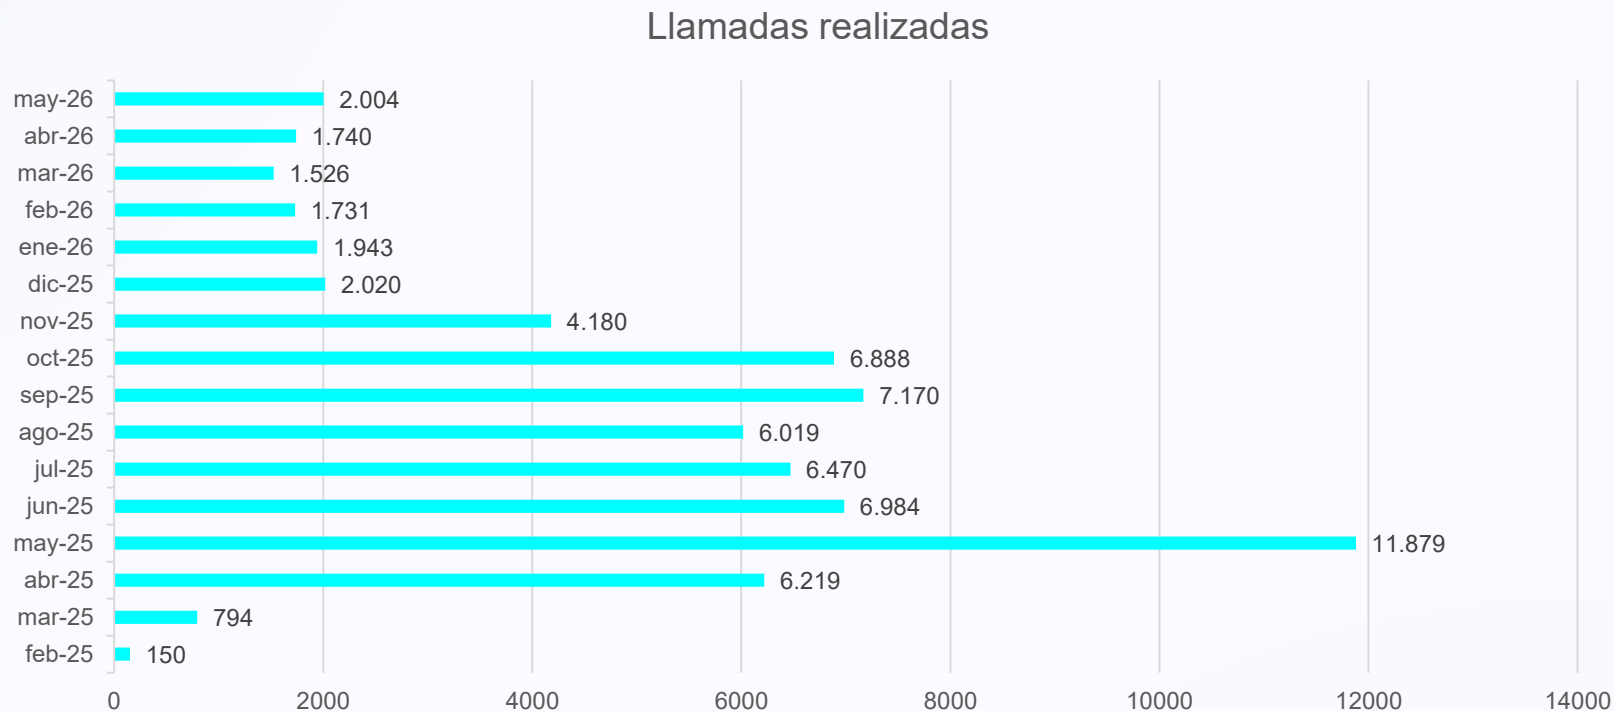

Con corte al presente comité , la interventoría ha llevado a cabo un total de **67.717** llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

Estado revisión informes mensuales ejecutores



Región	INFORMES																	Mar-26	Abr-26
	Oct-24	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26		
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

RESUMEN

S: En subsanación	2
R: En revisión	6
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	462

NOTA

Región 16: Finalizaron operación


Región 23 : Finalizaron operación

Región 24 : Finalizaron operación

INFORMES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00019-26 (261044078)	29/04/2026	Respuesta a Requerimiento	\$20.442.071,22	\$20.442.071,22	No superado*

* A la fecha se encuentran en trámite radicación de documento de superación de los hechos

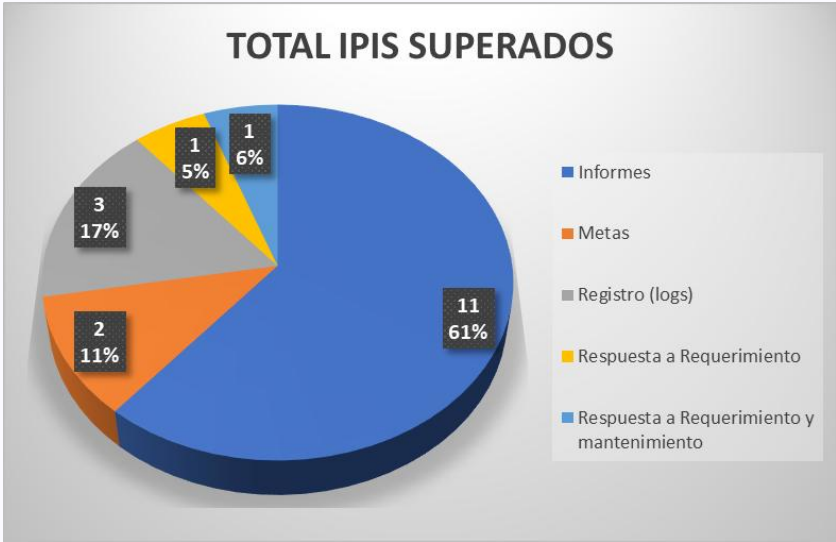

SUPERADOS	INFORMES MENSUALES					METAS		REGISTRO (LOGS)			RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTOS
REGIÓN	8	26	27	29	36	26	27	26	27	36	8	29
NO. INFORMES	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Varios

- ◆ Socialización de PQR
- ◆ Trámite de las Prórrogas R4, R5, R19, R20, R22 y R26



TIC



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2025



ministerio_tic



@ministerio_tic



@ministerio_tic



@Ministerio_TIC



MinisterioTIC.Colombia



@ministeriotic



@MinisterioTIC_Colombia

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA COMITE 16 VERSION 2 INTERVENTORIA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260610-161547-e63df6-46647336

Creación: 2026-06-10 16:15:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-11 19:21:40

Firma: Director de la interventoría

Juan Fernando Barrero Gonzalez
5826043
jbarrero@sca.in.co
Director Interventoría
Consortio Inter-Lineas 2.0

Firma: Directora (e) Infraestructura

MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

Firma: Apoyo principal seguimiento MINTIC

CESAR AUGUSTO POLO
80851277
cpolo@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
ACTA COMITE 16 VERSION 2 INTERVENTORIA			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260610-161547-e63df6-46647336		Creación: 2026-06-10 16:15:48	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-06-11 19:21:40	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR AUGUSTO POLO cpolo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-10 16:15:52 Lec.: 2026-06-11 10:20:12 Res.: 2026-06-11 10:20:32 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email
Firma	MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ mzuniga@mintic.gov.co ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-06-11 10:20:33 Lec.: 2026-06-11 18:36:39 Res.: 2026-06-11 18:36:46 IP Res.: 152.202.124.214 Canal: Email
Firma	Juan Fernando Barrero Gonzalez jbarrero@sca.in.co Director Interventoría Consortio Inter-Lineas 2.0	Aprobado	Env.: 2026-06-11 18:36:46 Lec.: 2026-06-11 19:21:34 Res.: 2026-06-11 19:21:40 IP Res.: 201.244.214.64 Canal: Email
