



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 1660

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
6	Reunión virtual	27/02/2026	10:00 am	10:23 am

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar Comité extraordinario del Convenio Interadministrativo N.º 1660 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Fondo Único TIC y la Alcaldía de Manaure – Guajira cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad y cierre de brechas digitales en el Municipio de Manaure Departamento la Guajira ” con el fin de cerrar la brecha digital, promover la masificación de la información y las comunicaciones – TIC”. La presente sesión se desarrolla de conformidad con las facultades contempladas en la Cláusula Novena de la minuta contractual. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula No 9 párrafo segundo, numeral 3, que indica que “Las Reuniones podrán ser de manera presencial o por medios electrónicos. En todo caso, siempre se dejará a los miembros la opción de conectarse a través de plataformas virtuales (teams, meet, etc)”

ORDEN DEL DÍA

En el marco de las funciones de seguimiento, coordinación y toma de decisiones del Comité Técnico Operativo del convenio interadministrativo No 1660-2025, se indica que el orden del día es el siguiente:

- 1. Verificación del Quórum de los miembros del comité técnico operativo.*
- 2. Aprobación de la tercera utilización del convenio 1660-2025.*
- 3. Propositiones y varios.*


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. Verificación del Quórum de los miembros del comité técnico operativo.*

- Johemir Jesús Pérez Pertuz - Supervisor Convenio MinTIC*
- Wendys Yanith Pérez Toncel - Supervisor, Alcaldía de Manaure, La Guajira.*
- Cesar Escalante – Delegado del FUTIC.*



ACTA DE REUNIÓN

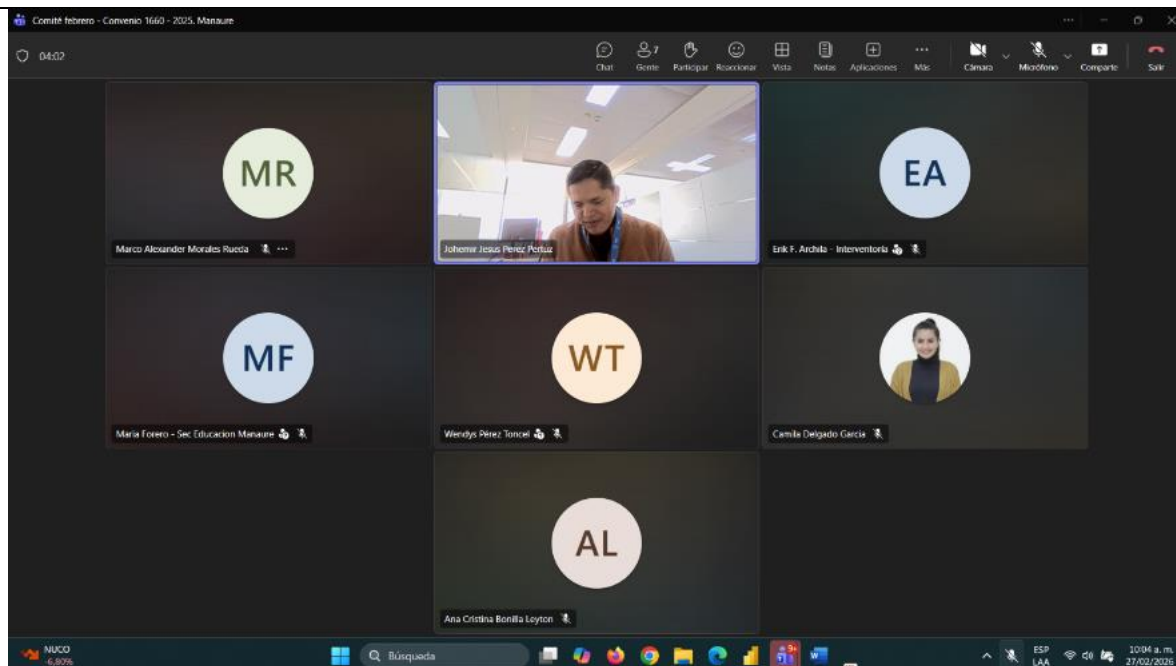

Se verificó el quórum reglamentario y se inició la grabación de la sesión, dejando constancia de la participación de los miembros del Comité Operativo.

Presentación de los requisitos para la tercera utilización de recursos.



ACTA DE REUNIÓN



COMITÉ OPERATIVO MENSUAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1660-2025
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE
DE BRECHAS DIGITALES EN EL MUNICIPIO DE
MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
27 DE FEBRERO 2026

The screenshot shows a Zoom window titled 'Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manauare'. The main presentation slide has a light blue background with water droplets. The slide content is centered and includes the title 'COMITÉ OPERATIVO MENSUAL', the agreement number 'CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1660-2025', the project name 'PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA', and the date '27 DE FEBRERO 2026'. The Zoom interface shows a grid of participants on the right, with icons for EA, MF, WT, AL, and MR. The bottom status bar shows the time as 05:32 and the language as ESP LAA.

ORDEN DEL DÍA

1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
2. ESTADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
3. AVANCE CAPEX Y CUMPLIMIENTO DE HITOS
4. PRIMER DESEMBOLSO – 3° UTILIZACIÓN
5. SOLICITUDES AL COMITÉ (2 DESEMBOLSO)

The screenshot shows a Zoom window titled 'Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manauare'. The main presentation slide has a light blue background with water droplets. The slide content is centered and includes the title 'ORDEN DEL DÍA' and a list of five items. The Zoom interface shows a grid of participants on the right, with icons for JP, EA, MF, WT, AL, and MR. The bottom status bar shows the time as 05:50 and the language as ESP LAA.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabura

06:20

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comporte Salir

1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO

Valor Convenio 1660-2025	\$	5.840.000.000
Ruinas MINTIC - RUTIC	\$	5.000.000.000
Recurso propio Manabura	\$	600.000.000
Tarifa Social	\$	240.000.000

- ALCANCE DEL PROYECTO:
 - ✓ INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 15 ZONAS WIFI EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
 - ✓ INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE (1000) HOGARES.
 - ✓ DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE A:
 - ✓ 28,6 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 24 HILOS PARA RED TRONCAL.
 - ✓ 32,6 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN.
 - ✓ INSTALACIÓN DEL NODO.
- TIEMPO DE EJECUCIÓN: 16 MESES
- FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS: 31 AGOSTO 2025
- FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS: 29 AGOSTO 2025
- ACTA DE INICIO CONVENIO: 2 SEPTIEMBRE 2025.
- FECHA DE FINALIZACIÓN CAPEX: 31 DICIEMBRE 2025.

MR

JP

EA

MF

WT

AL

UBERCO +6,54%

ESP LAA 10:06 a.m. 27/02/2026

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabura

06:38

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comporte Salir

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (7)

MR Marco Alexander Morales Rueda

AL Ana Cristina Bonilla Leyton

EA Camila Delgado García

JP Johemir Jesus Perez Pertuz

MF Maria Forero - Sec Educacion Manabura

WT Wendys Pérez Toncel

AL Ana Cristina Bonilla Leyton

Otros invitados (2)

CB Cesar Andres Escallante Borrero

alcaldia@manabura-laguajira.gov.co

UBERCO +6,54%

ESP LAA 10:07 a.m. 27/02/2026

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manure

09:15

1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DERIVADA:

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERMEDIO INFORMATIVO
CONVENIO N°	001-2025
OBJETO	"Asesor técnico, administrativo, de gestión y de implementación para la implementación y ejecución del proyecto de implementación de infraestructura de conectividad y cierre de brechas digitales en municipios de MANAUS, DEPARTAMENTO DE MANAUS, DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA".
VALOR	SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS Y CINCO PESOS N/CTA (\$6.335.595)
PLAZO	Señalado a partir de la firma del acta de inicio, hasta dar por finalizado el contrato de los cinco (5) años siguientes a la fecha de suscripción del presente, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalizante del contrato HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATANTE	ALCALDÍA PRIMERA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESARROLLO
NIT	901.680.435-5
FECHA DE INICIO	27/02/2025

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERMEDIO INFORMATIVO
CONVENIO N°	001-2025
OBJETO	"Contrato de implementación, gestión y ejecución para el cumplimiento del proyecto de implementación de infraestructura de conectividad y cierre de brechas digitales en municipios de MANAUS, DEPARTAMENTO DE MANAUS, DEPARTAMENTO DE LA GUAYRA".
VALOR	TRESCIENTOS TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS N/CTA (\$232.645.415)
PLAZO	Señalado a partir de la firma del acta de inicio, hasta dar por finalizado el contrato de los cinco (5) años siguientes a la fecha de suscripción del presente, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento legalizante del contrato HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATANTE	CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MANAUS EN TECNOLOGÍA DIGITAL
NIT	901.680.435-5
FECHA DE INICIO	27/02/2025

17°C Soledad

ESP LAA 10:09 a.m. 27/02/2025

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manure

09:31

2. ESTADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN FÍSICA

- DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE A:
 - 20 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 24 HILOS PARA RED TRONCAL.
 - 32 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN.
 - INSTALACIÓN DEL NODO.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DESPLIEGUE DE RED DE ÚLTIMA MILLA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MILITR.000 HOGARES.
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE QUINCE (15) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONFORME A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESTABLECIDOS.
- ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DIGITAL INF, ASÍ COMO DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS A DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL SERVICIO.
- SOPORTE Y MONITOREO DE APLICACIONES DEL CANAL DE ACCESO.
- APROBACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR), REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DEL NODO PRINCIPAL DE RED.

100%

EJECUCIÓN FINANCIERA

FACTURAS	ENTIDAD	VALOR	% EJECUCIÓN FINANCIERA
FACTURA N° 2 PÚB.	ALDEBARROLLO	\$ 1.168.239.287	20%
FACTURA N° 3 PÚB.	ALDEBARROLLO	\$ 1.636.020.850	30%
FACTURA N° 1 PÚB.	INTEC	\$ 81.410.154	2%
FACTURA N° 2 PÚB.	INTEC	\$ 1.132.074.140	2%
	VALOR TOTAL PÚB.	\$ 3.000.000.000	60%

60%

17°C Soledad

ESP LAA 10:09 a.m. 27/02/2025

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabú

12:27

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

PP1 MANABU 27022025 (1) - PowerPoint (Error de activación de producto)

CAPEX - INSTALACION DEL NODO:



Piano estructural y eléctrico del Nodo

Quince (15) paneles solares instalados en el Nodo Comunitario

Enk F. Archila - Interventoría

17°C Salasido

Búsqueda

ESP LAA 10:12 a.m. 27/02/2025

JP EA MF WT AL MR

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabú

13:59

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

PP1 MANABU 27022025 (1) - PowerPoint (Error de activación de producto)

CAPEX - 15 ZONAS WIFI INSTITUCIONES EDUCATIVAS:



Ubicación geográfica de las sedes educativas beneficiarias

ID	SEDE	COORDINACIÓN	UN	SOLUCIÓN ENERGÍA
1	EN MAYOR BORRADA LA RAYA	11.80725, -71.86831	Satélite	Fotovoltaica Off grid
2	EN OCHOA, I	11.85385, -71.79796	Satélite	Fotovoltaica Off grid
3	EN JALO ROSADO ROSQU	11.79034, -71.85088	Satélite	Fotovoltaica Off grid
4	EN SANJALES	11.74886, -71.89227	Satélite	Fotovoltaica Off grid
5	EN PUERTO DE LA VILLA	11.63585, -71.82483	Satélite	Fotovoltaica Off grid
6	EN POPOYA PLATA	11.64395, -71.80529	Satélite	Fotovoltaica Off grid
7	EN BALLEERARANA	11.80637, -71.79306	Satélite	Fotovoltaica Off grid
8	EN PIEDRAS BLANCA	11.78589, -71.43484	Satélite	Fotovoltaica Off grid
9	EN SANTA ROSA	11.81228, -71.95038	Satélite	Fotovoltaica Off grid
10	EN SOLISURAMANA	11.53103, -71.79633	Satélite	Fotovoltaica Off grid
11	EN NARAJARI	11.74792, -71.80276	Fibra	Fotovoltaica Off grid
12	ESCUELA RURAL VILLA SARA	11.75782, -72.4285	Fibra	Fotovoltaica Off grid
13	EN MCCOCHIBARANA	11.80781, -71.36411	Satélite	Fotovoltaica Off grid
14	EN SANJALES	11.74886, -71.89227	Fibra	Fotovoltaica Off grid
15	EN CASDA	11.72486, -71.42236	Satélite	Fotovoltaica Off grid

Enk F. Archila - Interventoría



17°C Salasido

Búsqueda

ESP LAA 10:14 a.m. 27/02/2025

JP EA MF WT AL MR

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

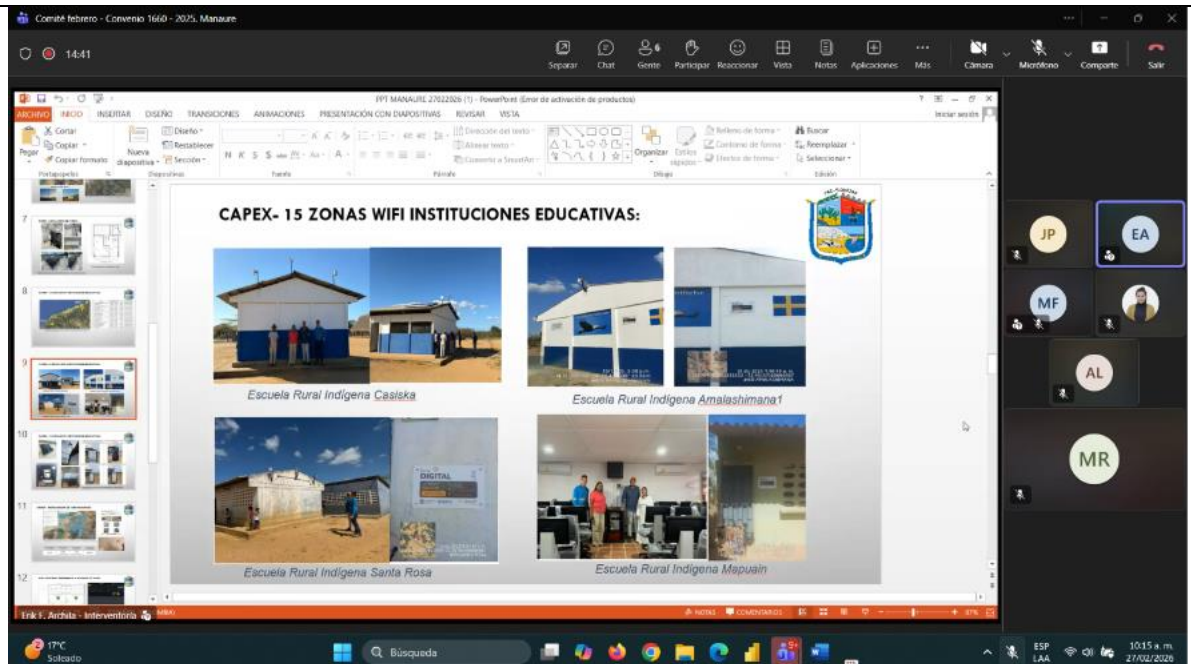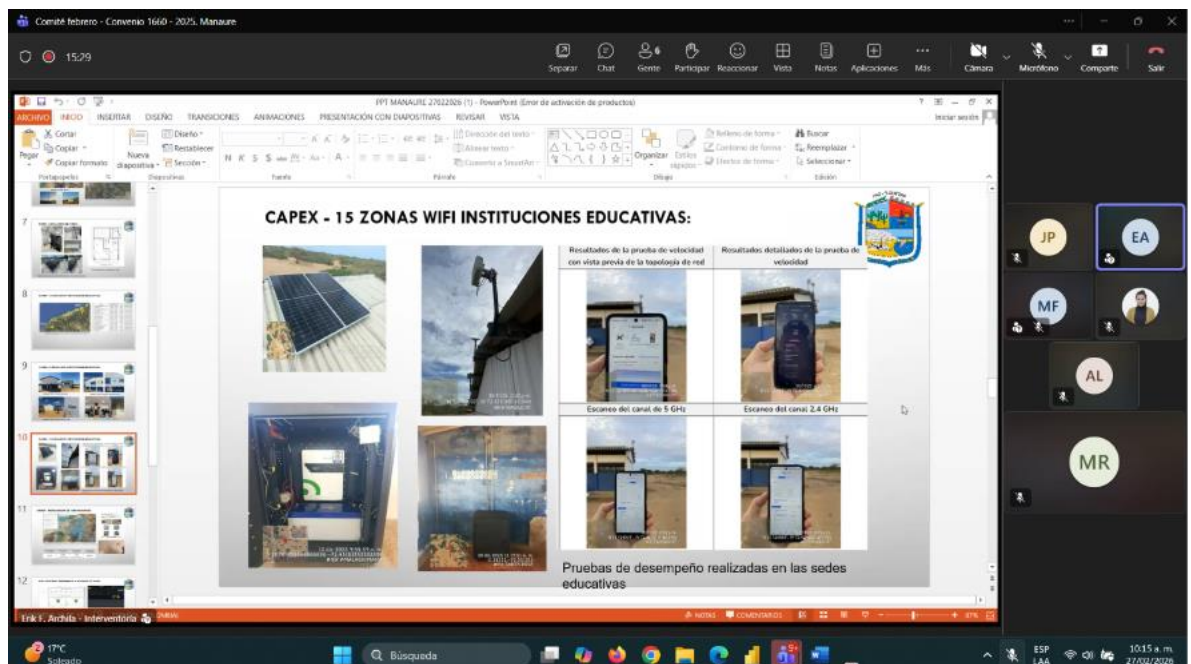

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabí

15:49

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

PTT MANABÍ 27022025 (1) - PowerPoint (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con Diapositivas Revisar Vista

CAPEX - INSTALACION DE 1000 HOGARES:



1000 hogares beneficiados con Internet tarifa social en el Municipio de Manabí.

Capacidad total de la red GPON	Total de Hogares instalados	Total de puertos disponibles	Porcentaje de disponibilidad
2.144	1.000 +3 sedes educativas	1.141 Para Hogares pasados	53,22%

17°C Soleado

Búsqueda

ESP LAA 10:16 a.m. 27/02/2026

JP EA MF AL MR

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabí

17:34

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

PTT MANABÍ 27022025 (1) - PowerPoint (Error de activación de productos)

Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con Diapositivas Revisar Vista

OPEX - MONITOREO - DASHBOARD DE LA APLICACIÓN OLT CLOUD:



Dashboard de la aplicación OLT Cloud



Plataforma Starlink

17°C Soleado

Búsqueda

ESP LAA 10:18 a.m. 27/02/2026

JP EA MF AL MR

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabí

18:15

3. EJECUCIÓN CAPEX Y OPEX

- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE QUINCE (15) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONFORME A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESTABLECIDOS.
- DEPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE A:
 - 28 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 24 HILLOS PARA RED TRONCAL
 - 32 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILLOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DEPLIEGUE DE RED DE ULTIMA MILLA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 48.000 HOGARES.
- ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DIGITAL, ASÍ COMO DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS A DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL SERVICIO.
- SOPORTE Y MONITORIO DE APLICACIONES DEL CANAL DE ACCESO.
- APROBACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CUBILOS) REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DEL NODO PRINCIPAL DE RED.

HITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS VERIFICADOS POR LA INTERVENTORIA 31 DICIEMBRE 2025.

CONCEPTOS FAVORABLES EMITIDOS POR INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN 31 DICIEMBRE 2025.

100%

17°C Soledad

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manabí

19:35

4. PRIMER DESEMBOLSO – 3º UTILIZACIÓN

A LA CUENTA DE AHORROS NO 52800008409 DE BANCOLOMBIA, CREADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SOLO SE HAN TRANSFERIDO \$3.000 MILLONES, PERO A QUE EL PRIMER DESEMBOLSO APROBADO ERA POR VALOR DE \$4.000 MILLONES, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE \$1.000 MILLONES DESDE EL MES DE OCTUBRE.

ESTE FALTANTE GENERA UN RIESGO GRAVE E INMINENTE PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DADO QUE:

- AFECTA EL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.
- IMPIDE CUBRIR LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE LOS HITOS YA EJECUTADOS.
- EXPONE AL MUNICIPIO A UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, SIN QUE EXISTA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LA ENTIDAD TERRITORIAL.
- EL RIESGO NO ES TÉCNICO NI CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO, SINO ESTRUCTURALMENTE FINANCIERO POR FLUJO DE RECURSOS.

SE SOLICITA AL COMITÉ MONITOREAR, CUANDO SE VA A GRAVAR EL SALDO PENDIENTE DEL PRIMER DESEMBOLSO.

17°C Soledad

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manure

20:49

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comportar Salir

PP1 MANURE 27022026 (1) - PowerPoint (Error de activación de productos)

4. PRIMER DESEMBOLSO – 3º UTILIZACIÓN

REQUISITO PARA LA TERCERA UTILIZACIÓN

- ✓ APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO (5) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONFORME A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESTABLECIDOS. 10 IE + FIBRA + 480 HOGARES
- ✓ CUMPLIDO
- ✓ APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DESPLIEGUE DE RED DE ÚLTIMA MILLA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOSCIENTO CUARENTA (240) HOGARES.
- ✓ CUMPLIDO

NOTA: LA NO TRANSFERENCIA DEL 100% DEL PRIMER DESEMBOLSO IMPIDE FORMALMENTE LA APROBACIÓN DE LA TERCERA UTILIZACIÓN, PESE A LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL CAPEX.

CONCEPTO	REQUISITO	ESTADO
2º DESEMBOLSO	10 IE + FIBRA + 480 HOGARES	✓ CUMPLIDO
3ª UTILIZACIÓN	5 IE + 240 HOGARES	¿QUÉ REQUIERE CURO TOTAL 1ER DESEMBOLSO

17°C Soledad

ESP LAA 1021 a.m. 27/02/2026

Comité febrero - Convenio 1660 - 2025, Manure

21:47

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comportar Salir

PP1 MANURE 27022026 (1) - PowerPoint (Error de activación de productos)

5. SOLICITUDES AL COMITÉ (2 DESEMBOLSO)

REQUISITO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO

- ✓ APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DIEZ (10) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONFORME A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS ESTABLECIDOS.
- ✓ APROBACIÓN DEL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE A:
 - ✓ 28 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 24 HILOS PARA RED TRONCAL
 - ✓ 32 KM DE FIBRA ÓPTICA DE 12 HILOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN.
- ✓ APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DESPLIEGUE DE RED DE ÚLTIMA MILLA Y PUESTA EN SERVICIO DE QUINCE (15) INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
- ✓ APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DESPLIEGUE DE RED DE ÚLTIMA MILLA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CUATROCIENTOS OCHENTA (480) HOGARES.

Reporte de Trazabilidad de la Solicitud

Información de la Solicitud

Objeto de la Solicitud: Solicitud de segundo desembolso - Comité Interdisciplinario No. 1660-2025.

Responsable de la Solicitud: [Nombre]

Fecha de Emisión: [Fecha]

Fecha de Recepción: [Fecha]

Fecha de Evaluación: [Fecha]


Fecha de Decisión: [Fecha]

La solicitud se realizó desde el 17 de diciembre de 2025.

17°C Soledad

ESP LAA 1022 a.m. 27/02/2026

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

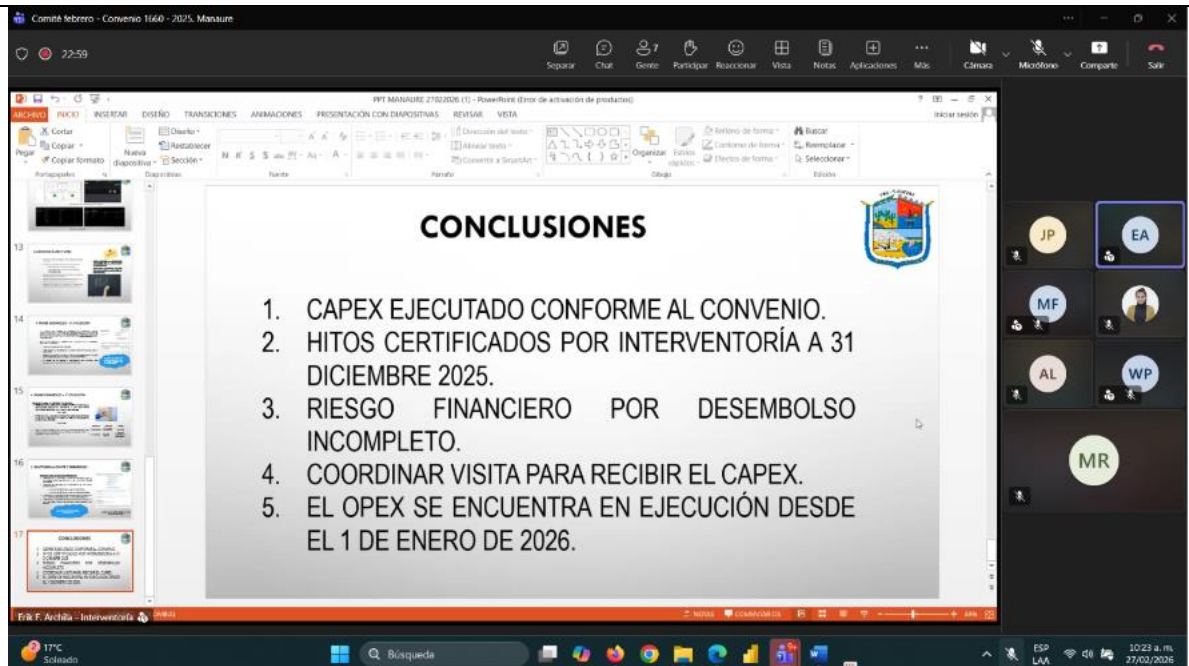

CONCLUSIONES

1. CAPEX EJECUTADO CONFORME AL CONVENIO.
2. HITOS CERTIFICADOS POR INTERVENTORÍA A 31 DICIEMBRE 2025.
3. RIESGO FINANCIERO POR DESEMBOLSO INCOMPLETO.
4. COORDINAR VISITA PARA RECIBIR EL CAPEX.
5. EL OPEX SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026.



La doctora Wendys Perez – Supervisora del convenio por parte del municipio, inicia realizando la exposición de los requisitos de la tercera utilización y manifiesta que ya se cumple con los requisitos que correspondiente a:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



En el marco del Convenio 1660-2025 del municipio de Manaure, se socializaron los avances del proyecto de implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad y cierre de brecha digital.

Durante la sesión se presentó el estado de ejecución física y financiera del proyecto, destacando la culminación de la fase CAPEX al 31 de diciembre de 2025, con la instalación y puesta en funcionamiento de 15 zonas Wi-Fi en instituciones educativas, la conexión de 1.000 hogares beneficiarios, el despliegue de la red de fibra óptica troncal y de distribución, así como la instalación del nodo principal con sistema de respaldo energético solar.

Igualmente, se informó que los hitos técnicos y operativos fueron verificados y aprobados por la interventoría, emitiéndose concepto favorable frente a la ejecución realizada.

En la revisión financiera se indicó que se efectuó un primer desembolso parcial por valor de \$3.000 millones, quedando pendiente un saldo de \$3.000 millones correspondiente al primer desembolso solicitado desde el mes de octubre, situación que impacta el flujo financiero del proyecto.

Finalmente, el municipio solicitó al comité información sobre la fecha estimada para el giro de los recursos pendientes y presentó la documentación correspondiente a la tercera utilización, relacionada con la aprobación e instalación de instituciones educativas conforme a los requisitos establecidos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
	<i>Municipio de Manaure</i>	

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Nombre complete	Cargo / Entidad	
<i>Cesar Andrés Escalante Borrero</i>	<i>Supervisor de convenio - MinTIC/FUTIC</i>	
<i>Wendys Yanit Pérez Toncel</i>	<i>Supervisora Municipio de Manaure</i>	



ACTA DE REUNIÓN



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Johemir Jesús Pérez Pertuz	Delegado Secretaría General - MinTIC	
Camila Delgado García	Apoyo jurídico – MinTIC	
Marco Alexander Morales	Apoyo Técnico- MinTIC	
Ana Cristina Bonilla Leyton	Apoyo financiero – MinTIC	
Erik Archilla	Interventor	

Anexos

Asistencia Teams:



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Comité Operativo Manaure -Febrero

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260703-115751-794963-33166882

Creación: 2026-07-03 11:57:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-06 12:24:49



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisora Municipio de Manaure

wendys yanith Perez Toncel
40943564
educacion@manaure-laguajira.gov.co
Secretaria de Educacion
Municipio de Manaure

Firma: Supervisor de convenio - MinTIC

Johemir Jesús Pérez Pertuz
80843232
jperezp@mintic.gov.co
Asesor
Min Tic

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
Comité Operativo Manaure -Febrero			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260703-115751-794963-33166882		Creación: 2026-07-03 11:57:51	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-07-06 12:24:49	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Johemir Jesús Pérez Pertuz jperezp@mintic.gov.co Asesor Min Tic	Aprobado	Env.: 2026-07-03 11:57:54 Lec.: 2026-07-03 11:59:37 Res.: 2026-07-03 12:00:46 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	wendys yanith Perez Toncel educacion@manaure-laguajira.gov.co Secretaria de Educacion Municipio de Manaure	Aprobado	Env.: 2026-07-03 12:00:46 Lec.: 2026-07-06 12:24:45 Res.: 2026-07-06 12:24:49 IP Res.: 4.31.39.42 Canal: Email
