



CONSOLIDACION DE INFORME SEMESTRAL AVANCE CONVENIO FENOG

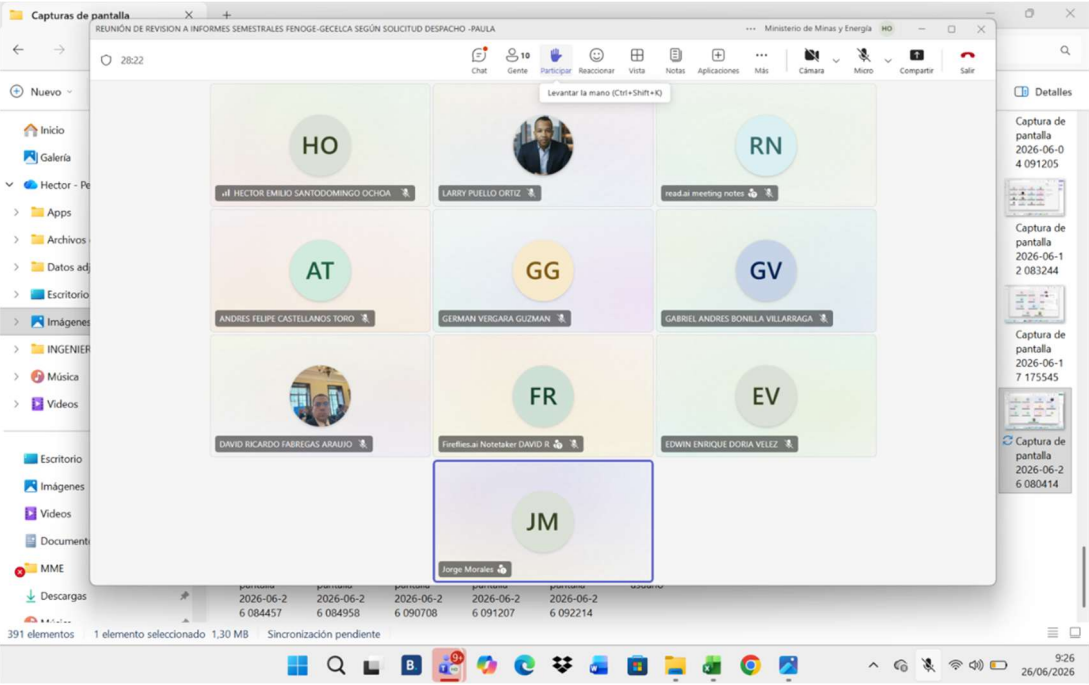


REUNION REVISION ESTADO DE AVANCE Y REVISION DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO EN LINK PUBLICO SECOP (TCC Y SIP)

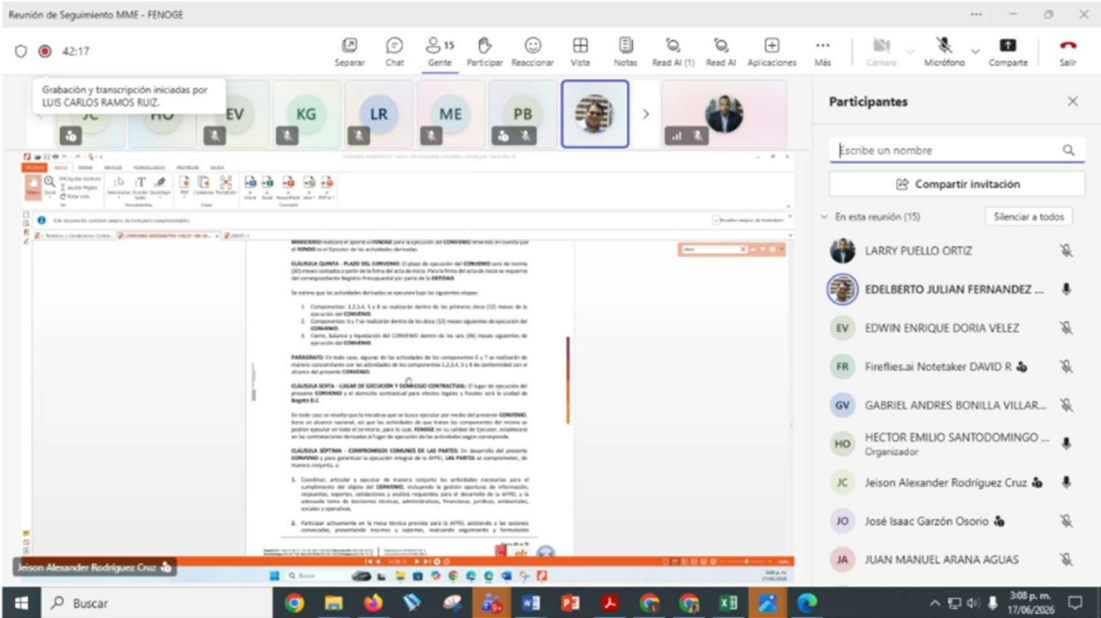

Seguimiento Fenoge

Actividad	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	0%	1%	7%	15%	15%
AVANCE PROYECTADO ACUMULADO	0%	23%	25%	28%	28%

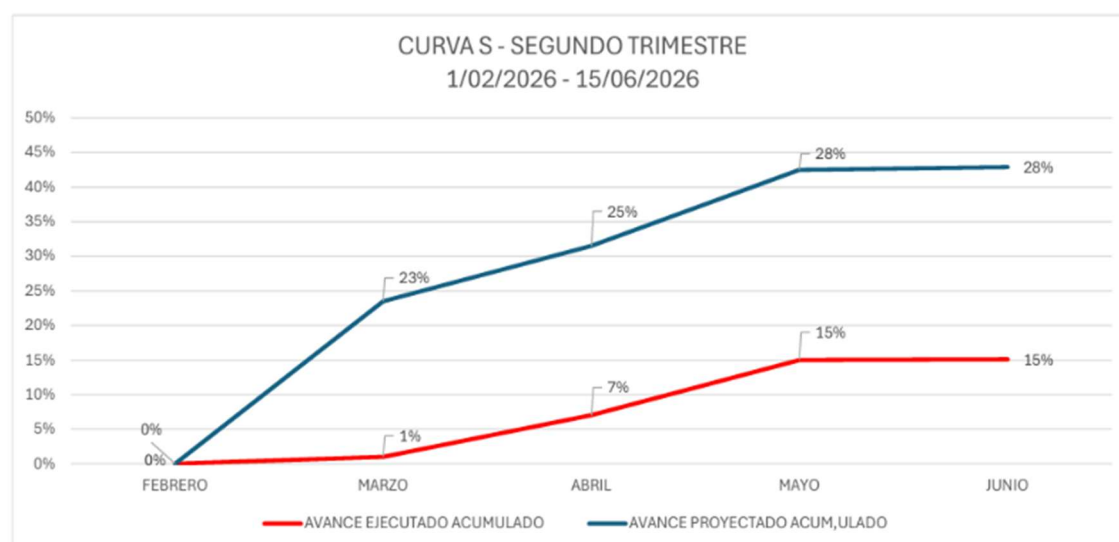

MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONVENIO FENOGE

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 116231-100-226										
FENOGE										
15%										
Ejecutor	Departamento	Municipio	COMPONENTE	Actividad	Estado	% Avance		Vigencia	Responsable	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 1.	Focalización - MINISTERIO, EL MINISTERIO	Completado	0,83	0,08	2025	MME	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 2.	Fase de diagnóstico de mercado - FENOGE.	Pendiente	0,25	0,03	2025	FENOGE	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 3.	Caracterización de beneficiarios - MINISTERIO y FENOGE.	Pendiente	0,17	0,02	2025	MM-FENOGE	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 4.	Evaluación y determinación de los usuarios beneficiarios y tipo de solución - MINISTERIO y FENOGE.	Pendiente	0,25	0,03	2025	MME-FENOGE	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 5.	Implementación de los SSFV - FENOGE.	Pendiente	0,00	0,00	2025	FENOGE	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 6.	Seguimiento a la ejecución de los negocios jurídicos derivados de la iniciativa - FENOGE.	Pendiente	0,00	0,00	2025	FENOGE	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 7.	Propiedad de los activos, ADM y monitoreo - MINISTERIO y FENOGE.	Pendiente	0,00	0,00	2025	MME FENOGE	
FENOGE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Componente 8.	Sensibilizaciones, socializaciones, capacitaciones y divulgación - MINISTERIO y FENOGE.	Pendiente	0,00	0,00	2025	MME-FENOGE	

ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE AVANCE

[illegible]

CRONOGRAMA CONTRATACION SSFV

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA MÁXIMA	LUGAR
Publicación de los Términos y Condiciones Contractuales e Invitación	<u>17 de junio de 2026</u>	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Audiencia de aclaración de Términos y Condiciones Contractuales a las 11:00 am (actividad híbrida, presencial y virtual)	19 de junio de 2026 a las 11:00 horas	Sala de Juntas del FENOGEC Cra 12 N. 84A-12 Of 801 o de manera virtual a través del aplicativo Teams. https://teams.microsoft.com/join/079662694132?p=dznhd99Nii3kbAKjIC Meeting ID: 250 079 662 694 132 Passcode: aK2Lj98z
Plazo para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales y a la Invitación.	23 de junio de 2026	A través del correo electrónico contratacion@fenoge.gov.co
Respuesta a las observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales y a la Invitación.	02 de julio de 2026.	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Plazo para expedir adendas a los Términos y Condiciones Contractuales e Invitación.	07 de julio de 2026	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Fecha máxima de presentación de ofertas y cierre del proceso	<u>10 de julio de 2026 a las 11:00 horas</u>	En las instalaciones del FENOGEC Cra 12 N. 84A-12 Of 801
Acto público de apertura de ofertas	<u>10 de julio de 2026 a las 11:15 horas</u>	En las instalaciones del FENOGEC Cra 12 N. 84A-12 Of 801
Publicación del informe preliminar de evaluación	21 de julio de 2026.	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Presentación de observaciones y subsanaciones al informe preliminar de evaluación	Hasta el 24 julio de 2026 hasta las 23:59 horas	A través del correo electrónico contratacion@fenoge.gov.co o de manera física en las instalaciones del FENOGEC Cra 12 N. 84A-12 Of 801
Respuesta a las observaciones al informe preliminar de evaluación, publicación del informe final de evaluación y orden de elegibilidad	30 de julio de 2026	A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Decisión del Ordenador del Gasto y comunicación de la aceptación de la oferta al oferente seleccionado o declaratoria de fallido del proceso de selección.	<u>03 de agosto de 2026</u>	Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
Presentación de carta cupo crédito aprobado	19 de agosto de 2026	Trámite del oferente seleccionado

Consulta SARLAFT proponente seleccionado	19 de agosto de 2026	Trámite interno FENOGEC
Plazo para la suscripción del contrato	19 de agosto de 2026	Trámite interno FENOGEC
Inicio de ejecución del contrato	21 de agosto de 2026	Trámite interno FENOGEC
Plazo de validez de las ofertas	3 meses	

INFORME DE AVANCE CONTRACTUAL: OBLIGACIÓN No. 8

Obligación Objeto de Reporte: Alimentar, actualizar y gestionar bases de datos, matrices de seguimiento, tableros de control u otros instrumentos de monitoreo que sean requeridos para el seguimiento técnico y operativo del Programa Colombia Solar.

1. Actividades Ejecutadas Durante el Período

- **Gestión y Soporte de la PMO Territorial:** Se consolidó y actualizó semanalmente el archivo maestro en Excel de seguimiento técnico y operativo. Este instrumento actúa como control interno permanente para evaluar holguras, hitos analíticos y desvíos críticos en las fases tempranas.
- **Unificación Documental e Integración de Riesgos:** Diseño, estructuración e implementación de la *Matriz de Riesgos Técnicos de Ingeniería* y la matriz de compromisos históricos. Ambos recursos se migraron formalmente al repositorio centralizado de SharePoint institucional para unificar los reportes analíticos de preinversión.
- **Tratamiento y Acoplamiento de Curvas S de Avance:** Integración y homologación del ecosistema de tableros de control con base en los parámetros del convenio MME-FENOGE y los históricos de ejecución de proyectos operados por GECELCA.
- **Procesamiento Analítico Supletorio ante Contingencias:** Ante la indisponibilidad de la plataforma nacional SUI de la Superservicios (materializada entre mayo y junio), se lideró el protocolo supletorio analítico mediante bases de datos institucionales de corte abril 2026 y censos de Juntas de Acción Comunal para proteger la caracterización de los 11,766 usuarios potenciales.

2. Resultados Obtenidos e Instrumentos Estructurados

Instrumento / Base de Datos	Estado Técnico	Rol Operativo en el Programa
Matriz Maestro de Compromisos PMO	Activo / Permanente	Control semanal de holguras operacionales y compromisos

Instrumento / Base de Datos	Estado Técnico	Rol Operativo en el Programa
		técnico-jurídicos de la mesa de coordinación.
Matriz de Riesgos Técnicos en SharePoint	100% Implementado	Repositorio central de alertas tempranas sobre infraestructura (viviendas), restricciones regulatorias y bloqueos analíticos de datos.
Modelo Matemático de Ponderación Muestral	Integrado / Validado	Cruza variables socioeconómicas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) con la radiación satelital regional (Atlas IDEAM / SolarGIS).
Tableros de Homologación de Curvas S	En Avance Técnico	Compatibilidad directa con los archivos unificados de control de programación, tales como CURVAS S CONVENIO FENOGE JUNIO 2026_2.xlsx.

3. Porcentaje de Cumplimiento de la Obligación

- **Porcentaje de Avance de la Actividad Específica: 100%** de efectividad operativa en el diseño, alimentación y resguardo de las herramientas de control analítico interno asignadas al equipo de ingeniería del Ministerio.
- *Nota de Contextualización:* Si bien el Porcentaje General de Ejecución Física Técnica Acumulada del Convenio registra un **15.1%** frente a una meta proyectada del **27.8%** (brecha del 12.7% por restricciones del SUI), los instrumentos de monitoreo y soporte de la PMO a cargo de la ingeniería de preinversión se encuentran completamente parametrizados y operativos en el servidor central.

4. Análisis Crítico de Datos Relacionados (Archivos de Referencia)

Para garantizar la consistencia transversal de los tableros de control y bases de datos unificadas bajo esta obligación, se deja constancia técnica de la articulación analítica de los siguientes archivos de referencia:

1. CURVAS S CONVENIO FENOGE JUNIO 2026_2.xlsx & ANEXO A Control de Programación y Curva S del Convenio.xlsx: Utilizados para el mapeo dinámico del retraso semestral acumulado (brecha del 15.1% real vs. 27.8% proyectado). Estos datos alimentan los tableros que alertan la necesidad de extender plazos o activar frentes geográficos alternos.
2. Plan_Seguimiento_Proyectos_Comunidades Priorizados_Gestión Contractual V2 LP (1) (1)_3.xlsx: Corresponde a la base analítica unificada donde se aplican los pesos relativos del algoritmo de focalización espacial para los 11,766 usuarios residenciales priorizados.
3. PROYECCION IMPLEMENTACION HASTA DICIEMBRE 2026_2.xlsx & Actualización Anexo 7. Cronograma y Flujo de Fondos-2026_2.xlsx: Instrumentos proyectivos claves incorporados a la mesa de control de la PMO para modelar la transición de la ingeniería conceptual hacia la fase de procura masiva de kits Solución Tipo I (1.5 kWp) indexados al Consumo Básico de Subsistencia.

5. Recomendación Técnica para el Cierre de Mes

Se sugiere formalizar mediante el Comité Técnico la congelación analítica de la base de datos de usuarios priorizados mapeada en el archivo Plan_Seguimiento_Proyectos_Comunidades Priorizados_Gestión Contractual V2 LP (1) (1)_3.xlsx. Esto blindará el algoritmo de selección territorial frente a posibles reclamaciones comunitarias, asegurando un proceso transparente y técnicamente incuestionable ante entes de control.
