

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                    |         |            |           |        |            |                          |
|--------------------|---------|------------|-----------|--------|------------|--------------------------|
| NÚMERO DE INFORME  | 30      |            |           |        |            |                          |
| SUPERVISIÓN        | X       |            |           |        |            |                          |
| INTERVENTORÍA      | N/A     |            |           |        |            |                          |
| TIPO DE INFORME    | PARCIAL | X          | PARA PAGO | X      | FINAL      | <input type="checkbox"/> |
| PERIODO DE INFORME | Desde:  | 01/06/2026 |           | Hasta: | 30/06/2026 |                          |
| PERIODO PARA PAGO  | Desde:  | 01/06/2026 |           | Hasta: | 30/06/2026 |                          |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATO<br>CONVENIO                                                                                                                                                                | x                        | NÚMERO:               |                                                                                                                                                                                                                                             | 23MA122C1482                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |                                                                                                                                                                                                                                             | 22/11/2023                                                          |                  |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                                                                             |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                             | Contratación Directa                                                |                  |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                                                                |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                             | 2023AS12215                                                         |                  |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                                                                              |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                             | 07/12/2023                                                          |                  |
| OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                  |
| ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:                                                                                                                                                 |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                             | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ |                  |
| CONTRATISTA /<br>CONVENIANTE                                                                                                                                                        | NOMBRE:                  |                       | VALOR + S.A.S.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                     | NIT                      |                       | 900.969.726-2                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                  |
| VALOR [\$]:                                                                                                                                                                         | INICIAL:                 |                       | NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$95.987.738.629) IVA incluido, sobre los honorarios por la administración y sobre el servicio de mesa de ayuda. |                                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                     |                          |                       | ADICIONES                                                                                                                                                                                                                                   | N o.                                                                | VALOR ADICIONADO |
|                                                                                                                                                                                     |                          |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 3.077.084.409                                                    | 0,032 (3,2%)     |
|                                                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL:             |                       | NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 99.064.823.038,00) IVA incluido sobre los honorarios por administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.                             |                                                                     |                  |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                            | VALOR                    |                       | RESPALDO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                  |
| 2023                                                                                                                                                                                | \$ 3.999.650.618         |                       | RESERVAS No. 208416 Y No. 208417                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                  |
| 2024                                                                                                                                                                                | \$ 30.382.868.870        |                       | CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003107                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                  |
| 2025                                                                                                                                                                                | \$ 21.897.929.831        |                       | CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003108 - RPC N° 4500066060, 4500066061, 4500066062, 4500066063, 4500066064, 4500066065, 4500066066, 4500066067, 4500066068.                                                                          |                                                                     |                  |
| 2026                                                                                                                                                                                | \$ 20.786.999.414        |                       | CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003109                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                  |
| 2027                                                                                                                                                                                | \$ 21.997.374.305        |                       | CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003110                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                  |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                            |                              |                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL, GENERAL                                                                             |                              | \$ 99.064.823.038        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                                            |                              |                          |                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                   |                      |
| PLAZO:                                                                                     | INICIAL                      |                          | CUATRO (4) AÑOS, UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
|                                                                                            |                              |                          | FECHA DE INICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DE TERMINACIÓN       |                   |                      |
|                                                                                            |                              |                          | 07/12/2023                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2027                 |                   |                      |
|                                                                                            | PRÓRROGAS                    | N o.                     | TIEMPO PRORROGADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |                   |                      |
|                                                                                            |                              |                          | N/A                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                        |                   |                      |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:                                                                 |                              |                          | N o.                                                                                                                                            | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | FECHA REANUDACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN |
|                                                                                            |                              |                          |                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | N/A               | N/A                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL                                                                |                              |                          | 31/12/2027                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS                                         |                              |                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | SI                |                      |
|                                                                                            |                              |                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR<br>Designación de supervisión No. 2026020007506 del 20/02/2026 |                              | NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL: |                                                                                                                                                 | ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ<br>c.c. 98.528.755<br>Supervisor Administrativo / Coordinador.<br><br>ALEXANDER MORALES GÁLVEZ C.C 1.036.929.677<br>GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA C.C 86.071.266<br>Apoyo Técnico/Contratistas.<br><br>KAREN RÍOS MARTÍNEZ C.C 1.037.587.090<br>JOHN FELIPE ZULUAGA GIRALDO C.C 1.045.021.654<br>Apoyo Jurídico/Contratistas.<br><br>YURY ANDREA BUITRAGO C.C 1.040.040.933<br>Apoyo Contable-Financiero/Contratista. |                            |                   |                      |
|                                                                                            | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: |                          | N/A                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA (2026)                                                               |                              |                          | 20.43%                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL                                                                |                              |                          | 63,06%                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |
| % DE EJECUCIÓN DE RECURSOS                                                                 |                              |                          | 53,37%                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                      |

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

1.1 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

| COMPONENTES | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SEGURIDAD   | Mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de comunicación para la seguridad.                                                                                                       | A demanda                                         |
|             | Conectividad de nodos con sistema de comunicación para la seguridad.                                                                                                                           | Mínimo 8 nodos subregionales Y nodo departamental |
|             | Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad.                                                                                                                            | Mínimo 2            nodos subregionales           |
|             | Personal                                                                                                                                                                                       | Gerenciamiento                                    |
|             | Mesa de ayuda                                                                                                                                                                                  | Mínimo 4 niveles de                               |
|             | Instalación de nuevos componentes de los sistemas integrados de emergencia y seguridad (CCTV, Planta telefónica, 'CAD, Sistemas de Comunicación y tecnología para los Organismos de Seguridad) | A demanda                                         |

Para el presente informe

| COMPONENTE / ACTIVIDADES                                                                    | CONTRATACIÓN                                          | % EJECUCIÓN FÍSICA (2026) | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (2024-2026) | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mantenimiento, modernización y reposición de sistemas de comunicación para la seguridad. | Contratación de los mantenimientos con vigencia 2026. | 18%                       | 50.96%                               | Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité, informas semanales. | Contratos de Mantenimiento de sistemas de videovigilancia vigencia 2026 se encuentra en proceso de diagnósticos en la subregión: Magdalena Medio (\$892.384.343) <b>contrato 170-2026:</b> Espera de la entrega parte de V+ a la SSJyP de los diagnósticos de los municipios de Yondó, Maceo, Caracolí, Puerto Nare, Puerto Triunfo para dar prioridad de atención a requerimientos de recuperación, mantenimientos y mejora de los sistemas de CCTV. Durante el periodo se atiende novedad de conectividad en el municipio de Puerto Berrio, permitiendo recuperar la gestión de las cámaras en el nodo subregional. Oriente (\$3.420.806.648) <b>contrato 168-2026.</b> Durante el periodo se realiza visitas de campo para diagnósticos de los sistemas de CCTV, se realiza entrega de los diagnósticos de Alejandría, Guarne y la Ceja, al equipo técnico de la SSJyP para priorizar actividades. Nordeste (\$1.487.307.239), <b>contrato 171-2026:</b> Vegachí: Se ejecutó la ronda de |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>mantenimiento preventivo y la verificación del estado operativo de la infraestructura. Se identificaron componentes pendientes de reemplazo, actualmente en proceso de consecución para su posterior instalación, los municipios de Santo Domingo, Yalí, Yolombó se aprueban actividades para iniciar con mantenimientos para la puesta a punto del sistema de CCTV. Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Segovia y Remedios: en revisión diagnóstico por parte SSJyP para alcance de mantenimientos y puesta a punto del sistema de CCTV.</p> <p>Norte (\$2.528.422.306), <b>contrato 172-2026:</b> Se realiza atención en el municipio de Don Matías Se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la red de fibra óptica, logrando la recuperación de ocho (8) de los once (11) puntos de cámara afectados. Como resultado, quedaron en operación treinta y tres (33) de las treinta y seis (36) visuales del sistema. Ituango, San Andrés De Cuerquia, Belmira, Briceño Campamento, Guadalupe, San Pedro De Los Milagros, Toledo Yarumal, Carolina Del Príncipe, Entreríos, Gómez Plata, Santa Rosa De Osos, Angostura, San José De La Montaña y Valdivia se realiza observaciones a los informes de diagnósticos generados se devuelven a V+ para revisión.</p> <p>Subregión compartida con Tasa es Urabá (\$1.131.667.573), <b>contrato 167-2026:</b> Arboletes, Turbo, Necoclí, Mutatá, San Pedro De Urabá: en revisión diagnóstico por parte de V+ para entrega a SSJyP los diagnósticos con los que priorizara los mantenimientos preventivos/correctivos y mejoras del sistema de CCTV. Apartado, Carepa, San Juan De Urabá, Chigorodó: en revisión de los diagnósticos por parte de SSJyP para definir prioridad para el sostenimiento y/o recuperación de puntos de CCTV. Vigía del Fuerte y Murindó Se realiza visita para el servicio de ingeniería de detalle para la implementación del</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                 |                                                                     |        |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                     |        |        |                                                                                                                          | <p>sistema fotoco voltaico en CCM, puntos de cámaras y estación de policía Vigía Del Fuerte.</p> <p>Las actividades principales para desarrollar en el marco de los contratos corresponden a la ampliación de la capacidad de almacenamiento de información en los servidores; asimismo, se contempla la ejecución de mantenimientos en los puntos de CCTV que no cuentan con servicio de post garantía.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>2. Conectividad de nodos con sistemas de comunicación para la seguridad.</p> | <p>Contratado hasta 31 de diciembre de 2026</p> <p>En Ejecución</p> | 49.24% | 64.43% | <p>Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité informes semanales y aprobaciones de pago.</p> | <p>Para un total de 124 de 125 municipios aprovisionados, Vigía del fuerte pendiente por inconvenientes eléctricos. Para este periodo se cuenta con la visual de cámaras federadas de 5.375 de cámaras publicas activas. Durante el mes de junio, los contratos de los servicios de conectividad e internet generan facturación.</p> <p>Contrato No. 468-2025 – Telefónica: comprende la atención de 12 municipios, incluyendo el Nodo Departamental de Seguridad, con facturación 580831468677 por valor de \$12.420.047.</p> <p>Contrato No. 470-2025 – Anexu: comprende la prestación del servicio en 31 municipios, con facturación FEV 427 por valor de \$23.463.016.</p> <p>Contrato No. 471-2025 – Elatin: comprende la prestación del servicio en 49 municipios, con facturación COO 4290 por valor de \$53.492.912.</p> <p>Contrato No. 469-2025 – Media commerce: comprende la prestación del servicio en 34 municipios, con facturación MECO 1483983 por un valor de \$19.763.445.</p> <p>Orden de Compra No. AM-1267683-4 – Servicio de internet dedicado: se recibe la factura No. BOPU- 136270472 por un valor de \$2.142.000, correspondiente a los servicios prestados durante el mes de junio.</p> <p>Líneas celulares – Nodos Subregionales de Seguridad, Contrato No. 195-2026: se encuentran activas durante el periodo. Se reciben las facturas No. E6068076865 por valor de \$508.200, correspondientes a los servicios prestados durante el mes.</p> |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                        |                                                                                                                                          |        |        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                          |        |        |                                                                                           | Se realiza seguimiento a la solicitud de compra de canales de comunicación para la implementación de SDWAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad. | <p>Parcialmente Contratado y ejecución.</p> <p>En ejecución de contratos de arrendamiento y servicios públicos con la vigencia 2026.</p> | 49.09% | 49.70% | <p>Contratos, Reuniones de seguimiento mediante actas de comité e informes semanales.</p> | <p><b>Servicios de arrendamiento – Pisos 1 y 2:</b> Contrato No. CAL 103 con EDATEL en ejecución, correspondiente al arrendamiento y servicios públicos. Se efectuó el pago del canon de arrendamiento del mes de junio, mediante factura por valor de \$57.518.406, se generó un incremento en el alquiler donde del área dispuesta para la implementación el CRUE. Asimismo, se adelantan gestiones para el pago de servicios públicos Arrendamiento zona planta de energía – Contrato No. CEPUZC-2025: se registra un valor de \$2.441.365, donde genera incremento por el espacio para la implementación de la planta eléctrica de respaldo para el CRUE. Pago de nómina: se realiza el pago correspondiente al coordinador y auxiliar administrativo del Nodo Departamental.</p> <p><b>Operadores Nodos:</b> Contrato 148_2026: Durante el periodo se recibe documentación para el pago de los servicios prestados en el mes de mayo por un valor de \$283.604.830. Operadores Nodos Activos Contratados: 31; En proceso de contratación: 1; sin personal a seleccionar: 5. Norte 3, Departamental 4, Occidente 4, Urabá 3, Nordeste 2, Suroeste 4, Magdalena Medio 3, Bajo cauca 3, Oriente 4. Auxiliar administrativo 1. Se tienen contratado el coordinador de nodos y en proceso de contratación la auxiliar de nodos. Para el periodo se realizaron 85 informes, destacando que el equipo de operaciones hizo una revisión detallada para el total de informes consolidados durante el presente mes. Continúan tres nodos con baja producción de informes. Durante el periodo se recibe los APU para la implementación y adecuaciones CRUE en el nodo departamental, donde V+ realiza ajustes de acuerdo con las inquietudes generadas por la</p> |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|    |                     |                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|----------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                            |        |        | supervisión de SSJyP, se encuentra en revisión para entrega del equipo apoyo AS a V+ durante la primera semana del mes de Julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Personal            | Parcialmente Contratado    | 48.96% | 54.83% | <p>Se diligencia semanalmente modelo de seguimiento cuantitativo, y cualitativo, por 5 hitos, por contrato, contratista y municipio.</p> <p>Se realiza seguimiento de los contratos asignados por subregión a los ingenieros para realizar la supervisión de los contratos activos de la secretaria de seguridad justicia y paz.</p> <p>Se realiza el informe semanal que se presenta al director de planeación.</p> <p>Apoyo en el levantamiento con personal de la gobernación para el de proyección de puntos de CCTV compromisos gobernación.</p> <p>Proyección y revisión de 11 ítems de facturación como insumo de las actas de transferencia. Se han proyectado 15 actas de transferencia para revisión de la parte Jurídica de Planeación, se espera el visto bueno para la entrega, ya que se están liquidando fases anteriores.</p> <p>Gestión de pago y Construcción de 15 Conceptos técnicos, jurídicos y financieros para pago.</p> <p>Apoyo a gestión de la dirección operativa en los programas integración de terceros, activación de entornos deportivos seguros.</p> <p>Se realiza acompañamiento y revisión en sitio de los diferentes proyectos a cargo de SSJyP en entrega de sistemas de fibra óptica, entornos deportivos seguros y puntos de CCTV.</p> <p>Apoyo para la puesta en funcionamiento del 123 municipio de Rionegro.</p> |
| 5. | Implementación SIES | En proceso de contratación | 100%   | 78.18% | <p>Contratos suscritos, reuniones de seguimiento mediante actas de comité, e informes semanales.</p> <p>Para el periodo se realiza el kick-off del contrato 255_2026 para el suministro de cámaras de video vigilancia para puesta en funcionamiento en el interior de los CCMS, se recibe las cámaras e informe para pago por el suministro por un calor de \$ 122.024.700.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Lo anterior buscando tener una ejecución física más coherente con los hitos y actividades asociadas a los contratos derivados: de tracto sucesivo, mantenimiento, entregas puntuales y recurrentes.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                        | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                            | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual.                                                                           | 1,41%                             | 63,06%                | Informes y de reuniones seguimiento.                                                             | Por parte de la supervisión del contrato durante los comités de seguimiento; se exponen la necesidad del cumplimiento de los tiempos contractuales, así como el alcances y objetos contractuales de todas las contrataciones derivadas teniendo en cuenta los retrasos presentados en la ejecución de lo contratado.                                |
| 2. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el cumplimiento del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                   | 1,41%                             | 63,06%                | Cronograma, Informes y de reuniones seguimiento.                                                 | Se realiza validación de los planes de trabajo y reprogramación de actividades del cronograma en acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la empresa Valor + teniendo en cuenta los procesos de las diferentes contrataciones, manifestando en los diferentes comités de contratación la preocupación por los plazos tan ajustados. |
| 3. Atender las recomendaciones dadas por la secretaría con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                                | 1,41%                             | 63,06%                | Actas de reunión e Informes de seguimiento.                                                      | Mediante comunicaciones y reuniones de seguimiento, se atienden recomendaciones y solicitudes emitidas por la Secretaría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                     |
| 4. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.                                                                                                                                      | 1,41%                             | 63,06%                | Informe de seguimiento a la contratación estatal                                                 | Durante el periodo se realiza atención en municipios con el restablecimiento de visuales de cámaras en la subregión Nordeste y Magdalena Medio.                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Realizar las actividades de gerenciamiento tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, del proyecto, lo cual implica, pero no se limita a contratación de proveedores, vinculación de personal, seguimiento a la ejecución, gestión de pagos, y todas las actividades tendientes al desarrollo del proyecto. | 1,41%                             | 63,06%                | Acta de reunión, Mesas de trabajo de plan de operación de los nodos, contratos suscritos, Pagos. | Se realizaron actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, como fueron: mesas de trabajo plan de operación, visitas técnicas para la de CCTVs de Municipios con conectividad, acompañamiento y operación a los nodos subregionales, contratación del personal AS.                                                                        |
| 6. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las                                                                                                                                                                          | 1,41%                             | 63,06%                | Informe de seguimiento a la contratación estatal                                                 | Durante el periodo se realiza atención en municipios con el restablecimiento de visuales de cámaras de cámaras en la subregión Nordeste y Magdalena Medio.                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b></p> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                             |                                                                    | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                             |                                                                    | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condiciones propias de cada equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Elaborar estudio de mercado antes de adquirir los equipos o servicios con mínimo tres cotizaciones y presentar el detalle a la supervisión del contrato para su aval.                                                                                                                                                                                                                              | 1,41% | 63,06% | Propuestas y análisis de mercado, Gestión referenciamiento y proyecciones presupuestales para los Mantenimientos de CCTV municipales e implementación de Nodos Subregionales. | La empresa Valor+ realiza estudios de mercado requeridos con el objetivo de determinar las soluciones acordes a las necesidades de las implementaciones nuevas, la operación y mantenimiento de los sistemas alcance del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con el supervisor designado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,41% | 63,06% | Comité técnico semanal con sus actas de reuniones.                                                                                                                            | Se participa en los comités de seguimiento, en el cual se exponen los avances y necesidades de la ejecución del proyecto, con el fin de dar trazabilidad y solución a los inconvenientes que se presentan en el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Presentar informes mensuales de seguimiento, en los cuales conste la ejecución técnica y el reporte mensual de ejecución presupuestal de los recursos entregados en gerenciamiento, con los respectivos soportes físicos y magnéticos. De igual manera al terminar el contrato interadministrativo deberá presentar un informe técnico y de ejecución con la información pactada entre las partes. | 1,41% | 63,06% | Informe de Seguimiento mensual                                                                                                                                                | Se presenta informe de seguimiento, en el cual se dan a conocer la ejecución administrativa, financiera y técnica del contrato; en el cual, se presentan los principales avances del proyecto y actividades ejecutadas durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Contar con los medios técnicos e informáticos que las Secretaría requiera para el cumplimiento de las actividades conforme a una planeación estratégica y acorde con las necesidades de las especificaciones técnicas definidas en la fase                                                                                                                                                        | 1,41% | 63,06% | Informe de conectividad y CCTV Departamental cámaras Dashboard Power BI                                                                                                       | Se mantiene actualizado tablero de control para el seguimiento de las actividades en atención de los requerimientos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Definir, el plan de trabajo y cronograma y darle cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,41% | 63,06% | Informe de seguimiento a la contratación estatal                                                                                                                              | Se cuenta con plan de trabajo y cronograma al cual se le realiza seguimiento periódico, con el fin de determinar los avances y rutas críticas del proyecto, y realizar los ajustes pertinentes según cambios a los requerimientos.<br>De igual manera se reitera durante los comités de seguimiento a la contratación por parte de la Supervisión del contrato la necesidad imperiosa de dar cabal cumplimiento a las fechas pactadas en los contratos derivados de la Empresa Valor+ y las fechas pactadas por parte de Hacienda Gobernación de Antioquia para materializar los pagos. |
| 12. Responder por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,41% | 63,06% | Informe de actividades del personal y ejecución de los contratos.                                                                                                             | Se continuó con el personal contratado:<br>1. Personal de apoyo a la supervisión: hasta el 30 de junio de 2026,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                                                                        | <p>quedando el equipo de apoyo a la supervisión con el siguiente personal:</p> <p>1 director técnico</p> <p>1 profesional de Seguridad y salud en el trabajo</p> <p>2 ingenieros</p> <p>5 tecnólogos de Campo</p> <p>1 profesional Jurídico</p> <p>1 auxiliar administrativo</p> <p>Cargo disponible 1 Profesional financiero.</p> <p>Con este personal, se viene atendiendo requerimientos y validaciones, con el fin de apoyar los respectivos procesos de mantenimiento/implementación CCTV, operación y conectividad.</p> <p>Se realiza continua retroalimentación en el manejo de la información existente y consolidación de documentos entregables.</p> <p>De igual manera, se encuentra contrato activo de servicio de transporte; para garantizar así, los medios para el desplazamiento para la ejecución del contrato y las actividades asignadas de levantamientos y socializaciones en los municipios.</p> |
| 13. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato y las órdenes de pauta recibidas.                                                            | 0%    | 0%     | N/A                                                                                    | En el periodo ejecutado se tiene muy presente el presupuesto disponible para realizar la facturación de acuerdo con esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario.                                          | 0%    | 0%     | N/A                                                                                    | En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15. Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, así como el pago de sus servicios.                                               | 1,41% | 63,06% | Programación, Comités de seguimiento y actas de reunión.                               | Mediante los comités de seguimiento semanal, se da cuenta de la ejecución del plan de trabajo del proyecto, sobre lo cual se toman acciones en conjunto con Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con el objetivo de dar cumplimiento a los alcances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. Realizar las acciones necesarias para proponer por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.                                   | 1,41% | 63,06% | Comités primarios de personal de apoyo a la supervisión                                | Se realizan diferentes reuniones y comités primarios de coordinación y seguimiento técnico a las actividades alcance en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia.                                                               | 1,41% | 63,06% | Contrato                                                                               | La entidad cuenta con políticas de reserva de la información, los contratos con los aliados cuentan con una cláusula de reserva de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. Realizar las actividades de revisión necesarias a cada contrato celebrado con los proveedores, ejerciendo un control técnico, administrativo y financiero de la actividad, equipo o servicio contratado. | 1,41% | 63,06% | Seguimiento de contratos, informes mensuales de ejecución. (transporte y conectividad) | Se realiza el seguimiento y control a la ejecución de los contratos suscritos; garantizando que cumplan con los requisitos de ley y revisando los informes por parte de la supervisión para garantizar aprobación de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b></p> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                             |                                                                    | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                             |                                                                    | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Informar de manera oportuna las novedades que se presenten en el desarrollo del contrato a suscribir, al responsable de los recursos y a las entidades vinculadas con el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,41% | 63,06% | Informe de Seguimiento mensual                                | La empresa Valor+, en el periodo reportado no ejecutó esta actividad.                                                                                                                                                                                                             |
| 20. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidación de los contratos que suscriba el contratista con terceros para la ejecución de este contrato, serán atendidas directamente por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                       | 0%    | 0%     | N/A                                                           | En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad                                                                                                                                                                                                                              |
| 21. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el contratista deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de estos.                                                                                                                                                                                        | 0%    | 0%     | N/A                                                           | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                                                                                                                                                                                                                              |
| 22. Prestar el servicio contratado conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo y en el Contrato además de las establecidas en la fase de estructuración que se determinen con los sectores intervinientes.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,41% | 63,06% | Informe de ejecución mensual, Actas de comité de seguimiento. | Se continúa avanzando en la ejecución y consolidación de acciones para la presentación de los servicios contratados; en coordinación con SSJyP, conforme a las necesidades y priorización de los alcances, atendiendo a las especificaciones técnicas definidas.                  |
| 23. Presentar un Informe final de ejecución presupuestal y de los servicios prestados, junto con los soportes necesarios, listados de entrega de material, actividades realizadas y novedades reportadas durante la realización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                              | 0%    | 0%     | N/A                                                           | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.                                                                                                                                                                                  | 0%    | 0%     | N/A                                                           | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                                                                                                                                                                                                                              |
| 25. Corresponderá al CONTRATISTA, exigir la constitución de garantías en los contratos suscritos con terceros para la ejecución del contrato interadministrativo a suscribir, según la naturaleza de los componentes y riesgos que eventualmente se puedan presentar en la ejecución del mismo, de acuerdo con el análisis de riesgos que adelante la Entidad, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas civiles y comerciales. Las | 1,41% | 63,06% | Contrato                                                      | La empresa Valor+ realiza estudios de mercado requeridos con el objetivo de determinar las soluciones acordes a las necesidades de las implementaciones nuevas, la Operación y mantenimiento de los sistemas alcance del contrato, para este periodo no se genera esta actividad. |

|                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> | <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b></p> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                   | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                                    |                                                                                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |     |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------------------------------------------------------|
| <p>garantías tendrán como beneficiario-asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, e incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual cuando sea aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato interadministrativo y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada deberá ser entregada por VALOR+ al supervisor del contrato.</p> |    |    |     |                                                      |
| <p>26. En caso de presentarse solicitudes de condiciones, demandas y/o reclamaciones, VALOR+ deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, condiciones o reclamaciones tengan lugar por acciones u omisiones de estos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0% | 0% | N/A | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad |

**2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO:**

El presente informe se desarrolla en función de los avances de la mesa ayuda, y los demás componentes del contrato interadministrativos permanecen tal cual el informe presentado en el periodo anterior.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                          | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cumplir con las obligaciones propias e inherentes al contrato en las condiciones, modos y plazos determinados. | 1,41%                             | 63,06%                | Informe de ejecución y actas de reunión de comités de seguimiento. | Presentación de informe de ejecución y atención a solicitudes por los medios gestionados, propias del alcance del contrato                                                              |
| 2. Realizar todos los actos tendientes a la legalización del contrato.                                            | 0%                                | 100%                  | N/A                                                                | Los actos administrativos correspondiente a este compromiso, se surtieron conforme la ejecución del contrato; para el periodo no se han configurado actos que impacten este compromiso. |
| 3. Estar prestos a la realización de todos los actos que garanticen la correcta ejecución del contrato.           | 1,41%                             | 63,06%                | Comités de seguimientos técnicos e informes mensuales.             | Se realiza seguimiento periódico mediante comités técnicos y la entrega de los informes mensuales.                                                                                      |
| 4. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos,                                   | 0%                                | 100%                  | Contrato, acta de inicio, modificaciones                           | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación. |       |        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.                                                                                       | 1,41% | 63,06% | Informe de ejecución mensual del contrato y comunicaciones de atención requerimientos supervisión. | Se entrega informe mensual con la ejecución con todos sus componentes, técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del contrato. Además, de los requerimientos documentales en apoyo a la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.                                                                                                                             | 1,41% | 63,06% | Informe de ejecución mensual, informes de atención, visitas a municipios y actas de comités.       | Se atienden los diferentes requerimientos expuestos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz; para, realización de visitas de validación de los sistemas de seguridad existente y necesidades de los Municipios del Departamento.<br>Se consolida información técnica de los CCTV municipales y se proyectan presupuestos para la gestión de prioridades por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.<br>Se realiza seguimiento a la ejecución de los contratos de mantenimiento/implementación CCTV municipios en apoyo técnico a la supervisión. |
| 7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.                                                                                               | 1,41% | 63,06% | Actas de Comités de seguimiento semanal.                                                           | Se realiza seguimiento periódico mediante comités técnicos entre la SSJP y Valor+, validando los componentes; técnico, financiero, administrativo y jurídico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.                               | 1,41% | 63,06% | Informes de visita técnicas del personal de supervisión del equipo de seguridad de Valor+          | Se realizaron visitas de validación técnica de los sistemas de seguridad existente y necesidades de los Municipios del Departamento.<br>Se consolida información técnica de los CCTV municipales.<br>Se realiza acompañamiento de los consejos de seguridad de la gobernación.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Propender por el logro de los productos pactados.                                                                                                                           | 1,41% | 63,06% | Reuniones de seguimiento.                                                                          | Se asiste a comité semanal para indicar avances de los contratos activos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato.                                                                      | 1,41% | 63,06% | Reuniones de seguimiento, grupos de WhatsApp e informes mensuales del contrato.                    | Se presenta información semanal del estado del proyecto y contratos asociados, en comités de seguimiento semanal.<br>Se presenta informe mensual de ejecución del proyecto, dando una comunicación oportuna de la información de la ejecución y estado de este, con el objetivo de dar solución a las necesidades que surgen de la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                           |
| 11. Cumplir con los anexos técnicos del contrato, a que haya lugar.                                                                                                            | 1,41% | 63,06% | Informe de ejecución mensual.                                                                      | Durante el periodo de ejecución se da cumplimiento a la entrega del informe de ejecución mensual con sus respectivos anexos técnicos, administrativos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|  |  |  |  |                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | financieros y jurídicos del contrato y cada uno de sus componentes. |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|

**CONECTIVIDAD DE NODOS CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD**

Se cuenta integrado con 124 enlaces MPLS de conexión con los municipios, se está pendiente la implementación del enlace Vigía del Fuerte el cual no cuentan flujo de energía eléctrica constante en el municipio, acumulando un total de 124 municipios integrados al nodo Departamental y un total de 5.375 visuales de cámaras publicas activas. Ver anexos técnicos para mayores detalles.

**MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION**

**Contrato 167-2026**

**Objeto:** Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 02

**Valor:** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE. PESOS M/L (\$1.487.307.239) IVA e impuestos a que haya lugar.

**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

**Actividad ejecutada:** Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica de los municipios asignados: san juan, arboletes, Mutata, Carepa y Chigorodó. con el propósito de identificar el estado operativo de los componentes tecnológicos, verificar su funcionamiento, detectar necesidades de mantenimiento y establecer las acciones requeridas para garantizar la continuidad y el adecuado desempeño de la infraestructura instalada.

Solicitud de celeridad en diagnósticos MTTO y atención de prioridades – Subregión Urabá

N

Nelson Fabian Gomez Valbuena<fabian.gomez@ci2.co>

Para: Edwin Ricardo Restrepo Gomez

CC: Usted; Juan David Betancur Ospina; Carlos Mario Prada Esparza; y 6 más

Dom 05/07/2026 20:36

 INFORME DE DIGANOSTICO CCTV...

838 KB

 MUTATA\_PROPUESTA\_ECONOMIC...

32 KB

2 archivos adjuntos (870 KB)

Guardar todo en OneDrive

Descargar todo

Buenas noches Edwin,

Se envía el informe de diagnóstico del municipio de Mutata.

Cordialmente,



Diagnóstico: San pedro de Urabá, san juan, arboletes y Mutata.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**Contrato 168-2026**

**Objeto:** Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 03  
**Valor:** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.420.806.648) IVA e impuestos a que haya lugar.  
**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

**Actividad ejecutada:** Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica de los municipios asignados: Alejandría, Guarne y La Ceja, con el propósito de identificar el estado operativo de los componentes tecnológicos, verificar su funcionamiento, detectar necesidades de mantenimiento y establecer las acciones requeridas para garantizar la continuidad y el adecuado desempeño de la infraestructura instalada.

RE: Solicitud de visto bueno para intervención de mantenimientos diagnosticados Contrato 168-2026 Oriente

IG

Ingeniero G2

Para: Horacio Alberto Baena Henao <horacio.baena@valormas.gov.co>; O Tecnólogo G2

CC: Juan David Betancur Ospina <juan.betancur@valormas.gov.co>; Carlos Mario Mazo Giraldo <carlos.mazo@valormas.gov.co>; O Director G2; y 4 más

Vie 12/06/2026 10:26 AM

Responder, Responder a todos, Reenviar, ...

Buenos días, Horacio,

Se realizó la revisión de los diagnósticos enviados y se otorga visto bueno para proceder con la intervención en los tres municipios contemplados en dichos diagnósticos. No obstante, se presenta una aclaración respecto al municipio de La Ceja.

En los diagnósticos se evidencia los puntos donde se realizaron los cambios y la revisión de las UPS y se restablecieron 30 puntos. Sin embargo, en el informe estas actividades fueron clasificadas como mantenimientos correctivos. Teniendo en cuenta que las intervenciones consistieron únicamente en el reemplazo de la UPS suministrada por el mismo municipio, y el encendido de otra esta actividad debe contabilizarse como mantenimientos preventivos.

Adicionalmente, se solicita tener en cuenta esta observación e informar al contratista que aún se encuentran pendientes en el informe de diagnóstico las LPR autorizadas para mantenimiento preventivo.

Para los municipios de Alejandría y Guarne, se solicita iniciar las intervenciones a la mayor brevedad posible. Quedo atento al cronograma de ejecución con el fin de realizar el seguimiento correspondiente, garantizar la trazabilidad de las actividades y validar su cumplimiento.

Cordialmente,



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

Edison Arley Restrepo Henao

Profesional Contratista

Dirección de Planeación y

Administración de la Seguridad

Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

El Ingeniero G2@antioquia.gov.co

+57 303 9281

Diagnóstico: Alejandría, Guarne y La Ceja

**Contrato 170-2026**

**Objeto:** Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 05  
**Valor:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$892.384.343) IVA e impuestos a que haya lugar.  
**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

**Actividad ejecutada:** para el periodo se encuentra en proceso de entrega de diagnósticos por parte de aliado V+, se atiende en el municipio de Puerto Berrio mantenimiento correctivo sobre la infraestructura de fibra óptica, consistentes en la recuperación del tramo de enlace de transmisión que interconecta el Nodo Subregional de Seguridad con el Centro de Monitoreo Municipal. Las labores incluyeron la identificación y corrección de la falla, el restablecimiento de la continuidad del medio de transmisión y la validación de la conectividad, garantizando la disponibilidad operativa del sistema de videovigilancia y de las comunicaciones asociadas.

|                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b></p> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                             |                                                                    | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                             |                                                                    | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |



Puerto Berrio

**Contrato 171-2026**

**Objeto:** Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana-CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 06

**Valor:** MIL CUATROCIENTOS ochenta y siete millones trescientos siete mil doscientos treinta y nueve PESOS M/L (\$1.487.307.239) IVA e impuestos a que haya lugar.

**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

**Actividad ejecutada:** Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica de los municipios asignados: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó, con el propósito de identificar el estado operativo de los componentes tecnológicos, verificar su funcionamiento, detectar necesidades de mantenimiento y establecer las acciones requeridas para garantizar la continuidad y el adecuado desempeño de la infraestructura instalada.

**Vegachí:** Se ejecutó la ronda de mantenimiento preventivo y la verificación del estado operativo de la infraestructura. Se identificaron componentes pendientes de reemplazo, actualmente en proceso de consecución para su posterior instalación.



Vegachí

**Contrato 172-2026**  
**Objeto:** Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 07  
**Valor:** DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/L (\$3.420.806.648) IVA e impuestos a que haya lugar.  
**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante el periodo se realiza mantenimiento preventivo y correctivo sobre la red de fibra óptica del municipio de Don Matías, logrando la recuperación de ocho (8) de los once (11) puntos de cámara afectados. Como resultado, quedaron en operación treinta y tres (33) de las treinta y seis (36) visuales del sistema.



Actas ver Anexos/Técnico/01.Mantenimiento

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE NODOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Durante el periodo el nodo departamental realiza cortes de diez días durante la operación donde se evidencia la cantidad de llamadas recibidas de la línea única de emergencias 123, con una cantidad total de 44.385 llamadas



|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**Contrato 148-2026**


**Objeto:** Servicio integral de análisis y gestión de medios tecnológicos en los nodos de seguridad del departamento de Antioquia.

**Valor:** TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$3.119.653.189) IVA e impuestos a que haya lugar.

**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026

Durante el periodo se representa la relación de las actividades generadas mes vencido, donde se generó informes orientativos 462 desde el inicio de la operación.

| Etiquetas de fila    | Cuenta de Consecutivo |
|----------------------|-----------------------|
| Bajo Cauca           | 5                     |
| Departamental        | 9                     |
| Norte                | 8                     |
| Occidente            | 7                     |
| Oriente              | 23                    |
| Suroeste             | 6                     |
| Uraba                | 1                     |
| <b>Total general</b> | <b>59</b>             |




Total, Informes Orientativos Por Nodo mes de mayo

Durante el desarrollo de los turnos asignados a cada operador, se llevó a cabo de manera sistemática la actualización del estado de las cámaras de seguridad en cada uno de los municipios que conforman el departamento de Antioquia. Este proceso consistió en la verificación permanente del total de cámaras desplegadas, así como la identificación y registro de aquellas que se encontraban fuera de servicio, permitiendo mantener un inventario actualizado y confiable para la toma de decisiones operativas y técnicas.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Esta labor, realizada de forma continua por el equipo de operadores durante el mes de abril, garantiza la trazabilidad del estado de la infraestructura tecnológica y facilita la generación de alertas tempranas para la pronta corrección de fallas, contribuyendo así a la efectividad del servicio de monitoreo y a la seguridad de los espacios públicos y bienes del departamento.

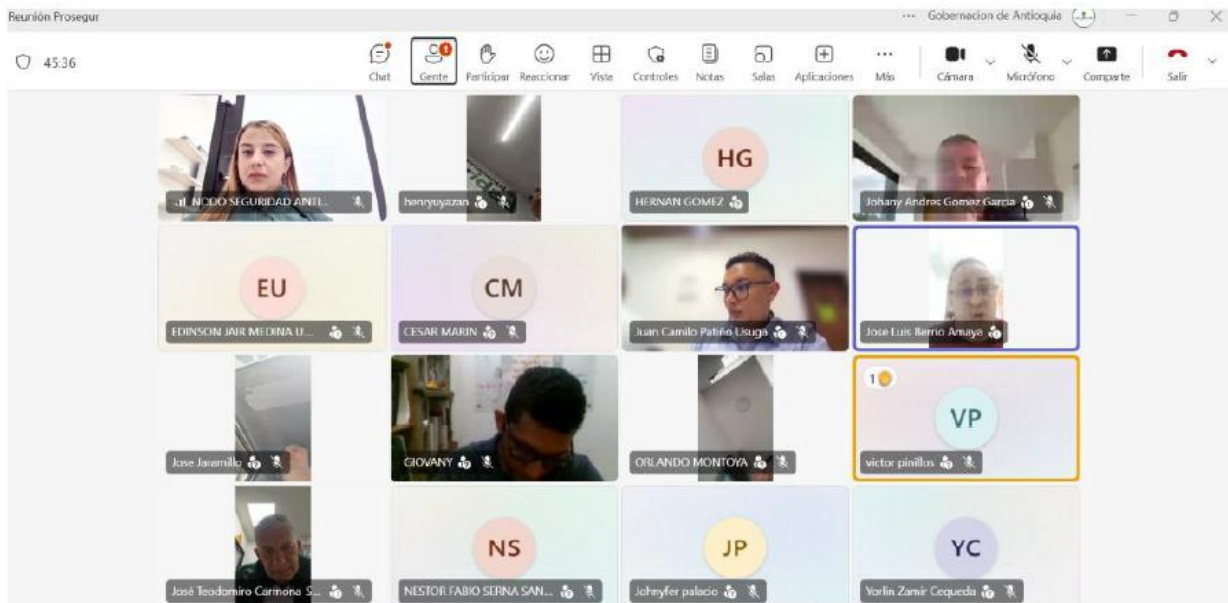Durante el mes de mayo, y en virtud del contexto electoral, el personal de Prosegur no realizó visitas administrativas a los Nodos. No obstante, se llevó a cabo una reunión operativa con el Jefe de Seguridad de la empresa Prosegur, el Coordinador Camilo y Lina Lopera, en la que participaron todos los operadores. Dicha reunión tuvo como objetivo verificar inconformidades y novedades relacionadas con la prestación del servicio.



#### **Contrato 206\_2026**

**Objeto:** Suministrar, instalar y realizar la reposición de la gigantografía institucional del nodo de santa rosa de osos, perteneciente a la subregión Norte, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y lineamientos de imagen establecidos para los nodos del proyecto, con el fin de restablecer las condiciones adecuadas de presentación, identidad visual y estandarización del espacio.

**Valor:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$4.500.450) IVA e impuestos a que haya lugar.

En proceso de cierre

#### **Contrato 255-2026**

**Objeto:** Suministro de cámaras para los centros de monitoreo del departamento de Antioquia.

**Valor:** CIENTO VEINTIDÓS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$122.024.700) IVA e impuestos a que haya lugar.

**Plazo:** será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de agosto de 2026

Durante el periodo se realiza kickoff para el alcance del proyecto, se recibe el suministro de 101 cámaras tipo domo con sus SD las cuales se instalarán en los CCM de los municipios del departamento de Antioquia.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

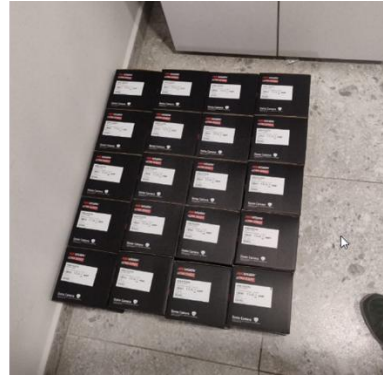


Imagen referencia de cámaras

Se recibe suministros y factura para proceso de pago.

#### **2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A

#### **2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

Durante el período reportado se realizó el seguimiento al componente ambiental de los aliados en los contratos vinculados al proyecto, mediante la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales asociada a cada uno de ellos, con el propósito de identificar, evaluar y controlar los posibles impactos generados por las actividades ejecutadas durante su desarrollo.

Como parte de este proceso de apoyo a la supervisión, se verificaron, entre otros, los siguientes componentes ambientales:

- Gestión integral de residuos sólidos ordinarios, reciclables y especiales.
- Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en actividades de mantenimiento.
- Gestión de residuos peligrosos (RESPEL), tales como luminarias, baterías, envases contaminados, aceites usados, pinturas, solventes y elementos impregnados con sustancias químicas.
- Consumo eficiente y ahorro de agua y energía durante la ejecución contractual.
- Control de emisiones atmosféricas, material particulado y generación de polvo en actividades de mantenimiento.
- Control de ruido y vibraciones ocasionados por el uso de maquinaria y herramientas.
- Manejo y almacenamiento temporal de materiales, insumos y sustancias químicas.
- Prevención de derrames y atención de contingencias ambientales.
- Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de las obligaciones ambientales establecidas en cada contrato.

Adicionalmente, se solicitó a los supervisores y contratistas la implementación, actualización o fortalecimiento de los Planes de Manejo de Residuos en aquellos contratos que contemplan actividades de mantenimiento, adecuación o intervención de infraestructura, especialmente cuando se prevé la generación de escombros, residuos peligrosos o materiales de manejo especial. Lo anterior, con el fin de garantizar su adecuada segregación, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento y disposición final, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los lineamientos institucionales.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

De igual manera, se continuó con la verificación de la correcta separación y disposición de los residuos sólidos en los puntos ecológicos ubicados en el Nodo Departamental de Seguridad. Durante las inspecciones realizadas se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la inadecuada separación en la fuente, evidenciándose la mezcla de residuos aprovechables con residuos ordinarios y la disposición incorrecta de algunos elementos en los recipientes destinados para su clasificación.

Como medida de mejora, se diseñó un plegable informativo como estrategia de sensibilización ambiental, orientado a fortalecer las buenas prácticas en la separación de residuos en la fuente, el uso adecuado de los puntos ecológicos y el cumplimiento de los lineamientos de gestión integral de residuos sólidos. Dicho material fue remitido oportunamente al Coordinador de Nodos para su impresión y posterior divulgación entre los servidores, contratistas y demás usuarios de las instalaciones, con el propósito de promover una cultura ambiental responsable y mejorar las condiciones de manejo de los residuos generados en el Nodo Departamental de Seguridad.

#### Planes de manejo ambiental aliados

| Ítem | Aliado                  | Matriz de Impacto Ambiental | Suministro de Información         | Observaciones                                                                                          |
|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | CI2 177-2026            | Si                          | Información en carpeta drive      | N/A                                                                                                    |
| 2    | Consorcio CCTV 168-2026 | Si                          | Información en carpeta drive      | N/A                                                                                                    |
| 3    | SOMATEC 135-2026        | SI                          | Información en carpeta drive      | N/A                                                                                                    |
| 4    | UT VMAS 170-2026        | SI                          | Información en carpeta drive      | N/A                                                                                                    |
| 5    | UT SOLUCIONES 171-2026  | SI                          | Información en carpeta drive      | N/A                                                                                                    |
| 6    | VIACOTUR                | SI                          | Información en carpeta drive      | N/A                                                                                                    |
| 7    | PROSEGUR 148-2026       | NO                          | sin información temas ambientales | Se han tenido dificultades por temas de seguridad informática, no llega la información                 |
| 8    | SPECTRA                 | NO                          | sin información temas ambientales | Se viene solicitando información y no se ha recibido respuesta por parte del encargado del área de SST |

El aliado **VIACOTUR**, en el marco del **Contrato No. 204 de 2026**, ha suministrado y mantenido actualizada la documentación y las certificaciones requeridas para los vehículos adscritos al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad vial y gestión ambiental.

Entre la documentación verificada se encuentran las certificaciones de la **revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes**, así como los certificados de inspección para los vehículos que operan con **Gas Natural Vehicular (GNV)**, cuando aplica. Estas verificaciones contribuyen a garantizar que el parque automotor opere en condiciones seguras, minimice las emisiones contaminantes y cumpla con la normatividad vigente en materia ambiental y de transporte.

Como soporte del seguimiento realizado, se relacionan las hojas de vida de los vehículos adscritos al proyecto, las cuales contienen la información correspondiente a su identificación, documentación legal, mantenimientos, revisiones periódicas y certificaciones técnicas.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Documentos ambientales de vehículos

| Vehículo                 | Revisión técnico-mecánica | Fecha de expedición | Fecha final vigencia |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Renault / Alaskan/ESK252 | 182611849                 | 2025-07-18          | 2026-07-18           |
| Renault / Alaskan/FXY377 | 186836788                 | 2026-01-10          | 2027-01-10           |
| Renault / Alaskan/GDY665 | 184438337                 | 025-10-06           | 2026-10-06           |
| Renault / Alaskan/JPO488 | 183492202                 | 2025-08-28          | 2026-08-28           |
| Renault / Duster/LVY477  | 187887490                 | 2026-02-21          | 2027-02-21           |

**2.1.1.2 SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO**

Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha dado seguimiento al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, priorizando la supervisión de los Estándares Mínimos mencionados en la res.0312 de 2019 según corresponda, los riesgos prioritarios del proyecto, lo anterior para garantizar que los contratistas o subcontratistas cumplan con estándares mínimos de SST y las obligaciones de seguridad social.

Según su caracterización de los riesgos los aliados deben presentar periódicamente sus planes de trabajo, certificaciones pertinentes cuando dé a lugar, como permisos para trabajos en alturas, entrega de EPP, implementación de normas y ATS en general.

Durante el mes de junio de 2026, se lleva a cabo la verificación de información aportada por las empresas aliadas. Donde se viene validando la pertinencia, coherencia y consistencia de la información diligenciada según los estándares establecidos en el marco normativo.

1. Cronograma de actividades: se deja constancia que algunos aliados no han aportado la información solicitada en cuanto al tema de cronogramas de actividades que permitan y faciliten una correcta coordinación para las inspecciones en campo y posterior verificación y cumplimiento de procesos y procedimientos enmarcados en SST.
2. Revisión de la seguridad social: Se constata que todos los colaboradores estén debidamente afiliados al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y que los aportes se encuentren al día.
3. Ejecución de actividades de alto riesgo: Se comprueba que las actividades consideradas de alto riesgo se hayan ejecutado con las medidas de prevención necesarias, y que los trabajadores involucrados cuenten con la formación y los (EPP) elementos de protección adecuados.
4. Señalización de prevención y control de riesgos: Se constata la existencia, adecuación y mantenimiento de la señalización de seguridad en las instalaciones, conforme a las normas vigentes.
5. Gestión ambiental: Se evalúan las acciones implementadas para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones, el uso eficiente de recursos y otras prácticas sostenibles y responsable (visitas de campo)

**Conclusión:** Durante el período evaluado se continúa con el proceso de consolidación y verificación de la información correspondiente a los diferentes componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La mayoría de los aliados estratégicos han venido alimentando de manera oportuna las carpetas compartidas dispuestas para el cargue de la documentación y evidencias requeridas, lo que ha permitido avanzar en el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales en esta materia.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

De igual manera, se realiza la revisión de los anexos y soportes documentales aportados por cada aliado, con el propósito de verificar la implementación efectiva de las acciones programadas, la conformidad con los requisitos normativos vigentes y el cumplimiento de los estándares establecidos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este proceso permite identificar oportunidades de mejora, formular recomendaciones y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

**Anexos:**

- ✓ VIACOTUR\_204-2026
- ✓ SPECTRA\_172-2026
- ✓ CONSORCIO\_CCTV\_186-2026
- ✓ UT\_SOLUCIONES\_171-2026
- ✓ CI2\_167-2026
- ✓ PROSEGUR\_148-2026
- ✓ SOMATEC\_235-2026
- ✓ UT\_ANTIOQUIA\_SEGURA\_173-2026
- ✓ UT\_VMAS\_170-2026

En **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, como apoyo a la supervisión se viene implementando un (**dossier**) es el expediente documental que reúne de manera organizada todas las evidencias que demuestran el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de un contratista, aliado o proveedor.

| NÚMERO DE CONTRATO | ESTADO CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALIADO  | INGENIERO       | CONTACTO SST                         | CORREO SST                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 208-2026           | OBJETO: Implementación de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento Lote 9.<br>VALOR: \$ 1.304.393.196 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)<br>Contrato No. 208-2026<br>FECHA INICIO: 25 FEB 2026<br>FECHA FIN: 30 JUN 2026<br>ALIADO: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A - CI2 S. A<br>NIT:830.056.149-0 | CI2     | HERNAN BETANCUR | KELLY ZULUAGA<br>324 4453777         | <a href="mailto:kelin.zuluaga@ci2.co">kelin.zuluaga@ci2.co</a>             |
| 235-2026           | OBJETO: Adecuación, Suministro de la dotación e instalación, para la ampliación del nodo departamental de seguridad de Antioquia<br>CONTRATO: 235-2026<br>VALOR: 3.045.096.800<br>FECHA INICIO: 23 de febrero<br>FECHA FIN: 30 de mayo 2026<br>ALIADO: SOMATEC<br>NIT:901855719-4                                                                                                                                                              | SOMATEC | HERNAN BETANCUR | Bibiana Álvarez<br>322 6633799       | <a href="mailto:bibiana.alvarez@somatec.co">bibiana.alvarez@somatec.co</a> |
| 174-2026           | OBJETO:<br>CONTRATO: 174-2026<br>FECHA INICIO:20 de FEB<br>FECHA FIN: 31DIC2026<br>ALIADO: UT DVS<br>NIT:901.855.917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UT DVS  | HERNAN BETANCUR | MARTHA JANNETH ORJUELA<br>3171632129 | <a href="mailto:m.orjuela@viotec.com.co">m.orjuela@viotec.com.co</a>       |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                             |                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204-2026 | OBJETO: Prestación de Servicio de Transporte<br>CONTRATO: 204-2026<br>FECHA INICIO: FEB 2026<br>FECHA FIN: DIC 2026<br>ALIADO: VIACOTUR<br>NIT: 811030548                                                                                                                                                                                                                                                    | VIACOTUR                            | N/A                         | JULIAN MESA<br>3052746093                      | <a href="mailto:analistasstyambienta@viacotur.com">analistasstyambienta@viacotur.com</a>                                                                                                                 |
| 166-2026 | OBJETO:<br>CONTRATO: 166-2026<br>FECHA INICIO: 04 MAR<br>FECHA FIN: 31 DIC2026<br>ALIADO: ELEPHAS<br>NIT:901193272                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELEPHAS                             | HERNAN<br>BETANCUR          | TATIANA ALZATE<br>3195743166                   | <a href="mailto:Tatalzate33@gmail.com">Tatalzate33@gmail.com</a><br><a href="mailto:sst@elephas.com.co">sst@elephas.com.co</a>                                                                           |
| 168-2026 | OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV, lote 3, subregión Oriente.<br>CONTRATO: 168-2026<br>FECHA INICIO: 20/02/2026<br>FECHA FIN: 31/12/2026<br>ALIADO: CONSORCIO CCTV<br>NIT: 901.855.719                                                                                                                              | CONSORCIO CCTV                      | HORACIO<br>ALBERTO<br>BAENA | NATALIA<br>RODRÍGUEZ<br>3138601026             | <a href="mailto:coordinacionsst@seltic.com.co">coordinacionsst@seltic.com.co</a><br><a href="mailto:auxiliarsst@seltic.com.co">auxiliarsst@seltic.com.co</a>                                             |
| 171-2026 | OBJETO:<br>CONTRATO: 171-2026<br>FECHA INICIO:<br>FECHA FIN:<br>ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES<br>NIT: 901.854.141<br>TECNOLOGO:                                                                                                                                                                                                                                                                           | UT<br>SOLUCIONES<br>INTEGRALES      | HORACIO<br>ALBERTO<br>BAENA | TATIANA ANDREA<br>MAZO ARBOLEDA<br>322 6765760 | <a href="mailto:tatiana.mazo@unicongr.com">tatiana.mazo@unicongr.com</a>                                                                                                                                 |
| 243-2026 | OBJETO:<br>CONTRATO: 243-2026<br>FECHA INICIO:<br>FECHA FIN:<br>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A - CI2 S. A<br>NIT:830.056.149-0:<br>TECNOLOGO:<br>REUNIÓN KICK OFF:                                                                                                                                                                                                                                | CI2                                 | HORACIO<br>ALBERTO<br>BAENA | KELLY ZULUAGA<br>324 4453777                   | <a href="mailto:kelin.zuluaga@ci2.co">kelin.zuluaga@ci2.co</a>                                                                                                                                           |
| 233-2026 | OBJETO: Suscripción de servicios tecnológicos de conectividad, administración y ciberseguridad para la operación y unificación entre las plataformas NUSE 123-SECAD Deant y Carbyne.<br>CONTRATO: 233-2026<br>FECHA INICIO: 9 feb 2026<br>FECHA FIN: 31 dic 2026<br>ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A<br>NIT:830.122.566                                                                              | COLOMBIA<br>TELECOMUNICACIONES S. A | EDWIN<br>RESTRESPO          | JUAN FORERO<br>3167426166                      | <a href="mailto:diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es">diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es</a><br><a href="mailto:juan.forerogomez@telefonica.com">juan.forerogomez@telefonica.com</a> |
| 175-2026 | OBJETO: Continuidad del servicio, la prestación integral, continua e ininterrumpida del servicio tecnológico asociado a la operación, sostenimiento y soporte del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos (SECAD) de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes, así como a las integraciones y desarrollos existentes.<br>CONTRATO: 175-2026 | COLOMBIA<br>TELECOMUNICACIONES S. A | EDWIN<br>RESTRESPO          | JUAN FORERO<br>3167426166                      | <a href="mailto:diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es">diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es</a><br><a href="mailto:juan.forerogomez@telefonica.com">juan.forerogomez@telefonica.com</a> |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                 |                                                                                                                                     |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | FECHA INICIO: 9 feb 2026<br>FECHA FIN: 31 dic 2026<br>COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A<br>NIT:830.122.566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                 |                                                                                                                                     |                                                                                        |
| 167-2026 | OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes Sistema de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 2.<br>CONTRATO: 167-2026<br>FECHA INICIO: 23 feb 2026<br>FECHA FIN: 31 die 2026<br>ALIADO:CI2<br>NIT: 830.056.149                                                                                                                  | CI2                           | EDWIN RESTRESPO | KELLY ZULUAGA<br>324 4453777                                                                                                        | <a href="mailto:kelin.zuluaga@ci2.co">kelin.zuluaga@ci2.co</a>                         |
| 169-2026 | OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes Sistema de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 4.<br>CONTRATO: 169-2026<br>FECHA INICIO: 23 feb 2026<br>FECHA FIN: 31 dic 2026<br>ALIADO: UT AEI<br>NIT: 901.852.025                                                                                                              | UT AEI                        | EDWIN RESTRESPO | ROSA MOGROVEJO GALLEG<br>3028653541                                                                                                 | <a href="mailto:rmogrovejo@enetel.com.co">rmogrovejo@enetel.com.co</a>                 |
| 170-2026 | OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los diferentes sistemas de video vigilancia ciudadana – CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, lote 5.<br>CONTRATO: 170-2026<br>FECHA INICIO: 20/02/2026<br>FECHA FIN: 31/12/2026<br>UT VMAS<br>NIT: 901.851.274<br>TECNOLOGO:                                                                                                        | UT VMAS                       | JADER BARRERA   | PAULA NOREÑA<br>3185120779                                                                                                          | <a href="mailto:pnorena@frisson.net.co">pnorena@frisson.net.co</a>                     |
| 173-2026 | OBJETO: Servicios de mantenimiento Preventivo y Correctivo para los diferentes Sistema de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia,<br>CONTRATO: 173-2026<br>FECHA INICIO: 02/03/2026<br>FECHA FIN: 31/12/2026<br>UT ANTIOQUIA SEGURA<br>NIT: 901.852.025                                                                                                                   | UT ANTIOQUIA SEGURA           | JADER BARRERA   | MONICA RODRIGUEZ<br>3145901857<br>MELISSA ZAPATA<br>3218267520                                                                      | <a href="mailto:monica.rodriguez@energizando.com">monica.rodriguez@energizando.com</a> |
| 148-2026 | Prestación del servicio integral de análisis y gestión de medios tecnológicos en los nueve (9) Nodos de Seguridad del Departamento de Antioquia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROSEGUR                      |                 | OSCAR FERNANDO DAZA BECERRA<br>3187955343                                                                                           | <a href="mailto:ext-oscar.daza@prosegur.com">ext-oscar.daza@prosegur.com</a>           |
| 206-2026 | “Suministrar, instalar y realizar la reposición de la gigantografía institucional del Nodo de Santa Rosa de Osos, perteneciente a la subregión Norte, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y lineamientos de imagen establecidos para los nodos del proyecto. Lo anterior, con el fin de restablecer las condiciones adecuadas de presentación, identidad visual y estandarización del espacio.” | G.O. Distribución y Logística |                 | MANUELA BELTRÁN<br>Área Administrativa<br>G.O. Distribución y Logística<br>MARIA PAULA Asistente Administrativa G.O. Distribución y | <a href="mailto:admingodistribucion@gmail.com">admingodistribucion@gmail.com</a>       |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|          |                                                                                                                                                                                                           |                              |  |                                        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                              |  | Logística<br>Contacto: 300 104<br>8124 |  |
| 172-2026 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana - CCTV y sistemas integrales de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 7 | SPECTRA<br>INGENIERIA S.A.S. |  |                                        |  |

En el marco del Contrato N°169-2026, suscrito con el aliado **UT AEI**, cuyo objeto corresponde a la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana (CCTV) y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios del departamento de Antioquia, Lote 4, se realizó acompañamiento y visita técnica de inspección y seguimiento en el municipio de SOPETRA el día 10 de junio de 2026.

La actividad tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista, evaluando las condiciones de ejecución de las labores, la implementación de los protocolos de seguridad y la aplicación de las medidas de prevención y control de riesgos durante el desarrollo de las actividades contractuales.

De manera específica, la visita estuvo orientada al acompañamiento y al apoyo a la supervisión de las actividades de mantenimiento ejecutadas por la empresa **UT AEI**, con el propósito de validar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, especialmente aquellos relacionados con la ejecución de tareas de alto riesgo, tales como el trabajo en alturas y las labores desarrolladas en espacio público.

#### **Actividades realizadas en el marco del apoyo a la Supervisión y Verificación – SST**

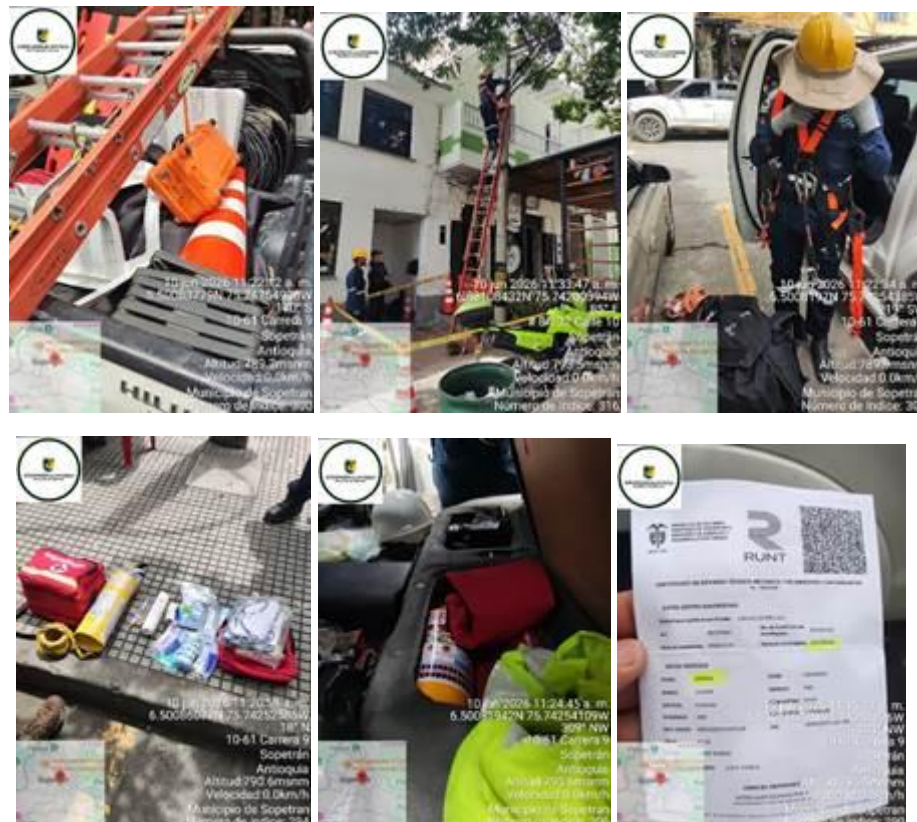
Durante la jornada se llevaron a cabo las siguientes actividades de inspección, control y seguimiento:

1. Verificación de la documentación del personal vinculado a la ejecución del proyecto.
2. Revisión de los certificados de formación y competencia laboral para trabajo seguro en alturas.
3. Validación de los exámenes médicos ocupacionales vigentes y acordes con el perfil de riesgo de cada trabajador.
4. Verificación de las afiliaciones activas al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).
5. Comprobación de la entrega, uso adecuado y estado de los elementos de protección personal (EPP), incluyendo arnés de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, botas dieléctricas y demás elementos requeridos para la labor.
6. Revisión de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración y Control de Riesgos (IPEVR), aplicable a las actividades ejecutadas en el proyecto.
7. Inspección de los registros preoperacionales de los EPP y de los equipos de protección contra caídas (EPCC).
8. Verificación de las condiciones de seguridad de los equipos de acceso utilizados, tales como escaleras, líneas de vida y puntos de anclaje.
9. Inspección de la señalización y delimitación de las áreas de trabajo mediante el uso de conos, cintas de seguridad y demás elementos de control destinados a restringir el acceso de personal no autorizado.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

10. Revisión del estado, funcionamiento y condiciones de seguridad de las herramientas manuales empleadas durante la ejecución de las actividades.
11. Verificación de la documentación y condiciones operativas del vehículo utilizado para el desplazamiento del personal, incluyendo licencias de conducción vigentes, revisión técnico-mecánica y demás requisitos legales aplicables.
12. Inspección de los equipos de atención de emergencias, verificando la disponibilidad y condiciones del botiquín de primeros auxilios, extintor y demás elementos de respuesta ante emergencias.
13. Control y verificación de los permisos especiales requeridos para la ejecución de labores de alto riesgo.
14. Validación del permiso de trabajo en alturas, constatando su correcto diligenciamiento, autorización y divulgación previa al inicio de las actividades.

Las actividades de seguimiento y verificación desarrolladas durante el período evaluado permitieron constatar avances en la implementación de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte de los aliados y contratistas, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales y operativas establecidas para la ejecución del contrato. Este proceso de supervisión ha facilitado la identificación de oportunidades de mejora, el fortalecimiento de los controles preventivos y la promoción del cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente en materia de SST, favoreciendo la ejecución segura de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.



En el marco del Contrato N° 235-2026, cuyo objeto corresponde a la Adecuación, Suministro de la dotación e instalación, para la ampliación del nodo departamental de seguridad de Antioquia, Contratista: CONSORCIO

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

CCTV CIUDADANIA NODOS VALOR MAS se realizó visita técnica en las instalaciones del Nodo Departamental de seguridad el día 16 de junio de 2026.

La visita tuvo como propósito efectuar acompañamiento y apoyo a la supervisión del contrato 235-2026, verificando las actividades operativas y de ejecución desarrolladas por la empresa SOMATEC SELTIC, con el fin de validar el cumplimiento de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como las condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades.

### Actividades de Supervisión y Verificación – Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

**Marco Normativo:** La presente inspección se fundamenta en las siguientes disposiciones normativas:

- ✓ Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales.
- ✓ Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- ✓ Resolución 0312 de 2019, mediante la cual se establecen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Resolución 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos para el desarrollo del trabajo en alturas.
- ✓ Resolución 2400 de 1979, sobre disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
- ✓ Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional.
- ✓ Resolución 2013 de 1986, referente a la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Demás normas concordantes y complementarias aplicables a las actividades objeto del contrato.

### Actividades de apoyo a la Supervisión realizadas – Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante la visita se desarrollaron las siguientes actividades de verificación:

#### Condiciones generales del área

Se evidenció:

- ✓ Área de trabajo delimitada y señalizada adecuadamente.
- ✓ Accesos y rutas de evacuación libres de obstáculos.
- ✓ Orden y limpieza en el sitio de trabajo.
- ✓ Disponibilidad de extintores y equipos de emergencia accesibles.
- ✓ Señalización de riesgos visible y en condiciones adecuadas.
- ✓ Iluminación suficiente para el desarrollo de las actividades.

#### Equipos y herramientas

Se verificó:

- ✓ Equipos en buen estado y con mantenimientos vigentes.
- ✓ Herramientas manuales sin defectos visibles.
- ✓ Uso adecuado de equipos eléctricos, conexiones y protecciones.
- ✓ Disponibilidad de certificados de inspección de maquinaria.
- ✓ Existencia de permisos de trabajo en alturas vigentes.

#### Trabajos de alto riesgo (cuando aplica)

Se verificó:

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

- ✓ Uso de arnés, línea de vida y sistemas de anclaje.
- ✓ Andamios certificados, correctamente armados y con barandas de protección.

### Equipos de Protección Personal (EPP)

Se evidenció la disponibilidad de:

- ✓ Casco de seguridad.
- ✓ Guantes.
- ✓ Botas de seguridad con puntera.
- ✓ Chaleco reflectivo.

Asimismo, se verificó el estado y la disponibilidad de reposición de los elementos de protección personal.

### Gestión documental y procedimientos

Se verificó:

- ✓ Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizada y socializada.
- ✓ Implementación de procedimientos de trabajo seguro y análisis de trabajo seguro (ATS).
- ✓ Permisos de trabajo específicos para actividades de alto riesgo.
- ✓ Disponibilidad de equipos para atención de emergencias, rescate y botiquín.

### Generalidades

Se evidenció:

- ✓ Personal con capacitación en primeros auxilios.
- ✓ Afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral.
- ✓ Certificaciones de formación vigentes de acuerdo con la actividad desarrollada.
- ✓ Evidencias de inducción previa para la ejecución de las labores.

### Hallazgos y Observaciones

Durante la inspección se identificaron las siguientes novedades:

#### Incumplimiento de medidas de seguridad para trabajo en alturas

Se evidenció que parte del personal que ejecuta actividades en alturas no cumple con los requisitos establecidos para el desarrollo seguro de dichas labores, observándose la ausencia y/o no utilización de:

- ✓ Arnés de cuerpo completo.
- ✓ Línea de vida.
- ✓ Sistemas de anclaje.
- ✓ Otros elementos de protección personal requeridos.

Lo anterior constituye una condición insegura que incrementa significativamente el riesgo de accidentes graves o fatales.

#### Falta de soportes documentales de terceros

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

No se evidenció la documentación correspondiente a algunos trabajadores contratistas y/o terceros, relacionada con:

- ✓ Afiliación al Sistema General de Seguridad Social.
- ✓ Certificados de formación para trabajo seguro en alturas.
- ✓ Permisos para trabajo en alturas.
- ✓ Registros de entrega de elementos de protección personal.

### Equipos para atención de emergencias

Se verificó la existencia de:

- ✓ Un (1) extintor multipropósito de 10 libras, con fecha de vencimiento para el año 2027.
- ✓ Una (1) camilla para atención de emergencias.
- ✓ Un (1) botiquín Tipo B debidamente dotado.

### Señalización

El área de trabajo dispone de señalización para rutas de evacuación y señalización preventiva de seguridad.

## 5. Conclusiones y Recomendaciones

La inspección realizada permitió evidenciar que, en términos generales, existen condiciones adecuadas de orden, señalización y disponibilidad de equipos para atención de emergencias; sin embargo, se identificaron incumplimientos relevantes asociados a la ejecución de trabajos de alto riesgo, particularmente en actividades de trabajo en alturas.

Se recomienda a la empresa SOMATEC SELTIC:

1. Garantizar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal por parte de todos los trabajadores y contratistas, especialmente en labores de trabajo en alturas, en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021.
2. Suspender las actividades de alto riesgo cuando no se cuente con las condiciones mínimas de seguridad requeridas.
3. Consolidar y cargar en la carpeta compartida destinada para tal fin la totalidad de los soportes documentales del personal propio y de terceros que intervienen en la ejecución del contrato, incluyendo afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, certificados de formación, permisos de trabajo y registros de entrega de EPP.
4. Fortalecer las actividades de supervisión y control sobre los contratistas y subcontratistas, con el propósito de prevenir incidentes y accidentes de trabajo.

En consecuencia, se deja constancia de que la continuidad de las actividades deberá estar sujeta al cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas por la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la protección de la vida, la integridad y la salud de los trabajadores involucrados en la ejecución del contrato.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |



En el marco del Contrato No. 214-2026, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios profesionales en áreas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), de conformidad con la normatividad vigente, para los contratos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, se participó en el Comité realizado el día 18 de junio de 2026.

La participación en este espacio tuvo como finalidad presentar un informe relacionado con la ejecución de las obligaciones contractuales, específicamente sobre las necesidades identificadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), derivadas de las actividades de apoyo a la supervisión y del acompañamiento desarrollado en los diferentes Nodos Subregionales de Seguridad del departamento de Antioquia.

## CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

### Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz – Gobernación de Antioquia Equipo Gerenciamiento 2

#### OBJETO

Consolidar y documentar las necesidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), relacionadas con elementos de emergencia y Elementos de Protección Personal (EPP), requeridos para el desarrollo seguro de las actividades ejecutadas por el personal de apoyo de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, tanto en el Nodo Regional como en los Nodos Subregionales.

#### MARCO NORMATIVO

La presente consolidación se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente:

- Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales.
- Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

- Resolución 2400 de 1979, referente a disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
- Resolución 2013 de 1986, relacionada con la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.
- Demás disposiciones aplicables en materia de prevención de riesgos laborales, atención de emergencias y protección de los trabajadores.

## ANTECEDENTES

En desarrollo de las actividades de acompañamiento, apoyo a la supervisión y fortalecimiento institucional que adelanta la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en las diferentes subregiones del departamento, se identificó la necesidad de realizar una revisión integral de los recursos destinados a la gestión de emergencias y a la protección de los servidores, contratistas y personal de apoyo.

Esta identificación busca garantizar condiciones seguras de trabajo, fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## METODOLOGÍA

Para la consolidación de las necesidades se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Revisión de las condiciones locativas del Nodo Regional y de los Nodos Subregionales.
2. Identificación de peligros y valoración de riesgos asociados a las actividades desarrolladas por el personal.
3. Verificación de la disponibilidad y del estado de los elementos de emergencia existentes.
4. Recepción y análisis de los requerimientos formulados por los equipos de trabajo.
5. Consolidación de necesidades de acuerdo con criterios de prioridad, cobertura y cumplimiento normativo.

## NECESIDADES IDENTIFICADAS

### Elementos de emergencia para el Nodo Regional y los Nodos Subregionales

Se identificó la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias mediante la adquisición y/o reposición de los siguientes elementos:

- ✓ Botiquines de primeros auxilios debidamente dotados.
- ✓ Botiquín de primeros auxilios tipo B para instalación fija en pared (Nodo Regional).
- ✓ Extintores portátiles multipropósito con mantenimiento y recarga vigentes.
- ✓ Camillas de emergencia debidamente instaladas.
- ✓ Linternas de emergencia recargables.
- ✓ Señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro.
- ✓ Señalización preventiva, informativa y de emergencia.
- ✓ Directorios de emergencia actualizados y visibles.
- ✓ Planos de evacuación y ubicación de equipos de emergencia.

### Elementos de Protección Personal (EPP)

Teniendo en cuenta las actividades de desplazamiento, visitas de campo, acompañamiento institucional, apoyo a la supervisión contractual y verificación en territorio, se identifican como necesarios los siguientes elementos:

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

- ✓ Cascos de seguridad.
- ✓ Chalecos reflectivos de alta visibilidad.
- ✓ Gafas de seguridad.
- ✓ Guantes de protección de acuerdo con la actividad desarrollada.
- ✓ Tapabocas, cuando las condiciones sanitarias o ambientales así lo requieran.
- ✓ Protectores auditivos para actividades con exposición a ruido.
- ✓ Calzado de seguridad o botas de protección.
- ✓ Gorras tipo pava con solapa para protección solar.

### ANÁLISIS TÉCNICO

La disponibilidad de elementos de emergencia y de Elementos de Protección Personal constituye un componente fundamental para la prevención de accidentes de trabajo, la mitigación de riesgos laborales y la protección de la integridad física de los servidores, contratistas y personal de apoyo.

Se evidenció que algunos Nodos requieren la actualización, reposición o complementación de estos elementos, debido al desgaste por uso, vencimiento de insumos y ampliación de las actividades operativas desarrolladas en territorio.

La implementación de estos recursos permitirá fortalecer el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes y promover entornos de trabajo seguros para todo el personal.

### CONCLUSIONES

- Se identificaron necesidades prioritarias en materia de elementos de emergencia y Elementos de Protección Personal para el Nodo Regional y los Nodos Subregionales.
- Los requerimientos consolidados contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
- La dotación de los elementos identificados permitirá mejorar las condiciones de seguridad, reducir la exposición a riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.
- Se recomienda adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la adquisición y reposición de los elementos requeridos.

### RECOMENDACIONES

1. Priorizar la adquisición de los elementos identificados como críticos para la atención de emergencias.
2. Garantizar la entrega, uso y reposición oportuna de los EPP, de acuerdo con las actividades desarrolladas por cada colaborador.
3. Realizar inspecciones periódicas para verificar el estado y vigencia de los elementos de emergencia.
4. Fortalecer los procesos de capacitación en prevención de riesgos, atención de emergencias y uso adecuado de los EPP.
5. Mantener actualizada la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, con el fin de determinar necesidades futuras.

Finalmente, se informa que se anexa la relación de necesidades identificadas en los diferentes Nodos de Seguridad del departamento, de acuerdo con los inventarios y verificaciones realizadas.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |



### EQUIPO TÉCNICO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

A continuación, se presenta la relación actualizada de los integrantes del equipo técnico de apoyo a la supervisión que, a la fecha, cuentan con contrato vigente y cuya permanencia está garantizada hasta el 31 de diciembre. Este recurso humano aseguró la continuidad operativa del proyecto y el cumplimiento de las actividades programadas, así como el avance conforme a los porcentajes de ejecución en el cronograma general.

| Nombre Completo                   | Perfil                                  | Vigencia                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alexander Morales Gálvez          | Director Técnico Contratista            | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Oscar Arley López Rincón          | Ingeniero de apoyo Contratista          | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Daniel Rodríguez Cardona          | Tecnólogo de apoyo Contratista          | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Edison Arley Restrepo Henao       | Ingeniero Contratista                   | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Jhon Felipe Zuluaga Giraldo       | Profesional Jurídico Contratista        | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Luis Fernando Macias villa        | SISO SST Contratista                    | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| En proceso de contratación        | Profesional Administrativa y Financiera | N/A                                       |
| Vilsuly Yaneth González Salas     | Técnica administrativa                  | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Juan Fernando Castaño Romero      | Tecnólogo de apoyo Contratista          | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Juan Carlos Ramírez Mosquera      | Tecnólogo de apoyo Contratista          | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Janier Alberto Piedrahita Isaza   | Tecnólogo de apoyo Contratista          | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| Gelbert Alexander Agudelo Tabares | Tecnólogo de apoyo Contratista          | Contrato Hasta el 31 de diciembre de 2026 |

### Revisión de la seguridad social – Personal

Para el periodo relacionado, mes de junio de 2026, se realizaron las respectivas revisiones de la planilla por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecutan los contratistas asignados por VALOR + al proyecto.

| NOMBRE COMPLETO          | EMPLEADO / CONTRATISTA         | PERIODO APOORTE             | SALUD    | PENSION            | ARL     | # PLANILLA |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|---------|------------|
| Alexander Morales Gálvez | Director Técnico Contratista   | Se acoge a mes vencido mayo | EPS SURA | PROTECCION COLMENA | COLMENA | 86354275   |
| Oscar Arley López Rincón | Ingeniero De Apoyo Contratista | Planilla mes de Junio       | EPS SURA | COLFONDOS          | COLMENA | 86539195   |
| Daniel Rodríguez Cardona | Tecnólogo De Apoyo Contratista | Se acoge a mes vencido mayo | EPS SURA | PROTECCION         | COLMENA | 1083114429 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                   |                                  |                             |           |              |          |            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------|------------|
| Edison Arley Restrepo Henao       | Ingeniero Contratista            | Planillas mes de Mayo       | EPS SURA  | COLFONDOS    | COLMENA  | 92760886   |
| Edison Arley Restrepo Henao       | Ingeniero Contratista            | Planillas mes de Junio      | EPS SURA  | COLFONDOS    | COLMENA  | 93049287   |
| Jhon Felipe Zuluaga Giraldo       | Profesional Jurídico Contratista | Planilla mes de Junio       | EPS SURA  | COLPENSIONES | ARL SURA | 85912352   |
| Luis Fernando Macias Villa        | SISO SST Contratista             | Planilla mes de Junio       | NUEVA EPS | PORVENIR     | COLMENA  | 9507170982 |
| Vilsuly Yaneth González Salas     | Técnica Administrativa           | Se acoge a mes vencido mayo | EPS SURA  | PROTECCION   | COLMENA  | 85916563   |
| Juan Fernando Castaño Romero      | Tecnólogo De Apoyo Contratista   | Planilla mes de Junio       | EPS SURA  | COLPENSIONES | COLMENA  | 86529404   |
| Juan Carlos Ramírez Mosquera      | Tecnólogo De Apoyo Contratista   | planilla mes de Junio       | EPS SURA  | PROTECCION   | COLMENA  | 85927748   |
| Janier Alberto Piedrahita Isaza   | Tecnólogo De Apoyo Contratista   | planilla mes de Junio       | NUEVA EPS | COLFONDOS    | COLMENA  | 86524384   |
| Gelbert Alexander Agudelo Tabares | Tecnólogo De Apoyo Contratista   | planilla mes de Junio       | EPS SURA  | PORVENIR     | ARL SURA | 86516439   |

### Revisión de la seguridad social – Contratistas – Aliados

Para el periodo relacionado mes de junio de 2026, se realizaron las respectivas verificaciones de las planillas, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal humano contratado por los contratistas – aliados.

Los informes de los proveedores y/aliados se ubicará en el drive de acceso como documentación disponible. (Se adjuntan evidencias)

### SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                     | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo y realizar la administración y ejecución de los recursos en la totalidad de los componentes requeridos. | 0%                                | 63,06%                | N/A                   | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad. |
| 2. VALOR+ no tendrá facultades para conciliar o transigir obligaciones                                                                                                                                                                                                                                       | 0%                                | 0%                    | N/A                   | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad  |

|                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> | <p align="center"><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b></p> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                   | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                                    |                                                                                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cuando esté inmersa la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Adelantar integralmente los procesos de contratación asociados al proyecto, con el fin de articular las actividades contractuales con las de ejecución en marco de las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y los municipios.                                                                               | 1.41% | 63,06% | Contrato 255 de 2026 | Se adelanta el proceso del contrato 255 de 2026 que tiene como objeto el Suministro de cámaras para el Centro de Monitoreo del Departamento de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y tratamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y lo establecido en el Manual de Contratación Interno de la Entidad. | 1.41% | 63,06% | N/A                  | El supervisor verificó que, durante el período objeto del presente informe, el contratista actuó conforme a los principios de lealtad, buena fe, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. En la ejecución del contrato no se evidenciaron actuaciones u omisiones que ocasionaran dilaciones injustificadas, afectaciones al normal desarrollo de las actividades o incumplimientos de las obligaciones contractuales atribuibles al contratista. De igual manera, se constató que su actuación se desarrolló en observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como de los lineamientos establecidos en el Manual Interno de Contratación de la Entidad. En consecuencia, se considera que la obligación fue cumplida durante el período evaluado. |
| 5. Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos en los diferentes componentes coordinados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio.                                                                                                                    | 1.41% | 63,06% | Contrato 255 de 2026 | Se adelanta el proceso del contrato 255 de 2026 que tiene como objeto el Suministro de cámaras para el Centro de Monitoreo del Departamento de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto del contrato.                                                                                                                                                                                             | 0%    | 0%     | N/A                  | Durante el período objeto de supervisión no se evidenció que la Entidad asumiera actividades, costos o responsabilidades que, de conformidad con el contrato, correspondieran al contratista. Las actividades desarrolladas se ejecutaron dentro del alcance contractual y bajo la responsabilidad del contratista, sin que se presentaran situaciones que generaran cargas adicionales para la Entidad. En consecuencia, se considera que la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                                                                                                                                                   | fue cumplida durante el período evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>7. Recibir las solicitudes únicamente del supervisor del contrato las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente.</p> | 1.41% | 63,06% | N/A                                                                                                                                                               | <p>Durante el período objeto de supervisión, las solicitudes, instrucciones y requerimientos relacionados con la ejecución del contrato fueron canalizados por conducto del supervisor, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales. No se presentaron situaciones de emergencia, fuerza mayor o caso fortuito que hicieran necesario impartir requerimientos por medios diferentes a los previstos. En consecuencia, se considera que la obligación fue cumplida durante el período evaluado.</p>                                                                             |
| <p>8. Desarrollar el proceso de selección y contratación eficiente de los productos y servicios solicitados.</p>                                                                                                                                                                                            | 1.41% | 63,06% | Contrato 255 de 2026                                                                                                                                              | <p>Se adelanta el proceso del contrato 255 de 2026 que tiene como objeto el Suministro de cámaras para el Centro de Monitoreo del Departamento de Antioquia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>9. Presentar mensualmente un informe que, dé cuenta del avance físico, administrativo. Financiero, y ambiental de la ejecución del contrato.</p>                                                                                                                                                         | 1,41% | 63,06% | Informe de seguimiento No. 30 del mes de junio de 2026                                                                                                            | <p>Se presenta el informe No. 30 correspondiente a la ejecución correspondiente al período del mes de junio de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>10. suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.</p>                                                                                               | 1,41% | 63,06% | <p>1 director<br/>1 jurídico<br/>1 SST<br/>1 financiero (en proceso de contratación)<br/>2 ingenieros<br/>5 tecnólogos de Campo<br/>1 auxiliar Administrativo</p> | <p>Durante el mes de junio de 2026, el equipo de apoyo a la supervisión está conformado de la siguiente manera:<br/>1. Personal de apoyo a la supervisión:<br/>Se cuenta actualmente con 11 perfiles como apoyo a la supervisión.</p> <p>1 director<br/>1 jurídico<br/>1 SST<br/>1 financiero (en proceso de contratación)<br/>2 ingenieros<br/>5 tecnólogos de Campo<br/>1 auxiliar Administrativo<br/>Con este personal, se viene atendiendo requerimientos y validaciones, con el fin de apoyar los respectivos procesos de mantenimiento/implementación CCTV, operación y conectividad</p> |
| <p>11. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el estudio previo.</p>                                                                                                                                                                                 | 1,41% | 63,06% | Contratos vigencia 2026                                                                                                                                           | <p>Se hace seguimiento mensual a las actividades y los servicios prestados por Mesa de Ayuda para la operación de la red de seguridad del Nodo, además</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                                            | de los servicios recurrentes como es el alquiler del locativo del Nodo, servicios, el personal, servicios de conectividad, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                          | 1,41% | 63,06% | Se presenta el informe No. 30 correspondiente a la ejecución del mes de junio de 2026.                                     | Durante el mes de junio de 2026, se llevó a cabo la revisión integral de las Matrices de Impactos Ambientales aplicadas en los contratos de instalación y mantenimiento. Esta actividad tuvo como propósito verificar la correcta implementación de los controles operacionales, las medidas preventivas y las estrategias de mitigación establecidas para la gestión de los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual.                                                                      |
| 13. Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.                                                                                                                                                                            | 1,41% | 63,06% | Se presenta el informe No. 30 correspondiente a la ejecución del mes de junio de 2026.                                     | Se realiza seguimiento a las actividades de la operación de la red del Nodo Departamental para dar cumplimiento a los requerimientos de SST de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con Valor+ y todos sus aliados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido. | 1,41% | 63,06% | N/A                                                                                                                        | En el período reportado, no se constituyeron nuevas garantías contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.                                                                                                                                                             | 1,41% | 63,06% | Actas de aprobación por las cuales los pagos se realizan de forma oportuna dentro del mes contable solicitado y facturado. | En el período del mes de junio de 2026, se presentó ante la supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia las facturas por arrendamiento del nodo departamental, Factura de Servicios Públicos, Factura por Servicios de conectividad, Factura por servicios prestados de transporte, pago de nómina del personal del Nodo departamental, las cuentas de cobro por honorarios y gastos de viaje del personal de apoyo a la supervisión y facturas de los contratos de lotes de mantenimiento. |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>16. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.</p> | 1,41% | 63,06% | Documentos soporte a la facturación                                                                                   | Todas las cuentas de cobro y facturas son validadas y verificadas en cumplimiento de obligaciones de seguridad social cómo se evidencia en el anexo, así mismo dichos para fiscales y riesgos laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>17. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,41% | 63,06% | Las reuniones quedan consignadas en las actas de cada comité de seguimiento celebrado al contrato interadministrativo | Se realiza seguimiento periódico mediante, reuniones de comité continuo, en el cual se atienden en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. Para el mes de mayo de 2026 se realizaron 4 reuniones de comité de seguimiento. Con fechas del 04, 11, 18 y 26 de junio de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>18. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0%    | 0%     | N/A                                                                                                                   | En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>19. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,41% | 63,06% | Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR)                                      | Se realiza la actualización de los porcentajes de ejecución de las medidas preventivas definidas en la Matriz IPERC del equipo técnico de apoyo a la supervisión y de los operadores de nodos, con el propósito de verificar el nivel de cumplimiento de los controles establecidos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, asegurando la eficacia de las acciones preventivas implementadas. Asimismo, esta actualización permite identificar desviaciones, oportunidades de mejora y necesidades de reforzamiento en los procedimientos operativos y de seguridad, contribuyendo a la reducción de incidentes, al fortalecimiento de la gestión de seguridad y salud |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                                                                                                                                                                           | en el trabajo, y al cumplimiento de la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,41% | 63,06% | Se presenta el informe No. 30 correspondiente a la ejecución del mes de junio de 2026.                                                                                                                    | Se realiza seguimiento a las actividades en campo para dar cumplimiento a los requerimientos de SST de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con Valor+ y todos sus aliados.                                                                                                                            |
| 21. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,41% | 63,06% | Actas de Aprobación de las Facturas para los correspondientes pagos autorizados por la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia según acta de aprobación. | Durante el periodo del mes de junio de 2026, Se aprobaron las facturas de arrendamiento y de administración del local de los servicios públicos, de transporte, papelería, de suministros de protección, honorarios, seguridad social, demás facturas para la debida prestación de los servicios necesarios. |
| 22. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo con el régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o Municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,41% | 63,06% | Comprobantes de egreso donde se detallan las deducciones correspondientes                                                                                                                                 | Teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad y agente retenedor de impuestos a nivel nacional, departamental y municipal, los pagos realizados a la fecha del presente informe presentan las deducciones correspondientes en materia tributaria a que haya lugar.                                        |
| 23. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria. | 0%    | 63,06% | N/A                                                                                                                                                                                                       | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0%    | 63,06% | N/A                                                                                                                                                                                                       | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. |    |        |                      |                                                                                  |
| 25. El mandatario garantizará que los diferentes contratistas cumplan la obligación formal de inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se prestará el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0% | 63,06% | N/A                  | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                             |
| 26. De acuerdo con el régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se presta el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0% | 63,06% | N/A                  | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                             |
| 27. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, éstas deberán ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia.                                                                                                                     | 0% | 63,06% | N/A                  | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                             |
| 28. Liquidar oportunamente los contratos en que se requiera de acuerdo con el reglamento de contratación de Valor + y expedición de certificaciones de cumplimiento a petición de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0% | 63,06% | Actas de Liquidación | En el periodo reportado no se han iniciado liquidaciones de contratos derivados. |
| 29. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0% | 63,06% | N/A                  | En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad                             |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.             | Cumple           | Documentos relacionados con la reserva de recursos (CDP/RPC y RESERVAS) | Se garantizan las gestiones administrativas para dar cumplimiento a esta obligación.                                                                                    |
| 2. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, o interventor cuando aplique, para que ejerza las respectivas funciones | Cumple           | Designación de Supervisión                                              | Se revisa para el contrato el tipo de supervisión que aplica<br>Se designa como supervisor a Antonio José Salazar López con Designación de supervisión N° 2026020007506 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.                                                                                                                                                                    | Cumple | Reunión de Seguimiento semanal | En estas reuniones se coordina todo lo referente al proyecto                                                       |
| 4. Realizar el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión/Interventoría externa (según el caso), de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32. | Cumple | Acta de Reunión Semanal        | En este tipo de reuniones de seguimiento se garantiza el cumplimiento del Contrato Estatal                         |
| 5. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato                                                                                      | Cumple | Actas de Reunión               | Se mantienen constante comunicación con el contratista vía correo                                                  |
| 6. Efectuar las solicitudes, requerimientos y recomendaciones que sean necesarias oportunamente.                                                                                                                                        | Cumple | Acta de Reunión Semanal        | En esta reunión de seguimiento semanal se realizan las solicitudes, requerimientos y recomendaciones del contrato. |
| 7. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de seguridad y Salud en el trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia.                                                               | Cumple | Acta de Reunión Semanal        | En estas reuniones se verifica el cumplimiento de los requisitos normativos                                        |
| 8. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.                                                                                                                                                        | Cumple | Informe de Seguimiento         | Se revisa la ejecución del contrato                                                                                |
| 9. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.                                                                                          | Cumple | Informe de Seguimiento         | El contratista realiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.                                              |
| 10. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista.                                                             | Cumple | Informe de Seguimiento         | El contratista aporta un informe de seguimiento mensual para actualización del informe de seguimiento              |
| 11. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato,                                                                                                                                                      | Cumple | Informe de Seguimiento         | Se revisa el cumplimiento de las actividades que tienen relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.  |

### 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| ENTIDAD                                | DEPARTAMENTO      | ASOCIADO(S) | OTROS  | TOTAL             |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
|                                        |                   | sí aplica   |        |                   |
| 1. Recursos iniciales comprometidos    | \$ 95.987.738.629 | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 95.987.738.629 |
| 2. Adición No. 1                       | \$ 3.077.084.409  | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 3.077.084.409  |
| <b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b> | \$ 99.064.823.038 | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 99.064.823.038 |
| 4. Anticipos                           | \$ 0              | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 0              |
| 5. Recursos pagados / desembolsados    | \$ 54.659.896.299 | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 54.659.896.299 |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>    | \$ 54.659.896.299 | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 54.659.896.299 |
| 7. Recursos ejecutados                 | \$ 52.872.572.596 | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 52.872.572.596 |
| 8. Recursos no ejecutados              | \$ 43.115.166.033 | \$ 0        | \$ 0,0 | \$ 43.115.166.033 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para el periodo en mención se calcula una ejecución acumulada del **53,37%** incluyendo los honorarios causados los cuales están distribuidos en cada uno de los componentes de la siguiente manera.

| COMPONENTE                                         | Presupuesto total        | Ejecutado acumulado      | Pendiente por ejecutar   | % Ejecución Total |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Instalación y operación Nuevos Nodos Subregionales | \$ 25.303.531.705        | \$ 12.574.952.592        | \$ 12.728.579.114        | 49,70%            |
| Conectividad de los sistemas integrales            | \$ 6.445.781.702         | \$ 4.153.243.597         | \$ 2.292.538.104         | 64,43%            |
| Mantenimiento, modernización y reposición.         | \$ 39.240.137.910        | \$ 19.997.697.130        | \$ 19.242.440.780        | 50,96%            |
| Implementaciones CCTV                              | \$ 7.488.323.032         | \$ 5.854.169.645         | \$ 1.634.153.387         | 78,18%            |
| Personal apoyo                                     | \$ 6.511.479.488         | \$ 3.570.490.225         | \$ 2.940.989.263         | 54,83%            |
| <b>SUBTOTAL 1</b>                                  | <b>\$ 84.989.253.837</b> | <b>\$ 46.150.553.189</b> | <b>\$ 38.838.700.648</b> | <b>54,30%</b>     |
| Mesa de ayuda                                      | \$ 5.984.592.235         | \$ 2.474.109.606         | \$ 3.510.482.630         | 41,34%            |
| <b>SUBTOTAL 2</b>                                  | <b>\$ 90.973.846.072</b> | <b>\$ 48.624.662.794</b> | <b>\$ 42.349.183.278</b> | <b>53,45%</b>     |
| Honorarios                                         | \$ 6.799.140.307         | \$ 3.569.672.102         | \$ 3.229.468.205         | 52,50%            |
| IVA de honorarios                                  | \$ 1.291.836.658         | \$ 678.237.699           | \$ 613.598.959           | 52,50%            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>\$ 99.064.823.038</b> | <b>\$ 52.872.572.596</b> | <b>\$ 46.192.250.442</b> | <b>53,37%</b>     |

Mesa de ayuda

Para el mes de junio 2026 la mesa de ayuda entrega la relación del mes en curso.



**Canales de contacto**

Si requieres de atención en temas relacionados con TI como enlaces, cámaras de seguridad, entre otros, **contáctanos a las siguientes líneas.**



**Portal web**

<https://mesanododepartamental.com>



**Correo electrónico**

[soportecctv@antioquia.gov.co](mailto:soportecctv@antioquia.gov.co)



**Línea telefónica**

018000411365



**Horario de atención**

24 horas, los 7 días de la semana



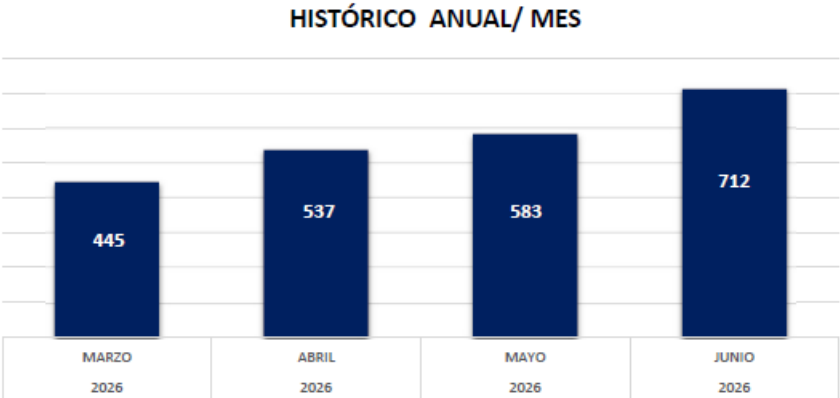
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad |                |                |                |                |                | Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Requerimientos                                                |                |                |                |                |                | Incidentes                                                    |                |                |                |                |                |
| Alto                                                          |                | Medio          |                | Bajo           |                | Alto                                                          |                | Medio          |                | Bajo           |                |
| Atención (min)                                                | Solución (min) | Atención (min) | Solución (min) | Atención (min) | Solución (min) | Atención (min)                                                | Solución (min) | Atención (min) | Solución (min) | Atención (min) | Solución (min) |
| 60                                                            | 480            | 60             | 960            | 60             | 2400           | 60                                                            | 240            | 60             | 480            | 60             | 720            |
|                                                               | 8              |                | 16             |                | 40             |                                                               | 4              |                | 8              |                | 12             |

Tiempos de ANS


Reportes de servicios generados durante el mes de mayo 2026.



Para el presente mes los casos atendidos desde la mesa de ayuda reportan un aumento del 18% respecto al mes anterior (583 casos), evidenciando un aumento debido al reporte individual de cámaras fuera de servicio con un volumen 712 casos gestionados respectivamente, Entre los casos más relevantes se encuentran:

- Redes y Comunicaciones > Conectividad > Sin conectividad
- Aplicaciones > SecurOS > Configurar
- Soporte > Cámaras de CCTV > Fijas > Sin conexión

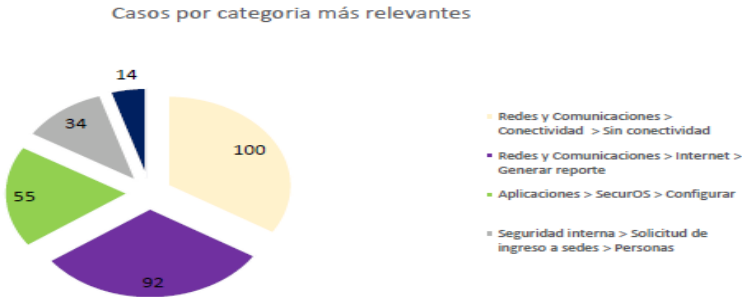
Los tipos de casos se categorizan entre incidentes y solicitudes (requerimiento) desde donde el cumplimiento se mide desde el momento que se recibe la incidencia y se realiza el registro en la herramienta de gestión.




|                                                                                                                                        |                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016            |
|                                                                                                                                        |                                                         | Versión: 03                     |
|                                                                                                                                        |                                                         | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) **en los requerimientos gestionados** por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 95.65%. Este **desempeño** refleja el esfuerzo del equipo por garantizar la calidad y puntualidad en la atención de las solicitudes. Igualmente, el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) **en los incidentes atendidos** por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 95%. Este resultado refleja el compromiso del equipo con la eficiencia y la calidad en la gestión de solicitudes, asegurando un nivel de atención

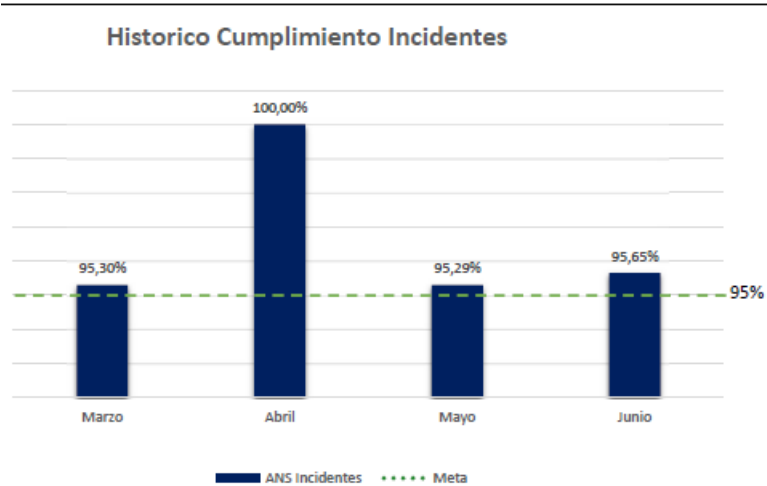El ANS para junio fue de 95.65% superando la meta establecida del 95%, reflejando en los últimos meses una estabilidad en la gestión en los procesos de la mesa de ayuda.



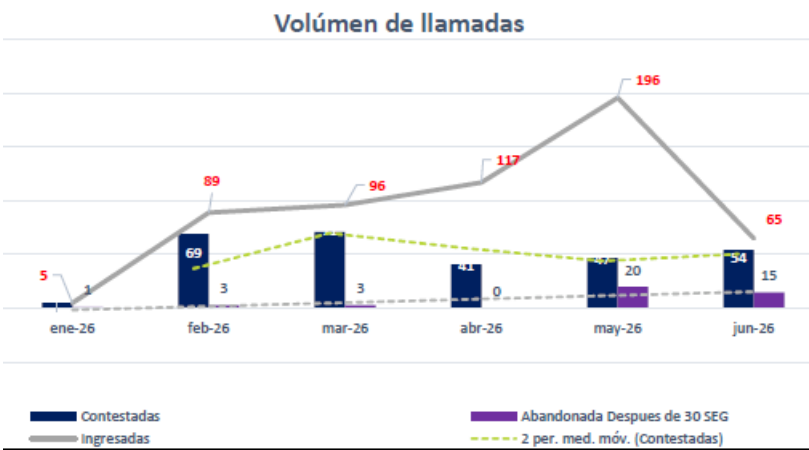El indicador de requerimientos refleja un cumplimiento general del 95.29% entre todos los aliados del proyecto, esto se debe a los procesos de cierre entre plataformas en las cuales se está realizando mesas técnicas para que se reflejen los procesos en las plataformas.



El desempeño general sigue siendo positivo, ya que en todo momento se ha superado el objetivo del 70%. Sin embargo, se observa una disminución en el volumen total de llamadas frente al mes anterior, durante el periodo se registra 54 llamadas, esta disminución señal del aumento en el uso de la plataforma helpdesk.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO**

| FECHA      | TIPO DE REUNIÓN                                        | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 04/06/2026 | Comité de seguimiento<br>Contrato 23MA122C1482 de 2023 | <b>Ver anexo:</b><br>3.1_04_06_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2 |
| 11/06/2026 | Comité de seguimiento<br>Contrato 23MA122C1482 de 2023 | <b>Ver anexo:</b><br>3.2_11_06_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2 |
| 18/06/2026 | Comité de seguimiento<br>Contrato 23MA122C1482 de 2023 | <b>Ver anexo:</b><br>3.3_18_06_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2 |
| 26/06/2026 | Comité de seguimiento<br>Contrato 23MA122C1482 de 2023 | <b>Ver anexo:</b><br>3.3_26_06_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2 |

**CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

**QUINTA: FORMA DE PAGO:** De conformidad con los componentes del contrato se tendrán dos formas de pago así:

**COMPONENTE GERENCIAMIENTO:**

**Valor de recursos a administrar:** Estimado en OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$82.179.644.260).

El desembolso de estos recursos se consignará en una cuenta bancaria especial para el manejo exclusivo de los mismos y que deberá abrirse a nombre del CONTRATISTA. Para el cumplimiento de lo anterior este deberá enviar un documento o carta firmada por el representante legal en la cual informe el número de la cuenta especial. Los rendimientos financieros que llegaren a causarse con ocasión de la administración de los recursos serán propiedad del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, desembolsará los recursos a administrar, en virtud del presente contrato Interadministrativo, de acuerdo con el PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para garantizar el pago oportuno de los proveedores. Para tal efecto realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por Valor+ en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Mandatarios de la entidad.

Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender el pago de proveedores, para lo cual se realizará un desembolso del recurso a administrar de acuerdo con la tabla adjunta.

Desembolsos recursos a administrar:

| Desembolsos recursos a administrar |           |                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 2023                               | Noviembre | \$ 3.651.981.937  |
|                                    | Mayo      | \$ 6.624.420.790  |
| 2024                               | Mayo      | \$ 13.248.841.580 |
|                                    | Octubre   | \$ 6.624.420.790  |
|                                    | Mayo      | \$ 3.966.278.795  |
| 2025                               | Mayo      | \$ 5.235.488.009  |
|                                    | Octubre   | \$ 6.663.348.375  |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                     |         |                          |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| <b>2026</b>                         | Mayo    | \$ 4.394.040.941         |
|                                     | Mayo    | \$ 5.800.134.042         |
|                                     | Octubre | \$ 7.381.988.781         |
| <b>2027</b>                         | Mayo    | \$ 4.647.175.055         |
|                                     | Mayo    | \$ 6.134.271.072         |
|                                     | Octubre | \$ 7.807.254.093         |
| <b>Total, recurso a administrar</b> |         | <b>\$ 82.179.644.260</b> |

- *Valor de honorarios por administración del Recurso: OCHO por ciento (8%) sobre los recursos a administrar del contrato, estimados en SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 6.574.371.541).*
- *Impuesto al valor agregado (IVA): Del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor de los honorarios por administración estimado en la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.249.130.593 pesos).*

*El pago de los honorarios incluido IVA será del ocho por ciento (8%). Estos serán pagados por la Gobernación de Antioquia a Valor+, contra el recurso facturado por el proveedor o aliado estratégico del mandatario y serán legalizados mediante la entrega de la factura o cuenta de cobro y los informes de las actividades ejecutadas.*

**COMPONENTE MESA DE AYUDA:**

**Valor del servicio: CINCO MIL VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS (\$ 5.029.069.105).**

**Impuesto al valor agregado (IVA): DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor del servicio, estimado en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$955.523.130).**

*El Departamento realizará un primer pago por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, previa presentación de las facturas, el informe de diagnóstico inicial del sistema, matriz de escalamiento y plan de comunicaciones, adjuntando los soportes que aseguren que los servicios de Mesa de Ayuda fueron debidamente ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor.*

*Los pagos siguientes correspondientes a la vigencia 2024 serán efectuados de manera mensual por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, cada uno, previa presentación del Informe mensual de ejecución donde se consoliden las actividades ejecutadas durante el período y el estado de todos los elementos del sistema, informe de seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento que realice el proveedor, medición de ANS e indicadores de gestión.*

*Los pagos que correspondan a las vigencias 2025, 2026 y 2027 tendrán un incremento anual de conformidad con el IPC del año anterior al que deba efectuarse el reajuste.*

*El contratista deberá acreditar al momento del inicio de la mesa de ayuda y en cada pago o desembolso que se haga del mismo, que todo el personal que utilice en la ejecución de la mesa de ayuda se encuentra afiliado y a paz y salvo a los sistemas de pensiones, salud ARL y parafiscales.*

*En el evento en que el contratista se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013.*

*Al momento de realizar cada pago se harán las deducciones y/o retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas a que hubiere lugar de conformidad con las normas a que este obligado como agente retenedor. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.*

*Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Departamento de Antioquia, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.*

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas la hará EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Dirección de Tesorería, respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Desembolso de los recursos administrados por parte de Valor + S.A.S.

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con ocasión de la suscripción del presente contrato interadministrativo de conformidad con las normas a que esté obligado por el ordenamiento jurídico; entre ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad de agente retenedor de las mismas. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre los cuales debe considerar los siguientes:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Según el artículo 115 del Estatuto Tributario la Entidad aplica y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de mayo del año 2016 dando cumplimiento al artículo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros) considerado dentro del estatuto tributario la entidad entrará a realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho artículo.

- **Estampilla Pro-Desarrollo:** El Departamento aplicará la retención del 0.60% por concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor:** El Departamento aplicará la retención del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla Pro-Hospitales Públicos:** El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 1% por concepto de la estampilla "PRO-HOSPITALES PÚBLICOS", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid:** El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E)** El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Tasa Pro-Deporte y Recreación:** El Departamento aplicará la retención del 1% por concepto de la "TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla Universidad digital:** El Departamento aplicará la retención del 0.4% por concepto de la "Universidad digital", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de Valor + S.A.S.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos y desembolsos descritos en el presente numeral serán hechos de conformidad con el flujo de caja aprobado por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia conforme con el PAC autorizado por la misma y que hace parte integral del presente contrato.

**PARÁGRAFO CUARTO:** El desembolso de los recursos se realizará en los meses proyectados del presente numeral, siempre y cuando el desembolso anterior, en su respectivo orden, alcance mínimo el 70% de ejecución financiera, es decir, efectivamente pagados, de lo contrario estará sujeto al cumplimiento de dicha ejecución, esto a excepción del desembolso que se debe asumir en el mes de octubre de cada año, en el cual se efectuará la totalidad del pago restante de la respectiva vigencia teniendo en cuenta que los recursos tienen que ser legalizados al mes de diciembre por tratarse de Vigencias Futuras, en caso que no legalizar la totalidad de los recursos se deberá reintegrar el sobrante al departamento con los respectivos rendimientos.

Entiéndase por legalización de recursos, la aprobación que realice la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, una vez ejecutados y pagados los recursos del contrato asignados para la respectiva vigencia fiscal.

**PARAGRAFO QUINTO.FORMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECUROS DE LA ADICION No.1:**

El departamento de Antioquia realizará dos desembolsos de los recursos administrar para la operación y funcionamiento del "Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)" de la siguiente manera:

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Un primer desembolso de los recursos a administrar por valor de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.404.804.788), con la presentación de Ingeniería de detalle aprobada por la supervisión del contrato y cronograma de ejecución de las actividades.

Un segundo desembolso de los recursos a administrar por valor de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.404.804.789), siempre y cuando se haya ejecutado en un mínimo del OCHENTA (80%) del primer desembolso, es decir, efectivamente pagados junto con la legalización y recibo a satisfacción. Cada desembolso deberá presentar factura o cuenta de cobro, Rut actualizado, certificado del No. cuenta donde se depositarán los recursos, informe de actividades y pago de parafiscales y sistema general de la seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

**PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA ADICION No.1:** El pago de los honorarios será del ocho (8%) más IVA y serán pagados por el Departamento a Valor+ S.A.S contra el recurso facturado por el proveedor o Aliado Proveedor del mandatario debidamente legalizados mediante la entrega de la factura o cuenta de cobro, adicionalmente deberá estar acompañado del recibo a satisfacción, los informes de las actividades ejecutadas y pago de parafiscales y sistema general de la seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en todo caso deberá ser aprobado por la supervisión del contrato.

## RESUMEN DE PAGOS

| CONCEPTO                           | FECHA      | VALOR CONTRATO    | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO             | COMPROBANTE DE EGRESO |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Valor Inicial                      | 28/02/2023 | \$ 95.987.738.629 |                         | \$ 0,00               |                    | \$ 95.987.738.629 |                       |
| Adición No. 1                      | 30/12/2025 | \$ 3.077.084.409  |                         |                       |                    | \$ 99.064.823.038 |                       |
| Pago No.1/ factura proveedores     | 23/12/2023 |                   | \$ 2.372.345.753        | \$ 0                  |                    | \$ 96.692.477.285 |                       |
| Pago No.2/ Honorarios              | 25/02/2024 |                   | \$ 225.847.315          | \$ 0                  |                    | \$ 96.466.629.970 |                       |
| Desembolso No 1. de 2024           | 25/02/2024 |                   | \$ 6.624.420.790        | \$ 0                  |                    | \$ 89.842.209.180 |                       |
| Pago No.3/ Honorarios              | 30/03/2024 |                   | \$ 13.431.723           | \$ 0                  |                    | \$ 89.828.777.457 |                       |
| Pago No.4/ Honorarios              | 30/10/2024 |                   | \$ 11.999.445           | \$ 0                  |                    | \$ 89.816.778.012 |                       |
| Pago No.5/ Honorarios mayo         | 30/10/2024 |                   | \$ 23.126.595           | \$ 0                  |                    | \$ 89.793.651.417 |                       |
| Pago No.6/ Honorarios junio        | 30/10/2024 |                   | \$ 23.561.206           | \$ 0                  |                    | \$ 89.770.090.211 |                       |
| Pago No.7/ Honorarios julio        | 30/10/2024 |                   | \$ 19.308.969           | \$ 0                  |                    | \$ 89.750.781.242 |                       |
| Pago No.8/ Honorarios agosto       | 30/10/2024 |                   | \$ 26.424.658           | \$ 0                  |                    | \$ 89.724.356.584 |                       |
| Pago No.9/ Honorarios septiembre   | 30/11/2024 |                   | \$ 100.526.392          | \$ 0                  |                    | \$ 89.623.830.191 |                       |
| Pago No.10/ Honorarios octubre-nov | 10/11/2024 |                   | \$ 304.029.047          | \$ 0                  |                    | \$ 89.319.801.144 |                       |
| Desembolso No. 2 de 2024           | 20/12/2024 |                   | \$ 13.248.841.580       | \$ 0                  |                    | \$ 76.070.959.564 |                       |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                             |            |  |                  |      |  |                   |  |
|---------------------------------------------|------------|--|------------------|------|--|-------------------|--|
| Desembolso No. 3, Parcial - 1 de (2024)     | 20/12/2024 |  | \$ 2.688.703.178 | \$ 0 |  | \$ 73.382.256.386 |  |
| Desembolso No. 3, parcial - 2 de 2024       | 30/01/2025 |  | \$ 1.957.184.873 | \$ 0 |  | \$ 71.425.071.513 |  |
| Pago No.11/ Honorarios dic- enero           | 30/01/2025 |  | \$ 1.623.744.260 | \$ 0 |  | \$ 69.801.327.253 |  |
| Pago No.1 de mesa de ayuda (Acumulado 2024) | 30/01/2025 |  | \$ 412.910.994   | \$ 0 |  | \$ 69.388.416.260 |  |
| Desembolso No.1 de 2025                     | 5/02/2025  |  | \$ 3.966.278.795 | \$ 0 |  | \$ 65.422.137.465 |  |
| Pago No.2 de mesa de ayuda                  | 29/04/2025 |  | \$ 240.895.213   | \$ 0 |  | \$ 65.181.242.252 |  |
| Desembolso No. 3, parcial final de 2024     | 29/04/2025 |  | \$ 787.224.598   | \$ 0 |  | \$ 64.394.017.654 |  |
| Pago No.12/ Honorarios                      | 29/04/2025 |  | \$ 263.014.606   | \$ 0 |  | \$ 64.131.003.048 |  |
| Pago No.3 de mesa de ayuda                  | 25/06/2025 |  | \$ 199.744.429   | \$ 0 |  | \$ 63.931.258.620 |  |
| Pago No.13/ Honorarios                      | 25/06/2025 |  | \$ 240.895.213   | \$ 0 |  | \$ 63.690.363.407 |  |
| Pago No.4 de mesa de ayuda                  | 25/07/2025 |  | \$ 120.447.606   | \$ 0 |  | \$ 63.569.915.800 |  |
| Pago No.14/ Honorarios                      | 25/07/2025 |  | \$ 81.073.178    | \$ 0 |  | \$ 63.488.842.622 |  |
| Desembolso No.2 de 2025                     | 25/07/2025 |  | \$ 5.235.488.009 | \$ 0 |  | \$ 58.253.354.613 |  |
| Pago No.15/ Honorarios                      | 26/08/2025 |  | \$ 72.946.789    | \$ 0 |  | \$ 58.180.407.824 |  |
| Pago No.16/ Honorarios                      | 25/07/2025 |  | \$ 232.813.718   | \$ 0 |  | \$ 57.947.594.106 |  |
| Pago No.5 de mesa de ayuda                  | 25/09/2025 |  | \$ 353.403.169   | \$ 0 |  | \$ 57.594.190.937 |  |
| Desembolso No.3 de 2025                     | 25/10/2025 |  | \$ 6.663.348.375 | \$ 0 |  | \$ 50.930.842.562 |  |
| Pago No.17/ Honorarios                      | 25/11/2025 |  | \$ 140.358.811   | \$ 0 |  | \$ 50.790.483.751 |  |
| Pago No.6 de mesa de ayuda                  | 25/11/2025 |  | \$ 119.455.150   | \$ 0 |  | \$ 50.671.028.601 |  |
| Pago No.18/ Honorarios                      | 12/12/2025 |  | \$ 488.208.383   | \$ 0 |  | \$ 50.182.820.218 |  |
| Pago No.7 de mesa de ayuda                  | 12/12/2025 |  | \$ 358.365.450   | \$ 0 |  | \$ 49.824.454.768 |  |
| Pago No.8 de mesa de ayuda                  | 25/02/2026 |  | \$ 125.547.362   | \$ 0 |  | \$ 49.698.907.406 |  |
| Pago No.19 Honorarios                       | 25/02/2026 |  | \$ 202.796.927   | \$ 0 |  | \$ 49.496.110.479 |  |
| Desembolso No.1 de 2026                     | 25/02/2026 |  | \$ 4.394.040.941 | \$ 0 |  | \$ 45.102.069.537 |  |
| Pago No.8 de mesa de ayuda                  | 25/04/2026 |  | \$ 251.094.724   | \$ 0 |  | \$ 44.850.974.813 |  |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                             |            |                   |                   |      |                |                   |  |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|--|
| Pago No.20 Honorarios       | 25/05/2026 |                   | \$ 194.953.350    | \$ 0 |                | \$ 44.656.021.463 |  |
| Pago No.9 de mesa de ayuda  | 25/05/2026 |                   | \$ 125.547.362    | \$ 0 |                | \$ 44.530.474.101 |  |
| Pago No.10 de mesa de ayuda | 25/06/2026 |                   | \$ 125.547.362    | \$ 0 |                | \$ 44.404.926.739 |  |
| Pago No.21 Honorarios       | En trámite |                   |                   | \$ 0 | \$ 145.622.860 | \$ 44.259.303.879 |  |
| Pago No.11 de mesa de ayuda | En trámite |                   |                   | \$ 0 | \$ 125.547.362 | \$ 44.133.756.517 |  |
| <b>TOTALES</b>              |            | \$ 99.064.823.038 | \$ 54.659.896.299 | \$ 0 | \$ 271.170.222 |                   |  |

Con el presente informe se presentan la legalización No.22 y 23 y el pago de honorarios relacionados a la misma por valor de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.L (\$145.622.860)**, los cuales están soportado en la factura No. V1990 de la siguiente forma:

| DETALLE                                 | VALOR                  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Legalización 22                         | \$756.277.804          |
| Legalización 23                         | \$773.374.085          |
| <b>Total, Recibo a satisfacción</b>     | <b>\$1.529.651.889</b> |
| HONORARIOS 8%                           | \$ 122.372.151         |
| IVA DE HONORARIOS (19%)                 | \$ 23.250.709          |
| <b>TOTAL, HONORARIOS- FACTURA V1990</b> | <b>\$ 145.622.860</b>  |

Seguidamente, se presenta un pago por concepto de mesa de ayuda por valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$125.547.362)**, soportados en la factura No. V1982.

| DETALLE                    | FACTURA | VALOR ANTES DE IVA | IVA           | VALOR TOTAL DESPUES DE IVA |
|----------------------------|---------|--------------------|---------------|----------------------------|
| MESA DE AYUDA<br>Mayo 2026 | V1982   | \$ 105.501.985     | \$ 20.045.377 | \$ 125.547.362             |

#### 4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado suscrito por el revisor fiscal el 09 de julio de 2026.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

#### 5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Para el proceso de contratación se estableció la matriz de riesgo correspondiente, en relación con el objeto contractual, las especificaciones técnicas y las actividades específicas del contrato. Es así que, durante el presente periodo de ejecución y con cada una de sus modificaciones, la matriz de riesgos no ha sufrido modificación alguna, no se han incluido riesgos adicionales.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Por parte de la Entidad y de la Supervisión designada, se ha estado al tanto de los riesgos previstos, por lo que se han realizado las acciones y tratamientos pertinentes y establecidas en la matriz para la mitigación de los posibles riesgos; por lo que no se ha dado lugar a la materialización de riesgo alguno durante la ejecución del contrato.

6.
CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Dentro del período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato.

7.
ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

8.
ANEXOS

- Informes semanales de seguimiento junio.
- Informe Mesa de Ayuda junio.
- Legalización No.22 y 23.
- Recibo a satisfacción.
- Factura N° V1990 Honorarios.
- Recibo a Satisfacción Honorarios.
- Factura N° V1982 Mesa de Ayuda.
- Recibo a Satisfacción Mesa de Ayuda.
- Actas de Comité Técnico mes de junio.
- Certificado pago de Parafiscales, Seguridad Social y documentos Revisor Fiscal.

Para constancia, se firma el presente informe el 31 de agosto de 2026.


  
 ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ  
**SUPERVISOR**

|                  |                                                                                                       |                                                                                              |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Proyectó:        | Alexander Morales Gálvez<br>Profesional Apoyo Técnico<br>Director del Proyecto Equipo AS              | Firma:  | Fecha: 31/08/2026 |
|                  | Giovani Alfonso Caicedo Barrera<br>Profesional Apoyo Técnico<br>Equipo AS                             | Firma:  | Fecha: 31/08/2026 |
|                  | John Felipe Zuluaga Giraldo<br>Profesional Apoyo Jurídico<br>Proyecto Equipo AS                       | Firma:  | Fecha: 31/08/2026 |
| Revisó y ajustó: | Yury Andrea Buitrago Loaiza<br>Profesional Apoyo Logístico<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz | Firma:  | Fecha: 31/08/2026 |
|                  | Karen Ríos Martínez<br>Profesional Especializada<br>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz           | Firma:  | Fecha: 31/08/2026 |

**Contrato 23MA122C1482 de 2023**

**Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.**

**04/06/2026**



# Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

# Compromisos comité anterior 25 mayo

| No. | Compromiso                                                                                                                                                                     | Responsable                                  | Fecha            | Resultado Esperado |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1   | Realizar pruebas piloto de instalación de equipos en municipios priorizados (ej. Bello y La Ceja).                                                                             | Equipo técnico / Proveedor Hikvision         | 04 junio de 2026 |                    |
| 2   | Informar previamente a la mesa de ayuda sobre intervenciones en campo y a las autoridades locales y notificar con anticipación cualquier suspensión o afectación del servicio. | Equipo técnico Valor +                       | Permanente       |                    |
| 3   | Realizar mesa técnica para solucionar integración de cámaras.                                                                                                                  | Alexander Morales<br><b>Ditector Técnico</b> | Inmediato        |                    |
| 4   | Realizar reuniones de empalme del nuevo coordinador de Nodos, para garantizar continuidad operativa.                                                                           | Tomás Sierra<br><b>Coordinador de Nodos</b>  | Semana en curso  |                    |
| 5   | Restringir el acceso directo a servidores sin justificación técnica.                                                                                                           | Tomás Sierra<br><b>Coordinador de Nodos</b>  | Permanente       |                    |
| 6   | Consolidar un inventario actualizado de cámaras (activas, inactivas, sin garantía).                                                                                            | Mesa de ayuda                                | Permanente       |                    |

# Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica en los municipios.
- Acompañamiento prueba piloto 123 Rionegro.
- Visita municipio Yalí, revisión de servidor y acompañamiento.
- Visita municipio Briceño: Validación técnica espacio CCM y Espejo.

## Pendiente de contratación perfil Financiero

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Caucasia, Rionegro, Briceño, Yalí.

Integración Terceros: Zaragoza, Barbosa, Gómez Plata, Caucasia, Andes, Santa Bárbara, Yarumal, Yalí, Salgar, Ebéjico, Arboletes, Apartadó, Betulia, Tarso, Concordia, Anzá.

2026

Ejecución Física 39,64 %

Ejecución financiera 25,64%

# Componente de Mantenimiento

| Lote   | Subregión       | Valor Total Lote | CDP | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de inicio |
|--------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Lote 2 | URABA           | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026     |
|        |                 | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                |
| Lote 3 | ORIENTE         | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026     |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343   | 183 | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026     |
| Lote 6 | NORDESTE        | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026      |
| Lote 7 | NORTE           | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026     |

En proceso de diagnostico en los municipios



2026

Ejecución Física 13 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor



# Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- Canales de conectividad para la implementación SD-WAN= En estudio de mercado.
- Redundancia canal dedicado internet en el **nodo departamental** = Único proponente- Se rechazó Propuesta por no cumplir requisitos- Indicadores financieros.
- Adquisición de radios-cerros asociados al proyecto de **CACOM 5**= Se inició nuevamente Estudio de Mercado

**2026**

**Ejecución física 40,78%**

**Ejecución financiera  
26,23%**



# Componente de Conectividad

## Novedad- Media Commerce- 469-2025

- Entregados fibra óptica.

|          |
|----------|
| TARSO    |
| NECOCLI  |
| HISPANIA |
| EBEJICO  |
| ARMENIA  |

- Novedad CRITICA.

| Municipio        | BW | Implemnetació | Valor IVA incluido |
|------------------|----|---------------|--------------------|
| VIGIA DEL FUERTE | 10 |               | \$ -               |
| ABRIAQUI         | 10 | 30 días       | \$ 578.340         |
| MURINDO          | 10 | 30 días       | \$ 578.340         |
| SABANALARGA      | 10 | 30 días       | \$ 578.340         |

Precios ANEXU

- Programaciones en curso - Proyección de última entrega  
09/06/2026

| CIUDAD             | AGENDA<br>INSTALACION FISICA | AGENDA DE<br>IMPLEMENTACION<br>LOGICA | ACTUALIZACIÓN MC / CLIENTE                                                                                   |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEQUE              | 25/06/2026                   | 09/06/2026 pm                         | Actualizacion de fecha inicial por falla en el servicio, revisando novedades                                 |
| SAN FRANCISCO      | 29/06/2026                   | 04/06/2026 am                         | Personal presenta novedades de fuerza mayor lo que genera actualizacion de agendamiento a proyeccion inicial |
| SAN PEDRO DE URABA | 02/06/2026                   | 04/06/2026 pm                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| SAN JUAN DEURABA   | 02/06/2026                   | 04/06/2026 am                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| MUTATA             | 05/06/2026                   | 09/06/2026 am                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| LA PINTADA         | 02/05/2026                   | 05/06/2026 am                         | Sin actualizacion de agenda inicial                                                                          |
| NARINO             | 29/06/2026                   | 03/06/2026 am                         | Personal presenta novedades de fuerza mayor lo que genera actualizacion de agendamiento a proyeccion inicial |

2026  
Ejecución física 40,78%  
Ejecución financiera 26,23%



# Componente de Nodos

## Rubro Nómina operación

V+: 55,42%/42% PS: 26,97/36%

- Segundo piso CRUE: Enviados APU el 28 de mayo del 2026----> Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983.
- Estudio de mercado mantenimientos locativos nodos. Enviado el 3 de junio del 2026. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763
- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).
- Auxiliar administrativa. Ya fue contratada

2026

Ejecución Física 40,61%

Ejecución financiera 28,08%



# Componente Implementaciones

Adquisición de cámaras fijas CCM (101)

Unión Temporal AEI

\$122.024.700 IVA incluido

En firma de contrato

Saldo Componente  
\$ 86.295.245

Valor



2026

Ejecución Física 0%

Ejecución financiera 0%

# Actas de Transferencias

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.



# Estado Disponibilidad X Componente 2026

| Componente                                       | Presupuestado     | Comprometido      | Pagado           | Facturado por pagar | Saldo contratos   | Disponible       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                  |                   | Valor             | Valor            | Valor               | Valor             |                  |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085  | \$ 4.105.747.133  | \$ 1.221.698.111 | \$ 0                | \$ 2.884.049.022  | \$ 41.955.189    |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 354.233.411    | \$ 354.233.411,00 | \$ 196.322.418   | \$ 0                | \$ 157.910.993    | \$ 0             |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577  | \$ 75.641.957     | \$ 7.480.525     |                     | \$ 68.161.432     | \$ 2.733.967.620 |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109  | \$ 9.460.588.109  | \$ 103.070.190   | \$ 0                | \$ 9.357.517.919  | \$ 0             |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150  | \$ 1.525.905.595  | \$ 451.295.874   | \$ 0                | \$ 1.074.609.721  | \$ 194.897.555   |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066  | \$ 1.400.584.027  | \$ 379.995.183   | \$ 0                | \$ 1.020.588.844  | \$ 81.387.039    |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945    | \$ 0              | \$ 0             | \$ 0                | \$ 0              | \$ 46.758.985    |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859  | \$ 1.537.584.859  | \$ 376.642.086   | \$ 125.547.362      | \$ 1.035.395.411  | \$ 0             |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622  | \$ 1.940.725.622  | \$ 0             | \$ 194.953.350      | \$ 1.745.772.272  | \$ 0             |
| Totales                                          | \$ 23.864.083.824 | \$ 20.401.010.713 | \$ 2.736.504.387 | \$ 320.500.712      | \$ 17.344.005.614 | \$ 3.098.966.388 |

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

| Componente                      | Presupuestado  | Comprometido   | Pagado         | Facturado por pagar | Saldos contratos | En proceso de contratación | Disponible     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                                 |                | Valor          | Valor          | Valor               | Valor            |                            |                |
| Instalación nodos               | \$ 92.988.384  | \$ 92.988.384  | \$ 86.900.900  | \$ 0                | \$ 6.087.484     | \$ 0                       | \$ 157.077.721 |
| Instalación nodos-rubros nómina | \$ 231.397.463 | \$ 231.397.463 | \$ 80.252.722  | \$ 0                | \$ 151.144.741   | \$ 0                       | \$ 0           |
| Mantenimiento 84 Mpios          | \$ 71.017.672  | \$ 71.017.672  | \$ 70.904.522  | \$ 0                | \$ 113.150       | \$ 0                       | \$ 7.029.008   |
| Conectividad                    | \$ 50.129.538  | \$ 50.129.538  | \$ 50.112.854  | \$ 0                | \$ 16.684        | \$ 0                       | \$ 135.072.888 |
| Personal Apoyo                  | \$ 65.753.419  | \$ 65.753.419  | \$ 34.591.790  | \$ 0                | \$ 31.161.629    | \$ 0                       | \$ 31.356.543  |
| Instalac Nuevos componentes     | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0                | \$ 0             | \$ 0                       | \$ 134.356     |
| Mesa de ayuda                   | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0                | \$ 0             | \$ 0                       | \$ 0           |
| Honorarios                      | \$ 296.213.658 | \$ 296.213.658 | \$ 202.796.927 | \$ 0                | \$ 93.416.731    | \$ 0                       | \$ 0           |
| Totales                         | \$ 807.500.134 | \$ 807.500.134 | \$ 525.559.715 | \$ 0                | \$ 281.940.419   | \$ 0                       | \$ 330.670.516 |

- Nodos \$ 157.077.721 Están para la adquisición de los 2 Fortinet de nodos occidente y oriente HA, y licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2. **En espera de cotización para definir otro si**
- Conectividad \$ 135.072.888 adquisición de teléfonos celulares CACOM 5. **En estudio de mercado nueva ficha técnica.**
- Radio enlaces (Cerro Marconi, Cerro Azul y Padre Amaya), se sugiere la adquisición de servidor de respaldo de integración, se envió ficha técnica del servidor a valor+. **Se inicia nuevamente estudio de mercado.**

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

**Licencias faciales. Enviado 3 de junio de  
2026**

| <b>N°</b> | <b>Proveedor</b> | <b>Valor Cotización</b> |
|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | SELTIC           | \$243.044.000,50        |
| <b>2</b>  | ASF              | \$254.261.415,91        |
| <b>3</b>  | DIVIX            | \$368.915.318,00        |

# Pendiente de pago

**Honorarios mesa de ayuda Abril Factura V1867 \$ 125.547.362**

**Honorarios ejecución enero - Abril Factura V1898 \$ 152.247.569**

**Honorarios ejecución reservas enero - Abril Factura V1899 \$ 42.705.781**

## Operación mayo Semana 4

### Gestión del servicio

#### Mesa de Ayuda Semana 4

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 167                | 149            | 18               |
| Casos abierturados | Casos cerrados | Casos pendientes |

#### Casos asociados a conectividad

|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| Casos Aperturados | Casos Cerrados | Casos Pendientes |
| 32                | 31             | 1                |

- ✓ Acompañamiento por parte de mesa en elecciones.
- ✓ Fallo en servidores de Zaragoza, Yalí y Giraldo.
- ✓ Intento irregular de autenticación contra el equipo de borde.
- ✓ Visita al SIES Medellín.

**Contrato 23MA122C1482 de 2023**

**Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.**

**11/06/2026**



# Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

# Compromisos comité anterior 6 junio

| No. | Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                                                                     | Fecha                                           | Resultado Esperado |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Definir y documentar el procedimiento para la atención de solicitudes de grabaciones de las cámaras de seguridad al interior del nodo departamental, teniendo en cuenta que la infraestructura pertenece al Departamento de Antioquia y que la responsabilidad de la administración y custodia de dichas grabaciones recae en la empresa de seguridad departamental. | Tomás Sierra<br><b>Coordinador de Nodos</b><br><br>Antonio José Salazar López<br><b>Supervisor del contrato</b> | 11 de junio de 2026                             |                    |
| 2   | Validar las posibles causas de la falla en las UPS del municipio de Zaragoza, con el fin de identificar el origen del problema y definir las acciones correctivas correspondientes.                                                                                                                                                                                  | Alexander Morales<br><b>Director Técnico AS</b>                                                                 | 11 de junio de 2026                             |                    |
| 3   | Elaborar la solicitud técnica que sustente la necesidad en ciberseguridad para las labores del nodo departamental, con el fin de que sea gestionada y contratada por el área de TI de la Gobernación de Antioquia.                                                                                                                                                   | Marcela Aguirre<br><b>Coordinadora Administrativa V+</b>                                                        | Después de la ley de garantía.                  |                    |
| 4   | Gestionar el envío de solicitud formal mediante correo electrónico a la administración del Edificio Edatel, con el fin de solicitar la habilitación de una puerta de acceso hacia el nodo departamental, incluyendo la autorización para el uso de la caseta ubicada en el nodo.                                                                                     | Tomás Sierra<br><b>Coordinador nodos</b>                                                                        | 11 de junio de 2026                             |                    |
| 5   | Realizar la solicitud ante la Gobernación de Antioquia para la asignación de personal de seguridad que cubra el acceso al nodo departamental, en caso de ser habilitada la nueva puerta.                                                                                                                                                                             | Antonio José Salazar López<br><b>Supervisor del contrato</b>                                                    | En caso que sea posible el compromiso anterior. |                    |
| 6   | Definir y documentar el procedimiento para la atención de solicitudes de grabaciones de las cámaras de seguridad al interior del nodo departamental, teniendo en cuenta que la infraestructura pertenece al Departamento de Antioquia y que la responsabilidad de la administración y custodia de dichas grabaciones recae en la empresa de seguridad departamental. | Tomás Sierra<br><b>Coordinador de Nodos</b><br><br>Antonio José Salazar López<br><b>Supervisor del contrato</b> | 11 de junio de 2026                             |                    |

# Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica en los municipios.
- Seguimiento de prueba piloto 123 Rionegro.
- Visita municipio Guatapé, revisión de servidor y conexión de DD

**Pendiente de contratación perfil Financiero**

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Rionegro, Sopetrán, Santa Fé de Antioquia, Guatapé, Yalí.

Integración Terceros: Barbosa, Concordia, Salgar, Caldas, La Unión, Rionegro.

**2026**

**Ejecución Física 41,92 %**

**Ejecución financiera 25,64%**

# Componente de Mantenimiento

| Lote   | Subregión       | Valor Total Lote | CDP | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de inicio |
|--------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Lote 2 | URABA           | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026     |
|        |                 | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                |
| Lote 3 | ORIENTE         | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026     |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343   | 183 | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026     |
| Lote 6 | NORDESTE        | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026      |
| Lote 7 | NORTE           | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026     |

En proceso de diagnostico en los municipios



2026

Ejecución Física 13 %  
Ejecución financiera 1.09%

# Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- Canales de conectividad para la implementación SD-WAN
- Redundancia canal dedicado internet en el **nodo departamental**.
- Adquisición de radios-cerros asociados al proyecto de **CACOM 5**= Se inició nuevamente Estudio de Mercado

**2026**

**Ejecución física 42,90%**

**Ejecución financiera  
26,23%**



# Componente de Conectividad

## Novedad- Media Commerce- 469-2025

- Entregados fibra óptica.

|          |
|----------|
| TARSO    |
| NECOCLI  |
| HISPANIA |
| EBEJICO  |
| ARMENIA  |

- Novedad CRITICA.

| Municipio        | BW | Implemnetació | Valor IVA incluido |
|------------------|----|---------------|--------------------|
| VIGIA DEL FUERTE | 10 |               | \$ -               |
| ABRIAQUI         | 10 | 30 días       | \$ 578.340         |
| MURINDO          | 10 | 30 días       | \$ 578.340         |
| SABANALARGA      | 10 | 30 días       | \$ 578.340         |

Precios ANEXU

- Programaciones en curso - Proyección de última entrega  
09/06/2026

| CIUDAD             | AGENDA<br>INSTALACION FISICA | AGENDA DE<br>IMPLEMENTACION<br>LOGICA | ACTUALIZACIÓN MIC / CLIENTE                                                                                  |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEQUE              | 25/06/2026                   | 09/06/2026 pm                         | Actualizacion de fecha inicial por falla en el servicio, revisando novedades                                 |
| SAN FRANCISCO      | 29/06/2026                   | 04/06/2026 am                         | Personal presenta novedades de fuerza mayor lo que genera actualizacion de agendamiento a proyeccion inicial |
| SAN PEDRO DE URABA | 02/06/2026                   | 04/06/2026 pm                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| SAN JUAN DEURABA   | 02/06/2026                   | 04/06/2026 am                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| MUTATA             | 05/06/2026                   | 09/06/2026 am                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| LA PINTADA         | 02/05/2026                   | 05/06/2026 am                         | Sin actualizacion de agenda inicial                                                                          |
| NARINO             | 29/06/2026                   | 03/06/2026 am                         | Personal presenta novedades de fuerza mayor lo que genera actualizacion de agendamiento a proyeccion inicial |

Se esta validando otrosi con  
Mediacommerce y Anexu

2026  
Ejecución física 40,78%  
Ejecución financiera  
26,23%

# Componente de Nodos

## Rubro Nómina operación

V+: 55,42%/44% PS: 26,97/39%

- Segundo piso CRUE: Enviados APU el 28 de mayo del 2026----> Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983. Se envió observaciones de parte de la secretaria a valor +, se encuentran en revisión y ajustes.
- Mantenimientos locativos nodos. En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763
- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).

2026

Ejecución Física 40,61%

Ejecución financiera 28,08%

# Componente Implementaciones

Adquisición de cámaras fijas CCM (101)

Unión Temporal AEI

\$122.024.700 IVA incluido

En firma de contrato - Expedición de  
polizas

Saldo Componente  
\$ 86.295.245

**2026**

Ejecución Física 0%

Ejecución financiera 0%

Valor+



# Actas de Transferencias

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.



# Estado Disponibilidad X Componente 2026

| Componente                                       | Presupuestado     | Comprometido      | Pagado           | Facturado por pagar | Saldo contratos   | Disponible       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                  |                   | Valor             | Valor            | Valor               | Valor             |                  |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085  | \$ 4.105.747.133  | \$ 1.221.698.111 | \$ 0                | \$ 2.884.049.022  | \$ 41.955.189    |
| Instalación nodos- rubros nómina                 | \$ 354.233.411    | \$ 354.233.411,00 | \$ 196.322.418   | \$ 0                | \$ 157.910.993    | \$ 0             |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577  | \$ 75.641.957     | \$ 7.480.525     |                     | \$ 68.161.432     | \$ 2.733.967.620 |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109  | \$ 9.460.588.109  | \$ 103.070.190   | \$ 0                | \$ 9.357.517.919  | \$ 0             |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150  | \$ 1.525.905.595  | \$ 451.295.874   | \$ 0                | \$ 1.074.609.721  | \$ 194.897.555   |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066  | \$ 1.400.584.027  | \$ 379.995.183   | \$ 0                | \$ 1.020.588.844  | \$ 81.387.039    |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945    | \$ 0              | \$ 0             | \$ 0                | \$ 0              | \$ 46.758.985    |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859  | \$ 1.537.584.859  | \$ 376.642.086   | \$ 125.547.362      | \$ 1.035.395.411  | \$ 0             |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622  | \$ 1.940.725.622  | \$ 0             | \$ 194.953.350      | \$ 1.745.772.272  | \$ 0             |
| Totales                                          | \$ 23.864.083.824 | \$ 20.401.010.713 | \$ 2.736.504.387 | \$ 320.500.712      | \$ 17.344.005.614 | \$ 3.098.966.388 |

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

| Componente                      | Presupuestado  | Comprometido   | Pagado         | Facturado por pagar | Saldos contratos | En proceso de contratación | Disponible     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                                 |                | Valor          | Valor          | Valor               | Valor            |                            |                |
| Instalación nodos               | \$ 92.988.384  | \$ 92.988.384  | \$ 86.900.900  | \$ 0                | \$ 6.087.484     | \$ 0                       | \$ 157.077.721 |
| Instalación nodos-rubros nómina | \$ 231.397.463 | \$ 231.397.463 | \$ 80.252.722  | \$ 0                | \$ 151.144.741   | \$ 0                       | \$ 0           |
| Mantenimiento 84 Mpios          | \$ 71.017.672  | \$ 71.017.672  | \$ 70.904.522  | \$ 0                | \$ 113.150       | \$ 0                       | \$ 7.029.008   |
| Conectividad                    | \$ 50.129.538  | \$ 50.129.538  | \$ 50.112.854  | \$ 0                | \$ 16.684        | \$ 0                       | \$ 135.072.888 |
| Personal Apoyo                  | \$ 65.753.419  | \$ 65.753.419  | \$ 34.591.790  | \$ 0                | \$ 31.161.629    | \$ 0                       | \$ 31.356.543  |
| Instalac Nuevos componentes     | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0                | \$ 0             | \$ 0                       | \$ 134.356     |
| Mesa de ayuda                   | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0                | \$ 0             | \$ 0                       | \$ 0           |
| Honorarios                      | \$ 296.213.658 | \$ 296.213.658 | \$ 202.796.927 | \$ 0                | \$ 93.416.731    | \$ 0                       | \$ 0           |
| Totales                         | \$ 807.500.134 | \$ 807.500.134 | \$ 525.559.715 | \$ 0                | \$ 281.940.419   | \$ 0                       | \$ 330.670.516 |

- Nodos \$ 157.077.721 Están para la adquisición de los 2 Fortinet de nodos occidente y oriente HA- **(En estudio de mercado)**
- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 **(En estudio de mercado).**

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

| SERVIDOR |                 |         |          |                |                |
|----------|-----------------|---------|----------|----------------|----------------|
| ITEM     | DESCRIPCION     | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL       |
| 1        | Servidor tipo 1 | UN      | 1        | \$ 81.728.000  | \$ 81.728.000  |
| 2        | Servidor tipo 2 | UN      | 1        | \$ 93.464.000  | \$ 93.464.000  |
| 3        | Servidor tipo 3 | UN      | 1        | \$ 97.952.000  | \$ 97.952.000  |
| SUBTOTAL |                 |         |          |                | \$ 273.144.000 |
| IVA      |                 |         |          | 19%            | \$ 51.897.360  |
| TOTAL    |                 |         |          |                | \$ 325.041.360 |

**Conectividad \$ 135.072.888 adquisición de teléfonos celulares CACOM 5. En estudio de mercado nueva ficha técnica.**

**Radio enlaces (Cerro Marconi, Cerro Azul y Padre Amaya), adquisición de servidor de respaldo de integración, se envió ficha técnica del servidor a valor+.**

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

## Valor techo servers:

Servidor tipo 1 - 8T \$97.256.320  
Servidor tipo 2 - 24T \$ 111.222.160  
Servidor tipo 3 - 40T 116.562.880  
Sumatoria: \$ 325.041.360

## Licencias faciales.

Mejor valor luego de cotización  
\$243.044.000,50.  
Se adelantara documentación para habilitar  
contrato pasado ley de garantías.

## Horas de desarrollo

| CONSOLIDADO ESTUDIO DE MERCADO |                               |                   | PROVEEDOR 1 ASF SOLUCIONES S.A.S.  |                                                                   |                                    |                                 | PROVEEDOR 2 DIVE SOCIEDAD POR ACCIONES |                                                                   |                                    |                                 | PROVEEDOR 3 SELTIC                 |                                                                   |                                    |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Item                           | Descripción / Características | Cantidad de horas | Valor unitario (sin IVA/IMPUESTOS) | Porcentaje de IVA de acuerdo a la actividad económica (si aplica) | Valor unitario (con IVA/IMPUESTOS) | Valor Total (con IVA/IMPUESTOS) | Valor unitario (sin IVA/IMPUESTOS)     | Porcentaje de IVA de acuerdo a la actividad económica (si aplica) | Valor unitario (con IVA/IMPUESTOS) | Valor Total (con IVA/IMPUESTOS) | Valor unitario (sin IVA/IMPUESTOS) | Porcentaje de IVA de acuerdo a la actividad económica (si aplica) | Valor unitario (con IVA/IMPUESTOS) | Valor Total (con IVA/IMPUESTOS) |
| 1                              | Pequeña Básico                | 12 horas          | \$ 1.113.000,00                    | 10%                                                               | \$ 1.220.300                       | \$ 13.209.600                   | \$ 2.332.633                           | 10%                                                               | \$ 2.564.933                       | \$ 26.449.332                   | \$ 1.227.000                       | 10%                                                               | \$ 1.350.300                       | \$ 14.029.330                   |
| 2                              | Pequeña Estándar              | 25 horas          | \$ 1.000.007,14                    | 10%                                                               | \$ 1.090.740                       | \$ 27.268.500                   | \$ 2.100.294                           | 10%                                                               | \$ 2.310.349                       | \$ 57.758.747                   | \$ 1.204.500                       | 10%                                                               | \$ 1.324.950                       | \$ 33.123.750                   |
| 3                              | Pequeña Premium               | 10 horas          | \$ 1.001.000,17                    | 10%                                                               | \$ 1.101.100                       | \$ 11.011.000                   | \$ 2.100.111                           | 10%                                                               | \$ 2.310.222                       | \$ 23.102.222                   | \$ 1.100.512                       | 10%                                                               | \$ 1.210.563                       | \$ 12.105.630                   |
| Valor Total de la Oferta       |                               |                   |                                    |                                                                   |                                    | \$ 51.489.100                   |                                        |                                                                   |                                    | \$ 107.310.781                  |                                    |                                                                   |                                    | \$ 119.239.678                  |

# Pendiente de pago

**Honorarios mesa de ayuda Abril Factura V1867 \$ 125.547.362**

**Honorarios ejecución enero - Abril Factura V1898 \$ 152.247.569**

**Honorarios ejecución reservas enero - Abril Factura V1899 \$ 42.705.781**

## Operación junio Semana 1

## Gestión del servicio

### Mesa de Ayuda Semana 1

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 137            | 128            | 9                |
| Casos abiertos | Casos cerrados | Casos pendientes |

### Casos asociados a conectividad

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| Casos Abiertos | Casos Cerrados | Casos Pendientes |
| 21             | 20             | 1                |

- ✓ Reparación servidores de Zaragoza y Yalí.
- ✓ Fallo en línea 123 Departamental (Telefónica).
- ✓ Revisión consultas LPR.
- ✓ Ajuste en los usuarios con marca de agua.

**Contrato 23MA122C1482 de 2023**

**Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.**

**18/06/2026**



# Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

# Compromisos comité anterior 6 junio

| No. | Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsable                                                                                           | Fecha                  | Resultado Esperado |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | Gestionar la solicitud y suministro de insumos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el Nodo Departamental y los nodos subregionales, incluyendo extintores (recarga y señalización), botiquines de primeros auxilios (dotación y reposición) y demás elementos necesarios para la prevención de riesgos, conforme a las necesidades identificadas en cada nodo. | Luis Fernando Macías<br>Profesional SST                                                               | 18 de junio<br>de 2026 |                    |
| 2   | Elaborar el proyecto de ordenanza de vigencias futuras para el periodo 2028–2031, con el fin de presentarlo ante la Asamblea Departamental.                                                                                                                                                                                                                              | Alexander Morales<br>Director Técnico<br><br>Antonio José Salazar<br>López<br>Supervisor del contrato | Junio 2026             |                    |

# Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica en los municipios.
- Seguimiento de prueba piloto 123 Rionegro acompañamiento BPO.
- Visita municipio Yali, garantía de servidor.

**Pendiente de contratación perfil Financiero**

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Rionegro, Necoclí, Zaragoza, Yalí, Medellín.

Integración Terceros: San Vicente Ferrer, Cisneros, Támesis, Retiro.

**2026**

**Ejecución Física 44,19 %**

**Ejecución financiera 37,16%**

# Componente de Mantenimiento

| Lote   | Subregión       | Valor Total Lote | CDP | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de inicio |
|--------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Lote 2 | URABA           | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026     |
|        |                 | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                |
| Lote 3 | ORIENTE         | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026     |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343   | 183 | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026     |
| Lote 6 | NORDESTE        | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026      |
| Lote 7 | NORTE           | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026     |

En proceso de diagnostico en los municipios



2026

Ejecución Física 13 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor



# Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- Redundancia canal dedicado internet en el **nodo departamental**.
  1. En proceso de contratación.
  2. Comité de contratación 19/06/2026.
  3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
  4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.
- Adquisición de radios-cerros asociados al proyecto de **CACOM 5= 2 Estudio de Mercado**. Respuesta estudio de mercado 30/06/2026.
- **Canales de conectividad para la implementación SD-WAN:** En estudio de mercado a la espera de cotizaciones de los proveedores.

**2026**

**Ejecución física 45,01%**

**Ejecución financiera**

**32,60%**

Valor



# Componente de Conectividad

Novedad- Media Commerce- 469-2025

- **Entregados fibra óptica.**

1. Tarso
2. Necoclí
3. Hispania
4. Ebejico
5. Armenia
6. Peque

- **En verificación de mesa**

1. Mutatá
2. San Juan de Uraba
3. San Pedro de Uraba.

- **Pendientes**

1. San FRancisco
2. Nariño

- **Otrosí con Anexu.**

|             |    |
|-------------|----|
| ABRIAQUI    | 10 |
| MURINDO     | 10 |
| SABANALARGA | 10 |

- **Continua en Starlink (sin recibir hasta la solución de energia solar)**

1. Vigia del fuerte

# Componente de Nodos

## Rubro Nómina operación

V+: 58,65%/46% PS: 36,06/41%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).
- **Mantenimientos locativos nodos.** En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.
  1. En proceso de contratación.
  2. Comité de contratación 19/06/2026.
  3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
  4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.

**Segundo piso CRUE: Enviados APU el 28 de mayo del 2026----> Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983. Se envió observaciones de parte de la secretaria a valor +, se encuentran en revisión y ajustes.**

2026

Ejecución Física 44,85%

Ejecución financiera 35,76%

Valor+



# Componente Implementaciones

## Adquisición de cámaras fijas CCM (101)- Contrato 255-2026

Unión Temporal AEI

**Valor contrato= \$122.024.700 IVA incluido**

- Kick off: 18/06/2026
- Entrega de cámaras y facturación: 19/06/2026



**2026**

**Ejecución Física 0%**

**Ejecución financiera 0%**

# Actas de Transferencias

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.



# Estado Disponibilidad X Componente 2026

| Componente                                       | Presupuestado     | Comprometido      | Pagado           | Facturado por pagar | Saldos contratos  | Disponible       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                  |                   | Valor             | Valor            | Valor               | Valor             |                  |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085  | \$ 4.105.747.133  | \$ 1.221.698.110 | \$ 333.945.992      | \$ 2.550.103.031  | \$ 18.280.288    |
| Instalación nodos- rubros nómina                 | \$ 354.233.411    | \$ 354.233.411,00 | \$ 207.758.870   | \$ 0                | \$ 146.474.541    | \$ 0             |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577  | \$ 75.641.957     | \$ 7.480.525     |                     | \$ 58.542.823     | \$ 1.215.405.637 |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109  | \$ 9.460.588.109  | \$ 103.070.190   | \$ 0                | \$ 9.357.517.919  | \$ 0             |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150  | \$ 1.525.905.595  | \$ 451.295.874   | \$ 109.647.620      | \$ 964.962.101    | \$ 178.237.555   |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066  | \$ 1.403.296.599  | \$ 463.048.154   | \$ 87.623.632       | \$ 852.624.813    | \$ 78.674.467    |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945    | \$ 122.024.700    | \$ 0             | \$ 0                | \$ 122.024.700    | \$ 86.295.245    |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859  | \$ 1.537.584.859  | \$ 376.642.086   | \$ 125.547.362      | \$ 1.035.395.411  | \$ 0             |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622  | \$ 1.940.725.622  | \$ 0             | \$ 194.953.350      | \$ 1.745.772.272  | \$ 0             |
| Totales                                          | \$ 23.864.083.824 | \$ 20.525.747.985 | \$ 2.830.993.809 | \$ 851.717.956      | \$ 16.833.417.611 | \$ 1.576.893.192 |

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

| Componente                  | Presupuestado  | Comprometido   | Pagado         | Saldos contratos | En proceso de contratación | Disponible     |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|
|                             |                | Valor          | Valor          | Valor            |                            |                |
| Instalación nodos           | \$ 396.710.396 | \$ 92.988.384  | \$ 91.401.350  | \$ 1.587.034     | \$ 243.044.000             | \$ 60.678.012  |
| Mantenimiento 84 Mpios      | \$ 71.017.672  | \$ 71.017.672  | \$ 70.904.522  | \$ 113.150       | \$ 0                       | \$ 7.029.008   |
| Conectividad                | \$ 50.129.538  | \$ 50.129.538  | \$ 50.112.854  | \$ 16.684        | \$ 0                       | \$ 135.072.888 |
| Personal Apoyo              | \$ 65.753.419  | \$ 65.753.419  | \$ 34.591.790  | \$ 31.161.629    | \$ 0                       | \$ 31.356.543  |
| Instalac Nuevos componentes | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0             | \$ 0                       | \$ 134.356     |
| Mesa de ayuda               | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0             | \$ 0                       | \$ 0           |
| Honorarios                  | \$ 296.213.658 | \$ 296.213.658 | \$ 202.796.927 | \$ 93.416.731    | \$ 0                       | \$ 0           |
| Totales                     | \$ 879.824.683 | \$ 576.102.671 | \$ 449.807.443 | \$ 126.295.228   | \$ 243.044.000             | \$ 234.270.807 |

- Nodos \$ 157.077.721 Están para la adquisición de los 2 Fortinet de nodos occidente y oriente HA- **(En estudio de mercado.) Entrega de cotización 30/06/2026.**
- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 **(En estudio de mercado).** Entrega de cotización proveedor **19/06/2026.**

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

- **Servidores:**

Estudio de mercado realizado; a la espera de el resultado de estudio de mercado de Radios y Celular (Para revisión saldo presupuestal).

- **Adquisición de teléfonos celulares CACOM 5:** En estudio de mercado, el 19/06/2026.

- **Licencias faciales.**

1. En proceso de contratación.
2. Comité de contratación 19/06/2026.
3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.

- **Horas de desarrollo** → **85 horas - Valor contrato (\$109.425.005).**

1. En proceso de contratación.
2. Comité de contratación 19/06/2026.
3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.

# Pendiente de pago

**Honorarios mesa de ayuda Abril Factura V1867 \$ 125.547.362**

**Honorarios ejecución enero - Abril Factura V1898 \$ 152.247.569**

**Honorarios ejecución reservas enero - Abril Factura V1899 \$ 42.705.781**

## Operación junio Semana 2

### Gestión del servicio

#### Mesa de Ayuda Semana 2

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 105                | 80             | 25               |
| Casos abierturados | Casos cerrados | Casos pendientes |

#### Casos asociados a conectividad

|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| Casos Aperturados | Casos Cerrados | Casos Pendientes |
| 27                | 22             | 5                |

- ✓ Licenciamiento Fortinet.
- ✓ Revisión visuales terceros.
- ✓ Restablecimiento servicio.
- ✓ Configuración usuario CACOM.

**Contrato 23MA122C1482 de 2023**

**Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.**

**26/06/2026**



# Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

# Compromisos comité anterior 6 junio

| No. | Compromiso                           | Responsable | Fecha      | Resultado Esperado |
|-----|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| 1   | Entrega de formulario elementos SST. | Equipo AS   | 25/06/2026 |                    |

# Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica en los municipios.
- Seguimiento de prueba piloto 123 Rionegro acompañamiento BPO.
- Visita municipio Granada revisión de enlace espejo.

**Pendiente de contratación perfil Financiero**

Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Rionegro, Santo Domingo, Sabanalarga, San Roque, Cisneros, Granada.

Integración Terceros: Rionegro, Carmen de Viboral, Támesis, Ciudad Bolívar.

**2026**

**Ejecución Física 46,46 %**

**Ejecución financiera 37,16%**

# Componente de Mantenimiento

| Lote   | Subregión       | Valor Total Lote | CDP | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de inicio |
|--------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Lote 2 | URABA           | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026     |
|        |                 | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                |
| Lote 3 | ORIENTE         | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026     |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343   | 183 | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026     |
| Lote 6 | NORDESTE        | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026      |
| Lote 7 | NORTE           | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026     |

En proceso de diagnostico en los municipios



2026

Ejecución Física 13 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor



# Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- Redundancia canal dedicado internet en el **nodo departamental**.
  1. En proceso de contratación.
  2. Comité de contratación 19/06/2026.
  3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
  4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.
- Adquisición de radios-cerros asociados al proyecto de **CACOM 5= 2 Estudio de Mercado**. Repuesta estudio de mercado 30/06/2026.
- **Canales de conectividad para la implementación SD-WAN:** En estudio de mercado a la espera de cotizaciones de los proveedores.

2026

Ejecución física 47,13%

Ejecución financiera  
32,72%

Valor



# Componente de Conectividad

Novedad- Media Commerce- 469-2025

- **Entregados fibra óptica.**

1. Tarso
2. Necoclí
3. Hispania
4. Ebejico
5. Armenia
6. Pequ
7. San Juan de Uraba
8. San Pedro de Uraba

- **En verificación de mesa**

1. Mutatá

- **Pendientes**

1. San Francisco
2. Nariño

- **Otrosí con Anexu.**

|             |    |
|-------------|----|
| ABRIAQUI    | 10 |
| MURINDO     | 10 |
| SABANALARGA | 10 |

San Jeronimo

- **Continua en Starlink (sin recibir hasta la solución de energia solar)**

1. Vigia del fuerte

# Componente de Nodos

## Rubro Nómina operación

V+: 58,65%/46% PS: 36,06/41%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería (definir insumos).
- **Mantenimientos locativos nodos.** En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.
  1. En proceso de contratación.
  2. Comite de contratación 19/06/2026.
  3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
  4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.

**Segundo piso CRUE: Enviados APU el 28 de mayo del 2026----> Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983. Se envio observaciones de parte de la secretaria a valor +, se encuentran en revision y ajustes.**

2026

**Ejecución Física 46,97%**

**Ejecución financiera 35,76%**

Valor+



# Componente Implementaciones

## Adquisición de cámaras fijas CCM (101)- Contrato 255-2026

Unión Temporal AEI

**Valor contrato= \$122.024.700 IVA incluido**

- Kick off: 18/06/2026
- Entrega de cámaras y facturación: 19/06/2026
- Cámaras almacenadas en bodega nodo departamental

**2026**

**Ejecución física 100%**

**Ejecución financiera  
93%**



# Actas de Transferencias

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

## RESUMEN EJECUTIVO

Estado global del control de Actas de Transferencia — AT 2024

16

Contratos Totales

vigencia 2024

91

Municipios Cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos Completos

todos en regla

7

Contratos Aprobados

40 municipios OK

5

Revisión Pendiente

37 municipios

4

En Firma Beneficiario

14 municipios

# Estado Disponibilidad X Componente 2026

| Componente                                       | Presupuestado    | Comprometido      |         | Pagado           |        | Facturado por pagar |        | Saldos contratos |        | En proceso de contratación | Disponible       |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|----------------------------|------------------|
|                                                  |                  | Valor             | %       | Valor            | %      | Valor               | %      | Valor            | %      |                            |                  |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085 | \$ 4.105.747.133  | 94,38%  | \$ 1.221.698.110 | 28,08% | \$ 333.945.992      | 7,68%  | \$ 2.550.103.031 | 62,11% | \$ 226.220.664             | \$ 18.280.288    |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 354.233.411   | \$ 354.233.411,00 | 100,00% | \$ 207.758.870   | 58,65% | \$ 0                | 0,00%  | \$ 146.474.541   | 41,35% | \$ 0                       | \$ 0             |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577 | \$ 75.641.957     | 2,69%   | \$ 7.480.525     | 0,27%  |                     |        | \$ 58.542.823    | 0,00%  | \$ 1.518.561.983           | \$ 1.215.405.637 |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109 | \$ 9.460.588.109  | 100,00% | \$ 103.070.190   | 1,09%  | \$ 0                | 0,00%  | \$ 9.357.517.919 | 0,00%  | \$ 0                       | \$ 0             |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150 | \$ 1.525.905.595  | 88,67%  | \$ 451.295.874   | 26,23% | \$ 111.789.620      | 6,50%  | \$ 962.820.101   | 63,10% | \$ 86.822.176              | \$ 108.075.379   |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066 | \$ 1.403.296.597  | 94,69%  | \$ 463.048.154   | 31,25% | \$ 87.623.632       | 5,91%  | \$ 852.624.811   | 60,76% | \$ 0                       | \$ 78.674.469    |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945   | \$ 122.024.700    | 58,58%  | \$ 0             | 0,00%  | \$ 122.024.700      | 58,58% | \$ 0             | 0,00%  | \$ 86.295.245              | \$ 0             |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859 | \$ 1.537.584.859  | 100,00% | \$ 376.642.086   | 24,50% | \$ 125.547.362      | 8,17%  | \$ 1.035.395.411 | 67,34% | \$ 0                       | \$ 0             |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622 | \$ 1.940.725.622  | 100,00% | \$ 0             | 0,00%  | \$ 194.953.350      | 10,05% | \$ 1.745.772.272 | 89,95% | \$ 0                       | \$ 0             |

## • Horas de desarrollo

85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)

1. En proceso de contratación.
2. Comite de contratación 19/06/2026.
3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.



# Estado Disponibilidad X Componente 2025

| Componente                      | Presupuestado  | Comprometido   |         | Pagado         |         | Facturado por pagar |       | Saldos contratos |        | En proceso de contratación | Disponible    |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------------|-------|------------------|--------|----------------------------|---------------|
|                                 |                | Valor          | %       | Valor          | %       | Valor               | %     | Valor            | %      |                            |               |
| Instalación nodos               | \$ 396.710.396 | \$ 92.988.384  | 23,44%  | \$ 91.401.350  | 23,04%  | \$ 0                | 0,00% | \$ 1.587.034     | 1,71%  | \$ 303.722.012             | \$ 0          |
| Instalación nodos-rubros nómina | \$ 80.252.722  | \$ 80.252.722  | 100,00% | \$ 80.252.722  | 100,00% | \$ 0                | 0,00% | \$ 0             | 0,00%  | \$ 0                       | \$ 0          |
| Mantenimiento 84 Mpios          | \$ 78.046.680  | \$ 71.017.672  | 90,99%  | \$ 70.904.522  | 90,85%  | \$ 0                | 0,00% | \$ 113.150       | 0,00%  | \$ 7.029.008               | \$ 0          |
| Conectividad                    | \$ 185.202.426 | \$ 50.129.538  | 27,07%  | \$ 50.112.854  | 27,06%  | \$ 0                | 0,00% | \$ 16.684        | 0,03%  | \$ 135.072.888             | \$ 0          |
| Personal Apoyo                  | \$ 97.109.962  | \$ 65.753.419  | 67,71%  | \$ 34.591.790  | 35,62%  | \$ 0                | 0,00% | \$ 31.161.629    | 47,39% | \$ 0                       | \$ 31.356.543 |
| Instalac Nuevos componentes     | \$ 134.356     | \$ 0           | 0,00%   | \$ 0           | 0,00%   | \$ 0                | 0,00% | \$ 0             | 0,00%  | \$ 134.356                 | \$ 0          |
| Mesa de ayuda                   | \$ 0           | \$ 0           | 0,00%   | \$ 0           | 0,00%   | \$ 0                | 0,00% | \$ 0             | 0,00%  | \$ 0                       | \$ 0          |
| Honorarios                      | \$ 296.213.658 | \$ 296.213.658 | 100,00% | \$ 202.796.927 | 68,46%  | \$ 0                | 0,00% | \$ 93.416.731    | 31,54% | \$ 0                       | \$ 0          |

- Nodos \$ 157.077.721 Están para la adquisición de los 2 Fortinet de nodos occidente y oriente HA- (En estudio de mercado.) Entrega de cotización 30/06/2026.
- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 \$ 273.076.440 (En proceso de contratación).

| Saludos presupuesto - Gerenciamiento 2 |                    |                   |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Componente                             | 2025 (Reserva)     | 2026              | TOTAL              |
| Instalación y operación de nodos       | 60.678.012         |                   | 60.678.012         |
| Mantenimiento                          | 7.029.008          |                   | 7.029.008          |
| Conectividad                           | 135.072.888        | 70.162.176        | 205.235.064        |
| Personal apoyo                         |                    |                   | -                  |
| Instalación nuevos componentes         | 134.356            |                   | 134.356            |
| <b>Total</b>                           | <b>202.914.264</b> | <b>70.162.176</b> | <b>273.076.440</b> |

# Estado Disponibilidad X Componente 2025

- **Servidores:**

Estudio de mercado realizado; a la espera de el resultado de estudio de mercado de Radios y Celular (Para revisión saldo presupuestal).

- **Adquisición de teléfonos celulares CACOM 5:** En estudio de mercado, el 19/06/2026.

- **Licencias faciales. \$243.044.000**

1. En proceso de contratación.
2. Comité de contratación 19/06/2026.
3. Inicio de proceso el 22/06/2026.
4. Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.



# Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

## Operación junio Semana 3

## Gestión del servicio

### Mesa de Ayuda Semana 3

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 109                | 97             | 12              |
| Casos abierturados | Casos cerrados | Casos pendiente |

### Casos asociados a conectividad

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Casos Aperturados | Casos Cerrados | Casos Pendiente |
| 25                | 24             | 1               |

- ✓ Apoyo en elecciones.
- ✓ Corrección KEY Giraldo.
- ✓ Instalación HA nodo.
- ✓ Fallo en Dashboard de Securos.
- ✓ Saturación red local nodo.

# Informe Operación Mesa de Ayuda Nodo Departamental

01 al 30 de junio 2026

Contrato:23MA122C1482\_de\_2023



Valor



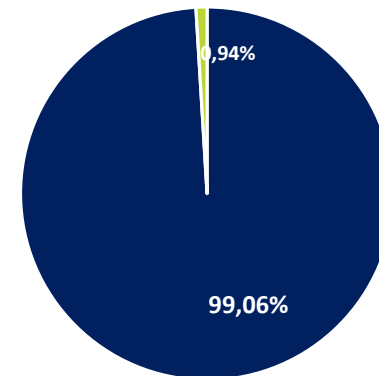
# ANS junio

Valor



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

INDICADOR GENERAL



■ Cumple ■ No Cumple

- ✓ En junio, el indicador general de cumplimiento del ANS alcanzó un **99,06 %**, superando ampliamente la meta establecida y reflejando un alto nivel de desempeño en la prestación del servicio. Del total de los casos gestionados, el **0,94 %** correspondió a incumplimientos, lo que evidencia una operación estable y un adecuado seguimiento por parte de la mesa de ayuda. Estos resultados demuestran la capacidad del equipo para mantener niveles de servicio consistentes, garantizando una atención oportuna y efectiva de los requerimientos e incidentes reportados.

# Comportamiento del Servicio proyectado

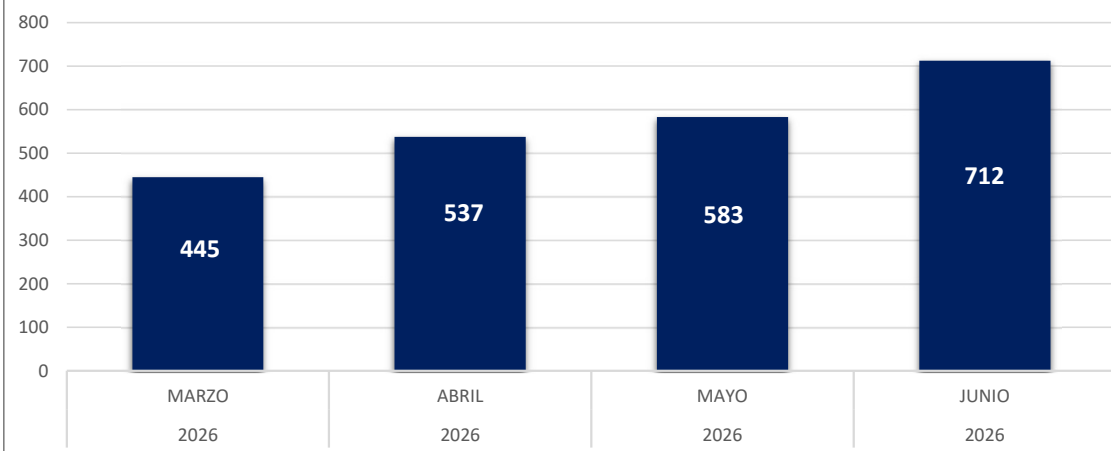
- ✓ En junio se registraron 712 casos en la herramienta GLPI, lo que representa un incremento del 18 % respecto al mes anterior (583 casos), evidenciando un aumento debido al reporte individual de cámaras fuera de servicio.
- ✓ La principal vía de contacto es canal de soporte:
  - Helpdesk : 90%.
  - Línea telefónica: 8%

Valor




GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia


## HISTÓRICO ANUAL/ MES



## Casos por medio de ingreso

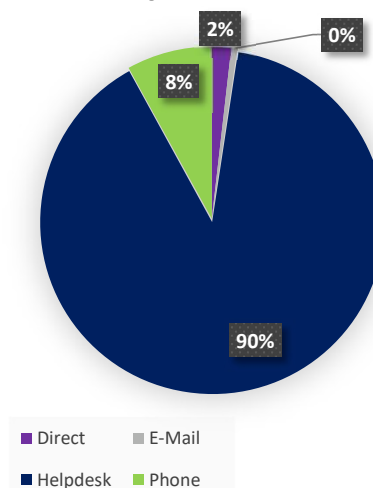

# CASOS GLPI MES JUNIO

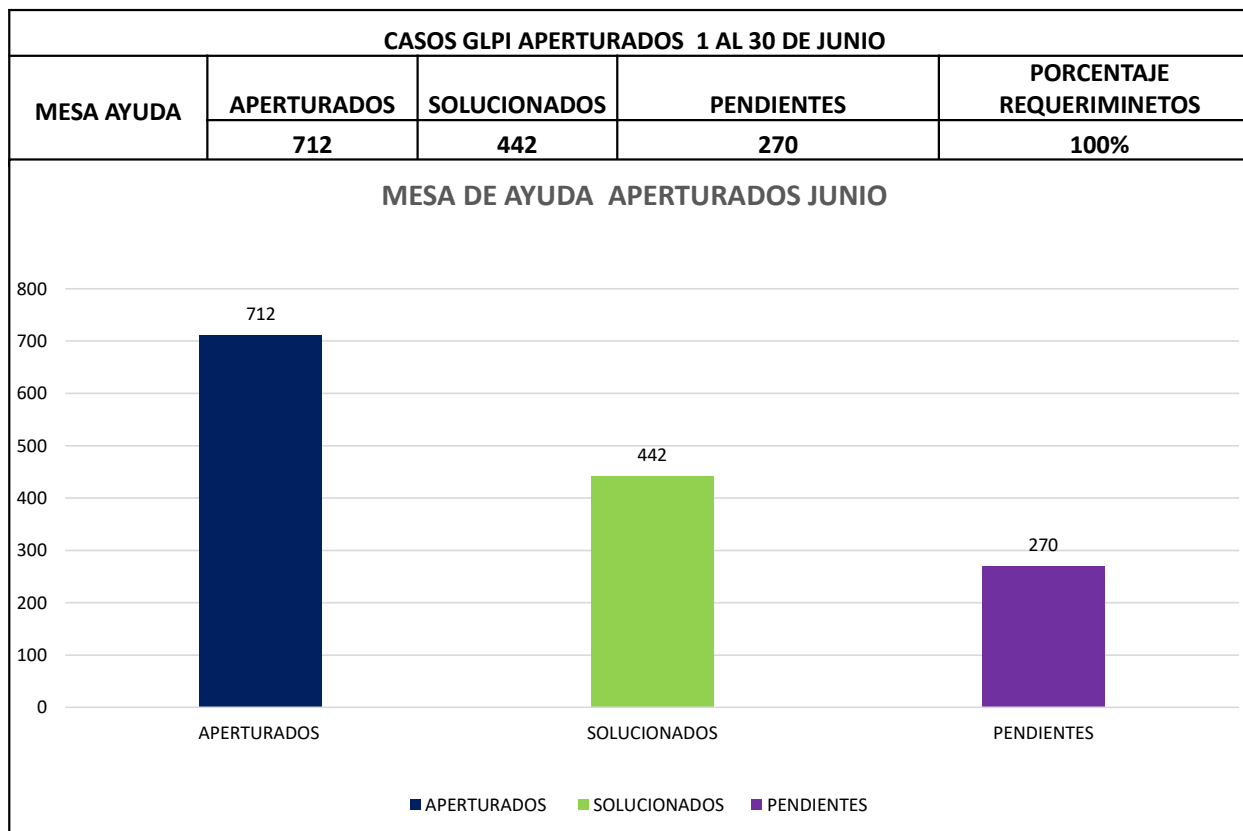

- ✓ La Mesa de Ayuda gestionó el 100% de los 712 casos registrados durante junio.
- ✓ El 62% (442 casos) fue resuelto directamente por la Mesa de Ayuda de acuerdo a su alcance de operación.
- ✓ El 38% (270 casos) fue canalizado y asignado a los aliados responsables para su atención especializada, garantizando la continuidad del servicio y el seguimiento de todos los requerimientos.

# CASOS PENDIENTES GLPI MES JUNIO

| ID   | Título                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6578 | Nodo subregional norte sin visual de cámaras Valdivia                                       |
| 6572 | Yali sin visual de 9 cámaras                                                                |
| 6567 | Lentitud envío de casos SECAD                                                               |
| 6545 | Falla crítica en servidor - Mutata                                                          |
| 6540 | Novedades Cámaras Entornos educativos                                                       |
| 6537 | Yarumal 8 cámaras sin video                                                                 |
| 6536 | Lentitud envío de casos SECAD                                                               |
| 6535 | Revisión canal de datos SIES D - DEANT                                                      |
| 6532 | Solicitud de direccionamiento IP -- EDS Mutata (IE Mutata / Placa Polideportiva Cabecera M) |
| 6531 | Solicitud de direccionamiento de red -- CCTV Municipio de Mutata Cto 704-2025               |
| 6494 | Video                                                                                       |
| 6486 | Integrar cámaras, municipio Heliconia                                                       |
| 6485 | Integrar cámara municipio de Salgar                                                         |
| 6482 | Llamadas robotizadas/degradadas                                                             |
| 6464 | Llamadas robotizadas/degradadas                                                             |
| 6462 | Validar equipos HERTA, Santa Fe                                                             |
| 6461 | Integración cámaras Santa Fe                                                                |
| 6457 | Novedad Visual Cámaras entornos Educativos                                                  |
| 6448 | Servidor fuera de línea, municipio La Pintada                                               |
| 6442 | Cámara "Alcaldía" sin visual, Cañasgordas                                                   |
| 6419 | Solicitud de contraseña para el joystick                                                    |
| 6398 | Sin llamadas en la línea 123                                                                |
| 6395 | Intermitencia en las llamadas y de Microsoft                                                |
| 6849 | Novedad cámara municipio Caldas PC22 SALA MONITOREO                                         |
| 6848 | Novedad cámara municipio Caldas PC21 BARRIO OLAYA HERRERA PTZ                               |
| 6847 | Novedad cámara municipio Caldas PC21 BARRIO OLAYA HERRERA LENTE 4 CL127 CR 49               |
| 6846 | Novedad cámara municipio Caldas PC21 BARRIO OLAYA HERRERA LENTE 3 CL127 CR 49               |
| 6845 | Novedad cámara municipio Caldas PC21 BARRIO OLAYA HERRERA LENTE 2 CL127 CR 49               |
| 6844 | Novedad cámara municipio Caldas PC21 BARRIO OLAYA HERRERA LENTE 1 CL127 CR 49               |
| 6843 | Novedad cámara municipio Caldas PC20 PARQUE SANTO PAN PTZ CR50 CON CLL 129 SUR              |
| 6842 | Novedad cámara municipio Caldas PC20 PARQUE SANTO LENTE 4 CR50 CON CLL 129 SUR              |
| 6841 | Novedad cámara municipio Caldas PC20 PARQUE SANTO LENTE 3 CR50 CON CLL 129 SUR              |
| 6840 | Novedad cámara municipio Caldas PC20 PARQUE SANTO LENTE 2 CR50 CON CLL 129 SU               |
| 6839 | Novedad cámara municipio Caldas PC20 PARQUE SANTO LENTE 1 CR50 CON CLL 129 SUR              |
| 6838 | Novedad cámara municipio Caldas PC19 PARQUE FELIPE 3 CR 47 CL 136 SUR                       |
| 6837 | Novedad cámara municipio Caldas PC18 PARQUE FELIPE 2 CR 46 CL 136                           |
| 6836 | Novedad cámara municipio Caldas PC17 PARQUE FELIPE 1 CR 47 CL 136 SUR                       |
| 6835 | Novedad cámara municipio Caldas PC16 PARQUE BOTICA PTZ CR 50 CL 130 SUR                     |
| 6834 | Novedad cámara municipio Caldas PC16 PARQUE BOTICA LENTE 4 CR 50 CL 130 SUR                 |
| 6825 | Novedad cámara municipio Caldas PC16 PARQUE BOTICA LENTE 3 CR 50 CL 130 SUR                 |
| 6824 | Novedad cámara municipio Caldas PC16 PARQUE BOTICA LENTE 2 CR 50 CL 130 SUR                 |
| 6822 | Novedad cámara municipio Caldas PC16 PARQUE BOTICA LENTE 1 CR 50 CL 130 SUR                 |
| 6821 | Novedad cámara municipio Caldas PC15 PARQUE ALCALDIA LENTE 4 CR49 CON CLL 130 SUR           |
| 6820 | Validar red MPLS del Municipio de San Rafael                                                |
| 6819 | Novedad cámara municipio Caldas PC15 PARQUE ALCALDIA LENTE 3 CR49 CON CLL 130 SUR           |
| 6818 | Novedad cámara municipio Caldas PC15 PARQUE ALCALDIA LENTE 2 CR49 CON CLL 130 SUR           |
| 6817 | Novedad cámara municipio Caldas PC15 PARQUE ALCALDIA LENTE 1 CR49 CON CLL 130 SUR           |
| 6816 | Novedad cámara municipio Caldas PC15 PARQUE ALCALDIA PTZ CR49 CON CLL 130 SUR               |
| 6815 | Novedad cámara municipio Caldas PC14 PARQUE HABITAT CR 50 CL 145 SUR                        |
| 6814 | Novedad cámara municipio Caldas PC13 MANDALAY 2 CR 50 143 SUR                               |

| ID   | Título                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6813 | Novedad cámara municipio Caldas PC12 MANDALAY 1 CR 50 CL 140 SUR                      |
| 6812 | Novedad cámara municipio Caldas PC11 LOGERIA PTZ CL 130 CR 54                         |
| 6811 | Novedad cámara municipio Caldas PC11 LOGERIA LENTE 4 CL 130 CR 54                     |
| 6802 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "I.E SAN LUIS GONSAGA EES CAM 1"       |
| 6801 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "I.E SAN LUIS GONSAGA EES CAM 2        |
| 6800 | Novedad cámara municipio Caldas PC11 LOGERIA LENTE 3 CL 130 CR 54                     |
| 6799 | Novedad cámara municipio Caldas PC11 LOGERIA LENTE 2 CL 130 CR 54                     |
| 6798 | Novedad cámara municipio Calda PC11 LOGERIA LENTE 1 CL 130 CR 54                      |
| 6797 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "N.7. I.T SANTA QUESUDOS 2"            |
| 6796 | Novedad cámara municipio Caldas PC10 LA RIVERA PTZ CL 138SUR CR 47A                   |
| 6795 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "N.7. I.T SANTA QUESUDOS 1"            |
| 6794 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "N.6. I.T DISTRIBUIDORA PPC            |
| 6793 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "N.3 I. T CASA SOLARIEGA 3"            |
| 6792 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "N.3 I. T CASA SOLARIEGA 2"            |
| 6791 | Novedad cámara municipio SANTA FE DE ANTIOQUIA "N.3 I. T CASA SOLARIEGA 1"            |
| 6790 | Novedad cámara municipio de SANTA FE DE ANTIOQUIA N. 2 CONCEJO SANTA FE"              |
| 6789 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO EDS GENEVEVA DIAZ"                              |
| 6788 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 15 GUAYACANES"                              |
| 6787 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 14 CANCHA SINTETICA"                        |
| 6786 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 12. SALA 2"                                 |
| 6785 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 12. SALA 1"                                 |
| 6784 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 11 PARQUE PRINCIPAL"                        |
| 6783 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 10. LETICIA"                                |
| 6782 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 9. LA RAYA"                                 |
| 6781 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 8. LA PLAYA"                                |
| 6780 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 7. ARA CARRERA 10"                          |
| 6779 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 6. INGRESO COMANDO"                         |
| 6778 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO "N. 5. ÉXITO BANCO AGRARIO"                     |
| 6777 | Novedad cámara municipio SAN JERONIMO N. 4 D1"                                        |
| 6776 | Novedad Municipio SAN JERONIMO "N.1. ALCALDIA"                                        |
| 6775 | Novedad Camara municipio de LIBORINA "S DVR POLICIA"                                  |
| 6774 | Novedad cámara municipio FRONTINO "I.E ESCUELA SUPERIOR MIGUEL ANGEL ALVAREZ CAM 2"   |
| 6773 | Novedad Camara municipio de FRONTINO "I.E ESCUELA SUPERIOR MIGUEL ANGEL ALVAREZ CAM 1 |
| 6772 | Novedad cámara municipio de EBEJICO "ENTRADA MEDELLIN"                                |
| 6771 | Novedad cámara municipio DABEIBA "CAMARA 2 (SIN NOMBRE)"                              |
| 6770 | Novedad Camara municipio de DABEIBA "I.E JUAN ENRIQUE WHIT CAM 2                      |
| 6769 | Novedad cámara municipio DABEIBA "I.E JUAN ENRIQUE WHIT CAM 1"                        |
| 6768 | Novedad cámara municipio CAÑASGORDAS "PC 04 ALCALDIA"                                 |
| 6767 | Novedad cámara municipio Caldas PC31 BOMBA ESSO                                       |
| 6766 | Novedad cámara municipio Caldas PC9 LA PLAYITA PTZ                                    |
| 6765 | Novedad cámara CAÑASGORDAS "I PC 02 LA ESPERANZA"                                     |
| 6764 | Novedad cámara municipio Caldas PC28 CONSUMO                                          |
| 6763 | Novedad cámara municipio Caldas COLUSEO LA PLAYITA                                    |
| 6762 | Novedad cámara municipio CAICEDO "I.E SAN JUAN BOSCO CAM 2"                           |
| 6761 | Novedad Camara Municipio CAICEDO "I.E SAN JUAN BOSCO CAM 1                            |
| 6760 | Novedad cámara municipio Caldas PC8 INMACULADA CR49 CLL120SUR                         |
| 6759 | Novedad Camara Municipio BURITICA "REC. FACIAL PARQUE PRINCIPAL"                      |
| 6758 | Novedad cámara municipio Caldas PC7 HOSPITAL PTZ CR49 CL 135 SUR                      |
| 6757 | Novedad cámara municipio Caldas PC7 HOSPITAL LENTE 4 CR49 CL 135 SUR                  |
| 6756 | Novedad cámara municipio BURITICA "PTZ SABANITAS"                                     |

| ID   | Título                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6755 | Novedad cámara municipio Caldas PC7 HOSPITAL LENTE 3 CR49 CL 135 SUR                    |
| 6754 | Novedad cámara municipio ANZA "I.T ENTRADA COLEGIO"                                     |
| 6753 | Novedad cámara municipio Caldas PC7 HOSPITAL LENTE 2 CR49 CL 135 SUR                    |
| 6752 | Novedad cámara municipio Caldas PC7 HOSPITAL LENTE 1 CR49 CL 135 SUR                    |
| 6751 | Novedad cámara municipio ANZA "I.T PASILLO COLEGIO"                                     |
| 6750 | Novedad cámara municipio Caldas PC6 HABITAR SUR PTZ CR52 CON CLL 143 SUR                |
| 6749 | Novedad cámara municipio ANZA "I.E ANZA                                                 |
| 6748 | Novedad cámara municipio Caldas PCS ESTADIO PLATILLO 4                                  |
| 6747 | Novedad cámara municipio Caldas PCS ESTADIO PLATILLO 3                                  |
| 6746 | Novedad cámara municipio Caldas PCS ESTADIO PLATILLO 2                                  |
| 6745 | Novedad cámara municipio Caldas PCS ESTADIO PLATILLO 1                                  |
| 6744 | Novedad cámara municipio Caldas PCS ESTADIO PARQUEADERO CR 46 CL 132 SUR                |
| 6743 | Novedad cámara municipio Caldas PC3 PLANTA LA VIRGEN                                    |
| 6742 | Novedad cámara municipio Caldas PC3 CRISTOREY CR54 CLL 135A SUR                         |
| 6741 | Novedad cámara municipio Caldas PC2 BANCO CAJA SOCIAL CR51 CON CLL 129 SUR              |
| 6740 | Novedad cámara municipio Caldas PC24 CALLE COMERCIO                                     |
| 6739 | Novedad cámara municipio Caldas LPR6 GR48 X CLL 107 SUR - LA RAYA                       |
| 6738 | Novedad cámara municipio Caldas LPR13 CR 45 CL 134 COLISEO ENTRADA VARIANTE - C-2       |
| 6737 | Novedad cámara municipio Caldas LPR12 CR 45 CL 134 COLISEO SALIDA VARIANTE - C-2        |
| 6736 | Novedad cámara municipio Caldas LPR7 CR 48 X CLL 128 SUR                                |
| 6735 | Novedad cámara municipio Caldas CAL-LPR-8-CR50 #107 SUR-LA RAYA                         |
| 6734 | Novedad cámara municipio Caldas CAL-LPR-4-CR50 # 125 SUR                                |
| 6733 | Novedad cámara municipio Caldas CAL-LPR-2-CLL 128 SUR CRR 45 ENTRADA PUENTE BOTERO      |
| 6732 | Novedad cámara municipio Barbosa LPR EL PORVENIR                                        |
| 6731 | Novedad cámara municipio Barbosa LPR KIMBERLY 2                                         |
| 6730 | Novedad Camara N° 33 LPR KIMBERLY 1, en el municipio de BARBOSA                         |
| 6729 | Novedad Camara N° 28 LPR VÍA CONCEPCIÓN, ubicada en el municipio de BARBOSA             |
| 6728 | Novedad cámara N° 29 CAS, ubicada en el municipio de BARBOSA                            |
| 6727 | Novedad Camara N° 25 CÁMARA 19, ubicada en el municipio de BARBOSA                      |
| 6726 | Novedad camras N° 24 CÁMARA 18, ubicada en el municipio de BARBOSA                      |
| 6725 | Novedad Cámaras N° 20 CÁMARA 14, ubicada en el municipio de BARBOSA                     |
| 6724 | Novedad camara N° 19 CÁMARA 13, de BARBOSA                                              |
| 6723 | Novedad Camara N° 13 CÁMARA 5, ubicada en el municipio de BARBOSA                       |
| 6722 | Novedad cámara municipio Amalfi Parque1 Fija 2                                          |
| 6721 | Novedad Camaras N° 10 CÁMARA 2, ubicada en el municipio de BARBOSA                      |
| 6720 | Novedad camras N° 8 CÁMARA 8, ubicada en el municipio de BARBOSA                        |
| 6719 | Novedad cámara municipio de Amalfi Jardín Bot PTZ Estado                                |
| 6718 | novedad camra N° 6 LPR 5 GLORIETA LA MONTAÑA, ubicada en el municipio de BARBOSA        |
| 6717 | Novedad cámara municipio de Amalfi Aeropuerto Fija2                                     |
| 6716 | Novedad Camras N° 5 LPR 4 GLORIETA LA MONTAÑA, ubicada en el municipio de BARBOSA,      |
| 6715 | Novedad cámara municipio Amalfi Aeropuerto Fija 1                                       |
| 6714 | Novedad Camara N° 4 LPR LAVADEROS, ubicada en el municipio de BARBOSA                   |
| 6713 | Novedad Camara N° 3 LPR LA AVENIDA 2, ubicada en el municipio de BARBOSA                |
| 6712 | Bloqueo a navegación libre en internet                                                  |
| 6711 | Novedad cámara municipio de Barbosa N° 2 LPR LA AVENIDA 1,                              |
| 6707 | Novedad municipio Barbosa N° 1 LPR LOS ABUELOS                                          |
| 6706 | Falla en el ingreso de las llamadas                                                     |
| 6704 | solicitud revisión y configuración de IP repetidor GTR8000 estación de policía Valdivia |
| 6702 | Municipio de Guatapé sin visual de las Cámaras en el Nodo                               |
| 6699 | Camara intermitente municipio de Maceo                                                  |



# CASOS PENDIENTES GLPI MES JUNIO

| ID   | Título                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6697 | Camara Caracoli sin señal                                                                            |
| 6696 | Novedad cámara municipio Caracoli I.E. GABRIELA CORREA VELEZ 1                                       |
| 6695 | Camara cuatro esquinas no se puede operar                                                            |
| 6694 | Camara comercio sin poder operar                                                                     |
| 6692 | Camara Yondo sin señal                                                                               |
| 6691 | Camara Yondo sin señal                                                                               |
| 6690 | Novedad Cámara municipio Yondó San Miguel del tigre cam 1                                            |
| 6689 | Camara Yondo sin señal                                                                               |
| 6688 | Camara Yondo sin señal                                                                               |
| 6687 | Camara Yondo sin señal                                                                               |
| 6686 | Novedad cámara municipio de Yondo Calle Central Comercio                                             |
| 6685 | Novedad cámara municipio de Yondo Parque principal                                                   |
| 6679 | Municipio de La Pintada sin conectividad                                                             |
| 6670 | Amalfi sin visual cámaras parque 2                                                                   |
| 6668 | CAMARAS SIN CONEXION                                                                                 |
| 6665 | Segovia puerta nodo subregional mala                                                                 |
| 6657 | Cámara del municipio de Santuario, sin video                                                         |
| 6628 | Lentitud envio de casos SECAD                                                                        |
| 6314 | Contraseña equipo Andes                                                                              |
| 6302 | Municipio de Granada sin visual de 3 Cámaras                                                         |
| 6954 | Alerta en servidor de Amaga                                                                          |
| 6950 | Segovia videowall con fallas en imagen                                                               |
| 6949 | Aire acondicionado bloqueado sala de operadores, policía, sala de descanso y rack                    |
| 6948 | SOLICITUD REVISION SERVICIO DE RED VOZ CONSOLA DE RADIOS NODO DEPARTAMENTAL                          |
| 6946 | Validar cámaras de Amagá                                                                             |
| 6945 | Camara de la alcaldía se queda pegada                                                                |
| 6935 | Novedad cámara municipio Itagüí 117-CARMELO ZONA INDUSTRIAL ANTES DE D1 CL 76 CR 48 - C-9            |
| 6934 | Novedad cámara municipio Itagüí 108-PORVENIR CANCHA SINTETICA CR 58 CL 85 - C-4                      |
| 6933 | Novedad cámara municipio Itagüí 062-LA MARIA PARTE ALTA - C-16                                       |
| 6932 | Novedad cámara municipio Itagüí 041-SANTA MARIA TALLERES MOTOS CR 52 CL 68 - C-30                    |
| 6931 | Novedad cámara municipio Itagüí 032-LA CRUZ INGRESO POR AUTOPISTA CR 41 CL 54 - C-29                 |
| 6930 | Novedad cámara municipio Itagüí 016-SAN ISIDRO SUBIDA PUENTE NUEVO DE PILSEN PTZ CR 50A CL 40 - C-21 |
| 6929 | Novedad cámara municipio Itagüí 016-SAN ISIDRO SUBIDA PUENTE NUEVO DE PILSEN F2 CR 50A CL 40 - C-21  |
| 6928 | Novedad cámara municipio Itagüí 016-SAN ISIDRO SUBIDA PUENTE NUEVO DE PILSEN F1 CR 50A CL 40 - C-21  |
| 6927 | Novedad cámara municipio Sabaneta ESTACION POLICIA PARQUEADERO CR 47D CL 78C SUR C 3-6               |
| 6926 | Novedad cámara municipio Sabaneta 263 - SAB-LPR-1-CATALAN SUR-NORTE 2 CR 43A CL 61 SUR C 3-8         |
| 6925 | Novedad cámara municipio Sabaneta 247 - LPR PACHO PINTURA                                            |
| 6924 | Novedad cámara municipio Sabaneta 253 - LPR ZARATOGA                                                 |
| 6923 | Novedad cámara municipio Sabaneta 252 - LPR CRISTI                                                   |
| 6922 | Novedad cámara municipio Sabaneta 250 - LPR PIZZA LOCA                                               |
| 6921 | Novedad cámara municipio Sabaneta 249 - LPR SUR NORTE DOMINOS PIZZA                                  |
| 6920 | Novedad cámara municipio Sabaneta 240 - LPR D1 CL 60 SUR                                             |
| 6919 | Novedad cámara municipio Sabaneta 243 - LPR CANCHA RESTREPO NARANJO                                  |
| 6918 | Novedad cámara municipio Sabaneta 246 - LPR TADA                                                     |
| 6917 | Novedad cámara municipio Sabaneta 223 - PLAYAS DE MARIA                                              |
| 6916 | Novedad cámara municipio Sabaneta 244 - LPR CANARIAS                                                 |
| 6912 | Solicitud cambio de contraseña                                                                       |
| 6909 | Novedad cámara municipio Sabaneta 169 - LPR MARIA AUXILIADORA SUBIDA CL 56 SUR CR 40 C 3-3           |
| 6908 | Novedad cámara municipio Sabaneta 157 - LOMA LINDA PTZ CR 43A CL 70 SUR C 3-3                        |
| 6907 | Novedad cámara municipio Sabaneta 168 - LPR MARIA AUXILIADORA BAJADA CL 56 SUR CR 40 C 3-3           |

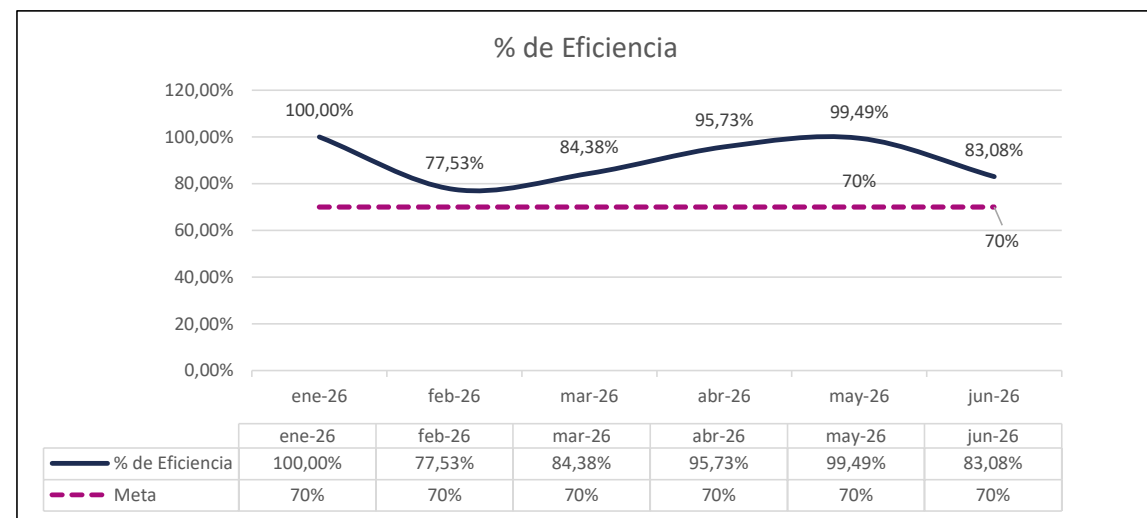
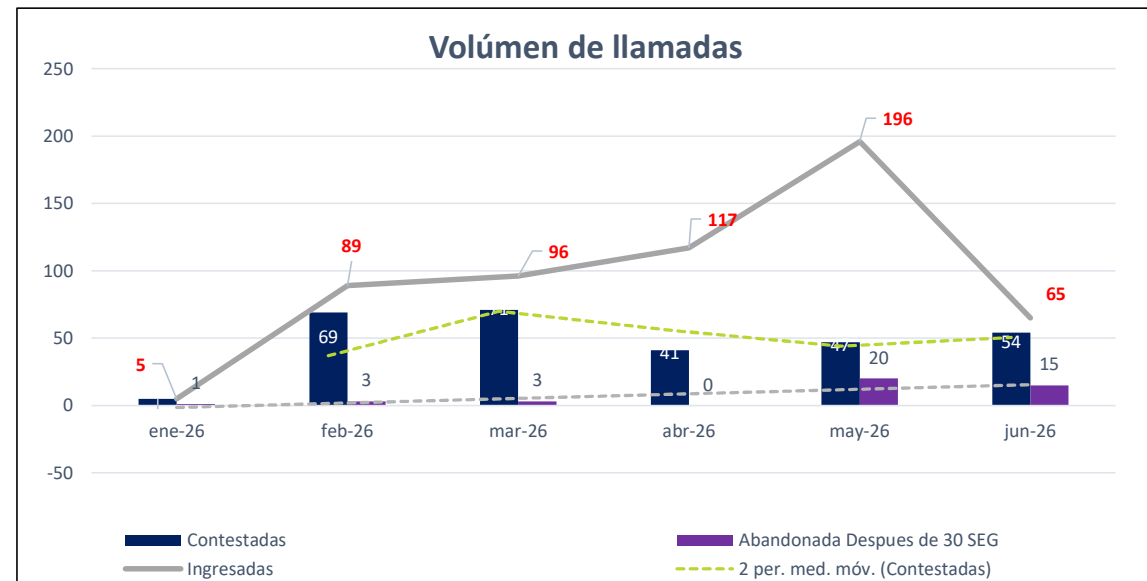
| ID   | Título                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 6856 | Novedad cámara municipio Caldas PC32 LA SALLISTA               |
| 6855 | Novedad cámara municipio Caldas PC30 FISCALIA                  |
| 6854 | Novedad cámara municipio Caldas PC26 CEMENTERIO                |
| 6853 | Novedad cámara municipio Caldas PC37 LOS CEREZOS CL 143 CR 48  |
| 6852 | Novedad cámara municipio Caldas PC29 SONI Y SORBO              |
| 6851 | Novedad cámara municipio Caldas PC25 TRIGALIA 1                |
| 6850 | Novedad cámara municipio Caldas PC23 COLEGIO JOSE MARIA BERNAL |
| 6284 | Activacion camaras LPR en monitor # 9                          |
| 6279 | Red municipio Sabanalarga                                      |
| 6276 | No se visualiza cámara del municipio de Arboletes              |
| 6261 | Servidor HERTA presenta fallas                                 |
| 6252 | Solicitud activación sistema operativo                         |
| 6291 | Cámaras sin visual, municipio de Betulia                       |
| 6289 | Cámara "EL COMANDO" sin grabación, municipio de Buriticá       |
| 6283 | Camara sin visual municipio de Betania                         |
| 6278 | Novedades Visual Cámaras Entornos Educativos.                  |
| 6275 | Camaras del municipio de San francisco, sin visual             |
| 6258 | Reporte novedad en configuración TOUR y PRESET CARACOLÍ        |
| 6257 | Reporte novedad en configuración TOUR y PRESET VEGACHÍ         |
| 6256 | Reporte novedad en configuración TOUR y PRESET CAÑASGORDAS     |

| ID   | Título                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6906 | Novedad cámara municipio Sabaneta 157 - LOMA LINDA V2 CR 43A CL 70 SUR C 3-3                   |
| 6905 | Novedad cámara municipio Sabaneta 157 - LOMA LINDA V1 CR 43A CL 70 SUR C 3-3                   |
| 6904 | Novedad cámara municipio Sabaneta 112 - SEPARADOR RIO SECRETO V2 CL 78C SUR CR 47E C 3-6       |
| 6903 | Novedad cámara municipio Sabaneta 103 - RESALTOS PTZ CR 49 CL 80 SUR C 3-6                     |
| 6902 | Novedad cámara municipio Sabaneta 134 - MARIA AUXILIADORA MEDIA V1 CR 40B CL 56 SUR C 3-3      |
| 6901 | Novedad cámara municipio Sabaneta 134 - MARIA AUXILIADORA MEDIA V1 CR 40B CL 56 SUR C 3-3      |
| 6900 | Novedad cámara municipio Sabaneta 134 - MARIA AUXILIADORA MEDIA PTZ CR 40B CL 56 SUR C 3-3     |
| 6899 | Novedad cámara municipio Sabaneta 103 - RESALTOS V1 CR 49 CL 80 SUR C 3-6                      |
| 6898 | Novedad cámara municipio Sabaneta 112 - SEPARADOR RIO SECRETO PTZ CL 78C SUR CR 47E C 3-6      |
| 6897 | Novedad cámara municipio Sabaneta 112 - SEPARADOR RIO SECRETO V1 CL 78C SUR CR 47E C 3-6       |
| 6896 | Novedad cámara municipio Sabaneta 103 - RESALTOS V2 CR 49 CL 80 SUR C 3-6                      |
| 6895 | Novedad cámara municipio Sabaneta 113 - COMANDO EXTERNO BODEGA PTZ CL 80 SUR CR 47D C 3-6      |
| 6894 | Novedad cámara municipio Sabaneta 113 - COMANDO EXTERNO BODEGA V2 CL 80 SUR CR 47D C 3-6       |
| 6893 | Novedad cámara municipio Sabaneta 123 - MARIA AUX INSPECCON PTZ CL 56 SUR CR 40 C 3-3          |
| 6892 | Novedad cámara municipio Sabaneta 123 - MARIA AUX INSPECCON V1 CL 56 SUR CR 40 C 3-3           |
| 6891 | Novedad cámara municipio Sabaneta 113 - COMANDO EXTERNO BODEGA V1 CL 80 SUR CR 47D C 3-6       |
| 6890 | Novedad cámara municipio Sabaneta 123 - MARIA AUX INSPECCON V2 CL 56 SUR CR 40 C 3-3           |
| 6889 | Novedad cámara municipio Sabaneta 071 - INDUGEVI PTZ CR 43A CL 57 SUR C 3-2                    |
| 6888 | Novedad cámara municipio Sabaneta 071 - INDUGEVI V1 CR 43A CL 57 SUR C 3-2                     |
| 6887 | Novedad cámara municipio Sabaneta 071 - INDUGEVI V2 CR 43A CL 57 SUR C 3-2                     |
| 6886 | Novedad cámara municipio Sabaneta 014 - BAJADA LOMITAS - LAS BRISAS V1 CR 30B CL 61 SUR C 3-4  |
| 6885 | Novedad cámara municipio Sabaneta 014 - BAJADA LOMITAS - LAS BRISAS V2 CR 30B CL 61 SUR C 3-4  |
| 6884 | Novedad cámara municipio Sabaneta 014 - BAJADA LOMITAS - LAS BRISAS PTZ CR 30B CL 61 SUR C 3-4 |
| 6883 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 1-VEREDA MANGA ARRIBA- SALON COMUNAL               |
| 6882 | Novedad cámara municipio Girardota Domo- SALON COMUNAL JAMUNDI                                 |
| 6881 | Novedad cámara municipio Girardota Domo-VEREDA MANGA ARRIBA-ALCATRAZ                           |
| 6880 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 7-BARRIO AURELIO-Calle 3-Cra 14A.                  |
| 6879 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 5-BARRIO AURELIO-Calle 3-Cra 14A.                  |
| 6878 | Novedad cámara municipio Girardota Domo- Barrio JUAN XIII CENTENARIO                           |
| 6877 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 3-CALLEJON LOS CARMONAS-Calle 3A                   |
| 6876 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 4-BARRIO LA NUEVA IGLESIA-Cra 17-Calle 12          |
| 6875 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 1-BARRIO SANTA ANA- SALON COMUNAL                  |
| 6874 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 1-LLANO AZUL-MANGA JUANCOLO                        |
| 6873 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 3-GUAYACANES PARTE ALTA-Calle 6B                   |
| 6872 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 1-GUAYACANES PARTE ALTA-Calle 6B                   |
| 6871 | Novedad cámara municipio Girardota Domo- BARRIO GUAYACANES                                     |
| 6870 | Novedad cámara municipio Girardota G1R Fija 2- PARQUE CATEDRAL-Calle 7- Cra 15                 |
| 6869 | Novedad cámara municipio Caldas PUENTE BOTERO PTZ                                              |
| 6868 | Novedad cámara municipio Caldas PLAYITAMS4                                                     |
| 6867 | Novedad cámara municipio Caldas PLAYITAMS3                                                     |
| 6866 | Novedad cámara municipio Caldas PLAYITAMS2                                                     |
| 6865 | Novedad cámara municipio Caldas PLAYITAMS                                                      |
| 6864 | Novedad cámara municipio Caldas PC34 PUENTE BOTERO LENTEN 3                                    |
| 6863 | Novedad cámara municipio Caldas PC34 PUENTE BOTERO LENTE 4                                     |
| 6862 | Novedad cámara municipio PC34 PUENTE BOTERO LENTE 2                                            |
| 6861 | Novedad cámara municipio Caldas PC 39 LA MIEL                                                  |
| 6860 | Novedad cámara municipio Caldas PC 27 LA Y PRIMAVERA                                           |
| 6859 | Novedad cámara municipio Caldas PC35 VILLA CAPRI                                               |
| 6858 | Novedad cámara municipio Caldas PC4 PARQUE DE LAS 3 AGUAS                                      |
| 6857 | Novedad cámara municipio Caldas PC1 COMANDO DE POLICIA                                         |



# Comportamiento del Servicio Proyectado

- ✓ Durante el mes de junio de 2026 se registró una reducción en el volumen de llamadas ingresadas, evidenciando una tendencia en la atención de este medio. La mesa de ayuda mantuvo un desempeño adecuado en la atención de los casos.
- ✓ En términos de eficiencia, para el mes de junio de 2026 se alcanzó un 83,08 %, superando la meta establecida del 70 %, lo que demuestra una gestión efectiva del servicio incluso bajo un escenario de mayor carga operativa como lo fue el mes de junio.




# Casos Por Categoría Más Relevantes Mes Proyectado

Valor



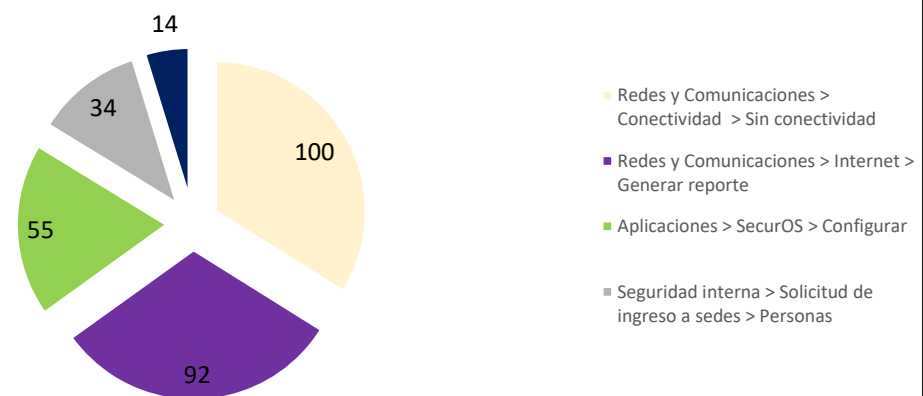Casos por categoría más relevantes




# MÉTRICAS DEL SERVICIO MESA DE AYUDA



# Cumplimiento de Incidentes Mesa de ayuda

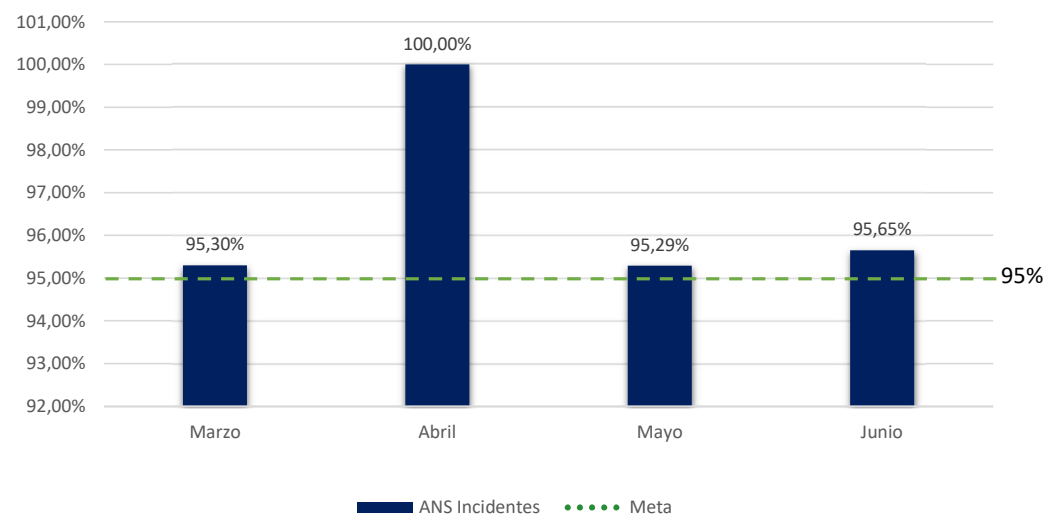Historico Cumplimiento Incidentes



- ✓ En junio, el ANS de atención de incidentes alcanzó un 95,65 %, manteniéndose por encima de la meta establecida del 95 % y presentando un leve incremento de 1,65 puntos porcentuales frente al mes de mayo. Este resultado evidencia la estabilidad en la prestación del servicio y la capacidad de la mesa de ayuda para mantener los niveles de cumplimiento esperados, garantizando una atención oportuna y efectiva de los incidentes reportados.



Métricas del Servicio


CONECTIVIDAD

Valor





# CONECTIVIDAD



Casos  
aperturados

95

Casos  
cerrados

93

Cumplimiento

31%

# ANEXU

Casos  
aperturados

13

Casos  
cerrados

13

Municipios  
reincidentes

- Sin reincidencias

Cumplimiento  
38,4%



# MEDIA COMMERCE

Casos  
aperturados

39

Casos  
cerrados

38

Municipios  
reincidentes

- Donmatías: 10
- San Francisco: 3
- Santa Rosa: 3

Cumplimiento

38,6%



# ELATIN



Casos  
aperturados

40

Casos  
cerrados

40

Municipios  
reincidentes

- Vegachí: 5
- Yalí: 3
- Ciudad Bolívar: 2

Cumplimiento

22,5%



# TELEFONICA

Casos  
aperturados

3

Casos  
cerrados

3

Municipios  
reincidentes

- Arboletes: 2

Cumplimiento

100%

# MUNICIPIOS CON INDISPONIBILIDAD DE CONECTIVIDAD MES DE JUNIO

| MUNICIPIOS            | TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JUNIO |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ALIADO: ELATIN        | DIAS CAIDO                                                 | TOTAL DIAS |
| AMAGA                 | 2,17                                                       | 2          |
| AMALFI                | 14,15,16,17,18,19,20,21,22                                 | 9          |
| ANGOSTURA             | 6,16,29,30                                                 | 4          |
| BETANIA               | 8,15,23                                                    | 3          |
| CAÑASGORDAS           | 4                                                          | 1          |
| CIUDAD BOLIVAR        | 7,8,9,10,25                                                | 5          |
| CONCORDIA             | 16                                                         | 1          |
| PEÑOL                 | 24                                                         | 1          |
| PUERTO NARE           | 23                                                         | 1          |
| REMEDIOS              | 10                                                         | 1          |
| SALGAR                | 15                                                         | 1          |
| SAN LUIS              | 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24                           | 11         |
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | 4                                                          | 1          |
| VALPARAISO            | 5                                                          | 1          |
| VEGACHI               | 14,22                                                      | 2          |
| YALI                  | 2,3,14                                                     | 3          |

| MUNICIPIOS        | TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JUNIO |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ALIADO: TELFÓNICA | DIAS CAIDO                                                 | TOTAL DIAS |
| ANGELOPOLIS       | 21                                                         | 1          |
| ARBOLETES         | 11,24                                                      | 2          |
| SAN JERONIMO      | 1.....30                                                   | 30         |
| ZARAGOZA          | 12,13,14,15,16,17                                          | 6          |

| MUNICIPIOS            | TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JUNIO |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ALIADO: MEDIACOMMERCE | DIAS CAIDO                                                 | TOTAL DIAS |
| ARMENIA               | 4                                                          | 1          |
| ABRIAQUI              | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10                                       | 10         |
| BAGRE                 | 4,16                                                       | 2          |
| DON MATIAS            | 1,7,10,12,14,15,19,22,24,26                                | 10         |
| EBEJICO               | 4                                                          | 1          |
| FREDONIA              | 4                                                          | 1          |
| GUARNE                | 4                                                          | 1          |
| HISPANIA              | 4                                                          | 1          |
| LA PINTADA            | 2,3,4,5                                                    | 4          |
| MURINDO               | 4,6,15,20,29                                               | 5          |
| MUTATA                | 4                                                          | 1          |
| NARIÑO                | 18,3                                                       | 2          |
| NECOCLI               | 4,28                                                       | 2          |
| PEQUE                 | 4                                                          | 1          |
| SABANALARGA           | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20         | 20         |
| SAN FRANCISCO         | 4,18,29,30                                                 | 4          |
| SAN JUAN DE URABA     | 4,5                                                        | 2          |
| SAN PEDRO DE URABÁ    | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,20                     | 16         |
| SAN VICENTE           | 4                                                          | 1          |
| SANTA BARBARA         | 4                                                          | 1          |
| TARZO                 | 4,28                                                       | 2          |
| VALDIVIA              | 4                                                          | 1          |
| VIGIA DEL FUERTE      | 1.....30                                                   | 30         |

| MUNICIPIOS    | TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE JUNIO |            |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| ALIADO: ANEXU | DIAS CAIDO                                                 | TOTAL DIAS |
| BARBOSA       | 9,18,19                                                    | 3          |
| CARAMANTA     | 5                                                          | 1          |
| GUATAPE       | 4                                                          | 1          |

|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                              |                                         |                                                           |                                         |                                               |                                |                                           |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--|
| <div></div> <div>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</div> <div>República de Colombia</div> |                 | INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                              |                                         |                                                           |                                         |                                               | Código: FO-M8-P6-034           |                                           |                       |  |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                              |                                         |                                                           |                                         |                                               | Versión: 01                    |                                           |                       |  |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                              |                                         |                                                           |                                         |                                               | Fecha de Aprobación:03/12/2024 |                                           |                       |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN                                                                                                                                              |                 | 6/10/2026                                                                        |                                              |                       |            | CONTRATO                                                       |                  | 23MA122C1482                   |                            |                                                         |                               | ENTIDAD ADMINISTRADORA       |                                         |                                                           |                                         |                                               |                                | VALOR+ S.A.S                              |                       |  |
| FECHA DE CORTE : 31 de mayo de 2026                                                                                                                               |                 |                                                                                  |                                              |                       |            | ORGANISMO RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz |                  |                                |                            | VALOR INICIAL DEL PROYECTO : \$ 95.987.738.628          |                               |                              |                                         | COSTO DIRECTO DEL PROYECTO : \$95.987.738.628             |                                         |                                               |                                |                                           |                       |  |
| VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS : \$ 7.823.502.133                                                                                                                  |                 |                                                                                  |                                              |                       |            | VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS: \$ 4.247.909.802            |                  |                                |                            | VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR : \$ 47.937.876.892 |                               |                              |                                         | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE: \$ 45.377.173.493    |                                         |                                               |                                |                                           |                       |  |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR : \$ 39.612.080.344                                                                                                                  |                 |                                                                                  |                                              |                       |            | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                              |                                         | VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS : \$ 0 |                                         |                                               |                                |                                           |                       |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            | DEDUCCIONES                                             |                               |                              |                                         |                                                           |                                         |                                               |                                | RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS |                       |  |
| No.                                                                                                                                                               | FACTURA CLIENTE | NIT DEL PROVEEDOR                                                                | PROVEEDOR                                    | VALOR FACTURA SIN IVA | VALOR IVA  | RETENCIONES PRACTICADAS                                        | RETENCIÓN DE IVA | RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO | ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2% | ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%                         | ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1% | ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4% | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4% | ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%                            | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%) | OTRAS RETENCIONES 0 Contribución Obra Pública | SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR       | MOVIMIENTO EJECUTADO                      | SALDO FINAL EJECUTADO |  |
| 1                                                                                                                                                                 | EG 25176        | 900.969.726                                                                      | VALOR+ Seguridad social abril 2026           | \$ 1.673.100          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.368.358.148              | \$ 1.673.100                              | \$ 40.366.685.048     |  |
| 2                                                                                                                                                                 | EG 25279        | 900.969.726                                                                      | VALOR + Nómina 1ra. Quincena mayo-2026       | \$ 5.062.748          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.366.685.048              | \$ 5.062.748                              | \$ 40.361.622.300     |  |
| 3                                                                                                                                                                 | VE6803          | 71.312.895                                                                       | AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER            | \$ 6.018.784          | -          | -                                                              | -                | -                              | 120.376                    | 36.113                                                  | 60.188                        | 24.075                       | 24.075                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.361.622.300              | \$ 6.018.784                              | \$ 40.355.603.516     |  |
| 4                                                                                                                                                                 | VE6801          | 98.662.485                                                                       | CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO                 | \$ 5.813.084          | -          | -                                                              | -                | -                              | 116.262                    | 34.879                                                  | 58.131                        | 23.252                       | 23.252                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.355.603.516              | \$ 5.813.084                              | \$ 40.349.790.432     |  |
| 5                                                                                                                                                                 | VE6798          | 1.036.607.036                                                                    | GONZALEZ SALAS VILSULY YANETH                | \$ 2.894.225          | -          | -                                                              | -                | -                              | 57.885                     | 17.365                                                  | 28.942                        | 11.577                       | 11.577                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.349.790.432              | \$ 2.894.225                              | \$ 40.346.896.207     |  |
| 6                                                                                                                                                                 | VE6796          | 71.371.308                                                                       | LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY                     | \$ 10.245.473         | -          | 188.000                                                        | -                | -                              | 204.909                    | 61.473                                                  | 102.455                       | 40.982                       | 40.982                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.346.896.207              | \$ 10.245.473                             | \$ 40.336.650.734     |  |
| 7                                                                                                                                                                 | VE6806          | 70.928.328                                                                       | MACIAS VILLA LUIS FERNANDO                   | \$ 8.070.467          | -          | -                                                              | -                | -                              | 161.409                    | 48.423                                                  | 80.705                        | 32.282                       | 32.282                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.336.650.734              | \$ 8.070.467                              | \$ 40.328.580.267     |  |
| 8                                                                                                                                                                 | VE6797          | 1.036.929.677                                                                    | MORALES GALVEZ ALEXANDER                     | \$ 15.527.850         | -          | 1.585.000                                                      | -                | -                              | 310.557                    | 93.167                                                  | 155.279                       | 62.111                       | 62.111                                  | 62.111                                                    | -                                       | -                                             | \$ 40.328.580.267              | \$ 15.527.850                             | \$ 40.313.052.417     |  |
| 9                                                                                                                                                                 | VE6804          | 1.128.456.781                                                                    | PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO              | \$ 6.327.334          | -          | -                                                              | -                | -                              | 126.547                    | 37.964                                                  | 63.273                        | 25.309                       | 25.309                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.313.052.417              | \$ 6.327.334                              | \$ 40.306.725.083     |  |
| 10                                                                                                                                                                | VE6802          | 1.017.194.316                                                                    | RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS                 | \$ 5.813.084          | -          | -                                                              | -                | -                              | 116.262                    | 34.879                                                  | 58.131                        | 23.252                       | 23.252                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.306.725.083              | \$ 5.813.084                              | \$ 40.300.911.999     |  |
| 11                                                                                                                                                                | VE6799          | 1.036.945.181                                                                    | RESTREPO HENAO EDISON ARLEY                  | \$ 10.593.766         | -          | 413.000                                                        | -                | -                              | 211.875                    | 63.563                                                  | 105.938                       | 42.375                       | 42.375                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.300.911.999              | \$ 10.593.766                             | \$ 40.290.318.233     |  |
| 12                                                                                                                                                                | VE6800          | 1.128.422.225                                                                    | RODRIGUEZ CARDONA DANIEL                     | \$ 6.327.334          | -          | -                                                              | -                | -                              | 126.547                    | 37.964                                                  | 63.273                        | 25.309                       | 25.309                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.290.318.233              | \$ 6.327.334                              | \$ 40.283.990.899     |  |
| 13                                                                                                                                                                | VE6805          | 1.045.021.654                                                                    | ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE                  | \$ 9.316.709          | -          | 40.000                                                         | -                | -                              | 186.334                    | 55.900                                                  | 93.167                        | 37.267                       | 37.267                                  | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.283.990.899              | \$ 9.316.709                              | \$ 40.274.674.190     |  |
| 14                                                                                                                                                                | EG 25707        | 91.522.343                                                                       | PRADA ESPARZA CARLOS MARIO                   | \$ 14.823.539         | -          | 865.000                                                        | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.274.674.190              | \$ 14.823.539                             | \$ 40.259.850.651     |  |
| 15                                                                                                                                                                | FEV 394         | 901.777.187                                                                      | ANEXU                                        | \$ 19.744.820         | 3.751.516  | 789.793                                                        | 562.727          | 35.541                         | 394.896                    | 118.469                                                 | 197.448                       | 78.979                       | 78.979                                  | 78.979                                                    | 493.621                                 | -                                             | \$ 40.259.850.651              | \$ 23.496.336                             | \$ 40.236.354.315     |  |
| 16                                                                                                                                                                | 580831457146    | 830.122.566                                                                      | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC  | \$ 11.411.142         | 2.168.117  | -                                                              | -                | -                              | 228.223                    | 68.467                                                  | 114.111                       | 45.645                       | 45.645                                  | 45.645                                                    | 285.279                                 | -                                             | \$ 40.236.354.315              | \$ 13.579.259                             | \$ 40.222.775.056     |  |
| 17                                                                                                                                                                | E6057171124     | 8.000.153.993                                                                    | COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A          | \$ 427.195            | 81.005     | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | 10.680                                  | -                                             | \$ 40.222.775.056              | \$ 508.200                                | \$ 40.222.266.856     |  |
| 18                                                                                                                                                                | BSPE3000988b    | 890.905.065                                                                      | EDATEL S.A.                                  | \$ 47.636.334         | 9.050.904  | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | 1.190.908                               | -                                             | \$ 40.222.266.856              | \$ 56.687.238                             | \$ 40.165.579.618     |  |
| 19                                                                                                                                                                | BSPE3001011     | 890.905.065                                                                      | EDATEL S.A.                                  | \$ 42.104.831         | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.165.579.618              | \$ 42.104.831                             | \$ 40.123.474.787     |  |
| 20                                                                                                                                                                | BSPE3001012     | 890.905.065                                                                      | EDATEL S.A.                                  | \$ 707.022            | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 40.123.474.787              | \$ 707.022                                | \$ 40.122.767.765     |  |
| 21                                                                                                                                                                | FE2377          | 901.705.079                                                                      | EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL         | \$ 953.318            | 181.130    | 33.366                                                         | 27.170           | 1.716                          | 19.066                     | 5.720                                                   | 9.533                         | 3.813                        | 3.813                                   | 3.813                                                     | 23.833                                  | -                                             | \$ 40.122.767.765              | \$ 1.134.448                              | \$ 40.121.633.317     |  |
| 22                                                                                                                                                                | COO4270         | 900.424.944                                                                      | ELATIN S.A.S                                 | \$ 44.595.016         | 8.473.053  | 1.783.801                                                      | 1.270.958        | 80.271                         | 891.900                    | 267.570                                                 | 445.950                       | 178.380                      | 178.380                                 | 178.380                                                   | 1.114.875                               | -                                             | \$ 40.121.633.317              | \$ 53.068.069                             | \$ 40.068.565.248     |  |
| 23                                                                                                                                                                | MECO1481506     | 819.006.966                                                                      | MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S                | \$ 12.661.577         | 2.405.700  | -                                                              | -                | 22.791                         | 253.232                    | 75.969                                                  | 126.616                       | 50.646                       | 50.646                                  | 50.646                                                    | 316.539                                 | -                                             | \$ 40.068.565.248              | \$ 15.067.277                             | \$ 40.053.497.971     |  |
| 24                                                                                                                                                                | VA83795         | 890.401.802                                                                      | PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA | \$ 278.316.811        | 5.288.019  | -                                                              | -                | 500.970                        | 5.566.336                  | 1.669.901                                               | 2.783.168                     | 1.113.267                    | 1.113.267                               | 1.113.267                                                 | 6.957.920                               | -                                             | \$ 40.053.497.971              | \$ 283.604.830                            | \$ 39.769.893.141     |  |
| 25                                                                                                                                                                | BOPU135110757   | 900.092.386                                                                      | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A               | \$ 1.800.000          | 342.000    | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                            | -                                       | -                                                         | 45.000                                  | -                                             | \$ 39.769.893.141              | \$ 2.142.000                              | \$ 39.767.751.141     |  |
| 26                                                                                                                                                                | FELE2625        | 811.030.548                                                                      | VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A.               | \$ 52.600.607         | -          | 1.841.021                                                      | -                | 94.681                         | 1.052.012                  | 315.604                                                 | 526.006                       | 210.402                      | 210.402                                 | 210.402                                                   | 1.315.015                               | -                                             | \$ 39.767.751.141              | \$ 52.600.607                             | \$ 39.715.150.534     |  |
| 27                                                                                                                                                                | FVCC62          | 901.855.719                                                                      | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS            | \$ 86.613.605         | 16.456.585 | 2.165.340                                                      | 2.468.488        | 155.904                        | 1.732.272                  | 519.682                                                 | 866.136                       | 346.454                      | 346.454                                 | 346.454                                                   | 2.165.340                               | -                                             | \$ 39.715.150.534              | \$ 103.070.190                            | \$ 39.612.080.344     |  |

|                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|                                                                                   |  | Total Legalización                                                                  |  | \$ 756.277.804                                   |
| FIRMA SUPERVISOR                                                                  |  | FIRMA CONTADOR-MANDATARIO                                                           |  |                                                  |
|  |  |  |  |                                                  |
| NOMBRE: ANTONIO JOSÉ SALAZAR                                                      |  | C.C.                                                                                |  | NOMBRE: ALVARO ALONSO ARROYAVE URIBE             |
| Correo Electrónico: antiojose.salazar@antioquia.gov.co                            |  | Tel:                                                                                |  | Correo Electrónico: contabilidad@valormas.gov.co |
|                                                                                   |  |                                                                                     |  | C.C.98.639.503                                   |
|                                                                                   |  |                                                                                     |  | Tel: 301 743 4096                                |

|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        |                                                           |                                         |                                               |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|
| <div></div> <div>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</div> <div>República de Colombia</div> |                 | INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        |                                                           |                                         | Código: FO-M8-P6-034                          |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        |                                                           |                                         | Versión: 01                                   |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        |                                                           |                                         | Fecha de Aprobación:03/12/2024                |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN                                                                                                                                              |                 | 10/07/2026                                                                       |                                              |                       |            | CONTRATO                                                       |                  | 23MA122C1482                   |                            |                                                         |                               | ENTIDAD ADMINISTRADORA        |                                        |                                                           |                                         |                                               | VALOR+ S.A.S             |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| FECHA DE CORTE : 30 de JUNIO de 2026                                                                                                                              |                 |                                                                                  |                                              |                       |            | ORGANISMO RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz |                  |                                |                            | VALOR INICIAL DEL PROYECTO : \$ 95.987.738.628          |                               |                               |                                        | COSTO DIRECTO DEL PROYECTO : \$95.987.738.628             |                                         |                                               |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS : \$ 7.823.502.133                                                                                                                  |                 |                                                                                  |                                              |                       |            | VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS: \$ 4.247.909.802            |                  |                                |                            | VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR : \$ 47.937.876.892 |                               |                               |                                        | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE: \$ 46.150.547.578    |                                         |                                               |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR : \$ 38.838.706.259                                                                                                                  |                 |                                                                                  |                                              |                       |            | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        | VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS : \$ 0 |                                         |                                               |                          |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        |                                                           |                                         |                                               | DEDUCCIONES              |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  | RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS |  |  |
| No.                                                                                                                                                               | FACTURA CLIENTE | NIT DEL PROVEEDOR                                                                | PROVEEDOR                                    | VALOR FACTURA SIN IVA | VALOR IVA  | RETENCIONES PRACTICADAS                                        | RETENCIÓN DE IVA | RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO | ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2% | ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%                         | ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1% | ESTAMPILLA S POLITÉCNICO 0,4% | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4% | ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%                            | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%) | OTRAS RETENCIONES 0 Contribución Obra Pública | SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR | MOVIMIENTO EJECUTADO | SALDO FINAL EJECUTADO |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 1                                                                                                                                                                 | EG 24748        | 900969726                                                                        | VALOR + S.A.S                                | \$ 4.725.232          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.612.080.344        | \$ 4.725.232         | \$ 39.607.355.112     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 2                                                                                                                                                                 | EG 25780        | 900969726                                                                        | VALOR + S.A.S                                | \$ 1.888.100          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.607.355.112        | \$ 1.888.100         | \$ 39.605.467.012     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 3                                                                                                                                                                 | EG 25840        | 900969726                                                                        | VALOR + S.A.S                                | \$ 6.209.120          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.605.467.012        | \$ 6.209.120         | \$ 39.599.257.892     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 4                                                                                                                                                                 | VE 6937         | 1036607036                                                                       | GONZALES SALAS VILSULY YANETH                | \$ 2.894.225          | -          | -                                                              | -                | -                              | 57.885                     | 17.365                                                  | 28.942                        | 11.577                        | 11.577                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.599.257.892        | \$ 2.894.225         | \$ 39.596.363.667     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 5                                                                                                                                                                 | VE 6935         | 71371308                                                                         | LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY                     | \$ 10.013.284         | -          | 162.000                                                        | -                | -                              | 200.266                    | 60.080                                                  | 100.132                       | 40.053                        | 40.053                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.596.363.667        | \$ 10.013.284        | \$ 39.586.350.383     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 6                                                                                                                                                                 | VE 6945         | 70928328                                                                         | MACIAS VILLA LUIS FERNANDO                   | \$ 7.864.767          | -          | -                                                              | -                | -                              | 157.295                    | 47.189                                                  | 78.648                        | 31.459                        | 31.459                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.586.350.383        | \$ 7.864.767         | \$ 39.578.485.616     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 7                                                                                                                                                                 | VE 6936         | 1036929677                                                                       | MORALES GALVEZ ALEXANDER                     | \$ 15.527.850         | -          | 1.585.000                                                      | -                | -                              | 310.557                    | 93.167                                                  | 155.279                       | 62.111                        | 62.111                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.578.485.616        | \$ 15.527.850        | \$ 39.562.957.766     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 8                                                                                                                                                                 | VE 6941         | 1017194316                                                                       | RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS                 | \$ 6.738.734          | -          | -                                                              | -                | -                              | 134.775                    | 40.432                                                  | 67.387                        | 26.955                        | 26.955                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.562.957.766        | \$ 6.738.734         | \$ 39.556.219.032     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 9                                                                                                                                                                 | VE 6939         | 1128422225                                                                       | RODRIGUEZ CARDONA DANIEL                     | \$ 6.121.634          | -          | -                                                              | -                | -                              | 122.433                    | 36.730                                                  | 61.216                        | 24.487                        | 24.487                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.556.219.032        | \$ 6.121.634         | \$ 39.550.097.398     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 10                                                                                                                                                                | VE 6942         | 71312895                                                                         | AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER            | \$ 6.121.634          | -          | -                                                              | -                | -                              | 122.433                    | 36.730                                                  | 61.216                        | 24.487                        | 24.487                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.550.097.398        | \$ 6.121.634         | \$ 39.543.975.764     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 11                                                                                                                                                                | VE 6940         | 98662485                                                                         | CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO                 | \$ 6.533.034          | -          | -                                                              | -                | -                              | 130.661                    | 39.198                                                  | 65.330                        | 26.132                        | 26.132                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.543.975.764        | \$ 6.533.034         | \$ 39.537.442.730     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 12                                                                                                                                                                | VE 6943         | 1128456781                                                                       | PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO              | \$ 6.327.334          | -          | -                                                              | -                | -                              | 126.547                    | 37.964                                                  | 63.273                        | 25.309                        | 25.309                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.537.442.730        | \$ 6.327.334         | \$ 39.531.115.396     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 13                                                                                                                                                                | VE 6938         | 1036945181                                                                       | RESTREPO HENAO EDISON ARLEY                  | \$ 10.593.766         | -          | 413.000                                                        | -                | -                              | 211.875                    | 63.563                                                  | 105.938                       | 42.375                        | 42.375                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.531.115.396        | \$ 10.593.766        | \$ 39.520.521.630     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 14                                                                                                                                                                | VE 6944         | 1045021654                                                                       | ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE                  | \$ 9.316.709          | -          | 40.000                                                         | -                | -                              | 186.334                    | 55.900                                                  | 93.167                        | 37.267                        | 37.267                                 | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 39.520.521.630        | \$ 9.316.709         | \$ 39.511.204.921     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 15                                                                                                                                                                | 580831468677    | 830122566                                                                        | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC  | \$ 10.437.014         | 1.983.033  | -                                                              | -                | -                              | 208.740                    | 62.622                                                  | 104.370                       | 41.748                        | 41.748                                 | 41.748                                                    | 260.925                                 | -                                             | \$ 39.511.204.921        | \$ 12.420.047        | \$ 39.498.784.874     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 16                                                                                                                                                                | E6068076865     | 800153993                                                                        | COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A          | \$ 427.195            | 81.005     | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | 10.680                                  | -                                             | \$ 39.498.784.874        | \$ 508.200           | \$ 39.498.276.674     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 17                                                                                                                                                                | FE 2388         | 901705079                                                                        | EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL         | \$ 1.098.249          | 208.667    | 38.439                                                         | 31.300           | 1.977                          | 21.965                     | 6.589                                                   | 10.982                        | 4.393                         | 4.393                                  | 4.393                                                     | 27.456                                  | -                                             | \$ 39.498.276.674        | \$ 1.306.916         | \$ 39.496.969.758     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 18                                                                                                                                                                | FE 2387         | 901705079                                                                        | EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL         | \$ 953.318            | 181.130    | 33.366                                                         | 27.170           | 1.716                          | 19.066                     | 5.720                                                   | 9.533                         | 3.813                         | 3.813                                  | 3.813                                                     | 23.833                                  | -                                             | \$ 39.496.969.758        | \$ 1.134.448         | \$ 39.495.835.310     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 19                                                                                                                                                                | COO4290         | 900424944                                                                        | ELATIN S.A.S                                 | \$ 44.952.026         | 8.540.885  | 1.798.081                                                      | 1.281.133        | 80.914                         | 899.041                    | 269.712                                                 | 449.520                       | 179.808                       | 179.808                                | 179.808                                                   | 1.123.801                               | -                                             | \$ 39.495.835.310        | \$ 53.492.911        | \$ 39.442.342.399     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 20                                                                                                                                                                | MECO 1483983    | 819006966                                                                        | MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S                | \$ 16.607.937         | 3.155.508  | -                                                              | -                | 29.894                         | 332.159                    | 99.648                                                  | 166.079                       | 66.432                        | 66.432                                 | 66.432                                                    | 415.198                                 | -                                             | \$ 39.442.342.399        | \$ 19.763.445        | \$ 39.422.578.954     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 21                                                                                                                                                                | VAB4364         | 890401802                                                                        | PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA | \$ 278.316.811        | 5.288.019  | -                                                              | -                | 500.970                        | 5.566.336                  | 1.669.901                                               | 2.783.168                     | 1.113.267                     | 1.113.267                              | 1.113.267                                                 | 6.957.920                               | -                                             | \$ 39.422.578.954        | \$ 283.604.830       | \$ 39.138.974.124     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 22                                                                                                                                                                | FELE 2687       | 811030548                                                                        | VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A.               | \$ 87.623.632         | -          | 3.066.827                                                      | -                | 157.723                        | 1.752.473                  | 525.742                                                 | 876.236                       | 350.495                       | 350.495                                | 350.495                                                   | 2.190.591                               | -                                             | \$ 39.138.974.124        | \$ 87.623.632        | \$ 39.051.350.492     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 23                                                                                                                                                                | FEV 427         | 901777187                                                                        | ANEXU                                        | \$ 19.715.980         | 3.746.036  | 788.639                                                        | 561.905          | 35.489                         | 394.320                    | 118.296                                                 | 197.160                       | 78.864                        | 78.864                                 | 78.864                                                    | 492.900                                 | -                                             | \$ 39.051.350.492        | \$ 23.462.016        | \$ 39.027.888.476     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 24                                                                                                                                                                | BSPE3001069     | 890905065                                                                        | EDATEL S.A.                                  | \$ 41.350.179         | 7.856.534  | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | 1.033.754                               | -                                             | \$ 39.027.888.476        | \$ 49.206.713        | \$ 38.978.681.763     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 25                                                                                                                                                                | BSPE3001071     | 890905065                                                                        | EDATEL S.A.                                  | \$ 6.984.616          | 1.327.077  | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | 174.615                                 | -                                             | \$ 38.978.681.763        | \$ 8.311.693         | \$ 38.970.370.070     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 26                                                                                                                                                                | BOPU136270472   | 900092385                                                                        | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A               | \$ 1.800.000          | 342.000    | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | 45.000                                  | -                                             | \$ 38.970.370.070        | \$ 2.142.000         | \$ 38.968.228.070     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 27                                                                                                                                                                | UTAE 42         | 901852025.8                                                                      | UNION TEMPORAL AEI                           | \$ 102.541.765        | 19.482.935 | 2.563.544                                                      | 2.922.440        | 184.575                        | 2.050.835                  | 615.251                                                 | 1.025.418                     | 410.167                       | 410.167                                | 410.167                                                   | 2.563.544                               | -                                             | \$ 38.968.228.070        | \$ 122.024.700       | \$ 38.846.203.370     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 28                                                                                                                                                                | EG 26196        | 900969726                                                                        | VALOR + S.A.S                                | \$ 6.209.120          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 38.846.203.370        | \$ 6.209.120         | \$ 38.839.994.250     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| 29                                                                                                                                                                | EG 26197        | 900969726                                                                        | VALOR + S.A.S                                | \$ 1.287.991          | -          | -                                                              | -                | -                              | -                          | -                                                       | -                             | -                             | -                                      | -                                                         | -                                       | -                                             | \$ 38.839.994.250        | \$ 1.287.991         | \$ 38.838.706.259     |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| Total Legalización                                                                                                                                                |                 |                                                                                  |                                              |                       |            |                                                                |                  |                                |                            |                                                         |                               |                               |                                        |                                                           |                                         |                                               | \$ 773.374.085           |                      |                       |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |

| FIRMA SUPERVISOR                                                                  |      | FIRMA CONTADOR-MANDATARIO                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |      |  |                   |
| NOMBRE: ANTONIO JOSÉ SALAZAR                                                      | C.C. | NOMBRE: ALVARO ALONSO ARROYAVE URIBE                                                | C.C.98.639.503    |
| Correo Electrónico: antiojose.salazar@antioquia.gov.co                            | Tel: | Correo Electrónico: contabilidad@valormas.gov.co                                    | Tel: 301 743 4096 |



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

# Gobernación de Antioquia

## RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 24.07.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264888

|                                        |  |                                           |  |                                                       |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| FACTURA:                               |  | Nro ACTA:                                 |  | DOC CAUSACION:                                        |  |
| CODIGO PROVEEDOR: 2200013241           |  | NIT: 9009697262                           |  | NOMBRE / RAZON SOCIAL : VALOR + S.A.S. VALOR + S.A.S. |  |
| Nro CONTRATO: 23MA122C1482             |  | DEPENDENCIA: SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA |  |                                                       |  |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2023 |  | OBSERVACION:                              |  |                                                       |  |

PEDIDO: 1. 4500066527 SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

| PED | POS PED | ANT | FONDO  | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION           | CANTIDAD   | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA    |
|-----|---------|-----|--------|----------------------------|-----------------------|------------|-----|------------------|-------|-------------------|-------------------|
|     | 6       |     | 0-8115 | 1002375                    | ACT VF GERENCIAMIENTO | 1529651889 | UN  | 1,000            | 0%    | 1,0000            | 1.529.651.889,000 |
|     |         |     |        |                            |                       |            |     |                  |       | V/R TOTAL NETO    | 1.529.651.889,000 |
|     |         |     |        |                            |                       |            |     |                  |       | V/R TOTAL IVA     | 0,000             |
|     |         |     |        |                            |                       |            |     |                  |       | V/R TOTAL         | 1.529.651.889,000 |

### REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- |                                               |                                |                                                                |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Factura Original                           | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 2. Resolución de facturación vigente          | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.    | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.      | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo            | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 11. Informe de seguimiento                                     | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 5. RPC del pago                               | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere         | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado.                | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición       | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social       | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere              | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
|                                               |                                | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal        | <input type="checkbox"/> V.Bo. |

### DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- |                                |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Estampillas                      |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Contribución Especial            |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención de IVA                 |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención en la Fuente           |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención Empleados 1070         |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención Industria y Comercio   |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. |                                  |  |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Salazar López, Antonio José



VALOR + S.A.S

NIT 900969726-2

Calle 41 N° 52-28 Edificio EDATEL Piso 3

Teléfono 6044443747

Email: contabilidad@valormas.gov.co

Medellín, Colombia

Régimen Ordinario Renta

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación 18764106055723 del 18 de Febrero de 2026, vigencia 18 meses. Prefijo V, rango 1771 al 10000

Agente retenedor IVA Art.437-2 Empresa de Economía Mixta. No practicar retención de IVA

No Practicar retención de ICA Municipio de Medellín según resolución 44390 del 10 diciembre de 2019

Actividad económica 6311/6190/ 8201/8220

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° V1990

FECHA EMISION

2026-07-17 11:26:58

FECHA VENCIMIENTO

2026-08-18

Fecha de certificación: 2026-07-17 11:30:13

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>CLIENTE:</b>                          | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                | <b>NIT:</b>     | 890900286-0 |
| <b>DIRECCIÓN:</b>                        | CL 42 B 52 106 P 1 OF 111                                                                                                                                                                                                | <b>TELÉFONO</b> | 3838048     |
| <b>ELABORADO POR:</b>                    | JORGE ARMANDO MONTOYA TABORDA                                                                                                                                                                                            |                 |             |
| <b>Observaciones:</b>                    | Honorarios correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio 2026. contrato interadministrativo 23MA122C1482 gerenciamiento de seguridad Fase II. calculados sobre una base de ejecución de \$ 1.529.651.889. |                 |             |
| Medio de Pago<br>INSTRUMENTO NO DEFINIDO | Consignar en No. De cuenta 10009936 IDEA.                                                                                                                                                                                |                 |             |
| Forma de Pago<br>CREDITO                 |                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                   | VALOR UNITARIO | IVA           | CANTIDAD | VALOR TOTAL    |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 325-1459 | GERENCIAMIENTO SEGURIDAD FASE II - HONORARIOS | \$ 122.372.151 | \$ 23.250.709 | 1        | \$ 145.622.860 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>SON:</b> CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SUBTOTAL:</b>    | <b>\$ 122.372.151</b> |
| Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 671 y s.s. 771 - 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio.<br>Después de la fecha de vencimiento de la presente factura se causarán intereses de mora mensuales, de acuerdo con el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera. | <b>IVA:</b>         | <b>\$ 23.250.709</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RET. ICA:</b>    | <b>\$ 0</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RET. FUENTE:</b> | <b>\$ 0</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$ 145.622.860</b> |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2026-08-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |



CUFE: e7d2f896c557651717372900b0828eee7fd4a122ec92b55340c76e10eec4b80d4fd8ebc28a265eda3795c08d12d6b701

ACTIVIDAD ECONOMICA: 6201





GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

# Gobernación de Antioquia

## RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 24.07.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264889

|                                        |  |                                           |  |                                                       |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| FACTURA:                               |  | Nro ACTA:                                 |  | DOC CAUSACION:                                        |  |
| CODIGO PROVEEDOR: 2200013241           |  | NIT: 9009697262                           |  | NOMBRE / RAZON SOCIAL : VALOR + S.A.S. VALOR + S.A.S. |  |
| Nro CONTRATO: 23MA122C1482             |  | DEPENDENCIA: SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA |  |                                                       |  |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2023 |  | OBSERVACION:                              |  |                                                       |  |

PEDIDO: 1. 4500066527 SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

| PED | POS PED | ANT | FONDO  | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION                      | CANTIDAD  | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA  |
|-----|---------|-----|--------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|     | 2       |     | 0-8115 | 1002375                    | ACT VF GERENCIAMIENTO HONORARIOS | 122372151 | UN  | 1,000            | 19%   | 1,1900            | 145.622.859,690 |
|     |         |     |        |                            |                                  |           |     |                  |       | V/R TOTAL NETO    | 122.372.151,000 |
|     |         |     |        |                            |                                  |           |     |                  |       | V/R TOTAL IVA     | 23.250.708,690  |
|     |         |     |        |                            |                                  |           |     |                  |       | V/R TOTAL         | 145.622.859,690 |

### REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- |                                               |                                |                                                                |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Factura Original                           | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 2. Resolución de facturación vigente          | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.    | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.      | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo            | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 11. Informe de seguimiento                                     | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 5. RPC del pago                               | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere         | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado.                | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición       | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social       | <input type="checkbox"/> V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere              | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
|                                               |                                | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal        | <input type="checkbox"/> V.Bo. |

### DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- |                                |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Estampillas                      |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Contribución Especial            |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención de IVA                 |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención en la Fuente           |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención Empleados 1070         |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención Industria y Comercio   |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. |                                  |  |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Salazar López, Antonio José



VALOR + S.A.S

NIT 900969726-2

Calle 41 N° 52-28 Edificio EDATEL Piso 3

Teléfono 6044443747

Email: contabilidad@valormas.gov.co

Medellín, Colombia

Régimen Ordinario Renta

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación 18764106055723 del 18 de Febrero de 2026, vigencia 18 meses. Prefijo V, rango 1771 al 10000

Agente retenedor IVA Art.437-2 Empresa de Economía Mixta. No practicar retención de IVA

No Practicar retención de ICA Municipio de Medellín según resolución 44390 del 10 diciembre de 2019

Actividad económica 6311/6190/ 8201/8220

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° V1982

FECHA EMISION

2026-07-09 07:03:40

FECHA VENCIMIENTO

2026-08-10

Fecha de certificación: 2026-07-09 07:04:10

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>CLIENTE:</b>                          | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NIT:</b>     | 890900286-0 |
| <b>DIRECCIÓN:</b>                        | CL 42 B 52 106 P 1 OF 111                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TELÉFONO</b> | 3838048     |
| <b>ELABORADO POR:</b>                    | JORGE ARMANDO MONTOYA TABORDA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |
| <b>Observaciones:</b>                    | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SOPORTE MESA DE AYUDA 23MA122C1482 – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA – PERIODO DEL 1 AL30 DE JUNIO DEL 2026. |                 |             |
| Medio de Pago<br>INSTRUMENTO NO DEFINIDO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |
| Forma de Pago<br>CREDITO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                            | VALOR UNITARIO | IVA           | CANTIDAD | VALOR TOTAL    |
|----------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 448-1616 | Mesa de Ayuda Gerenciamiento Seguridad | \$ 105.501.985 | \$ 20.045.377 | 1        | \$ 125.547.362 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>SON:</b> CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SUBTOTAL:</b>    | <b>\$ 105.501.985</b> |
| Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 671 y s.s. 771 - 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio.<br>Después de la fecha de vencimiento de la presente factura se causarán intereses de mora mensuales, de acuerdo con el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera. | <b>IVA:</b>         | <b>\$ 20.045.377</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RET. ICA:</b>    | <b>\$ 0</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RET. FUENTE:</b> | <b>\$ 0</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$ 125.547.362</b> |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b> 2026-08-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |



CUFE: ae83a49f033417ee770fca3ba06a5128fa5351581938282f5c507619acb4a9ff4d1ef9e47d1e70dd821ba5cc94105dc5

ACTIVIDAD ECONOMICA: 6201





GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

# Gobernación de Antioquia

## RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 24.07.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264940

|                                        |  |                                           |  |                                                       |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| FACTURA:                               |  | Nro ACTA:                                 |  | DOC CAUSACION:                                        |  |
| CODIGO PROVEEDOR: 2200013241           |  | NIT: 9009697262                           |  | NOMBRE / RAZON SOCIAL : VALOR + S.A.S. VALOR + S.A.S. |  |
| Nro CONTRATO: 23MA122C1482             |  | DEPENDENCIA: SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA |  |                                                       |  |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2023 |  | OBSERVACION:                              |  |                                                       |  |

PEDIDO: 1. 4500066527 SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

| PED | POS PED | ANT | FONDO  | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION                         | CANTIDAD  | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA  |
|-----|---------|-----|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----|------------------|-------|-------------------|-----------------|
|     | 1       |     | 0-8115 | 1002375                    | ACT VF GERENCIAMIENTO MESA DE AYUDA | 105501985 | UN  | 1,000            | 19%   | 1,1900            | 125.547.362,150 |
|     |         |     |        |                            |                                     |           |     |                  |       | V/R TOTAL NETO    | 105.501.985,000 |
|     |         |     |        |                            |                                     |           |     |                  |       | V/R TOTAL IVA     | 20.045.377,150  |
|     |         |     |        |                            |                                     |           |     |                  |       | V/R TOTAL         | 125.547.362,150 |

### REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- |                                                                        |                                |                                                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Factura Original                           | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| <input type="checkbox"/> 2. Resolución de facturación vigente          | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.    | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| <input type="checkbox"/> 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.      | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| <input type="checkbox"/> 4. Recibo a satisfacción por fondo            | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 11. Informe de seguimiento                                     | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| <input type="checkbox"/> 5. RPC del pago                               | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere         | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| <input type="checkbox"/> 6. Contrato y Rut actualizado.                | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición       | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
| <input type="checkbox"/> 7. Soportes del pago a seguridad social       | <input type="checkbox"/> V.Bo. | <input type="checkbox"/> 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere              | <input type="checkbox"/> V.Bo. |
|                                                                        |                                | <input type="checkbox"/> 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal        | <input type="checkbox"/> V.Bo. |








### DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- |                                |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Estampillas                      |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Contribución Especial            |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención de IVA                 |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención en la Fuente           |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención Empleados 1070         |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. | Retención Industria y Comercio   |  |
| <input type="checkbox"/> V.Bo. |                                  |  |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Salazar López, Antonio José

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |            |               |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|------|
| Acta N.                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                                                 | Hora Inicio            | 04:00 PM   | Hora Fin                                                                              | 05:20 PM   | Fecha Reunión |     |      |
| Dependencia que convoca                                                                                                                                                     | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+                                                                                  |                        |            |                                                                                       |            | Día           | Mes | Año  |
| Lugar de la reunión                                                                                                                                                         | Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos                                                                   |                        |            |                                                                                       |            | 04            | 06  | 2026 |
| Nombre de la reunión                                                                                                                                                        | Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023                                                                                 |                        |            |                                                                                       |            |               |     |      |
| Señale en el espacio el tipo de reunión                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                        | Virtual    |                                                                                       | Presencial | X             |     |      |
| Objetivo de la reunión                                                                                                                                                      | Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia. |                        |            |                                                                                       |            |               |     |      |
| <i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i> |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |            |               |     |      |
| Nombre                                                                                                                                                                      | Cargo                                                                                                                              | Entidad                | Teléfono   | Firma                                                                                 |            |               |     |      |
| Yuri Marcela Aguirre                                                                                                                                                        | Coordinadora Administrativa                                                                                                        | VALOR+                 | 3137450593 |    |            |               |     |      |
| Juan David Betancur                                                                                                                                                         | Supervisor Técnico                                                                                                                 | VALOR+                 | 3014210126 |   |            |               |     |      |
| Duván Cardona                                                                                                                                                               | Coordinador técnico TASA                                                                                                           | VALOR+                 | 3014063263 |  |            |               |     |      |
| Carlos Mario Mazo Giraldo                                                                                                                                                   | Profesional Financiero                                                                                                             | VALOR+                 | 3104996091 |  |            |               |     |      |
| Richard Uribe Camargo                                                                                                                                                       | Supervisor Jurídico                                                                                                                | VALOR+                 | 3012392911 |  |            |               |     |      |
| Tomás Sierra                                                                                                                                                                | Coordinador de Nodos                                                                                                               | SSJYP                  | 3183262485 |  |            |               |     |      |
| Carlos Mario Prada                                                                                                                                                          | Coordinador TI                                                                                                                     | SSJYP                  | 3167390024 |  |            |               |     |      |
| Cristián Andrés Castro                                                                                                                                                      | Coordinador Técnico TASA                                                                                                           | VALOR+                 | 3014063263 |  |            |               |     |      |
| Sebastián Metaute Luján                                                                                                                                                     | Líder Mesa de Ayuda                                                                                                                | VALOR+                 | 3125792683 |  |            |               |     |      |
| Antonio José Salazar                                                                                                                                                        | Director de Planeación SSJYP                                                                                                       | SSJYP                  | 3105011594 |  |            |               |     |      |
| Karen Ríos Martínez                                                                                                                                                         | Profesional Jurídica SSJYP                                                                                                         | SSJYP                  | 3013824999 |  |            |               |     |      |
| Yuri Andrea Buitrago                                                                                                                                                        | Profesional Financiero SSJYP                                                                                                       | SSJYP                  | 3006740685 |  |            |               |     |      |
| Alexander Morales                                                                                                                                                           | Director técnico                                                                                                                   | Apoyo a la Supervisión | 3017719895 |  |            |               |     |      |
| Giovanni Caicedo Barrera                                                                                                                                                    | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3125566816 |  |            |               |     |      |
| John Felipe Zuluaga                                                                                                                                                         | Profesional Jurídico                                                                                                               | Apoyo a la Supervisión | 3113701264 |  |            |               |     |      |
| Oscar Arley López                                                                                                                                                           | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3007858860 |  |            |               |     |      |
| Edison Arley Restrepo                                                                                                                                                       | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3218747232 |  |            |               |     |      |
| Vilsuly Yaneth González                                                                                                                                                     | Auxiliar administrativa                                                                                                            | Apoyo a la Supervisión | 3216956205 |  |            |               |     |      |
| Agenda                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |            |               |     |      |

| N.º                             | Temas a Tratar                       | Tratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                 |                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO |
| 1                               | Compromisos del Comité Anterior      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2                               | Componente apoyo a la supervisión    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 3                               | Componente de mantenimiento          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 4                               | Componente de Conectividad           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 5                               | Componente de Nodos                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 6                               | Componente implementaciones          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 7                               | Actas de transferencias              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 8                               | Informe presupuestal y financiero    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 9                               | Estado Disponibilidad por componente | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 10                              | Pendientes de pago                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 11                              | Mesa de ayuda                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <b>Desarrollo de la Reunión</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| N.º                             | Tema                                 | Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1                               | Compromisos del comité Anterior      | <p>Se da inicio al comité de seguimiento del <b>Contrato No. 23MA122C1482 de 2023</b>, con la socialización de los compromisos generados en la reunión anterior, a cargo del profesional técnico del Equipo de Apoyo a la Supervisión, Edison Arley Restrepo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pruebas piloto de instalación de equipos en municipios priorizados}</b><br/>Se revisa el avance de las pruebas piloto en los municipios de Bello y La Ceja, las cuales continúan pendientes. Juan David Betancur informa que en el transcurso de la semana se entregará la documentación correspondiente, incluyendo una propuesta de solución de analítica de terceros de origen español.<br/><br/>Se discutió que el servidor de Hikvision dispuesto en el nodo permitirá la implementación de analítica comportamental; no obstante, persisten retos asociados a la integración con el sistema ISS y la base de datos de la Policía Nacional. Adicionalmente, se identificó que la degradación del servicio en algunos municipios obedece principalmente a limitaciones en el ancho de banda (canales de 10 Mbps insuficientes), más que a problemas de configuración de red.</li> <li><b>Comunicación de intervenciones en campo:</b><br/>Se reitera la necesidad de informar previamente a la mesa de ayuda, así como a las autoridades locales, sobre cualquier intervención en campo. Igualmente, se deberá notificar con antelación cualquier suspensión o afectación del servicio. El contratista Valor+ deberá articular esta comunicación con sus aliados. Sebastián Metaute expone los protocolos establecidos para la comunicación con los municipios.</li> <li><b>Mesa técnica para integración de cámaras.</b><br/>Se acuerda la realización de una mesa técnica orientada a la solución de la integración de cámaras. El coordinador de nodos, Tomás Sierra, informa que tiene conocimiento de plataformas como SECAD, ISS y Herta, y que actualmente se encuentra en proceso de revisión de alternativas de integración con terceros, para lo cual está estructurando una hoja de ruta.</li> <li><b>Reuniones de empalme del nuevo coordinador de nodos:</b></li> </ol> |    |

|        |                                   | <p>Se establece la realización de reuniones de empalme con el nuevo coordinador de nodos, con el fin de garantizar la continuidad operativa y la adecuada transferencia de conocimiento.</p> <p><b>5. Restricción de acceso a servidores:</b><br/>Se define restringir el acceso directo a los servidores únicamente a personal autorizado y con justificación técnica, responsabilidad que estará a cargo del coordinador de nodos, Tomás Sierra.</p> <p><b>6. Inventario actualizado de cámaras:</b><br/>Se solicita la consolidación de un inventario actualizado de cámaras (activas, inactivas y sin garantía). Sebastián Metaute informa que dicho inventario ya se encuentra consolidado, publicado en línea y contiene aproximadamente 5.700 cámaras, con la totalidad de la información requerida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |                  |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|--------|-------|------------------|-----|----------------|------|-----|----------|------------|--------|---------|------------------|-----|------------------|------------------|----------------|----------|------------|--------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|------------|--------|----------|----------------|-----|----------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-------|------------------|-----|------------------|------------------|---------|----------|------------|--|--|------------------|-----|------------------|------------------|--|--|--|
| 2      | Componente Apoyo a la Supervisión | <p>En relación con el componente de <b>Apoyo a la Supervisión</b>, el profesional Edison Arley Restrepo informa lo siguiente respecto a las actividades desarrolladas por el equipo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acompañamiento a la supervisión en la realización de pruebas y certificación de fibra óptica en diferentes municipios.</li><li>• Acompañamiento en la prueba piloto del sistema 123 en el municipio de Rionegro.</li><li>• Visita al municipio de Yalí, donde se realizó la revisión del servidor y acompañamiento técnico.</li><li>• Visita al municipio de Briceño, con el fin de realizar la validación técnica del espacio destinado al Centro de Monitoreo (CCM) y la implementación de un punto espejo.</li><li>• Se encuentra pendiente la contratación del perfil financiero requerido para el componente.</li><li>• En el marco del Contrato de Transporte No. 204-2026, se efectuaron visitas técnicas a los municipios de Caucasia, Rionegro, Briceño y Yalí.</li><li>• Avances en la integración de terceros en los municipios de Zaragoza, Barbosa, Gómez Plata, Caucasia, Andes, Santa Bárbara, Yarumal, Yalí, Salgar, Ebéjico, Arboletes, Apartadó, Betulia, Tarso, Concordia y Anzá.</li></ul> <p>Adicionalmente, se informa que en el municipio de Yalí el servidor fue retirado por garantía, instalándose de manera provisional una estación de trabajo sin capacidad de grabación, con el fin de mantener la continuidad del monitoreo policial. Por su parte, en el municipio de Briceño se validó el espacio para la instalación de un punto espejo en la estación de policía, reiterando que es responsabilidad de los municipios proveer las estaciones de trabajo y monitores necesarios para este tipo de implementaciones.</p> <p><b>Ejecución Física 39,64%</b><br/><b>Ejecución financiera 25,64%</b></p>                                                |      |                  |                  |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
| 3      | Componente Mantenimiento          | <p>Respecto al componente de mantenimiento, el profesional <b>Edison Arley Restrepo</b> informa lo siguiente:</p> <table><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Valor Total Lote</th><th>CDP</th><th>Valor</th><th>Proyecto o Fondo</th><th>Proponentes</th><th>Numero de Contrato</th><th>Acta de Inicio</th></tr><tr><td>Lote 2</td><td>URABA</td><td>\$ 1.636.037.963</td><td>174</td><td>\$ 504.370.390</td><td>TASA</td><td>CI2</td><td>167-2026</td><td>23/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>ORIENTE</td><td>\$ 1.636.037.963</td><td>176</td><td>\$ 1.131.667.573</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>CONSORCIO CCTV</td><td>168-2026</td><td>20/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>\$ 3.420.806.648</td><td>178</td><td>\$ 3.420.806.648</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>UT VMAS SEGURIDAD</td><td>170-2026</td><td>27/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 6</td><td>NORDESTE</td><td>\$ 892.384.343</td><td>183</td><td>\$ 892.384.343</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>UT SOLUCIONES INTEGRALES</td><td>171-2026</td><td>2/03/2026</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>NORTE</td><td>\$ 1.487.307.239</td><td>184</td><td>\$ 1.487.307.239</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>SPECTRA</td><td>172-2026</td><td>20/02/2026</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ 2.528.422.306</td><td>189</td><td>\$ 2.528.422.306</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Se acuerda incluir en la próxima acta un reporte detallado de los municipios atendidos bajo criterios de prioridad y urgencia, con el fin de evidenciar el avance real de las cuadrillas en territorio. Lo anterior permitirá reflejar de manera más precisa las acciones operativas ejecutadas y las soluciones implementadas en campo, especialmente en aquellos casos donde la respuesta ha sido ágil, aun cuando el indicador de ejecución financiera no evidencie un alto nivel de avance.</p> | Lote | Subregión        | Valor Total Lote | CDP                      | Valor              | Proyecto o Fondo | Proponentes | Numero de Contrato | Acta de Inicio | Lote 2 | URABA | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390 | TASA | CI2 | 167-2026 | 23/02/2026 | Lote 3 | ORIENTE | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV | 168-2026 | 20/02/2026 | Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD | 170-2026 | 27/02/2026 | Lote 6 | NORDESTE | \$ 892.384.343 | 183 | \$ 892.384.343 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026 | 2/03/2026 | Lote 7 | NORTE | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA | 172-2026 | 20/02/2026 |  |  | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 |  |  |  |
| Lote   | Subregión                         | Valor Total Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CDP  | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de Inicio   |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
| Lote 2 | URABA                             | \$ 1.636.037.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174  | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
| Lote 3 | ORIENTE                           | \$ 1.636.037.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176  | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO                   | \$ 3.420.806.648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178  | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
| Lote 6 | NORDESTE                          | \$ 892.384.343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183  | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026        |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
| Lote 7 | NORTE                             | \$ 1.487.307.239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184  | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |
|        |                                   | \$ 2.528.422.306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189  | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                  |     |                  |                  |                   |          |            |        |          |                |     |                |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |  |

|   |                         | <p><b>Ejecución Física 13%</b><br/><b>Ejecución Financiera 1,09%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Componente Conectividad | <p>El profesional Edison Arley Restrepo informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad continúa sin variaciones relevantes respecto al reporte anterior. En detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plan de datos – líneas nodo (Contrato No. 195-2026):</b> Se mantiene sin novedades operativas ni contractuales.</li> <li>• <b>Canales de conectividad para la implementación de SD-WAN:</b> Actualmente en proceso de estudio de mercado.</li> <li>• <b>Redundancia de canal dedicado a internet en el nodo departamental:</b> Se presentó un único proponente; sin embargo, la propuesta fue rechazada por no cumplir con los requisitos establecidos, particularmente en los indicadores financieros.</li> <li>• <b>Adquisición de radios cerro asociados al proyecto CACOM 5:</b> Se dio inicio nuevamente al estudio de mercado.</li> </ul> <p><b><u>Novedad Mediacommerce – Migración de municipios a fibra óptica mediante Otrosí N.º 469-2025</u></b></p> <p>En el marco del proceso de migración de municipios a fibra óptica, el aliado <b>Mediacommerce</b> presentó el cronograma de transición de los municipios que se encontraban pendientes, con fecha estimada de finalización inicialmente prevista para el <b>27 de mayo de 2026</b>.</p> <p>Durante el seguimiento al proceso, se identificaron limitaciones de cobertura por parte del aliado Mediacommerce, por lo cual se aprobó retirar del proceso de migración a fibra óptica los municipios de <b>Abriaquí, Murindó, Sabanalarga y San Jerónimo</b>. Estos municipios serán atendidos por el aliado <b>ANEXU</b>, dado que, de acuerdo con el estudio de viabilidad realizado, es el único operador con cobertura disponible para garantizar la implementación del servicio mediante fibra óptica.</p> <p>Adicionalmente, se informa que el servicio de <b>Starlink en el municipio de Vigía del Fuerte</b> permanece suspendido debido a fallas en el suministro eléctrico de la zona, situación que afecta la continuidad del servicio.</p> <p>Se resalta que el municipio de <b>Murindó</b> presenta condiciones particulares asociadas a la infraestructura eléctrica, aspecto que deberá ser considerado en cualquier intervención técnica relacionada con la implementación de fibra óptica.</p> <p><b>Municipios con migración a fibra óptica finalizada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarso</li> <li>• Necoclí</li> <li>• Hispania</li> <li>• Ebéjico</li> <li>• Armenia</li> </ul> <p><b>Municipios con programación en curso:</b></p> <p>Se mantiene proyección de última entrega para el <b>09 de junio de 2026</b>, contemplando los siguientes municipios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peque (San Francisco)</li> </ul> |

- San Pedro de Urabá
- San Juan de Urabá
- Mutatá
- La Pintada
- Nariño

| CIUDAD             | AGENDA<br>INSTALACION FISICA | AGENDA DE<br>IMPLEMENTACION<br>LOGICA | ACTUALIZACIÓN MC / CLIENTE                                                                                   |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEQUE              | 25/06/2026                   | 09/06/2026 pm                         | Actualización de fecha inicial por falla en el servicio, revisando novedades                                 |
| SAN FRANCISCO      | 29/06/2026                   | 04/06/2026 am                         | Personal presenta novedades de fuerza mayor lo que genera actualización de agendamiento a proyección inicial |
| SAN PEDRO DE URABA | 02/06/2026                   | 04/06/2026 pm                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| SAN JUAN DEURABA   | 02/06/2026                   | 04/06/2026 am                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| MUTATA             | 05/06/2026                   | 09/06/2026 am                         | Novedades en el transporte de equipos aliados detenidos en carretera                                         |
| LA PINTADA         | 02/05/2026                   | 05/06/2026 am                         | Sin actualización de agenda inicial                                                                          |
| NARIÑO             | 29/06/2026                   | 03/06/2026 am                         | Personal presenta novedades de fuerza mayor lo que genera actualización de agendamiento a proyección inicial |

Con la actualización definida, se continuará el seguimiento a la implementación con los aliados correspondientes, garantizando la continuidad de conectividad en los municipios priorizados.

En este sentido, se aprueba el **otrosí al Contrato N.º 469-2025** con el aliado **ANEXU**, por parte del supervisor del contrato, **Antonio José Salazar López**, en su calidad de **Director de Planeación y Administración de la Seguridad**.

**Ejecución Física 40,78%**  
**Ejecución Financiera 26,23%**

5

Componentes de Nodos

El profesional técnico Edison Arley Restrepo informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances:

- **Segundo piso CRUE:**

Se informa que los Análisis de Precios Unitarios (APU) fueron enviados el 28 de mayo de 2026, con un presupuesto estimado de **\$1.518.561.983**. Durante la sesión, se discutió la necesidad de instalar medidores de servicios públicos independientes para el CRUE, con el fin de garantizar un adecuado prorrateo de los consumos.

Adicionalmente, la Policía Nacional solicitó la asignación de un operador especializado en analítica de video y sistemas LPR (reconocimiento de placas), que permita cubrir los turnos operativos, teniendo en cuenta que en algunos casos los comandantes de estación no atienden oportunamente los llamados de alerta.

- **Estudio de mercado – Mantenimientos locativos nodos:**

El estudio de mercado correspondiente al servicio de **mantenimientos locativos para los nodos subregionales y el nodo departamental** fue enviado el 03 de junio de 2026. El proceso contempla un contrato bajo modalidad de bolsa por valor de \$202.545.763, destinado a atender las necesidades de mantenimiento de acuerdo con los requerimientos que se presenten durante la ejecución.

Actualmente, se requiere la **aprobación del supervisor** con el fin de dar inicio al proceso de contratación, cuyo objeto es: **“Contratar el servicio de mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los ocho (8) nodos subregionales y el nodo**

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             | <p>departamental de Antioquia, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la continuidad operativa 7/24 y la disponibilidad de la infraestructura física que soporta la operación de la línea de emergencias 123 del departamento de Antioquia.”</p> <p>El estudio de mercado fue elaborado por Valor+ y es aprobado en este comité por el supervisor del contrato, Antonio José Salazar López, director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, estableciendo para cada ítem el <b>menor valor que cumple con las condiciones técnicas requeridas</b>, teniendo en cuenta que la contratación corresponde a una bolsa de servicios para consumo según las necesidades que se generen durante la ejecución contractual. <b>Valor estimado de la bolsa: \$202.545.763.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contrato No. 148-2026 – Servicio de operadores de nodos:</b><br/>Contratista: PROSEGUR Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.<br/>Se cuenta con un total de 31 operadores y 1 auxiliar. Se encuentra pendiente la validación y aprobación de 5 hojas de vida adicionales.</li> <li>• <b>Contrato No. 220-2026 – Suministro de papelería:</b><br/>Se encuentra en proceso de definición de los insumos requeridos para su adecuada ejecución.</li> <li>• <b>Auxiliar administrativa:</b> Se informa que el perfil requerido ya fue contratada, la profesional Leidy Mariana Alvarez Jaramillo, con inicio de labores a partir del 01 de junio de 2026; con objeto del contrato: Contratar los servicios personales de EL TRABAJADOR en el desempeño propio de las funciones de APOYO ADMINISTRATIVO DE NODOS, para la ejecución de las actividades derivadas del contrato interadministrativo N°23MA122C1482 de 2023, suscrito por VALOR + S.A.S Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.</li> <li>• <b>Rubro nómina de operación:</b> Se reporta la siguiente distribución: V+: 55,42% / 42% - PS: 26,97% / 36%</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Ejecución Física 40,61%</b><br/><b>Ejecución financiera 28,08%</b></p> |
| 6 | Componente Implementaciones | <p>En relación con el componente de implementaciones, el profesional técnico <b>Edison Arley Restrepo</b> informa lo siguiente:</p> <p>El valor final del suministro de una (1) cámara destinada al interior de los Centros de Monitoreo (CCM) es de \$122.024.700 IVA incluido, por el aliado Unión Temporal; encontrándose actualmente en proceso de firma del contrato. Con esta adquisición, el saldo del componente asciende a \$86.295.245 M/L. Se espera que el contrato esté firmado y legalizado la próxima semana para optimizar el uso de las 85 horas de desarrollo estimadas.</p> <p>Al sumar este disponible con la diferencia proveniente del componente de instalación de nodos, se cuenta con un total de \$109.970.146. Inicialmente, se contempló la adquisición de cincuenta (50) horas de desarrollo del sistema ISS por dicho valor.</p> <p>No obstante, tras la actualización de las condiciones de mercado, se evidenció una disminución en el costo unitario de las horas de desarrollo, lo que permite optimizar el uso de los recursos. En consecuencia, no se contratará un número fijo de horas, sino aquellas que resulten alcanzables con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                  |                                           | <p>el presupuesto disponible, estimándose actualmente una capacidad aproximada de ochenta y cinco (85) horas de desarrollo, sujeta a validación dentro del proceso contractual correspondiente.</p> <p>El estudio de mercado fue elaborado por Valor+ y es aprobado en este comité por el supervisor del contrato, Antonio José Salazar López, director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, estableciendo para cada ítem el menor valor que cumple con las condiciones técnicas requeridas. Valor estimado: \$109.970.146.</p> <p>Ejecución Física 0%<br/>Ejecución financiera 0%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------|----|-----------------|----|----------|----|------------|---|-------------|---|-------------|-------|
| 7                                                | Actas de transferencia                    | <p><b>Informe jurídico – Revisión y proyección de actas:</b> El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa</p> <p><b>Vigencia 2024:</b> En el tablero “Control AT 2024 – Indicadores clave de desempeño (Actas de transferencia)” el resumen general del estado de gestión de las transferencias a los municipios del departamento de Antioquia, se han completado 89 de 91 municipios (97,8%). Ya hay más 30 actas de transferencia para firmas y Montebello y Venecia ya firmaron.</p> <p>Para la vigencia 2025, se proyectan 50 actas de transferencia.</p> <table><tr><th colspan="2">Control Actas de transferencia Vigencia 2024</th></tr><tr><th colspan="2">Indicadores de desempeño – Actos administrativos</th></tr><tr><td>Total municipios</td><td>91</td></tr><tr><td>Total contratos</td><td>16</td></tr><tr><td>Completo</td><td>89</td></tr><tr><td>Pendientes</td><td>1</td></tr><tr><td>Sin activos</td><td>1</td></tr><tr><td>Complejidad</td><td>97,8%</td></tr></table> <p><b>Vigencia 2025:</b> Se continúa con el proceso de revisión detallada de ítems por facturación, así como con los ajustes correspondientes a las actas de transferencia, se tiene proyectadas 50 actas de transferencia.</p> | Control Actas de transferencia Vigencia 2024 |  | Indicadores de desempeño – Actos administrativos |  | Total municipios | 91 | Total contratos | 16 | Completo | 89 | Pendientes | 1 | Sin activos | 1 | Complejidad | 97,8% |
| Control Actas de transferencia Vigencia 2024     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Indicadores de desempeño – Actos administrativos |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Total municipios                                 | 91                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Total contratos                                  | 16                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Completo                                         | 89                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Pendientes                                       | 1                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Sin activos                                      | 1                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| Complejidad                                      | 97,8%                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |
| 8                                                | Estado Disponibilidad por componente 2026 | <p>Respecto al estado de disponibilidad por componente para la vigencia 2026, se presentan las siguientes aclaraciones en relación con el presupuesto asignado y su ejecución, conforme al cuadro detallado anteriormente.</p> <p>Hasta el mes de mayo, la ejecución del componente se ha concentrado únicamente en gastos recurrentes. En este periodo, se ha efectuado el pago correspondiente al mantenimiento por un valor de \$103.000.000.</p> <p>Adicionalmente, se evidencia un incremento en el costo de los servicios, los cuales pasaron de \$32.000.000 a \$42.000.000, lo que representa una variación significativa en el comportamiento del gasto operativo.</p> <p>Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |  |                                                  |  |                  |    |                 |    |          |    |            |   |             |   |             |       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table><tr><th>Componente</th><th>Presupuestado</th><th>Comprometido</th><th>Pagado</th><th>Facturado por pagar</th><th>Saldo contratos</th><th>Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><td></td></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.105.747.133</td><td>\$ 1.221.698.111</td><td>\$ 0</td><td>\$ 2.884.049.022</td><td>\$ 41.955.189</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>\$ 196.322.418</td><td>\$ 0</td><td>\$ 157.910.993</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 75.641.957</td><td>\$ 7.480.525</td><td>\$ 0</td><td>\$ 68.161.432</td><td>\$ 2.733.967.620</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 103.070.190</td><td>\$ 0</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.525.905.595</td><td>\$ 451.295.874</td><td>\$ 0</td><td>\$ 1.074.609.721</td><td>\$ 194.897.555</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.400.584.027</td><td>\$ 379.995.183</td><td>\$ 0</td><td>\$ 1.020.588.844</td><td>\$ 81.387.039</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 46.758.985</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 376.642.086</td><td>\$ 125.547.382</td><td>\$ 1.035.395.411</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 0</td><td>\$ 194.953.350</td><td>\$ 1.745.772.272</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 23.864.083.824</td><td>\$ 20.401.010.713</td><td>\$ 2.736.504.387</td><td>\$ 320.500.712</td><td>\$ 17.344.005.614</td><td>\$ 3.098.966.388</td></tr></table> | Componente       | Presupuestado       | Comprometido      | Pagado                     | Facturado por pagar | Saldo contratos            | Disponible |  |  | Valor | Valor | Valor | Valor |  | Instalación nodos | \$ 4.350.248.085  | \$ 4.105.747.133 | \$ 1.221.698.111 | \$ 0          | \$ 2.884.049.022 | \$ 41.955.189 | Instalación nodos-rubros nómina | \$ 354.233.411 | \$ 354.233.411,00               | \$ 196.322.418 | \$ 0           | \$ 157.910.993 | \$ 0 | Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577 | \$ 75.641.957  | \$ 7.480.525                | \$ 0          | \$ 68.161.432 | \$ 2.733.967.620 | Mantenimiento 84 Mpios | \$ 9.460.588.109 | \$ 9.460.588.109 | \$ 103.070.190 | \$ 0         | \$ 9.357.517.919 | \$ 0          | Conectividad  | \$ 1.720.803.150 | \$ 1.525.905.595 | \$ 451.295.874 | \$ 0           | \$ 1.074.609.721 | \$ 194.897.555 | Personal Apoyo | \$ 1.481.971.066 | \$ 1.400.584.027 | \$ 379.995.183 | \$ 0 | \$ 1.020.588.844 | \$ 81.387.039         | Implementaciones CCTV | \$ 208.319.945 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 46.758.985 | Mesa de ayuda | \$ 1.537.584.859 | \$ 1.537.584.859 | \$ 376.642.086 | \$ 125.547.382 | \$ 1.035.395.411 | \$ 0 | Honorarios | \$ 1.940.725.622 | \$ 1.940.725.622 | \$ 0           | \$ 194.953.350 | \$ 1.745.772.272 | \$ 0          | Totales | \$ 23.864.083.824 | \$ 20.401.010.713 | \$ 2.736.504.387 | \$ 320.500.712 | \$ 17.344.005.614 | \$ 3.098.966.388 |                |      |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------|----------------|
| Componente                                       | Presupuestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pagado           | Facturado por pagar | Saldo contratos   | Disponible                 |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor            | Valor               | Valor             |                            |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 4.105.747.133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.221.698.111 | \$ 0                | \$ 2.884.049.022  | \$ 41.955.189              |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 354.233.411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 354.233.411,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 196.322.418   | \$ 0                | \$ 157.910.993    | \$ 0                       |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 75.641.957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 7.480.525     | \$ 0                | \$ 68.161.432     | \$ 2.733.967.620           |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 9.460.588.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 103.070.190   | \$ 0                | \$ 9.357.517.919  | \$ 0                       |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.525.905.595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 451.295.874   | \$ 0                | \$ 1.074.609.721  | \$ 194.897.555             |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.400.584.027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 379.995.183   | \$ 0                | \$ 1.020.588.844  | \$ 81.387.039              |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0             | \$ 0                | \$ 0              | \$ 46.758.985              |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.537.584.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 376.642.086   | \$ 125.547.382      | \$ 1.035.395.411  | \$ 0                       |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.940.725.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 0             | \$ 194.953.350      | \$ 1.745.772.272  | \$ 0                       |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Totales                                          | \$ 23.864.083.824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 20.401.010.713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 2.736.504.387 | \$ 320.500.712      | \$ 17.344.005.614 | \$ 3.098.966.388           |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| 9                                                | <p><b>Estado Disponibilidad por componente 2025</b></p> <p>Respecto al estado de disponibilidad por componente 2025, se realizan las siguientes aclaraciones en relación con el presupuesto asignado y su ejecución.</p> <p><b>Vigencia 2025 (Reservas Presupuestales)</b></p> <p>De acuerdo con la información disponible, se evidencian saldos significativos en los componentes de <b>instalación de nodos (\$157M)</b> y <b>conectividad (\$135M)</b>. En el marco del comité, se reiteró que el <b>cierre máximo de estas reservas debe realizarse en julio de 2026</b>, considerando que corresponden a <b>recursos de crédito</b>, los cuales <b>no admiten prórrogas adicionales</b>.</p> <p>En consecuencia, se hace necesario adelantar las gestiones requeridas para garantizar la <b>ejecución oportuna de los recursos</b>, evitando su pérdida y asegurando el cumplimiento de los compromisos asociados a dichos componentes.</p> <table><tr><th>Componente</th><th>Presupuestado</th><th>Comprometido</th><th>Pagado</th><th>Facturado por pagar</th><th>Saldo contratos</th><th>En proceso de contratación</th><th>Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><td></td><td></td></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 92.988.384</td><td>\$ 92.988.384</td><td>\$ 86.900.900</td><td>\$ 0</td><td>\$ 6.087.484</td><td>\$ 0</td><td>\$ 157.077.721</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 231.397.463</td><td>\$ 231.397.463</td><td>\$ 80.252.722</td><td>\$ 0</td><td>\$ 151.144.741</td><td>\$ 0</td><td>\$ 151.144.741</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 municipios</td><td>\$ 71.017.672</td><td>\$ 71.017.672</td><td>\$ 70.904.522</td><td>\$ 0</td><td>\$ 113.150</td><td>\$ 0</td><td>\$ 7.029.008</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 50.129.538</td><td>\$ 50.129.538</td><td>\$ 50.112.854</td><td>\$ 0</td><td>\$ 16.684</td><td>\$ 0</td><td>\$ 135.072.888</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 65.753.419</td><td>\$ 65.753.419</td><td>\$ 34.591.790</td><td>\$ 0</td><td>\$ 31.161.629</td><td>\$ 0</td><td>\$ 31.356.543</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 134.356</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 202.796.927</td><td>\$ 0</td><td>\$ 93.416.731</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 807.500.134</td><td>\$ 807.500.134</td><td>\$ 525.559.715</td><td>\$ 0</td><td>\$ 281.940.419</td><td>\$ 0</td><td>\$ 330.670.516</td></tr></table> <p>Se continúa con la distribución y asignación de gastos, haciendo uso de los saldos disponibles en los diferentes componentes, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nodos \$ 157.077.721 Están para la adquisición de los 2 Fortinet de nodos occidente y oriente HA, y licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2. <b>En espera de cotización para definir otro si</b></li><li>Conectividad \$ 135.072.888 adquisición de teléfonos celulares CACOM 5. <b>En estudio de mercado nueva ficha técnica.</b></li></ul> | Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presupuestado    | Comprometido        | Pagado            | Facturado por pagar        | Saldo contratos     | En proceso de contratación | Disponible |  |  | Valor | Valor | Valor | Valor |  |                   | Instalación nodos | \$ 92.988.384    | \$ 92.988.384    | \$ 86.900.900 | \$ 0             | \$ 6.087.484  | \$ 0                            | \$ 157.077.721 | Instalación nodos-rubros nómina | \$ 231.397.463 | \$ 231.397.463 | \$ 80.252.722  | \$ 0 | \$ 151.144.741                                   | \$ 0             | \$ 151.144.741 | Mantenimiento 84 municipios | \$ 71.017.672 | \$ 71.017.672 | \$ 70.904.522    | \$ 0                   | \$ 113.150       | \$ 0             | \$ 7.029.008   | Conectividad | \$ 50.129.538    | \$ 50.129.538 | \$ 50.112.854 | \$ 0             | \$ 16.684        | \$ 0           | \$ 135.072.888 | Personal Apoyo   | \$ 65.753.419  | \$ 65.753.419  | \$ 34.591.790    | \$ 0             | \$ 31.161.629  | \$ 0 | \$ 31.356.543    | Implementaciones CCTV | \$ 0                  | \$ 0           | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 134.356    | Mesa de ayuda | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0             | \$ 0 | \$ 0       | Honorarios       | \$ 296.213.658   | \$ 296.213.658 | \$ 202.796.927 | \$ 0             | \$ 93.416.731 | \$ 0    | \$ 0              | Totales           | \$ 807.500.134   | \$ 807.500.134 | \$ 525.559.715    | \$ 0             | \$ 281.940.419 | \$ 0 | \$ 330.670.516 |
| Componente                                       | Presupuestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pagado           | Facturado por pagar | Saldo contratos   | En proceso de contratación | Disponible          |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor            | Valor               | Valor             |                            |                     |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Instalación nodos                                | \$ 92.988.384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 92.988.384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 86.900.900    | \$ 0                | \$ 6.087.484      | \$ 0                       | \$ 157.077.721      |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 231.397.463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 231.397.463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 80.252.722    | \$ 0                | \$ 151.144.741    | \$ 0                       | \$ 151.144.741      |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Mantenimiento 84 municipios                      | \$ 71.017.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 71.017.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 70.904.522    | \$ 0                | \$ 113.150        | \$ 0                       | \$ 7.029.008        |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Conectividad                                     | \$ 50.129.538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 50.129.538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 50.112.854    | \$ 0                | \$ 16.684         | \$ 0                       | \$ 135.072.888      |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Personal Apoyo                                   | \$ 65.753.419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 65.753.419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 34.591.790    | \$ 0                | \$ 31.161.629     | \$ 0                       | \$ 31.356.543       |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0             | \$ 0                | \$ 0              | \$ 0                       | \$ 134.356          |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0             | \$ 0                | \$ 0              | \$ 0                       | \$ 0                |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Honorarios                                       | \$ 296.213.658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 296.213.658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 202.796.927   | \$ 0                | \$ 93.416.731     | \$ 0                       | \$ 0                |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |
| Totales                                          | \$ 807.500.134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 807.500.134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 525.559.715   | \$ 0                | \$ 281.940.419    | \$ 0                       | \$ 330.670.516      |                            |            |  |  |       |       |       |       |  |                   |                   |                  |                  |               |                  |               |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |                |                             |               |               |                  |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |                |                  |                |                |                  |                  |                |      |                  |                       |                       |                |      |      |      |      |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |                |      |                |

|                                |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Radio enlaces (Cerro Marconi, Cerro Azul y Padre Amaya), se sugiere la adquisición de servidor de respaldo de integración, se envió ficha técnica del servidor a valor+. <b>Se inicia nuevamente estudio de mercado.</b></li> <li>Licencias faciales: enviado 3 de junio de 2026, se presentaron 3 proveedores:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th><th>Proveedor</th><th>Valor Cotización</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>SELTIC</td><td>\$243.044.000,50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ASF</td><td>\$254.261.415,91</td></tr> <tr> <td>3</td><td>DIVIX</td><td>\$368.915.318,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Después del traslado de los saldos de rubros de nómina de la vigencia 2025 al componente de instalación de nodos, de \$151.144.741, quedando un valor total de 308.222.462 Millones de Pesos M/L para la adquisición de licencias faciales.</p> <p>El estudio de mercado fue elaborado por Valor+ y es aprobado en este comité por el supervisor del contrato, Antonio José Salazar López, director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, estableciendo para cada ítem el <b>menor valor que cumple con las condiciones técnicas requeridas, por valor de \$243.044.000,50 Millones de pesos M/L.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº                             | Proveedor | Valor Cotización | 1              | SELTIC         | \$243.044.000,50 | 2  | ASF | \$254.261.415,91 | 3 | DIVIX | \$368.915.318,00 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----|-----|------------------|---|-------|------------------|
| Nº                             | Proveedor          | Valor Cotización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| 1                              | SELTIC             | \$243.044.000,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| 2                              | ASF                | \$254.261.415,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| 3                              | DIVIX              | \$368.915.318,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| 10                             | Pendientes de pago | <p>Honorarios mesa de ayuda Abril Factura V1867 \$ 125.547.362</p> <p>Honorarios ejecución enero - Abril Factura V1898 \$ 152.247.569</p> <p>Honorarios ejecución reservas enero - Abril Factura V1899 \$ 42.705.781</p> <p>Estos pagos se encuentran actualmente en gestión ante la Secretaría de Hacienda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| 11                             | Mesa de Ayuda      | <p>En relación con las novedades reportadas a través de la mesa de ayuda, el líder de mesa, <b>Sebastián Metaute</b>, informa que durante el periodo evaluado se registraron un total de 167 casos, de los cuales 149 han sido cerrados satisfactoriamente y 18 permanecen pendientes de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Del total de incidentes reportados, 32 correspondieron a fallas de conectividad</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr> <tr> <th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td><td>31</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Acompañamiento en jornada electoral:</b><br/>Se brindó acompañamiento por parte de la mesa de ayuda durante el desarrollo de las elecciones, garantizando soporte operativo y atención de incidentes.</li> <li><b>Municipio de Zaragoza:</b><br/>Se reporta daño en una UPS. Se encuentra pendiente la validación técnica para identificar la causa raíz de la falla y definir las acciones correctivas.</li> <li><b>Municipio de Yalí:</b><br/>Sin novedades adicionales reportadas en la presente sesión.</li> <li><b>Municipio de Giraldo:</b><br/>Se detectó un incidente de ciberseguridad consistente en aproximadamente 40 intentos de autenticación irregular contra el equipo FortiGate F200. Adicionalmente, se evidenció que el uso de una licencia tipo "demo" del sistema ISS generó indisponibilidad del servicio durante la jornada electoral, situación que ya fue corregida.<br/>Se resalta la necesidad de agilizar la contratación de un ingeniero de ciberseguridad a través del área de TI, con el fin de fortalecer la gestión de este tipo de eventos.</li> </ul> | Casos asociados a conectividad |           |                  | Casos abiertos | Casos Cerrados | Casos pendientes | 32 | 31  | 1                |   |       |                  |
| Casos asociados a conectividad |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| Casos abiertos                 | Casos Cerrados     | Casos pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |
| 32                             | 31                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |                  |                |                |                  |    |     |                  |   |       |                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Visita al SIES Medellín:</b><br/>Se realizó visita técnica para la revisión de la integración con la línea mujer. Como resultado, se acordó enviar comunicación formal para gestionar el acceso a las bases de datos, en el marco del acuerdo firmado. Se solicita a María Patricia Giraldo ordenadora del gasto a remitir dicho acuerdo para continuar con el proceso.</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Compromisos Acordados

| No. | Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                                                                     | Fecha                          | Resultado Esperado |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1   | Definir y documentar el procedimiento para la atención de solicitudes de grabaciones de las cámaras de seguridad al interior del nodo departamental, teniendo en cuenta que la infraestructura pertenece al Departamento de Antioquia y que la responsabilidad de la administración y custodia de dichas grabaciones recae en la empresa de seguridad departamental. | Tomás Sierra<br><b>Coordinador de Nodos</b><br><br>Antonio José Salazar López<br><b>Supervisor del contrato</b> | 11 de junio de 2026            |                    |
| 2   | Validar las posibles causas de la falla en las UPS del municipio de Zaragoza, con el fin de identificar el origen del problema y definir las acciones correctivas correspondientes.                                                                                                                                                                                  | Alexander Morales<br><b>Director Técnico AS</b>                                                                 | 11 de junio de 2026            |                    |
| 3   | Elaborar la solicitud técnica que sustente la necesidad en ciberseguridad para las labores del nodo departamental, con el fin de que sea gestionada y contratada por el área de TI de la Gobernación de Antioquia.                                                                                                                                                   | Marcela Aguirre<br><b>Coordinadora Administrativa V+</b>                                                        | Después de la ley de garantía. |                    |
| 4   | Gestionar el envío de solicitud formal mediante correo electrónico a la administración del Edificio Edatel, con el fin de solicitar la habilitación de una                                                                                                                                                                                                           | Tomás Sierra<br><b>Coordinador nodos</b>                                                                        | 11 de junio de 2026            |                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                 |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|   | puerta de acceso hacia el nodo departamental, incluyendo la autorización para el uso de la caseta ubicada en el nodo.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                 |  |
| 5 | Realizar la solicitud ante la Gobernación de Antioquia para la asignación de personal de seguridad que cubra el acceso al nodo departamental, en caso de ser habilitada la nueva puerta.                                                                                                                                                                             | Antonio José Salazar López<br><b>Supervisor del contrato</b>                                                    | En caso que sea posible el compromiso anterior. |  |
| 6 | Definir y documentar el procedimiento para la atención de solicitudes de grabaciones de las cámaras de seguridad al interior del nodo departamental, teniendo en cuenta que la infraestructura pertenece al Departamento de Antioquia y que la responsabilidad de la administración y custodia de dichas grabaciones recae en la empresa de seguridad departamental. | Tomás Sierra<br><b>Coordinador de Nodos</b><br><br>Antonio José Salazar López<br><b>Supervisor del contrato</b> | 11 de junio de 2026                             |  |


**Documentos Anexos al Acta**

| No.                                                                                         | Nombre del documento                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                           | Asistencia Comité Seguimiento 04-06-2026 – G2 |
| 2                                                                                           | Comité Técnico 04-06-2026 – G2                |
| <b>Proyectado por:</b> Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa              |                                               |
| <b>Revisó y Aprobó:</b> Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI |                                               |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |              | LISTADO ASISTENCIA                                  |              |                                   | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |  |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| FECHA: 4-Junio-2026                               | HORA: 4:00pm | LUGAR EVENTO: Centro de Análisis de Seguridad - CAD |              |                                   |                                                                        |  |
| ASUNTO: Comité de Seguimiento - GZ                | Acta N° 19   | DEPENDENCIA RESPONSABLE: Valor +                    |              |                                   |                                                                        |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS                      | CÉDULA       | CARGO/DEPENDENCIA                                   | TELÉFONO     | CORREO ELECTRÓNICO                | FIRMA                                                                  |  |
| Richard Uribe Camargo                             | 71692842     | Sup. Jurídico                                       | 301274771    | Guitos.ori@valormas.gov.co        |                                                                        |  |
| Tomás Sieva                                       | 49579400     | coordinador                                         | 31822614     | Nodos, Seguridad                  |                                                                        |  |
| Giovani Enrique Borrero                           | 86071266     | Profesor SSTP                                       | 305366816    | giamarr@valormas.gov.co           |                                                                        |  |
| Alexandra Muñoz G.                                | 13692464     | Dir. G. AS                                          | 30111425     | guitos.ori@valormas.gov.co        |                                                                        |  |
| Marcelo Aguirre                                   | 11859789     | coordinador                                         | 313745583    | Juan Carlos Aguirre               |                                                                        |  |
| Juan Carlos Botero                                | 3391516      | Spewer                                              | 3391516      | Juan Carlos Botero                |                                                                        |  |
| Oscar López Rincón                                | 71371308     | Ing. SSTP                                           | 300785886    | ingenieros@valormas.gov.co        |                                                                        |  |
| Yury Andrea Botero Leiva                          | 104042933    | Coordinadora SSTP                                   | 300340685    | yurya@valormas.gov.co             |                                                                        |  |
| Edison A. Roldán Henao                            | 1036945181   | Ing. SSTP                                           | 321874788    | ing.sstp@valormas.gov.co          |                                                                        |  |
| Camila A. Carrero Nieto                           | 9872374      | Coordinadora SSTP                                   | 3014063263   | camila@valormas.gov.co            |                                                                        |  |
| Carlos Flaminio Espinosa                          | 91572353     | Coordinador                                         | 316734004    | carlos.pnd@valormas.gov.co        |                                                                        |  |
| Juan Cordero                                      | 98571321     | Coordinador                                         | 300153300    | Juan Cordero                      |                                                                        |  |
| Sebastián Metayta                                 | 1080734543   | Líder mesa                                          | 3125742833   | sebastian.metayta@valormas.gov.co |                                                                        |  |
| John Felipe Zuloaga G.                            | 1015021654   | Jurídico AS                                         | 311-370-1204 | john.f.zuloaga@valormas.gov.co    |                                                                        |  |
| Carlos M. Marz G.                                 | 71690367     | Prof. F. O. U                                       | 310496041    | carlos.marzo@valormas.gov.co      |                                                                        |  |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1561 de 2012 en la que explico el régimen general de la protección de datos personales.

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1551 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.



## LISTADO ASISTENCIA

**Código: FO-M1-P7-001**

Version: 03

**Fecha de aprobación:** 04/02/2025

**FECHA:**

**HORA:**

**LUGAR EVENTO:**












ASUNTO:

Acta N°

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos.\* En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1551 de 2012 en la que expide el régimen general de la protección de datos personales.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |          |               |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|------|
| Acta N.                                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                 | Hora Inicio            | 04:39 PM   | Hora Fin                                                                              | 05:20 PM | Fecha Reunión |     |      |
| Dependencia que convoca                                                                                                                                                     | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+                                                                                  |                        |            |                                                                                       |          | Día           | Mes | Año  |
| Lugar de la reunión                                                                                                                                                         | Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos - CAD                                                             |                        |            |                                                                                       |          | 11            | 06  | 2026 |
| Nombre de la reunión                                                                                                                                                        | Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023                                                                                 |                        |            |                                                                                       |          |               |     |      |
| Señale en el espacio el tipo de reunión                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | Virtual                |            | Presencial                                                                            |          | X             |     |      |
| Objetivo de la reunión                                                                                                                                                      | Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia. |                        |            |                                                                                       |          |               |     |      |
| <i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i> |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |          |               |     |      |
| Nombre                                                                                                                                                                      | Cargo                                                                                                                              | Entidad                | Teléfono   | Firma                                                                                 |          |               |     |      |
| Duván Cardona                                                                                                                                                               | Coordinador técnico TASA                                                                                                           | VALOR+                 | 3014063263 |    |          |               |     |      |
| Carlos Mario Prada                                                                                                                                                          | Coordinador TI                                                                                                                     | SSJYP                  | 3167390024 |    |          |               |     |      |
| Cristián Andrés Castro                                                                                                                                                      | Coordinador Técnico TASA                                                                                                           | VALOR+                 | 3014063263 |   |          |               |     |      |
| Sebastián Metaute Luján                                                                                                                                                     | Líder Mesa de Ayuda                                                                                                                | VALOR+                 | 3125792683 |  |          |               |     |      |
| Antonio José Salazar                                                                                                                                                        | Director de Planeación SSJYP                                                                                                       | SSJYP                  | 3105011594 |  |          |               |     |      |
| Karen Ríos Martínez                                                                                                                                                         | Profesional Jurídica SSJYP                                                                                                         | SSJYP                  | 3013824999 |  |          |               |     |      |
| Yuri Andrea Buitrago                                                                                                                                                        | Profesional Financiero SSJYP                                                                                                       | SSJYP                  | 3006740685 |  |          |               |     |      |
| Tomás Sierra                                                                                                                                                                | Coordinador de Nodos                                                                                                               | SSJYP                  | 3183262485 |  |          |               |     |      |
| Alexander Morales                                                                                                                                                           | Director técnico                                                                                                                   | Apoyo a la Supervisión | 3017719895 |  |          |               |     |      |
| Giovanni Caicedo Barrera                                                                                                                                                    | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3125566816 |  |          |               |     |      |
| John Felipe Zuluaga                                                                                                                                                         | Profesional Jurídico                                                                                                               | Apoyo a la Supervisión | 3113701264 |  |          |               |     |      |
| Oscar Arley López                                                                                                                                                           | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3007858860 |  |          |               |     |      |
| Edison Arley Restrepo                                                                                                                                                       | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3218747232 |  |          |               |     |      |
| Vilsuly Yaneth González                                                                                                                                                     | Auxiliar administrativa                                                                                                            | Apoyo a la Supervisión | 3216956205 |  |          |               |     |      |
| <b>Agenda</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |          |               |     |      |
| N.º                                                                                                                                                                         | Temas a Tratar                                                                                                                     | Tratado                |            |                                                                                       |          |               |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | SI                     | NO         |                                                                                       |          |               |     |      |
| 1                                                                                                                                                                           | Compromisos del Comité Anterior                                                                                                    | X                      |            |                                                                                       |          |               |     |      |
| 2                                                                                                                                                                           | Componente apoyo a la supervisión                                                                                                  | X                      |            |                                                                                       |          |               |     |      |
| 3                                                                                                                                                                           | Componente de mantenimiento                                                                                                        | X                      |            |                                                                                       |          |               |     |      |

|    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 4  | Componente de Conectividad           | X |  |
| 5  | Componente de Nodos                  | X |  |
| 6  | Componente implementaciones          | X |  |
| 7  | Actas de transferencias              | X |  |
| 8  | Informe presupuestal y financiero    | X |  |
| 9  | Estado Disponibilidad por componente | X |  |
| 10 | Pendientes de pago                   | X |  |
| 11 | Mesa de ayuda                        | X |  |

**Desarrollo de la Reunión**

| N.º | Tema                              | Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Compromisos del comité Anterior   | <p>Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la socialización de los compromisos generados en la reunión anterior, a cargo del profesional técnico del Equipo de Apoyo a la Supervisión, Oscar Arley López.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definir y documentar el procedimiento para la atención de solicitudes de grabaciones de las cámaras de seguridad al interior del nodo departamental, teniendo en cuenta que la infraestructura pertenece al Departamento de Antioquia y que la responsabilidad de la administración y custodia de dichas grabaciones recae en la empresa de seguridad departamental, el supervisor del contrato informa que está en trámite con la Subsecretaría de Servicios Administrativos.</li> <li>Validar las posibles causas de la falla en las UPS del municipio de Zaragoza, con el fin de identificar el origen del problema y definir las acciones correctivas correspondientes, el director del contrato, el profesional Alexander Morales informa que se pasó el caso al aliado de mantenimiento de la subregión y se encontró que el servidor estaba bloqueado y está en reparación en el nodo departamental, se requiere diagnóstico para establecer si hay fallas en la acometida eléctrica o en la UPS para encontrar una solución definitiva.</li> <li>Elaborar la solicitud técnica que sustente la necesidad en ciberseguridad para las labores del nodo departamental, con el fin de que sea gestionada y contratada por el área de TI de la Gobernación de Antioquia, esta solicitud está siendo revisada por la profesional Marcela Aguirre.</li> <li>Gestionar el envío de solicitud formal mediante correo electrónico a la administración del Edificio Edatel, con el fin de solicitar la habilitación de una puerta de acceso hacia el nodo departamental, incluyendo la autorización para el uso de la caseta ubicada en el nodo, en lugar de correo se gestiona por la profesional Marcela Aguirre, una reunión presencial con la administración del edificio EDATEL.</li> <li>Realizar la solicitud ante la Gobernación de Antioquia para la asignación de personal de seguridad que cubra el acceso al nodo departamental, en caso de ser habilitada la nueva puerta, este compromiso está Supeditado a que se autorice la habilitación de la puerta en el punto anterior.</li> </ol> |
| 2   | Componente Apoyo a la Supervisión | En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Oscar Arley López, informa lo siguiente respecto a las actividades desarrolladas por el equipo técnico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acompañamiento a la supervisión en la realización de pruebas y certificación de fibra óptica en diferentes municipios.</li><li>• Seguimiento de prueba piloto 123 – Rionegro</li><li>• Visita municipio de Guatapé, Revisión de servidor y conexión del disco duro.</li><li>• Transporte CTO 204 – 2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Rionegro, Sopetrán, San Fe de Antioquia, Guatapé, Yalí.</li></ul> <p>En el municipio de Yalí: El servidor falló y se está revisando en el nodo departamental, por el momento se instaló una estación de trabajo provisional que no graba. Se proyecta instalar el servidor reparado el próximo <b>miércoles 17 de junio de 2026</b>.</p> <p>En el municipio de Guatapé: Se recuperó por garantía el disco duro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Integración terceros: Barbosa, Concordia, Salgar, Caldas, La Unión, Rionegro.</li></ul> <p><b>Ejecución Física 41,92%</b><br/><b>Ejecución financiera 25,64%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                  |                  |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|--------|-------|------------------|-----|----------------|------|-----|----------|------------|--|--|------------------|-----|------------------|------------------|--|--|--------|---------|------------------|-----|------------------|------------------|----------------|----------|------------|--------|-----------------|----------------|-----|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|--------|----------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-------|------------------|-----|------------------|------------------|---------|----------|------------|
| 3      | Componente Mantenimiento | <p>Respecto al componente de mantenimiento, el profesional Oscar Arley López informa lo siguiente:</p> <p><b>Alerta crítica:</b> El supervisor del contrato, <b>Antonio José Salazar López, Director de Planeación y Administración de la Seguridad</b>, manifiesta una alerta crítica debido a que, de los diagnósticos realizados, a la fecha únicamente se cuenta con <b>dos (2) diagnósticos oficiales y avalados por la SSJYP</b>. En consecuencia, se establece como decisión del comité un <b>plazo de dos (2) semanas</b> para culminar la revisión y obtener el aval correspondiente de los diagnósticos pendientes. Actualmente, se reportan <b>cuarenta y ocho (48) diagnósticos adelantados</b>, los cuales aún no han sido entregados oficialmente a la <b>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJYP)</b>.</p> <table><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Valor Total Lote</th><th>CDP</th><th>Valor</th><th>Proyecto o Fondo</th><th>Proponentes</th><th>Numero de Contrato</th><th>Acta de Inicio</th></tr><tr><td>Lote 2</td><td>URABA</td><td>\$ 1.636.037.963</td><td>174</td><td>\$ 504.370.390</td><td>TASA</td><td rowspan="2">CI2</td><td>167-2026</td><td>23/02/2026</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ 1.636.037.963</td><td>176</td><td>\$ 1.131.667.573</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>ORIENTE</td><td>\$ 3.420.806.648</td><td>178</td><td>\$ 3.420.806.648</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>CONSORCIO CCTV</td><td>168-2026</td><td>20/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>\$ 892.384.343</td><td>183</td><td>\$ 892.384.343</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>UT VMAS SEGURIDAD</td><td>170-2026</td><td>27/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 6</td><td>NORDESTE</td><td>\$ 1.487.307.239</td><td>184</td><td>\$ 1.487.307.239</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>UT SOLUCIONES INTEGRALES</td><td>171-2026</td><td>2/03/2026</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>NORTE</td><td>\$ 2.528.422.306</td><td>189</td><td>\$ 2.528.422.306</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>SPECTRA</td><td>172-2026</td><td>20/02/2026</td></tr></table> <p><b>Ejecución Física 13%</b><br/><b>Ejecución Financiera 1,09%</b></p> | Lote | Subregión        | Valor Total Lote | CDP                      | Valor              | Proyecto o Fondo | Proponentes | Numero de Contrato | Acta de Inicio | Lote 2 | URABA | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390 | TASA | CI2 | 167-2026 | 23/02/2026 |  |  | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |  |  | Lote 3 | ORIENTE | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV | 168-2026 | 20/02/2026 | Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343 | 183 | \$ 892.384.343 | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD | 170-2026 | 27/02/2026 | Lote 6 | NORDESTE | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026 | 2/03/2026 | Lote 7 | NORTE | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA | 172-2026 | 20/02/2026 |
| Lote   | Subregión                | Valor Total Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CDP  | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de Inicio   |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 2 | URABA                    | \$ 1.636.037.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174  | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
|        |                          | \$ 1.636.037.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176  | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 3 | ORIENTE                  | \$ 3.420.806.648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178  | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO          | \$ 892.384.343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183  | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 6 | NORDESTE                 | \$ 1.487.307.239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184  | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026        |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 7 | NORTE                    | \$ 2.528.422.306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189  | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| 4      | Componente Conectividad  | <p>El profesional <b>Oscar Arley López</b> informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad continúa sin variaciones relevantes respecto al reporte anterior, en detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de datos – líneas nodo (Contrato No. 195-2026): se mantiene sin cambios.</li><li>• Canales de conectividad para la implementación de SD-WAN: el proceso continúa en etapa de estudio de mercado, el 15 de junio se reciben propuestas.</li><li>• Redundancia canal dedicado internet en el nodo departamental: se hará por contratación directa con ANEXU, existe un <b>riesgo alto</b> para elecciones, se decidió activar licencias de equipos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |                  |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |  |  |                  |     |                  |                  |  |  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                   |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             | <p>actuales para usar un canal de cortesía de mediacommerce, ante la falta de contratación formal por parte de Valor+, una propuesta del Líder de Mesa, Sebastián Metaute.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migración de municipios a fibra óptica: entregados a fibra, se está pendiente con la proyección del otrosí con ANEXU para la cobertura de los servicios de fibra óptica a 4 municipios, ya mencionados en el comité anterior: Abriaquí, Murindó, Sabanalarga y San Jerónimo.</li> </ul> <p>A la fecha se han migrado a fibra óptica: Tarso, Necoclí, Ebéjico, Hispania y Armenia.</p> <p><b>Adquisición de radios – cerros asociados de CACOM 5:</b> El estudio de mercado se reinició por especificaciones técnicas insatisfactorias, como en el comité anterior.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 42,90%</b><br/><b>Ejecución Financiera 26,23%</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Componentes de Nodos        | <p>El profesional técnico <b>Oscar Arley López</b> informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segundo piso CRUE: Enviados APU el 28 de mayo del 2020 ➡ Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983. Se envió observaciones de parte de la secretaria a valor +, se encuentran en revisión y ajustes.</li> <li>2. Mantenimientos locativos nodos. En proceso de contratación. Contrato tipo bolsa \$202.545.763, también se reportaron 4 puertas en mal estado y problemas en los baños del segundo piso, se va a validar si tienen garantías por el contrato 269-2024.</li> <li>3. Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.</li> <li>4. Contrato 220-2026, papelería; los diseños de los sticker de la APP de Antioquia segura se pasaron a Valor +.</li> <li>5. Rubro nómina Operación V+: 55,42%/44% PS: 26,97/39%</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 40,61%</b><br/><b>Ejecución Financiera 28,08%</b></p> |
| 6 | Componente Implementaciones | <p>En relación con el componente de implementaciones, el profesional técnico <b>Oscar Arley López</b> informa que se realizó la contratación por un valor de <b>\$122.024.700, IVA incluido</b>. Actualmente, el contrato se encuentra en <b>proceso de firma y trámite de expedición de las respectivas pólizas</b>. Se cuenta con un <b>saldo disponible de \$86.295.245</b>, valor que se mantiene sin cambios respecto a la semana anterior.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 0%</b><br/><b>Ejecución financiera 0%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | Actas de transferencia      | <p><b>Informe jurídico – Revisión y proyección de actas:</b> El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa que se determinó que para el año 2025 las actas en custodia como anexo no son obligatorias administrativamente por no estar en la lista de chequeo original y que para las actas de transferencia de la vigencia 2026, serán de uso obligatorio en el expediente.</p> <p><b>Vigencia 2024:</b> 91 actas de transferencia.</p> <p><b>Vigencia 2025:</b> 82 actas de transferencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Estado Disponibilidad       | <p style="text-align: center;"><b>Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                  | por componente<br>2026                    | <table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th>Comprometido</th><th>Pagado</th><th>Facturado por pagar</th><th>Saldos contratos</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.105.747.133</td><td>\$ 1.221.698.111</td><td>\$ 0</td><td>\$ 2.884.049.022</td><td>\$ 41.955.18</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>\$ 198.322.418</td><td>\$ 0</td><td>\$ 157.910.993</td><td>\$</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 75.641.957</td><td>\$ 7.480.525</td><td>\$ 0</td><td>\$ 68.161.432</td><td>\$ 2.733.967,62</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 103.070.190</td><td>\$ 0</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>\$</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.525.905.595</td><td>\$ 451.295.874</td><td>\$ 0</td><td>\$ 1.074.609.721</td><td>\$ 194.897.55</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.400.584.027</td><td>\$ 379.995.183</td><td>\$ 0</td><td>\$ 1.020.588.844</td><td>\$ 81.387.03</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 46.758.98</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 376.642.086</td><td>\$ 125.547.362</td><td>\$ 1.035.395.411</td><td>\$</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 0</td><td>\$ 194.953.350</td><td>\$ 1.745.772.272</td><td>\$</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 23.864.083.824</td><td>\$ 20.401.010.713</td><td>\$ 2.736.504.387</td><td>\$ 320.500.712</td><td>\$ 17.344.005.614</td><td>\$ 3.098.966.33</td></tr></table> <p><b>Gastos recurrentes y mantenimiento:</b> Con corte al mes de mayo, la ejecución presupuestal corresponde principalmente a los gastos recurrentes. En cuanto al componente de mantenimiento, a la fecha se han realizado pagos por aproximadamente \$103.000.000. Asimismo, se informa que el valor de los servicios presentó un incremento, pasando de \$32.000.000 a \$42.000.000 mensuales, lo que representa un aumento de \$10.000.000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Componente       | Presupuestado  | Comprometido      | Pagado              | Facturado por pagar | Saldos contratos           | Disponible                 | Valor      | Valor      | Valor | Valor | Instalación nodos | \$ 4.350.248.085  | \$ 4.105.747.133 | \$ 1.221.698.111 | \$ 0          | \$ 2.884.049.022 | \$ 41.955.18 | Instalación nodos-rubros nómina | \$ 354.233.411 | \$ 354.233.411,00               | \$ 198.322.418 | \$ 0           | \$ 157.910.993 | \$   | Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577 | \$ 75.641.957 | \$ 7.480.525           | \$ 0          | \$ 68.161.432 | \$ 2.733.967,62 | Mantenimiento 84 Mpios | \$ 9.460.588.109 | \$ 9.460.588.109 | \$ 103.070.190 | \$ 0         | \$ 9.357.517.919 | \$            | Conectividad  | \$ 1.720.803.150 | \$ 1.525.905.595 | \$ 451.295.874 | \$ 0          | \$ 1.074.609.721 | \$ 194.897.55 | Personal Apoyo | \$ 1.481.971.066 | \$ 1.400.584.027 | \$ 379.995.183 | \$ 0 | \$ 1.020.588.844 | \$ 81.387.03                | Implementaciones CCTV | \$ 208.319.945 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 46.758.98 | Mesa de ayuda | \$ 1.537.584.859 | \$ 1.537.584.859 | \$ 376.642.086 | \$ 125.547.362 | \$ 1.035.395.411 | \$   | Honorarios | \$ 1.940.725.622 | \$ 1.940.725.622 | \$ 0           | \$ 194.953.350 | \$ 1.745.772.272 | \$            | Totales | \$ 23.864.083.824 | \$ 20.401.010.713 | \$ 2.736.504.387 | \$ 320.500.712 | \$ 17.344.005.614 | \$ 3.098.966.33 |                |      |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|------|---------------|
| Componente                                       | Presupuestado                             | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                | Pagado            | Facturado por pagar | Saldos contratos    | Disponible                 |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
|                                                  |                                           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor            | Valor          | Valor             |                     |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085                          | \$ 4.105.747.133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.221.698.111 | \$ 0           | \$ 2.884.049.022  | \$ 41.955.18        |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 354.233.411                            | \$ 354.233.411,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 198.322.418   | \$ 0           | \$ 157.910.993    | \$                  |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577                          | \$ 75.641.957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 7.480.525     | \$ 0           | \$ 68.161.432     | \$ 2.733.967,62     |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109                          | \$ 9.460.588.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 103.070.190   | \$ 0           | \$ 9.357.517.919  | \$                  |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150                          | \$ 1.525.905.595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 451.295.874   | \$ 0           | \$ 1.074.609.721  | \$ 194.897.55       |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066                          | \$ 1.400.584.027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 379.995.183   | \$ 0           | \$ 1.020.588.844  | \$ 81.387.03        |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945                            | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0             | \$ 0           | \$ 0              | \$ 46.758.98        |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859                          | \$ 1.537.584.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 376.642.086   | \$ 125.547.362 | \$ 1.035.395.411  | \$                  |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622                          | \$ 1.940.725.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 0             | \$ 194.953.350 | \$ 1.745.772.272  | \$                  |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Totales                                          | \$ 23.864.083.824                         | \$ 20.401.010.713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2.736.504.387 | \$ 320.500.712 | \$ 17.344.005.614 | \$ 3.098.966.33     |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| 9                                                | Estado Disponibilidad por componente 2025 | <p><b>Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025:</b> Respecto al estado de disponibilidad por componente de la vigencia 2025, se realizan las siguientes aclaraciones en relación con el presupuesto asignado y su ejecución. Se deja constancia de que el mes de julio de 2026 constituye la fecha máxima para el cierre y la ejecución de las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia 2025, aspecto que deberá quedar registrado en la presente acta debido a la importancia de garantizar la ejecución oportuna de los recursos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este sentido, se continúa con la distribución y asignación de gastos, haciendo uso de los saldos disponibles en los diferentes componentes, de conformidad con las necesidades identificadas y la disponibilidad presupuestal existente, de la siguiente manera:</p> <table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th>Comprometido</th><th>Pagado</th><th>Facturado por pagar</th><th>Saldos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 92.988.384</td><td>\$ 92.988.384</td><td>\$ 86.900.900</td><td>\$ 0</td><td>\$ 6.087.484</td><td>\$ 0</td><td>\$ 157.077.72</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 231.397.463</td><td>\$ 231.397.463</td><td>\$ 80.252.722</td><td>\$ 0</td><td>\$ 151.144.741</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 71.017.672</td><td>\$ 71.017.672</td><td>\$ 70.904.522</td><td>\$ 0</td><td>\$ 113.150</td><td>\$ 0</td><td>\$ 7.029.00</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 50.129.538</td><td>\$ 50.129.538</td><td>\$ 50.112.854</td><td>\$ 0</td><td>\$ 16.684</td><td>\$ 0</td><td>\$ 135.072.88</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 65.753.419</td><td>\$ 65.753.419</td><td>\$ 34.591.790</td><td>\$ 0</td><td>\$ 31.161.629</td><td>\$ 0</td><td>\$ 31.356.54</td></tr><tr><td>Instalac Nuevos componentes</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 134.35</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 202.796.927</td><td>\$ 0</td><td>\$ 93.416.731</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 807.500.134</td><td>\$ 807.500.134</td><td>\$ 525.559.715</td><td>\$ 0</td><td>\$ 281.940.419</td><td>\$ 0</td><td>\$ 330.670.51</td></tr></table> <p><b>Nodos – \$157.077.721:</b> Los recursos disponibles están destinados a la adquisición de dos (2) equipos Fortinet para los nodos Occidente y Oriente, bajo esquema de alta disponibilidad (HA). Actualmente, la adquisición se encuentra en estudio de mercado y se tiene previsto realizar un otrosí al contrato vigente con el aliado Telefónica, una vez se surtan las validaciones y el proceso correspondiente.</p> <p><b>Licenciamiento de Fortinet</b> fase 1 y fase 2 (En estudio de mercado).</p> | Componente       | Presupuestado  | Comprometido      | Pagado              | Facturado por pagar | Saldos contratos           | En proceso de contratación | Disponible | Valor      | Valor | Valor | Valor             | Instalación nodos | \$ 92.988.384    | \$ 92.988.384    | \$ 86.900.900 | \$ 0             | \$ 6.087.484 | \$ 0                            | \$ 157.077.72  | Instalación nodos-rubros nómina | \$ 231.397.463 | \$ 231.397.463 | \$ 80.252.722  | \$ 0 | \$ 151.144.741                                   | \$ 0             | \$ 0          | Mantenimiento 84 Mpios | \$ 71.017.672 | \$ 71.017.672 | \$ 70.904.522   | \$ 0                   | \$ 113.150       | \$ 0             | \$ 7.029.00    | Conectividad | \$ 50.129.538    | \$ 50.129.538 | \$ 50.112.854 | \$ 0             | \$ 16.684        | \$ 0           | \$ 135.072.88 | Personal Apoyo   | \$ 65.753.419 | \$ 65.753.419  | \$ 34.591.790    | \$ 0             | \$ 31.161.629  | \$ 0 | \$ 31.356.54     | Instalac Nuevos componentes | \$ 0                  | \$ 0           | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 134.35    | Mesa de ayuda | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0           | \$ 0           | \$ 0             | \$ 0 | \$ 0       | Honorarios       | \$ 296.213.658   | \$ 296.213.658 | \$ 202.796.927 | \$ 0             | \$ 93.416.731 | \$ 0    | \$ 0              | Totales           | \$ 807.500.134   | \$ 807.500.134 | \$ 525.559.715    | \$ 0            | \$ 281.940.419 | \$ 0 | \$ 330.670.51 |
| Componente                                       | Presupuestado                             | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                | Pagado            | Facturado por pagar | Saldos contratos    | En proceso de contratación |                            |            | Disponible |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
|                                                  |                                           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor            | Valor          | Valor             |                     |                     |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Instalación nodos                                | \$ 92.988.384                             | \$ 92.988.384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 86.900.900    | \$ 0           | \$ 6.087.484      | \$ 0                | \$ 157.077.72       |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 231.397.463                            | \$ 231.397.463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 80.252.722    | \$ 0           | \$ 151.144.741    | \$ 0                | \$ 0                |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 71.017.672                             | \$ 71.017.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 70.904.522    | \$ 0           | \$ 113.150        | \$ 0                | \$ 7.029.00         |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Conectividad                                     | \$ 50.129.538                             | \$ 50.129.538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 50.112.854    | \$ 0           | \$ 16.684         | \$ 0                | \$ 135.072.88       |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Personal Apoyo                                   | \$ 65.753.419                             | \$ 65.753.419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 34.591.790    | \$ 0           | \$ 31.161.629     | \$ 0                | \$ 31.356.54        |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Instalac Nuevos componentes                      | \$ 0                                      | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0             | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0                | \$ 134.35           |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 0                                      | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0             | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0                | \$ 0                |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Honorarios                                       | \$ 296.213.658                            | \$ 296.213.658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 202.796.927   | \$ 0           | \$ 93.416.731     | \$ 0                | \$ 0                |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |
| Totales                                          | \$ 807.500.134                            | \$ 807.500.134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 525.559.715   | \$ 0           | \$ 281.940.419    | \$ 0                | \$ 330.670.51       |                            |                            |            |            |       |       |                   |                   |                  |                  |               |                  |              |                                 |                |                                 |                |                |                |      |                                                  |                  |               |                        |               |               |                 |                        |                  |                  |                |              |                  |               |               |                  |                  |                |               |                  |               |                |                  |                  |                |      |                  |                             |                       |                |      |      |      |      |              |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |                |                |                  |               |         |                   |                   |                  |                |                   |                 |                |      |               |

**Conectividad \$ 135.072.888** adquisición de teléfonos celulares CACOM 5. En el día de hoy 11 de junio, Valor + compartió con la supervisión el estudio de mercado de los servidores con la nueva ficha técnica, se habían planteado por parte del Equipo apoyo a la supervisión la necesidad de 3 servidores:

**Valor techo servidores:**

\_Servidor tipo 1 - 8T \$ 97.256.320  
\_Servidor tipo 2 - 24T \$ 111.222.160  
\_Servidor tipo 3 - 40T \$ 116.562.880

**Decisión:** Se comprará el servidor de 24T o 40T una vez se cierren los estudios de mercado de radios y celulares para no exceder el presupuesto, información dada por el director del Gerenciamiento 2; Alexander Morales.

| SERVIDOR |                 |         |          |                |                |
|----------|-----------------|---------|----------|----------------|----------------|
| ITEM     | DESCRIPCION     | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL       |
| 1        | Servidor tipo 1 | UN      | 1        | \$ 81.728.000  | \$ 81.728.000  |
| 2        | Servidor tipo 2 | UN      | 1        | \$ 93.464.000  | \$ 93.464.000  |
| 3        | Servidor tipo 3 | UN      | 1        | \$ 97.952.000  | \$ 97.952.000  |
| SUBTOTAL |                 |         |          |                | \$ 273.144.000 |
| IVA      |                 |         |          | 19%            | \$ 51.897.360  |
| TOTAL    |                 |         |          |                | \$ 325.041.360 |

**Radio enlaces** (Cerro Marconi, Cerro Azul y Padre Amaya) integración, se envió ficha técnica del servidor a valor+.

**Licencias faciales y ejecución de recursos:** Se informa que, para la adquisición de las licencias faciales, la cotización más favorable corresponde a un valor de \$243.044.000,50. En este sentido, se adelantará la documentación requerida con el propósito de habilitar el proceso contractual una vez finalice la Ley de Garantías.

No obstante, en caso de que Valor+ no avance oportunamente con este proceso, y teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de los recursos correspondientes a la reserva durante el mes de junio, se propone priorizar, por urgencia de ejecución, la adquisición de elementos de seguridad y salud en el trabajo (SST), específicamente extintores y botiquines.

Para tal efecto, será necesario que el profesional Luis Fernando Macías realice la solicitud a Valor+ de los elementos requeridos para SST. Esta alternativa fue propuesta por el supervisor del contrato y director de Planeación y Administración de la Seguridad, Antonio José Salazar López, como medida para garantizar la ejecución de los recursos y evitar su pérdida.

Los recursos para esta adquisición serían imputados al componente de mantenimiento, quedando pendiente la revisión y definición del alcance correspondiente.

Esta es la presentación de la oferta por Valor + para la adquisición de las horas de desarrollo:

| CONVOLUCIÓN ESTUDIO DE MERCADO |                               |                   | PROVEEDOR 1 A.M. SOLUCIONES S.A.S.   |                                                                   |                                      | PROVEEDOR 2 BIVEL SISTEMAS POR ACCIONES |                                      |                                                                   | PROVEEDOR 3 DELIC                    |                                   |                                      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Item                           | Descripción / Características | Cantidad de horas | Valor unitario (en \$/HORA) (E.T.O.) | Porcentaje de hora de desarrollo a la actividad solicitada (en %) | Valor unitario (en \$/HORA) (E.T.O.) | Valor Total (en \$/HORA) (E.T.O.)       | Valor unitario (en \$/HORA) (E.T.O.) | Porcentaje de hora de desarrollo a la actividad solicitada (en %) | Valor unitario (en \$/HORA) (E.T.O.) | Valor Total (en \$/HORA) (E.T.O.) | Valor unitario (en \$/HORA) (E.T.O.) |
| 1                              | Programa de Ayuda             | 10 horas          | 1.111.111,11                         | 10%                                                               | 1.111.111,11                         | 11.111.111,11                           | 2.222.222,22                         | 10%                                                               | 2.222.222,22                         | 22.222.222,22                     | 3.333.333,33                         |
| 2                              | Programa de Ayuda             | 25 horas          | 1.444.444,44                         | 10%                                                               | 1.444.444,44                         | 35.555.555,56                           | 3.555.555,56                         | 10%                                                               | 3.555.555,56                         | 88.888.888,89                     | 4.444.444,44                         |
| 3                              | Programa de Ayuda             | 50 horas          | 2.222.222,22                         | 10%                                                               | 2.222.222,22                         | 70.370.370,37                           | 7.037.037,04                         | 10%                                                               | 7.037.037,04                         | 351.851.851,85                    | 11.111.111,11                        |
| Valor Total de la oferta:      |                               |                   |                                      |                                                                   |                                      | 111.111.111,11                          |                                      |                                                                   |                                      | 351.851.851,85                    |                                      |

**Adquisición de horas de desarrollo del sistema ISS:** En el comité anterior se presentó y analizó el estudio de mercado para la adquisición de horas de desarrollo del sistema ISS, en el cual se compararon las propuestas económicas de los diferentes proveedores. De acuerdo con el cuadro presentado, el **Proveedor 1 – AS Soluciones S.A.S.** presentó la oferta económica más favorable, contemplando los paquetes de diez (10), veinticinco (25) y cincuenta (50) horas, para un total de **ochenta y cinco (85) horas de desarrollo**, cuyo valor inicialmente ofertado ascendía a **\$109.970.146**. Como resultado del proceso, se concretó la contratación con dicho proveedor por un valor final de **\$108.230.500**, correspondiente a las **ochenta y cinco (85) horas de desarrollo** requeridas para el sistema ISS.

Lo anterior contó con el **visto bueno y la aprobación** del supervisor del contrato, Antonio José Salazar López, Director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJYP) de la Gobernación de Antioquia.

10

Pendientes de pago

Honorarios mesa de ayuda Abril Factura V1867 \$ 125.547.362  
Honorarios ejecución enero - Abril Factura V1898 \$ 152.247.569  
Honorarios ejecución reservas enero - Abril Factura V1899 \$ 42.705.781  
  
Se reportan facturas pendientes por honorarios de mesa de ayuda y ejecución (V1867, V1898, V1899) que suman más de **\$320.000.000 aproximadamente**.

11

Mesa de Ayuda

En relación con las novedades reportadas a través de la mesa de ayuda, el líder de mesa, **Sebastián Metaute**, informa que durante el periodo evaluado se registraron un total de 137 casos, de los cuales 128 han sido cerrados satisfactoriamente y 9 permanecen pendientes de gestión.

**Del total de incidentes reportados, 21 correspondieron a fallas de conectividad:**

| Casos asociados a conectividad |                |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Casos abiertos                 | Casos Cerrados | Casos pendientes |
| 21                             | 20             | 1                |

- ✓ Reparación servidores de Zaragoza y Yalí, se espera tenerlos listos a más tardar el martes 16 de junio de 2026 para instalarlos en los municipios correspondientes.
- ✓ En los municipios de **Peque y Sabanalarga**, se encuentra en proceso de identificación y definición de la persona encargada, con el fin de garantizar la **visualización desde el nodo** y realizar las gestiones necesarias para habilitar el acceso correspondiente.
- ✓ En el comité anterior se decide retirar el municipio de San Jerónimo al aliado Telefónica, por fallas en conectividad.
- ✓ Fallo en la línea 123 Departamental: La **Línea 123** estuvo fuera de servicio 3 horas el sábado 6 de junio de 2026, se restablece el servicio intermitente a las 2:00 PM, el responsable es **Telefónica/Movistar** por una intervención no informada en Rionegro.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión consultas LPR en el nodo departamental, ISS informa que debe validar unas configuraciones en los municipios.</li> <li>✓ Ajuste en los usuarios con marca de agua.</li> <li>✓ La <b>Mesa de Ayuda</b> cuenta actualmente con seis (6) profesionales contratados. Se encuentran pendientes de vinculación dos (2) personas, por el momento existe una persona contratada (1) por cada subnodo, con el fin de garantizar la cobertura en una única jornada de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., así como la <b>disponibilidad para atender requerimientos en los demás horarios, cuando sea necesario.</b></li> </ul> <p>Se precisa que actualmente <b>no se cuenta con personal asignado en el municipio de Caucasia</b>, mientras que en Andes el proceso de contratación se encuentra en curso.</p> <p>Para el proyecto de <b>ordenanza de vigencias futuras correspondiente al periodo 2028–2031</b>, se contempla la inclusión de los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios asociados a la Mesa de Ayuda, los receptores, los operadores de videovigilancia, los gastos recurrentes y las aplicaciones. Asimismo, se establece que el equipo apoyo a la supervisión de estos componentes será contratada directamente por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJYP).</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Compromisos Acordados

| No. | Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable                              | Fecha               | Resultado Esperado |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | Gestionar la solicitud y suministro de insumos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el Nodo Departamental y los nodos subregionales, incluyendo extintores (recarga y señalización), botiquines de primeros auxilios (dotación y reposición) y demás elementos necesarios para la prevención de riesgos, conforme a las necesidades identificadas en cada nodo.. | Luis Fernando Macías<br>Profesional SST  | 18 de junio de 2026 |                    |
| 2   | Elaborar el proyecto de ordenanza de vigencias futuras para el periodo 2028–2031, con el fin de presentarlo ante la Asamblea Departamental.                                                                                                                                                                                                                               | Alexander Morales<br>Director Técnico AS | Junio de 2026       |                    |













#### Documentos Anexos al Acta


| No. | Nombre del documento                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1   | Asistencia Comité Seguimiento 11-06-2026 – G2 |
| 2   | Comité Técnico 11-06-2026 – G2                |

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proyectado por:  | Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa             |
| Revisó y Aprobó: | Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI |

| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |                             | LISTADO ASISTENCIA                                    |            | Código: FO-M1-P7-001<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 04/02/2025 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FECHA: 11 JUNIO DE 2026                                                                                                                  | HORA: 4:39 PM               | LUGAR EVENTO: Centro de analítica de Seguridad. - CAD |            |                                                                        |                    |
| ASUNTO: Comité de Seguimiento G2.                                                                                                        | DEPENDENCIA RESPONSABLE: V+ |                                                       | N° ACTA:   |                                                                        |                    |
| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS                                                                                                             | CÉDULA                      | CARGO/DEPENDENCIA                                     | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO                                                     | FIRMA              |
| Giovanni Ricardo Romero                                                                                                                  | 96074266                    | ing. control de SSJP                                  | 312376816  | gromero777@antioquia.com                                               | <i>[Signature]</i> |
| Carlos Plinio Puelin E.                                                                                                                  | 91572343                    | Coordinador Op V+.                                    | 316734087  | carlos.puelin@valorms.gov.co                                           | <i>[Signature]</i> |
| Yiky Andrea Botago Lopera                                                                                                                | 1000040913                  | Contratista SSJP                                      | 300674005  | yabotago@gmail.com                                                     | <i>[Signature]</i> |
| Oscar Lopez                                                                                                                              | 71371308                    | Ing. AS J y P                                         | 300785880  | ingeniero.62@antioquia.com                                             | <i>[Signature]</i> |
| Karen Rios Martinez                                                                                                                      | 103755790                   | cheta SSJP.                                           | 301320077  | karen.rios@antioquia.com                                               | <i>[Signature]</i> |
| Elisa A. Restrepo Hinojosa                                                                                                               | 1036745181                  | ingeniero SSJP                                        | 321894932  | ingeniero.gabriel@antioquia.gov.co                                     | <i>[Signature]</i> |
| Alexander Muñoz G.                                                                                                                       | 1076924699                  | Asesor AS                                             | 30001005   | alexmuñoz@cont                                                         | <i>[Signature]</i> |
| John Felipe Zuluaga G.                                                                                                                   | 1045021654                  | Jurídico AS                                           | 3113711264 | john.felipe.zuluaga@antioquia.com                                      | <i>[Signature]</i> |
| Tomás Suarez                                                                                                                             | 79579400                    | Coordinador - Nodo                                    | 318316288  | Nodos.seguridad@                                                       | <i>[Signature]</i> |
| Edgar Cardona                                                                                                                            | 98677321                    | Coordinador valor +                                   | 3001153200 | edgarcardona@valorms                                                   | <i>[Signature]</i> |
| CRISTIAN ANGELO CASTAÑO NIÑO                                                                                                             | 96773769                    | COORDINADOR VALOR +                                   | 3014063763 | cristian.castano@valorms.gov.co                                        | <i>[Signature]</i> |
| Vilsy Y Janeth González S.                                                                                                               | 1036607036                  | Auxiliar Admin                                        | 321695620  | auxiliar.g2@antioquia.gov.co                                           | <i>[Signature]</i> |
| Antonio José Salazar L.                                                                                                                  | 98528777                    | Dir. Planeación                                       | 310011594  | antonio.jose.salazar@antioquia.gov.co                                  | <i>[Signature]</i> |
| Sebastián Nietante Wijn                                                                                                                  | 1000734343                  | Mesa Nodo                                             | 3125792683 | sebastian.nietante@valorms.gov.co                                      | <i>[Signature]</i> |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

|                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                    |                 |                                                                                       |                   |                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| <b>Acta N.</b>                                                                                                                                                              | 21                           | <b>Hora Inicio</b>                                                                                                                 | 02:00 PM        | <b>Hora Fin</b>                                                                       | 03:20 PM          | <b>Fecha Reunión</b> |            |            |
| <b>Dependencia que convoca</b>                                                                                                                                              |                              | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+                                                                                  |                 |                                                                                       |                   | <b>Día</b>           | <b>Mes</b> | <b>Año</b> |
| <b>Lugar de la reunión</b>                                                                                                                                                  |                              | Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos - CAD                                                             |                 |                                                                                       |                   | 18                   | 06         | 2026       |
| <b>Nombre de la reunión</b>                                                                                                                                                 |                              | Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023                                                                                 |                 |                                                                                       |                   |                      |            |            |
| <b>Señale en el espacio el tipo de reunión</b>                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                    | <b>Virtual</b>  |                                                                                       | <b>Presencial</b> | X                    |            |            |
| <b>Objetivo de la reunión</b>                                                                                                                                               |                              | Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia. |                 |                                                                                       |                   |                      |            |            |
| <b>Participantes</b> (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales) |                              |                                                                                                                                    |                 |                                                                                       |                   |                      |            |            |
| <b>Nombre</b>                                                                                                                                                               | <b>Cargo</b>                 | <b>Entidad</b>                                                                                                                     | <b>Teléfono</b> | <b>Firma</b>                                                                          |                   |                      |            |            |
| Yuri Marcela Aguirre                                                                                                                                                        | Coordinadora Administrativa  | VALOR+                                                                                                                             | 3137450593      |    |                   |                      |            |            |
| Juan David Betancur                                                                                                                                                         | Supervisor Técnico           | VALOR+                                                                                                                             | 3014210126      |    |                   |                      |            |            |
| Duván Cardona                                                                                                                                                               | Coordinador técnico TASA     | VALOR+                                                                                                                             | 3014063263      |    |                   |                      |            |            |
| Carlos Mario Mazo Giraldo                                                                                                                                                   | Profesional Financiero       | VALOR+                                                                                                                             | 3104996091      |    |                   |                      |            |            |
| Carlos Mario Prada                                                                                                                                                          | Coordinador Operativo        | VALOR+                                                                                                                             | 3167390024      |   |                   |                      |            |            |
| Richard Uribe                                                                                                                                                               | Supervisor Jurídico          | VALOR+                                                                                                                             | 3012392911      |  |                   |                      |            |            |
| Cristián Andrés Castro                                                                                                                                                      | Coordinador Técnico TASA     | VALOR+                                                                                                                             | 3014063263      |  |                   |                      |            |            |
| Sebastián Metaute Luján                                                                                                                                                     | Líder Mesa de Ayuda          | VALOR+                                                                                                                             | 3125792683      |  |                   |                      |            |            |
| Antonio José Salazar                                                                                                                                                        | Director de Planeación SSJYP | SSJYP                                                                                                                              | 3105011594      |  |                   |                      |            |            |
| Karen Ríos Martínez                                                                                                                                                         | Profesional Jurídica SSJYP   | SSJYP                                                                                                                              | 3013824999      |  |                   |                      |            |            |
| Yuri Andrea Buitrago                                                                                                                                                        | Profesional Financiero SSJYP | SSJYP                                                                                                                              | 3006740685      |  |                   |                      |            |            |
| Tomás Sierra                                                                                                                                                                | Coordinador de Nodos         | SSJYP                                                                                                                              | 3183262485      |  |                   |                      |            |            |
| Alexander Morales                                                                                                                                                           | Director técnico             | Apoyo a la Supervisión                                                                                                             | 3017719895      |  |                   |                      |            |            |
| Giovanni Caicedo Barrera                                                                                                                                                    | Profesional Técnico          | Apoyo a la Supervisión                                                                                                             | 3125566816      |  |                   |                      |            |            |
| John Felipe Zuluaga                                                                                                                                                         | Profesional Jurídico         | Apoyo a la Supervisión                                                                                                             | 3113701264      |  |                   |                      |            |            |
| Oscar Arley López Rincón                                                                                                                                                    | Profesional Técnico          | Apoyo a la Supervisión                                                                                                             | 3007858860      |  |                   |                      |            |            |
| Edison Arley Restrepo                                                                                                                                                       | Profesional Técnico          | Apoyo a la Supervisión                                                                                                             | 3218747232      |  |                   |                      |            |            |
| Luis Fernando Macías                                                                                                                                                        | Profesional SST              | Apoyo a la Supervisión                                                                                                             | 3132556737      |  |                   |                      |            |            |

|                         |                         |                        |            |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilsuly Yaneth González | Auxiliar administrativa | Apoyo a la Supervisión | 3216956205 |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Agenda

| N.º | Temas a Tratar                       | Tratado |    |
|-----|--------------------------------------|---------|----|
|     |                                      | SI      | NO |
| 1   | Compromisos del Comité Anterior      | X       |    |
| 2   | Componente apoyo a la supervisión    | X       |    |
| 3   | Componente de mantenimiento          | X       |    |
| 4   | Componente de Conectividad           | X       |    |
| 5   | Componente de Nodos                  | X       |    |
| 6   | Componente implementaciones          | X       |    |
| 7   | Actas de transferencias              | X       |    |
| 8   | Informe presupuestal y financiero    | X       |    |
| 9   | Estado Disponibilidad por componente | X       |    |
| 10  | Pendientes de pago                   | X       |    |
| 11  | Mesa de ayuda                        | X       |    |

#### Desarrollo de la Reunión

| N.º | Tema                            | Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Compromisos del comité Anterior | <p>Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la socialización de los compromisos generados en la reunión anterior, a cargo del profesional técnico del Equipo de Apoyo a la Supervisión, Edison Arley Restrepo.</p> <p>A continuación, se presenta el estado de los compromisos:</p> <p><b>1. Insumos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):</b> en el comité anterior se establece como compromiso la gestión de la solicitud y suministro de insumos requeridos para el nodo departamental y los nodos subregionales, incluyendo extintores (recarga y señalización), botiquines de primeros auxilios (dotación y reposición) y demás elementos necesarios para la prevención de riesgos, conforme a las necesidades identificadas en cada punto. Esta actividad se encuentra a cargo de Luis Fernando Macías, profesional SST. Según el informe presentado por él, en el comité, a continuación, se detallan los principales aspectos:</p> <p><b>Elementos de emergencia y señalización:</b> Se evidenció que la mayoría de los extintores, tanto en el nodo departamental como en los subregionales, se encuentran vencidos, por lo cual se requiere su mantenimiento y recarga. En total, se han identificado veinticinco (25) extintores tipo CO<sub>2</sub> que requieren intervención.</p> <p>En cuanto a los botiquines, varios de sus elementos están próximos a vencer o ya han sido utilizados, lo que hace necesaria su reposición. Se proyecta la adquisición de ocho (8) kits de reabastecimiento, así como la instalación de dos (2) botiquines fijos tipo B en el nodo departamental, uno por cada piso.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Respecto a la señalización, se han adelantado algunas instalaciones; sin embargo, aún se requiere completar la cobertura en todos los nodos. Para ello, se estima la necesidad de sesenta (60) piezas de señalética con diferentes especificaciones.</p> <p><b>Dotación y protección personal:</b> Se identificó la necesidad de suministrar una dotación básica de elementos de protección personal (EPP) para el personal que realiza labores en campo, estimándose la adquisición de nueve (9) kits para el equipo de gerenciamiento.</p> <p>Adicionalmente, en los nodos subregionales se planteó la necesidad de adquirir lockers para el resguardo de pertenencias del personal operativo, incluyendo miembros de la fuerza pública; no obstante, esta necesidad se considera secundaria frente a los requerimientos de emergencia</p> <p><b>Capacitación y adecuaciones en el nodo:</b> Se han desarrollado capacitaciones en el manejo de extintores y se tiene programada una capacitación en primeros auxilios básicos.</p> <p>Asimismo, en el marco de las obras que se adelantan en el segundo piso del nodo departamental, se están evaluando los elementos de emergencia adicionales requeridos para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en el nuevo espacio.</p> <p><b>Gestión presupuestal para SST:</b> En cuanto a la financiación, se identificó que estos elementos no pueden ser incluidos fácilmente en contratos de mantenimiento actualmente en ejecución. Por lo tanto, se propone destinar una disponibilidad aproximada de dieciocho millones de pesos (\$18.000.000) del rubro de “instalación y operación de nodos” como una bolsa específica para la adquisición de insumos de SST.</p> <p>Desde el punto de vista contractual, se recomienda la estructuración de un contrato tipo bolsa, soportado en un listado de precios de mercado, que permita la adquisición exclusiva de los suministros de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).</p> <p>En conclusión, la prioridad inmediata se centra en la actualización, mantenimiento y reposición de los equipos de emergencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y mitigar riesgos en la operación de los nodos, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles.</p> <p>En este sentido, el supervisor del contrato, en su calidad de director de la Dirección de Planeación y Administración de la Seguridad, aprueba la solicitud presentada y otorga el visto bueno para gestionar la adquisición y suministro de insumos de SST para el nodo departamental y los nodos subregionales. Lo anterior incluye extintores (recarga y señalización), botiquines de primeros auxilios (dotación y reposición) y demás elementos necesarios para la prevención de riesgos, conforme a las necesidades identificadas en cada nodo.</p> <p><b>2. Proyecto de ordenanza de vigencias futuras 2028–2031:</b> Elaborar el proyecto de ordenanza de vigencias futuras para el período 2028–2031, con el fin de presentarlo ante la Asamblea Departamental. Actividad a cargo del director técnico Alexander Morales y del supervisor del contrato, Antonio José Salazar López. Actualmente se adelanta la proyección respectiva; Alexander Morales manifestó inquietud frente al incremento de los costos de mantenimiento y sugirió aplicar el incremento correspondiente al IPC certificado por el Banco de la República. Según lo indicado por el supervisor del contrato y director de Planeación y Administración de la Seguridad, Antonio José Salazar López, se debe tomar como referencia el histórico de mantenimientos realizados en los municipios para proyectar de manera adecuada las vigencias futuras.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | <p>La gestión del presupuesto se encuentra en una fase crítica de transición, en la que se busca pasar de una lógica de mantenimiento reactivo hacia una planificación técnica basada en el crecimiento acelerado de la infraestructura tecnológica.</p> <p>Los aspectos más relevantes discutidos en el comité incluyen:</p> <p><b>Proyecciones para el cuatrienio 2028–2031:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aumento significativo de costos:</b> se estima que el presupuesto para el próximo periodo de cuatro años deberá incrementarse de los \$100.000 millones actuales a un mínimo de \$250.000 millones.</li> <li>• <b>Causas del incremento:</b> este salto presupuestal responde a que la infraestructura instalada se ha duplicado durante la gestión actual, siendo necesario cubrir servicios recurrentes que antes no estaban contemplados, tales como el servicio de llamadas, el sistema 1-2-3, horas de desarrollo y el aumento en el consumo de servicios públicos.</li> <li>• <b>Criterios técnicos:</b> los responsables enfatizan la necesidad de aprovechar el aprendizaje obtenido durante la vigencia actual para definir los presupuestos con base en lo que efectivamente quedará instalado en cada municipio, en lugar de replicar proyecciones anteriores.</li> </ul> <p><b>Desafíos en el presupuesto de mantenimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reducción del promedio por municipio:</b> existe preocupación debido a que, mientras el promedio actual de inversión por municipio ronda los \$100 y tantos millones, los recursos de gerenciamiento proyectados para el próximo año ascienden a \$10.000 millones, lo cual reduciría la bolsa disponible a aproximadamente \$81 millones por municipio, en caso de atender los 125 municipios del departamento.</li> <li>• <b>Equidad subregional (Urabá y Nordeste):</b> en la subregión de Urabá se ha decidido no aprobar diagnósticos individuales hasta contar con una visión global de la subregión, considerando que solo la reparación de las 39 cámaras en mal estado en Apartadó tendría un costo aproximado de \$100 millones, lo que agotaría el recurso de forma desigual entre los municipios. En el Nordeste, intervenciones como la realizada en Vegachí (con un costo de \$53 millones) evidencian que los costos reales suelen superar las proyecciones iniciales estimadas para los municipios pequeños.</li> </ul> |
| 2 | Componente Apoyo a la Supervisión | <p>En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Edison Arley Restrepo informa lo siguiente respecto a las actividades desarrolladas por el equipo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañamiento a la supervisión en la realización de pruebas y certificación de fibra óptica en diferentes municipios.</li> <li>• Seguimiento de prueba piloto 123, Rionegro acompañamiento BPO</li> <li>• Visita al municipio de Yalí, Garantía de servidor.</li> <li>• En cuanto al contrato N°204 – 2026 de transporte, correspondiente al Contrato No. 204-2026, se reporta la realización de visitas a los municipios <b>Apoyo a la supervisión:</b> Rionegro, Necoclí, Zaragoza, Yalí, Medellín y <b>Integración a terceros:</b> San Vicente Ferrer, Cisneros, Támesis, Retiro</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Ejecución Física 44,19%</b><br/><b>Ejecución financiera 37,16%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Componente Mantenimiento          | <p>En relación con el componente de mantenimiento, el profesional Edison Arley Restrepo presenta el siguiente informe sobre el estado actual, avances, dificultades y proyecciones:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Actualmente, se están adelantando tendidos de manera urgente y prioritaria, atendiendo los municipios conforme a su nivel de criticidad. En la subregión Oriente, se aprobaron tres (3) municipios para dar inicio a las labores de mantenimiento. Por su parte, en el Nordeste, el municipio de Yalí cuenta con cinco (5) cámaras, de las cuales tres (3) se encuentran fuera de servicio; el diagnóstico técnico arrojó un presupuesto estimado de cincuenta y tres millones de pesos (\$53.000.000).

El mantenimiento de las cámaras atraviesa una etapa de transición estratégica, en la cual se enfrenta el reto de una infraestructura que prácticamente se ha duplicado, mientras que los recursos disponibles presentan limitaciones importantes.

El mantenimiento de las cámaras se encuentra en una etapa de **transición estratégica**, enfrentando el reto de una infraestructura que se ha duplicado mientras los recursos inmediatos presentan limitaciones importantes.

A continuación, se detallan los puntos clave discutidos:

#### Estado del Mantenimiento por Subregión:

| Lote   | Subregión       | Valor Total Lote | CDP | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de Inicio |
|--------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Lote 2 | URABA           | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026     |
| Lote 3 | ORIENTE         | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026     |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343   | 183 | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UT VMAS SEGURIDAD        | 170-2026           | 27/02/2026     |
| Lote 6 | NORDESTE        | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026      |
| Lote 7 | NORTE           | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026     |

- **Urabá (Equidad en la distribución):** Se ha decidido **no aprobar diagnósticos individuales** hasta tener los resultados de toda la subregión. La razón es técnica: solo en **Apartadó** hay **39 cámaras malas**, cuya reparación costaría unos **100 millones**, lo que podría agotar el presupuesto de forma inequitativa antes de atender a municipios como Chigorodó o Carepa.
- **Nordeste (Costos elevados):** Solo un municipio (Vegachi) tiene un mantenimiento completo aprobado, el cual costó aproximadamente **53 millones para solo cinco cámaras**. Otros municipios como **Santo Domingo y Cisneros** requieren inversiones mayores a las estimadas; en el caso de este último, se redujo una propuesta de 900 millones a 196 millones enfocándose solo en puntos críticos.
- **Oriente:** Ya se encuentran aprobados los mantenimientos para **Guarne, La Ceja y Alejandría**.

#### Problemas Técnicos y de Visualización:

- **Degradación por resolución:** Se identificó que el video está llegando con **demasiada resolución**, lo que satura la red MPLS hacia los municipios, causando que la imagen sea intermitente o no llegue. Se están realizando pruebas para **bajar la resolución** en entornos educativos y terceros.
- **Casos de conectividad:**
  - En **Montebello**, una intervención en la fibra creó un **bucle (loop)** que bloqueó la visualización en el nodo central, aunque localmente sí hay servicio.
  - **San Jerónimo** permanece sin visualización debido a problemas de infraestructura de Telefónica en su transición de redes.

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>En Yalf, se logró recuperar la federación y grabación tras reponer un servidor por garantía.</li> </ul> <p><b>Gestión de Equipos de Soporte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Servidores y UPS:</b> Se han presentado fallos en equipos como en Zaragoza, donde la UPS falló tras cumplir sus tres años de garantía, obligando a usar equipos de respaldo del área de mantenimiento para proteger el servidor.</li> <li><b>Licenciamiento de Fortinet:</b> Existe una complicación con las licencias de los equipos Fortinet de las fases 1 y 2, ya que el fabricante cobra una <b>penalización retroactiva</b> por el tiempo que los equipos estuvieron sin licencia, un costo que no se había contemplado inicialmente en los estudios de mercado.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 13%</b><br/><b>Ejecución Financiera 1.09%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Componente Conectividad | <p>El profesional Edison Arley Restrepo informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad no presenta variaciones relevantes respecto al reporte anterior. A continuación, se detalla el estado actual de los principales frentes:</p> <p><b>Plan de datos – Líneas Nodo (Contrato No. 195-2026):</b> El componente se mantiene sin cambios frente al último reporte, sin novedades operativas ni contractuales a resaltar.</p> <p><b>Canales de conectividad para la implementación de SD-WAN:</b> El proceso continúa en etapa de estudio de mercado, encontrándose a la espera de las cotizaciones por parte de los proveedores interesados.</p> <p><b>Redundancia de canal:</b> El proceso se encuentra en fase de contratación. Se reporta que el comité de contratación se llevó a cabo el 19 de junio de 2026, dando inicio formal al proceso el 22 de junio de 2026, con una fecha estimada de suscripción del contrato para el 8 de julio de 2026.</p> <p><b>Adquisición de radios – Cerros asociados al proyecto CACOM 5:</b> Actualmente en etapa de estudio de mercado, con fecha estimada de recepción de propuestas por parte de los proveedores el 30 de junio de 2026.</p> <p><b>Alerta – Contrato No. 469-2025 (Mediacommerce):</b> Se aprueba la terminación de la conectividad en los municipios de Abriaquí, Murindó y Sabanalarga, debido a que el proveedor no cuenta con cobertura mediante tendido de fibra óptica en dichas localidades.</p> <p>En relación con el estado de los municipios vinculados al proceso de migración a fibra óptica, se presenta el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Municipios entregados a fibra óptica (6):</b> Tarso, Necoclí, Hispania, Ebéjico, Armenia y Peque.</li> <li><b>Municipios en verificación por mesa de ayuda:</b> Mutatá, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.</li> <li><b>Municipios pendientes:</b> San Francisco y Nariño.</li> <li><b>Municipio que continúa con tecnología Starlink:</b> Vigía del Fuerte, el cual no será migrado hasta tanto se solucione la problemática asociada al sistema de energía solar.</li> </ul> <p><b>Alerta – Contrato No. 468-2025 (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC):</b> Se informa que el enlace de conectividad del municipio de San Jerónimo presenta una afectación superior a cincuenta (50) días sin solución efectiva por parte del proveedor, sin respuesta</p> |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             | <p>satisfactoria por parte del aliado. En consecuencia, se determina la cancelación definitiva de dicho enlace en el marco del contrato referido.</p> <p>En ese sentido, el supervisor del contrato, <b>Antonio José Salazar López</b>, Director de Planeación y Administración de la Seguridad, aprueba la terminación de la conectividad en los municipios de Abriaquí, Murindó y Sabanalarga en el marco del Contrato No. 469-2025, así como la del municipio de San Jerónimo correspondiente al Contrato No. 468-2025. De igual forma, se solicita gestionar la cobertura de estos cuatro (4) municipios mediante otro aliado proveedor.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 45.01%</b><br/><b>Ejecución Financiera 32,60%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Componentes de Nodos        | <p>El profesional técnico Edison Arley Restrepo informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contrato No. 148-2026 – Servicio de operadores de nodos:</b> Se encuentra en ejecución el contrato suscrito con la empresa Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda., mediante el cual se dispone de treinta y un (31) operadores y un (1) auxiliar. A la fecha, se encuentran pendientes cinco (5) hojas de vida por aprobación.</li> <li>• <b>Contrato No. 220-2026 – Papelería:</b> El proceso se encuentra en etapa de definición de insumos requeridos para la operación de los nodos.</li> <li>• <b>Mantenimientos locativos de nodos:</b> El proceso se encuentra en etapa de contratación bajo la modalidad de contrato tipo bolsa, con un presupuesto asignado de doscientos dos millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos (\$202.545.763). El comité de contratación se realizó el 19 de junio de 2026, dando inicio al proceso el 22 de junio de 2026, con una fecha estimada de suscripción del contrato para el 8 de julio de 2026.</li> <li>• <b>Adecuaciones segundo piso CRUE:</b> Se informa que los Análisis de Precios Unitarios (APU) fueron remitidos el 28 de mayo de 2026, con un presupuesto estimado de mil quinientos dieciocho millones quinientos sesenta y un mil novecientos ochenta y tres pesos (\$1.518.561.983). La Secretaría remitió observaciones al aliado Valor+, las cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión y ajuste.</li> <li>• <b>Rubro nómina de operación:</b> Se reporta la siguiente distribución: V+: 58,65% / 46% - PS:36,06% / 41%</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 44,85%</b><br/><b>Ejecución financiera 35,76%</b></p> |
| 6 | Componente Implementaciones | <p>En relación con el componente de implementaciones, el profesional técnico Edison Arley Restrepo informa lo siguiente:</p> <p><b>1. Adquisición de cámaras fijas CCM (101) – Contrato No. 255-2026</b><br/>El proceso de adquisición se desarrolla con el aliado Unión Temporal AEI, con un valor final de ciento veintidós millones veinticuatro mil setecientos pesos (\$122.024.700), IVA incluido.</p> <p>A la fecha, el contrato se encuentra en etapa de firma. Se realizó reunión de inicio (kick-off) el día 18 de junio de 2026, y se reporta la entrega de las cámaras junto con la respectiva facturación el 19 de junio de 2026.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 0%</b><br/><b>Ejecución financiera 0%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 7                                                | Actas de transferencia                    | <p><b>Informe jurídico – Revisión y proyección de actas:</b> El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa que actualmente ya se ajustaron las actas de 2024 y 2025, y se está definiendo la inclusión de los recibos a satisfacción, respectivas para continuar con el proceso</p> <p>Se relaciona las el número de municipios y entidades beneficiadas en en los bienes a transferir y hay un total de 85 actas de transferencia para la vigencia 2025.</p> <table><tr><th colspan="2">Control Actas de transferencia Vigencia 2024</th></tr><tr><th colspan="2">Indicadores de desempeño – Actos administrativos</th></tr><tr><td>Total municipios</td><td>91</td></tr><tr><td>Total contratos</td><td>16</td></tr><tr><td>Completo</td><td>89</td></tr><tr><td>Pendientes</td><td>1</td></tr><tr><td>Sin activos</td><td>1</td></tr><tr><td>Complejidad</td><td>97,8%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control Actas de transferencia Vigencia 2024 |                | Indicadores de desempeño – Actos administrativos |                     | Total municipios    | 91              | Total contratos | 16    | Completo | 89    | Pendientes | 1                 | Sin activos      | 1                | Complejidad      | 97,8%          |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--|---------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|------------|------------------|------------------|------|----------------|------------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Control Actas de transferencia Vigencia 2024     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Indicadores de desempeño – Actos administrativos |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Total municipios                                 | 91                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Total contratos                                  | 16                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Completo                                         | 89                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Pendientes                                       | 1                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Sin activos                                      | 1                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Complejidad                                      | 97,8%                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                |                                                  |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| 8                                                | Estado Disponibilidad por componente 2026 | <p><b>Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026:</b></p> <table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th>Comprometido</th><th>Pagado</th><th>Facturado por pagar</th><th>Saldo contratos</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.105.747.133</td><td>\$ 1.221.698.110</td><td>\$ 333.945.992</td><td>\$ 2.550.103.031</td><td>\$ 18.280.288</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>\$ 207.758.870</td><td>\$ 0</td><td>\$ 146.474.541</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 75.641.957</td><td>\$ 7.480.525</td><td></td><td>\$ 58.542.823</td><td>\$ 1.215.405.637</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 103.070.190</td><td>\$ 0</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.525.905.595</td><td>\$ 451.295.874</td><td>\$ 109.647.620</td><td>\$ 964.962.101</td><td>\$ 178.237.555</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.403.296.599</td><td>\$ 463.048.154</td><td>\$ 87.623.632</td><td>\$ 852.624.813</td><td>\$ 78.674.467</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 122.024.700</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 122.024.700</td><td>\$ 86.295.245</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 376.642.086</td><td>\$ 125.547.362</td><td>\$ 1.035.395.411</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 0</td><td>\$ 194.953.350</td><td>\$ 1.745.772.272</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 23.864.083.824</td><td>\$ 20.525.747.985</td><td>\$ 2.830.993.809</td><td>\$ 851.717.956</td><td>\$ 16.833.417.611</td><td>\$ 1.576.893.192</td></tr></table> <p><b>En el componente de Conectividad:</b> Se mencionan 178 millones de pesos disponibles. Se aclara que este es el único recurso del cual se puede emitir un CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) en este momento para el componente de conectividad.</p> <p><b>Instalación de Nodos / Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):</b> Se identificaron 18 millones de pesos destinados originalmente a "instalación". El comité acordó revisar si estos recursos se pueden asignar como una "bolsa SST" para cubrir necesidades urgentes de este componente.</p> <p><b>CRUE (Centro Regulador de Urgencias):</b> Aparece una disponibilidad de 1.200 millones, pero se aclara que estos son recursos de salud y no pueden ser utilizados para otros fines del proyecto, ya que pertenecen a un fondo distinto.</p> <p><b>Adquisición de horas de desarrollo:</b> Por un valor contractual de \$109.425.005, se encuentra en proceso de contratación. El comité de contratación se llevará a cabo el 19 de junio de 2026, dando inicio formal al proceso el 22 de junio de 2026. Se tiene como fecha estimada para la suscripción del contrato el 8 de julio de 2026.</p> | Componente                                   | Presupuestado  | Comprometido                                     | Pagado              | Facturado por pagar | Saldo contratos | Disponible      | Valor | Valor    | Valor | Valor      | Instalación nodos | \$ 4.350.248.085 | \$ 4.105.747.133 | \$ 1.221.698.110 | \$ 333.945.992 | \$ 2.550.103.031 | \$ 18.280.288 | Instalación nodos-rubros nómina | \$ 354.233.411 | \$ 354.233.411,00 | \$ 207.758.870 | \$ 0 | \$ 146.474.541 | \$ 0 | Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577 | \$ 75.641.957 | \$ 7.480.525 |  | \$ 58.542.823 | \$ 1.215.405.637 | Mantenimiento 84 Mpios | \$ 9.460.588.109 | \$ 9.460.588.109 | \$ 103.070.190 | \$ 0 | \$ 9.357.517.919 | \$ 0 | Conectividad | \$ 1.720.803.150 | \$ 1.525.905.595 | \$ 451.295.874 | \$ 109.647.620 | \$ 964.962.101 | \$ 178.237.555 | Personal Apoyo | \$ 1.481.971.066 | \$ 1.403.296.599 | \$ 463.048.154 | \$ 87.623.632 | \$ 852.624.813 | \$ 78.674.467 | Implementaciones CCTV | \$ 208.319.945 | \$ 122.024.700 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 122.024.700 | \$ 86.295.245 | Mesa de ayuda | \$ 1.537.584.859 | \$ 1.537.584.859 | \$ 376.642.086 | \$ 125.547.362 | \$ 1.035.395.411 | \$ 0 | Honorarios | \$ 1.940.725.622 | \$ 1.940.725.622 | \$ 0 | \$ 194.953.350 | \$ 1.745.772.272 | \$ 0 | Totales | \$ 23.864.083.824 | \$ 20.525.747.985 | \$ 2.830.993.809 | \$ 851.717.956 | \$ 16.833.417.611 | \$ 1.576.893.192 |
| Componente                                       | Presupuestado                             | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                | Pagado                                           | Facturado por pagar | Saldo contratos     | Disponible      |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
|                                                  |                                           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor                                        | Valor          | Valor                                            |                     |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085                          | \$ 4.105.747.133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.221.698.110                             | \$ 333.945.992 | \$ 2.550.103.031                                 | \$ 18.280.288       |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Instalación nodos-rubros nómina                  | \$ 354.233.411                            | \$ 354.233.411,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 207.758.870                               | \$ 0           | \$ 146.474.541                                   | \$ 0                |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577                          | \$ 75.641.957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 7.480.525                                 |                | \$ 58.542.823                                    | \$ 1.215.405.637    |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Mantenimiento 84 Mpios                           | \$ 9.460.588.109                          | \$ 9.460.588.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 103.070.190                               | \$ 0           | \$ 9.357.517.919                                 | \$ 0                |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150                          | \$ 1.525.905.595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 451.295.874                               | \$ 109.647.620 | \$ 964.962.101                                   | \$ 178.237.555      |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066                          | \$ 1.403.296.599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 463.048.154                               | \$ 87.623.632  | \$ 852.624.813                                   | \$ 78.674.467       |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945                            | \$ 122.024.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 0                                         | \$ 0           | \$ 122.024.700                                   | \$ 86.295.245       |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859                          | \$ 1.537.584.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 376.642.086                               | \$ 125.547.362 | \$ 1.035.395.411                                 | \$ 0                |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622                          | \$ 1.940.725.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0                                         | \$ 194.953.350 | \$ 1.745.772.272                                 | \$ 0                |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |
| Totales                                          | \$ 23.864.083.824                         | \$ 20.525.747.985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.830.993.809                             | \$ 851.717.956 | \$ 16.833.417.611                                | \$ 1.576.893.192    |                     |                 |                 |       |          |       |            |                   |                  |                  |                  |                |                  |               |                                 |                |                   |                |      |                |      |                                                  |                  |               |              |  |               |                  |                        |                  |                  |                |      |                  |      |              |                  |                  |                |                |                |                |                |                  |                  |                |               |                |               |                       |                |                |      |      |                |               |               |                  |                  |                |                |                  |      |            |                  |                  |      |                |                  |      |         |                   |                   |                  |                |                   |                  |

|                          |                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modalidad de contratación:</b> Las horas de desarrollo forman parte de los procesos de contratación directa que estaban programados para iniciar el 22 de junio, una vez finalizada la ley de garantías.</li><li>• <b>Naturaleza del servicio:</b> Se menciona que estas horas de desarrollo son uno de los servicios recurrentes que se integraron en la nueva lógica del contrato de gerenciamiento, junto con otros servicios como las llamadas del 123, los cuales no estaban contemplados anteriormente.</li></ul> <p><b>Observaciones sobre la Ejecución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Restricciones de Contratación:</b> Se enfatiza que, debido a que la mayor parte del presupuesto ya está comprometido en contratos existentes, no hay disponibilidad líquida para nuevas contrataciones, excepto por los 178 millones mencionados.</li><li>• <b>Estrategia para Conectividad:</b> Se sugiere dejar el recurso de conectividad para el último trimestre del año o utilizarlo para sostener servicios (como el cambio a la tecnología SD-WAN) mientras se liquidan otros contratos, aunque se advierte que los 178 millones podrían no alcanzar para cubrir dos meses de servicio.</li><li>• <b>SST:</b> Existe la intención de utilizar los 18 millones de la bolsa de instalación para adquirir los elementos de emergencia (extintores, botiquines) solicitados por el profesional de SST, verificando previamente si el objeto del contrato permite dicho uso.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                            |                |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------|--|--|-------|-------|-------|--|--|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9                        | Estado Disponibilidad por componente 2025 | <p>Respecto al estado de disponibilidad por componente de la vigencia 2025, se realizan las siguientes aclaraciones en relación con el presupuesto asignado y su ejecución, con el fin de garantizar la correcta utilización de los recursos, el cumplimiento de los tiempos establecidos y el adecuado cierre financiero de la vigencia.</p> <p><b>Ejecución de Reservas y Plazos Administrativos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Presión de Hacienda:</b> El equipo del Gerenciamiento 2 enfrenta el reto de ejecutar los recursos de suministros (servidores, licencias, celulares) antes de los plazos de reserva.</li><li>2. <b>Solicitud de Prórroga:</b> Se planea solicitar un permiso a la Secretaría de Hacienda para extender el plazo de legalización hasta agosto, bajo la premisa de que para esa fecha los equipos no solo deben estar contratados, sino instalados, recibidos a satisfacción y funcionando.</li><li>3. <b>Ley de Garantías:</b> Varias contrataciones directas (horas de desarrollo, mantenimientos locativos) están programadas para iniciar el 22 de junio, inmediatamente después de que finalice la restricción legal.</li></ol> <table><tr><th>Componente</th><th>Presupuestado</th><th>Comprometido</th><th>Pagado</th><th>Saldo contratos</th><th>En proceso de contratación</th><th>Disponible</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Valor</td><td>Valor</td><td>Valor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>396.710.396</td><td>\$ 92.988.384</td><td>\$ 91.401.350</td><td>1.587.034</td><td>\$ 243.044.000</td><td>\$ 60.678.012</td></tr><tr><td>Mantenimiento municipios</td><td>\$ 71.017.672</td><td>\$ 71.017.672</td><td>\$ 70.904.522</td><td>\$ 113.150</td><td>\$ 0</td><td>\$ 7.029.008</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 50.129.538</td><td>\$ 50.129.538</td><td>\$ 50.112.854</td><td>\$ 16.684</td><td>\$ 0</td><td>\$ 135.072.888</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 65.753.419</td><td>\$ 65.753.419</td><td>\$ 34.591.790</td><td>\$ 31.161.629</td><td>\$ 0</td><td>\$ 31.356.543</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 134.356</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 202.796.927</td><td>\$ 93.416.731</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 879.824.683</td><td>\$ 576.102.671</td><td>\$ 449.807.443</td><td>\$ 126.295.228</td><td>\$ 243.044.000</td><td>\$ 234.270.807</td></tr></table> <p><b>Recursos y procesos en estudio de mercado:</b> Se cuenta con un presupuesto de ciento cincuenta y siete millones setenta y siete mil setecientos veintinueve pesos (\$157.077.721) destinado a la</p> | Componente     | Presupuestado   | Comprometido               | Pagado         | Saldo contratos | En proceso de contratación | Disponible |  |  | Valor | Valor | Valor |  |  | Instalación nodos | 396.710.396 | \$ 92.988.384 | \$ 91.401.350 | 1.587.034 | \$ 243.044.000 | \$ 60.678.012 | Mantenimiento municipios | \$ 71.017.672 | \$ 71.017.672 | \$ 70.904.522 | \$ 113.150 | \$ 0 | \$ 7.029.008 | Conectividad | \$ 50.129.538 | \$ 50.129.538 | \$ 50.112.854 | \$ 16.684 | \$ 0 | \$ 135.072.888 | Personal Apoyo | \$ 65.753.419 | \$ 65.753.419 | \$ 34.591.790 | \$ 31.161.629 | \$ 0 | \$ 31.356.543 | Implementaciones CCTV | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 134.356 | Mesa de ayuda | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | Honorarios | \$ 296.213.658 | \$ 296.213.658 | \$ 202.796.927 | \$ 93.416.731 | \$ 0 | \$ 0 | Totales | \$ 879.824.683 | \$ 576.102.671 | \$ 449.807.443 | \$ 126.295.228 | \$ 243.044.000 | \$ 234.270.807 |
| Componente               | Presupuestado                             | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pagado         | Saldo contratos | En proceso de contratación | Disponible     |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
|                          |                                           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor          | Valor           |                            |                |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Instalación nodos        | 396.710.396                               | \$ 92.988.384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 91.401.350  | 1.587.034       | \$ 243.044.000             | \$ 60.678.012  |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Mantenimiento municipios | \$ 71.017.672                             | \$ 71.017.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 70.904.522  | \$ 113.150      | \$ 0                       | \$ 7.029.008   |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Conectividad             | \$ 50.129.538                             | \$ 50.129.538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 50.112.854  | \$ 16.684       | \$ 0                       | \$ 135.072.888 |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Personal Apoyo           | \$ 65.753.419                             | \$ 65.753.419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 34.591.790  | \$ 31.161.629   | \$ 0                       | \$ 31.356.543  |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Implementaciones CCTV    | \$ 0                                      | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0           | \$ 0            | \$ 0                       | \$ 134.356     |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Mesa de ayuda            | \$ 0                                      | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0           | \$ 0            | \$ 0                       | \$ 0           |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Honorarios               | \$ 296.213.658                            | \$ 296.213.658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 202.796.927 | \$ 93.416.731   | \$ 0                       | \$ 0           |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |
| Totales                  | \$ 879.824.683                            | \$ 576.102.671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 449.807.443 | \$ 126.295.228  | \$ 243.044.000             | \$ 234.270.807 |                 |                            |            |  |  |       |       |       |  |  |                   |             |               |               |           |                |               |                          |               |               |               |            |      |              |              |               |               |               |           |      |                |                |               |               |               |               |      |               |                       |      |      |      |      |      |            |               |      |      |      |      |      |      |            |                |                |                |               |      |      |         |                |                |                |                |                |                |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | <p>adquisición de dos (2) equipos Fortinet para los nodos de Occidente y Oriente, bajo esquema de alta disponibilidad (HA). Este proceso se encuentra actualmente en etapa de estudio de mercado, con fecha estimada de recepción de cotizaciones el 30 de junio de 2026.</p> <p>De igual forma, el licenciamiento de equipos Fortinet correspondientes a las Fases 1 y 2 se encuentra en estudio de mercado, con fecha de recepción de cotización por parte del proveedor el 19 de junio de 2026, por un valor de \$273.076.440, en proceso de contratación.</p> <p>La adquisición de <b>teléfonos celulares para CACOM 5</b> se encuentra en etapa de estudio de mercado hasta el 19 de junio de 2026. Actualmente, se está a la espera de los resultados tanto para radios como para celulares, con el fin de realizar la revisión del saldo presupuestal disponible. Este análisis es necesario para avanzar en la adquisición de <b>servidores</b>, la cual también se encuentra en etapa de estudio de mercado y depende de la disponibilidad de dicho saldo presupuestal.</p> <p><b>Licencias de ISS y gestión presupuestal:</b> Se solicitó un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por valor de doscientos cuarenta y tres millones de pesos (\$243.044.000), destinado a cubrir las licencias de ISS.</p> <p>Actualmente, el proceso de licencias faciales se encuentra en etapa de contratación. El comité de contratación se llevará a cabo el 19 de junio de 2026, dando paso al inicio formal del proceso el 22 de junio de 2026. Asimismo, se tiene como fecha estimada para la suscripción del contrato el 8 de julio de 2026.</p> <p>Posterior a esta asignación, se cuenta con un saldo aproximado de sesenta millones seiscientos mil pesos (\$60.600.000), el cual se proyecta utilizar para la adquisición de otros equipos tecnológicos, tales como servidores o radios, sujeto a los resultados de los estudios de mercado en curso.</p> <p><b>Ejecución y trámites administrativos:</b> Ante la falta de respuesta por parte del proveedor Telefónica frente a las solicitudes relacionadas con licencias y equipos Fortinet, se decidió avanzar con estudios de mercado independientes, con el fin de dar mayor celeridad al proceso.</p> <p>En paralelo, se proyecta solicitar una prórroga ante la Secretaría de Hacienda para ampliar el plazo de legalización de las licencias hasta el mes de agosto. Como condición, se establece que para dicha fecha las licencias deberán estar no solo contratadas, sino también instaladas, configuradas y en operación satisfactoria.</p> <p>Por otra parte, la contratación directa de estas licencias está prevista para iniciar el 22 de junio de 2026, una vez finalizadas las restricciones asociadas a la Ley de Garantías.</p> <p><b>Soluciones temporales para jornada electoral:</b> Debido a la imposibilidad de contar con el licenciamiento definitivo de los equipos propios antes de la jornada electoral, el fabricante Fortinet acordó el préstamo de un equipo para garantizar la alta disponibilidad (HA) durante el proceso electoral.</p> <p>Esta solución implica la realización de una ventana de mantenimiento con caída programada del servicio mañana 19 de julio de 2026, necesaria para ejecutar actualizaciones y configuraciones en el borde de la red.</p> |
| 10 | Pendientes de pago | <p>Honorarios mesa de ayuda Abril Factura V1867 \$ 125.547.362</p> <p>Honorarios ejecución enero - Abril Factura V1898 \$ 152.247.569</p> <p>Honorarios ejecución reservas enero - Abril Factura V1899 \$ 42.705.781</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 11                             | Mesa de Ayuda  | <p>En relación con las novedades reportadas a través de la mesa de ayuda, el líder de mesa, <b>Sebastián Metaute</b>, informa que durante el periodo evaluado se registraron un total de 105 casos, de los cuales 80 han sido cerrados satisfactoriamente y 25 permanecen pendientes de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Del total de incidentes reportados, 27 correspondieron a fallas de conectividad</li> </ul> <table border="1" data-bbox="614 409 1358 517"> <thead> <tr> <th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr> <tr> <th>Casos abiertos</th><th>Casos Cerrados</th><th>Casos pendientes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td><td>22</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> <p>En el municipio de La Pintada se está intentando restablecer la conectividad gracias a las intervenciones del aliado MediaCommerce. En Sabanalarga, la Secretaría de Gobierno indicó a la persona de sistemas que brindará apoyo en la situación. Por su parte, en Venecia el servidor se quemó, por lo que está pendiente programar una torre disponible para poder restablecer la visual hacia el nodo.</p> <p>Se presenta un daño en la cámara de Peque. En el municipio de Montebello se cuenta con visual, sin embargo, en el nodo departamental no hay visual. Adicionalmente, se identifica un daño en la fibra óptica en el municipio, lo cual podría estar afectando la conectividad general.</p> <p><b>Problemática con el licenciamiento de Fortinet:</b> Se presenta una problemática crítica relacionada con el licenciamiento de los equipos Fortinet correspondientes a las Fases 1 y 2, cuyas licencias se encuentran vencidas, algunas desde el año 2024 y otras desde el 2025. Adicionalmente, se identificó que el fabricante aplica una penalización retroactiva por el tiempo en que los equipos han permanecido sin licenciamiento activo, lo que implica que para su reactivación es necesario adquirir licencias adicionales que cubran dicho periodo, generando un sobre costo no contemplado en los estudios de mercado iniciales.</p> <p>En cuanto a las soluciones temporales, aunque se obtuvo una licencia demo por dos (2) meses con el fin de garantizar la alta disponibilidad (HA) durante el periodo electoral, esta se consume de manera inmediata debido a la deuda acumulada de licenciamiento, lo que limita su efectividad como solución de mediano o largo plazo.</p> <p>Finalmente, la profesional <b>Marcela Aguirre</b> informa que se tiene programada una reunión con la empresa Fortinet el día 19 de julio de 2026 a las 12:00 m., con el objetivo de evaluar alternativas y definir posibles soluciones frente a la situación presentada.</p> <p><b>Revisión Visuales Terceros:</b> Se evidencia que los videos están llegando con una resolución demasiado alta, lo que ocasiona que en los municipios la señal llegue degradada y, en algunos casos, no se cuenta con visual. Como medida de mitigación, se están realizando pruebas en los entornos educativos mediante la plataforma Hikvision, ajustando y reduciendo la resolución de los videos con el fin de mejorar la transmisión y garantizar la visualización adecuada.</p> <p><b>Restablecimiento del servicio:</b> Se tiene programada una ventana de mantenimiento con caída controlada del servicio para el día 19 de julio de 2026, la cual es necesaria para ejecutar actualizaciones y configuraciones en el borde de la red. Esta actividad se realiza con el propósito de prevenir fallas durante la jornada electoral y garantizar la estabilidad del servicio.</p> <p><b>Configuración Usuario CACOM:</b> Se realizó la configuración del usuario CACOM, evidenciando acceso desde el computador de CACOM hacia el servidor. Asimismo, se llevó a cabo la incorporación de los 39 municipios, con el fin de habilitar su acceso dentro del sistema de manera adecuada.</p> <p><b>Compromisos Acordados</b></p> | Casos asociados a conectividad |  |  | Casos abiertos | Casos Cerrados | Casos pendientes | 27 | 22 | 5 |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|----|----|---|
| Casos asociados a conectividad |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |  |  |                |                |                  |    |    |   |
| Casos abiertos                 | Casos Cerrados | Casos pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |  |  |                |                |                  |    |    |   |
| 27                             | 22             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |  |  |                |                |                  |    |    |   |

| No.                              | Compromiso                                    | Responsable                                                         | Fecha            | Resultado Esperado |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1                                | Entrega de formulario SST                     | Equipo apoyo a la supervisión                                       | 25 junio de 2026 |                    |
| <b>Documentos Anexos al Acta</b> |                                               |                                                                     |                  |                    |
| No.                              | Nombre del documento                          |                                                                     |                  |                    |
| 1                                | Asistencia_Comite_Seguimiento_18-06-2026 – G2 |                                                                     |                  |                    |
| 2                                | Comite_Tecnico_18-06-2026 – G2                |                                                                     |                  |                    |
| Proyectado por:                  |                                               | Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa             |                  |                    |
| Revisó y Aprobó:                 |                                               | Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI |                  |                    |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |                          | LISTADO ASISTENCIA       |            |                                      | Código: FO-M1-P7-001                  |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| FECHA:                                            | 18 JUNIO de 2026         | HORA:                    | 2:00 pm    | LUGAR EVENTO:                        | Centro de atención de Seguridad - CAD | Versión: 03 |
| ASUNTO:                                           | Comité de Seguimiento G2 | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |            |                                      | V+                                    | N° ACTA: 21 |
| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS                      | CÉDULA                   | CARGO/DEPENDENCIA        | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO                   | FIRMA                                 |             |
| Richard Uribe Conzalez                            | 21692842                 | Dir. Jurídica            | 3023392911 | gustavo.uribe@antioquia.gov.co       | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Vicgo Andrea Bustos Laverde                       | 1146040483               | Contratista SST          | 302346885  | gabriel.eguilera@antioquia.gov.co    | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Carlos Hincapié Ruiz E.                           | 91572343                 | Coordinador O.P.         | 3167351022 | carlos.eguilera@antioquia.gov.co     | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Gisela Caicedo Barrera                            | 8604266                  | Controlador SST          | 3125866816 | gisela.eguilera@antioquia.gov.co     | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Fernando Sierra                                   | 79519400                 | Maestro de Obras         | 316736485  | fernando.eguilera@antioquia.gov.co   | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Alexander Morales                                 | 10364266                 | Dir. de Rec. y Adm.      | 302346885  | alexander.eguilera@antioquia.gov.co  | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Marcela Aguirre                                   | 12667986                 | Dir. de Rec. y Adm.      | 3125866816 | marcela.eguilera@antioquia.gov.co    | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Oscar A. López R.                                 | 71371308                 | Ing. AS SST              | 300785886  | oscar.eguilera@antioquia.gov.co      | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Karen Rios Martinez                               | 1037557090               | Jefe de Oficina          | 3125866816 | karen.eguilera@antioquia.gov.co      | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Tom Felipe Zuluaga Giraldo                        | 1045021654               | Jurídico AS              | 3113701264 | tom.felipe.zuluaga@antioquia.gov.co  | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Fabiano Salazar L.                                | 98528755                 | Dir. Planeación          | 3105011594 | fabiano.salazar@antioquia.gov.co     | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Luis Fernando Vivas                               | 70928328                 | Profesional SST          | 312555677  | luis.fernando.vivas@antioquia.gov.co | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Sebastián Mateute L                               | 1040734843               | Mesa de trabajo          | 3125792683 | sebastian.mateute@antioquia.gov.co   | <i>[Firma]</i>                        |             |
| CRISTIAN ANDRÉS CALVO NIETO                       | 91272761                 | COORDINADOR VIGILANCIA   | 302346885  | cristian.calvo@antioquia.gov.co      | <i>[Firma]</i>                        |             |
| Jose Ceballos                                     | 98572321                 | Coordinador Vigilancia   | 302346885  | jose.cebaldos@antioquia.gov.co       | <i>[Firma]</i>                        |             |

## LISTADO ASISTENCIA

**Código: FO-M1-P7-001**

**Version: 03**

**Fecha de aprobación:** 04/02/2025

FECHA: 18 maio de 2026

HORA: 2:00 pm

LUGAR EVENTO: Centro de analítica de Seguridad - CAD.













**ASUNTO:**

# Comité de Seguimiento G2

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

 $\frac{4}{+}$ [illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7° del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |          |               |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| Acta N.                                                                                                                                                                     | 22                                                                                                                                 | Hora Inicio            | 10:44 AM   | Hora Fin                                                                              | 11:40 AM | Fecha Reunión |     |         |
| Dependencia que convoca                                                                                                                                                     | Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+                                                                                  |                        |            |                                                                                       |          | Día           | Mes | Año     |
| Lugar de la reunión                                                                                                                                                         | Nodo Departamental                                                                                                                 |                        |            |                                                                                       |          | 26            | 06  | 2026    |
| Nombre de la reunión                                                                                                                                                        | Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023                                                                                 |                        |            |                                                                                       |          |               |     |         |
| Señale en el espacio el tipo de reunión                                                                                                                                     | Virtual                                                                                                                            |                        | Presencial |                                                                                       | X        |               |     |         |
| Objetivo de la reunión                                                                                                                                                      | Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia. |                        |            |                                                                                       |          |               |     |         |
| <i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i> |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |          |               |     |         |
| Nombre                                                                                                                                                                      | Cargo                                                                                                                              | Entidad                | Teléfono   | Firma                                                                                 |          |               |     |         |
| Juan David Betancur                                                                                                                                                         | Supervisor Técnico                                                                                                                 | VALOR+                 | 3014210126 |    |          |               |     |         |
| Duván Cardona                                                                                                                                                               | Coordinador técnico TASA                                                                                                           | VALOR+                 | 3014063263 |    |          |               |     |         |
| Carlos Mario Prada                                                                                                                                                          | Coordinador Operativo                                                                                                              | VALOR+                 | 3167390024 |    |          |               |     |         |
| Cristián Andrés Castro                                                                                                                                                      | Coordinador Técnico TASA                                                                                                           | VALOR+                 | 3014063263 |   |          |               |     |         |
| Sebastián Metaute Luján                                                                                                                                                     | Líder Mesa de Ayuda                                                                                                                | VALOR+                 | 3125792683 |  |          |               |     |         |
| Sergio Andrés Vélez Upegui                                                                                                                                                  | Coordinador Mesa de Ayuda                                                                                                          | VALOR+                 | 3003536119 |  |          |               |     |         |
| Carlos Arturo Correa Correa                                                                                                                                                 | Líder Mesa de Ayuda                                                                                                                | VALOR+                 | 3104014456 |  |          |               |     |         |
| Antonio José Salazar                                                                                                                                                        | Director de Planeación SSJYP                                                                                                       | SSJYP                  | 3105011594 |  |          |               |     |         |
| Karen Ríos Martínez                                                                                                                                                         | Profesional Jurídica SSJYP                                                                                                         | SSJYP                  | 3013824999 |  |          |               |     |         |
| Yuri Andrea Buitrago                                                                                                                                                        | Profesional Financiero SSJYP                                                                                                       | SSJYP                  | 3006740685 |  |          |               |     |         |
| Tomás Sierra                                                                                                                                                                | Coordinador de Nodos                                                                                                               | SSJYP                  | 3183262485 |  |          |               |     |         |
| Alexander Morales                                                                                                                                                           | Director técnico                                                                                                                   | Apoyo a la Supervisión | 3017719895 |  |          |               |     |         |
| Giovanni Caicedo Barrera                                                                                                                                                    | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3125566816 |  |          |               |     |         |
| John Felipe Zuluaga                                                                                                                                                         | Profesional Jurídico                                                                                                               | Apoyo a la Supervisión | 3113701264 |  |          |               |     |         |
| Oscar Arley López Rincón                                                                                                                                                    | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3007858860 |  |          |               |     |         |
| Edison Arley Restrepo                                                                                                                                                       | Profesional Técnico                                                                                                                | Apoyo a la Supervisión | 3218747232 |  |          |               |     |         |
| Vilsuly Yaneth González                                                                                                                                                     | Auxiliar administrativa                                                                                                            | Apoyo a la Supervisión | 3216956205 |  |          |               |     |         |
| <b>Agenda</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                       |          |               |     |         |
| N.º                                                                                                                                                                         | Temas a Tratar                                                                                                                     |                        |            |                                                                                       |          |               |     | Tratado |

|    |                                      | SI | NO |
|----|--------------------------------------|----|----|
| 1  | Compromisos del Comité Anterior      | X  |    |
| 2  | Componente apoyo a la supervisión    | X  |    |
| 3  | Componente de mantenimiento          | X  |    |
| 4  | Componente de Conectividad           | X  |    |
| 5  | Componente de Nodos                  | X  |    |
| 6  | Componente implementaciones          | X  |    |
| 7  | Actas de transferencias              | X  |    |
| 8  | Informe presupuestal y financiero    | X  |    |
| 9  | Estado Disponibilidad por componente | X  |    |
| 10 | Pendientes de pago                   | X  |    |
| 11 | Mesa de ayuda                        | X  |    |

### Desarrollo de la Reunión

| N.º | Tema                              | Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Compromisos del comité Anterior   | <p>Se da inicio al comité de seguimiento del Contrato No. 23MA122C1482 de 2023, con la socialización de los compromisos generados en la reunión anterior, a cargo del profesional técnico del Equipo de Apoyo a la Supervisión, Edison Arley Restrepo.</p> <p>A continuación, se presenta el estado de los compromisos:</p> <p>En relación con la entrega del <b>formulario de elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)</b> por parte del equipo o componente de <b>apoyo a la supervisión</b>, se informó que el compromiso adquirido con el profesional de SST, <b>Luis Fernando Macías</b>, fue cumplido el día anterior a la reunión, es decir, el <b>25 de junio de 2026</b>, mediante la entrega del formulario correspondiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Componente Apoyo a la Supervisión | <p>En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Edison Arley Restrepo informa lo siguiente respecto a las actividades desarrolladas por el equipo técnico:</p> <p><b>Acompañamiento en campo:</b> Se informa que el equipo continúa realizando acompañamiento al personal en campo para la <b>entrega y puesta en funcionamiento de la fibra óptica</b>, realizando el seguimiento correspondiente a las actividades programadas.</p> <p><b>Seguimiento BPO:</b> Se realizó seguimiento a las actividades de <b>BPO en el municipio de Rionegro</b> hasta el domingo correspondiente a la jornada electoral, con el fin de garantizar la continuidad y atención de los requerimientos asociados.</p> <p><b>Municipio de Granada:</b> El equipo realizó la revisión de un asunto relacionado con el <b>espejo</b> en este municipio. La situación fue validada el día anterior, identificándose un inconveniente con el <b>canal de conectividad propio</b>, el cual se encuentra actualmente en revisión y gestión con el contratista para determinar las acciones necesarias para su solución.</p> <p><b>Perfil financiero:</b> Se informa que se encuentra <b>pendiente la contratación del perfil financiero</b>, requerido para el desarrollo de las actividades correspondientes.</p> |

|        |                          | <p><b>Transporte – CTO 204-2026:</b> En el marco del contrato, se realizaron visitas de campo en los municipios de <b>Rionegro, Santo Domingo, Sabanalarga, San Roque, Cisneros y Granada</b>, con el propósito de realizar las actividades de seguimiento y verificación correspondientes.</p> <p><b>Integración con terceros:</b> Se informa que se realizaron actividades de integración con terceros en los municipios de <b>Rionegro, El Carmen de Viboral, Támesis y Ciudad Bolívar</b>, en el marco de las actividades programadas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 46,46%</b><br/><b>Ejecución financiera 37,16%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |                  |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|--------|-------|------------------|-----|----------------|------|-----|----------|------------|------------------|-----|------------------|------------------|--------|---------|------------------|-----|------------------|------------------|----------------|----------|------------|--------|-----------------|----------------|-----|----------------|------------------|------------------|----------|------------|--------|----------|------------------|-----|------------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|-------|------------------|-----|------------------|------------------|---------|----------|------------|
| 3      | Componente Mantenimiento | <p>En relación con el <b>componente de mantenimiento</b>, el profesional Edison Arley Restrepo presenta el siguiente informe sobre el estado actual, avances, dificultades y proyecciones:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Valor Total Lote</th><th>CDP</th><th>Valor</th><th>Proyecto o Fondo</th><th>Proponentes</th><th>Numero de Contrato</th><th>Acta de Inicio</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Lote 2</td><td rowspan="2">URABA</td><td>\$ 1.636.037.963</td><td>174</td><td>\$ 504.370.390</td><td>TASA</td><td rowspan="2">CI2</td><td rowspan="2">167-2026</td><td rowspan="2">23/02/2026</td></tr><tr><td>\$ 1.636.037.963</td><td>176</td><td>\$ 1.131.667.573</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>ORIENTE</td><td>\$ 3.420.806.648</td><td>178</td><td>\$ 3.420.806.648</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>CONSORCIO CCTV</td><td>168-2026</td><td>20/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>\$ 892.384.343</td><td>183</td><td>\$ 892.384.343</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>UTVMAS SEGURIDAD</td><td>170-2026</td><td>27/02/2026</td></tr><tr><td>Lote 6</td><td>NORDESTE</td><td>\$ 1.487.307.239</td><td>184</td><td>\$ 1.487.307.239</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>UT SOLUCIONES INTEGRALES</td><td>171-2026</td><td>2/03/2026</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>NORTE</td><td>\$ 2.528.422.306</td><td>189</td><td>\$ 2.528.422.306</td><td>GERENCIAMIENTO 2</td><td>SPECTRA</td><td>172-2026</td><td>20/02/2026</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;"><b><u>Estado actual y avances</u></b></p> <p><b>Gestión de diagnósticos:</b> Se informa que el contrato de mantenimiento se encuentra actualmente en fase de validación. A la fecha del comité, se han recibido más de treinta (30) diagnósticos para su respectiva revisión y trámite.</p> <p><b>Métricas de ejecución:</b> De acuerdo con el seguimiento realizado, se presenta el siguiente estado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Veintitrés (23) diagnósticos</b> se encuentran en revisión por de los técnicos.</li><li>○ <b>Siete (7) mantenimientos</b> ya fueron ejecutados.</li><li>○ <b>Seis (6) diagnósticos</b> cuentan con aprobación por parte de la Secretaría y se encuentran en proceso de ejecución.</li><li>○ <b>Catorce (14) diagnósticos</b> se encuentran actualmente en revisión por parte de la Secretaría.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Ejecución Física 13%</b><br/><b>Ejecución Financiera 1.09%</b></p> | Lote | Subregión        | Valor Total Lote | CDP                      | Valor              | Proyecto o Fondo | Proponentes | Numero de Contrato | Acta de Inicio | Lote 2 | URABA | \$ 1.636.037.963 | 174 | \$ 504.370.390 | TASA | CI2 | 167-2026 | 23/02/2026 | \$ 1.636.037.963 | 176 | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 | Lote 3 | ORIENTE | \$ 3.420.806.648 | 178 | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV | 168-2026 | 20/02/2026 | Lote 5 | MAGDALENA MEDIO | \$ 892.384.343 | 183 | \$ 892.384.343 | GERENCIAMIENTO 2 | UTVMAS SEGURIDAD | 170-2026 | 27/02/2026 | Lote 6 | NORDESTE | \$ 1.487.307.239 | 184 | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026 | 2/03/2026 | Lote 7 | NORTE | \$ 2.528.422.306 | 189 | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA | 172-2026 | 20/02/2026 |
| Lote   | Subregión                | Valor Total Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CDP  | Valor            | Proyecto o Fondo | Proponentes              | Numero de Contrato | Acta de Inicio   |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 2 | URABA                    | \$ 1.636.037.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174  | \$ 504.370.390   | TASA             | CI2                      | 167-2026           | 23/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
|        |                          | \$ 1.636.037.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176  | \$ 1.131.667.573 | GERENCIAMIENTO 2 |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 3 | ORIENTE                  | \$ 3.420.806.648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178  | \$ 3.420.806.648 | GERENCIAMIENTO 2 | CONSORCIO CCTV           | 168-2026           | 20/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 5 | MAGDALENA MEDIO          | \$ 892.384.343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183  | \$ 892.384.343   | GERENCIAMIENTO 2 | UTVMAS SEGURIDAD         | 170-2026           | 27/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 6 | NORDESTE                 | \$ 1.487.307.239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184  | \$ 1.487.307.239 | GERENCIAMIENTO 2 | UT SOLUCIONES INTEGRALES | 171-2026           | 2/03/2026        |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| Lote 7 | NORTE                    | \$ 2.528.422.306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189  | \$ 2.528.422.306 | GERENCIAMIENTO 2 | SPECTRA                  | 172-2026           | 20/02/2026       |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |
| 4      | Componente Conectividad  | <p>El profesional Edison Arley Restrepo informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad no presenta variaciones relevantes respecto al reporte anterior. A continuación, se detalla el estado actual de los principales frentes:</p> <p><b>Plan de datos – Líneas Nodo (Contrato No. 195-2026):</b> El componente se mantiene sin cambios frente al último reporte, sin novedades operativas ni contractuales a resaltar.</p> <p><b>Procesos de contratación y adquisiciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Redundancia del canal:</b> Se informó que el proceso de contratación para el canal dedicado de internet no departamental inició el <b>22 de junio de 2026</b>, posterior al Comité</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                  |                  |                          |                    |                  |             |                    |                |        |       |                  |     |                |      |     |          |            |                  |     |                  |                  |        |         |                  |     |                  |                  |                |          |            |        |                 |                |     |                |                  |                  |          |            |        |          |                  |     |                  |                  |                          |          |           |        |       |                  |     |                  |                  |         |          |            |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      | <p>de Contratación realizado el <b>19 de junio de 2026</b>. A la fecha del comité, se encontraba pendiente la definición de la fecha estimada para la firma del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adquisición de radios – CACOM 5:</b> Se informó que los <b>radios fueron recibidos el día del comité</b> y quedaron pendientes de traslado al área de <b>Nodos</b>, para continuar con las actividades de implementación correspondientes.</li> <li>• <b>Implementación de SD-WAN:</b> Los canales de conectividad requeridos para la implementación de la solución <b>SD-WAN</b> se encontraban en <b>estudio de mercado</b>, a la espera de la recepción y análisis de las propuestas correspondientes.</li> <li>• <b>Horas de desarrollo:</b> Se informó que el proceso de contratación de las horas de desarrollo ISS inició el <b>22 de junio de 2026</b>, con fecha estimada de firma para el <b>8 de julio de 2026</b>.</li> </ul> <p><b>Migración y estado de la red de fibra óptica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A la fecha del comité, se habían recibido ocho (8) canales en fibra óptica</b> por parte de la Mesa de Ayuda, avanzando en las actividades asociadas a la migración y puesta en operación.</li> <li>• <b>San Jerónimo:</b> Se recuerda que debido a la falta de solución por parte de <b>Telefónica</b>, se realizó la suspensión del enlace y será instalado por el aliado <b>ANEXU</b>, <b>se espera que quede totalmente operativo el martes siguiente al comité</b>.</li> <li>• <b>Mutatá:</b> Se reportó un inconveniente con el servidor, el cual se encontraba <b>bloqueado físicamente</b>. Aunque permitía la visualización del servicio, era necesario el desplazamiento de personal técnico para realizar el desbloqueo y normalizar su operación.</li> <li>• <b>San Francisco:</b> Se informó que la <b>fibra óptica ya había sido instalada</b>; sin embargo, la migración aún no se había completado debido a que se encontraba pendiente la <b>configuración técnica por parte del contratista</b>.</li> <li>• <b>Sabanalarga:</b> Se presentaron dificultades técnicas para realizar la <b>puesta en servicio del canal</b>, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de otros equipos técnicos para avanzar en la solución y lograr la normalización de la conectividad.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Ejecución Física 47,13%</b><br/><b>Ejecución Financiera 37,2%</b></p> |
| 5 | Componentes de Nodos | <p>El profesional técnico Edison Arley Restrepo informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contrato No. 148-2026 – Servicio de operadores de nodos:</b> Se encuentra en ejecución el contrato suscrito con la empresa Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda., mediante el cual se dispone de treinta y un (31) operadores y un (1) auxiliar. A la fecha, se encuentran pendientes cinco (5) hojas de vida por aprobación.</li> <li>• <b>Contrato No. 220-2026 – Papelería:</b> El proceso se encuentra en etapa de definición de insumos requeridos para la operación de los nodos.</li> <li>• <b>Mantenimientos locativos de nodos:</b> El proceso se encuentra en etapa de contratación bajo la modalidad de contrato tipo bolsa, con un presupuesto asignado de doscientos dos millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos (\$202.545.763). El comité de contratación se realizó el 19 de junio de 2026, dando inicio al proceso el 22 de junio de 2026, con una fecha estimada de suscripción del contrato para el 8 de julio de 2026.</li> <li>• <b>Adecuaciones segundo piso CRUE:</b> Se informa que los Análisis de Precios Unitarios (APU) fueron remitidos el 28 de mayo de 2026, con un presupuesto estimado de mil quinientos dieciocho millones quinientos sesenta y un mil novecientos ochenta y tres pesos (\$1.518.561.983).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             | <p>La Secretaría remitió observaciones al aliado Valor+, las cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión y ajuste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rubro nómina de operación: Se reporta la siguiente distribución: V+: 58,65% / 46% - PS:36,06% / 41%</li> </ul> <p><b>Ejecución Física 46,97%</b><br/><b>Ejecución financiera 35,76%</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Componente Implementaciones | <p>En relación con el componente de implementaciones, el profesional técnico Edison Arley Restrepo informa lo siguiente:</p> <p><b>Adquisición de cámaras fijas CCM (101) – Contrato No. 255-2026:</b><br/>El proceso de adquisición se desarrolla con el aliado Unión Temporal AEI, con un valor final de ciento veintidós millones veinticuatro mil setecientos pesos (\$122.024.700), IVA incluido.</p> <p><b>Adquisición y distribución de equipos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cámaras fijas – Contrato 5520 de 2026:</b> Se informó que durante la semana se recibieron las cámaras físicas correspondientes al contrato y se procedió con la aprobación de la factura respectiva.</li> <li><b>Asignación por subregión:</b> Las cámaras fueron asignadas a las diferentes subregiones del departamento, de acuerdo con la distribución establecida.</li> <li><b>Suministro de cámaras 101:</b> Se adelantó la gestión correspondiente al suministro de ciento una (101) cámaras, las cuales serán integradas a los procesos de instalación y operación de los aliados.</li> </ul> <p><b>Estrategia de instalación y soporte técnico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Integración con mantenimiento:</b> Se definió como estrategia realizar la instalación de las cámaras en articulación con las actividades de <b>mantenimiento preventivo</b> ejecutadas por los aliados. Se busca que el costo asociado a la instalación quede <b>incluido dentro de un valor integral en el contrato de mantenimiento</b>, optimizando así los recursos y la ejecución de las actividades.</li> <li><b>Gestiones de red y licenciamiento:</b> Se solicitó a la <b>Mesa de Ayuda</b> la asignación de las <b>direcciones IP</b> requeridas para los nuevos equipos. De igual manera, se estableció el compromiso de adelantar las gestiones correspondientes para obtener el <b>licenciamiento necesario para su puesta en funcionamiento</b>.</li> </ul> <p><b>Ejecución Física 100%</b><br/><b>Ejecución financiera 93%</b></p> |
| 7 | Actas de transferencia      | <p><b>Informe jurídico – Revisión y proyección de actas:</b> El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa sobre los avances en la gestión de las actas de transferencia, destacando que el alcance del proceso pasó de <b>cuatro (4) a cinco (5) contratos</b>, los cuales comprenden <b>diecisiete (17) municipios</b> y se encuentran listos para la firma de los respectivos beneficiarios.</p> <p>En cuanto al estado de las aprobaciones, actualmente se cuenta con <b>un (1) contrato aprobado por el despacho</b>, mientras permanecen pendientes las revisiones de los contratos correspondientes a las vigencias 2024 y 2025.</p> <p>Como <b>meta inmediata</b>, se estableció que durante la semana en curso se dará trámite a aproximadamente <b>cuatro (4) o cinco (5) contratos</b>, con el propósito de agilizar y descongestionar el proceso de revisión por parte del despacho.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Finalmente, como <b>mejora del proceso</b>, se informó que se ha establecido un canal de comunicación más directo con Liliana López, asesora jurídica del Despacho, con el fin de atender y corregir oportunamente observaciones de forma, tales como uso de negrillas, centrado de texto u otros ajustes menores. Esta coordinación busca <b>evitar reprocesos innecesarios, agilizar las revisiones y reducir los tiempos requeridos para la formalización y firma de las actas.</b></p> <table><tr><th colspan="2">Control Actas de transferencia Vigencia 2024</th></tr><tr><th colspan="2">Indicadores de desempeño – Actos administrativos</th></tr><tr><td>Total municipios</td><td>91</td></tr><tr><td>Total contratos</td><td>16</td></tr><tr><td>Anexos Completos</td><td>100%</td></tr><tr><td>Contratos aprobados</td><td>7 (40 municipios)</td></tr><tr><td>Revisión Pendiente</td><td>37 municipios</td></tr><tr><td>En firma del beneficiario</td><td>4 (14 municipios)</td></tr></table> | Control Actas de transferencia Vigencia 2024 |                  | Indicadores de desempeño – Actos administrativos |                | Total municipios | 91                  | Total contratos | 16               | Anexos Completos | 100%                       | Contratos aprobados | 7 (40 municipios)          | Revisión Pendiente | 37 municipios | En firma del beneficiario | 4 (14 municipios) |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---|-------|---|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|------|------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|--------------|-------|--|--|---------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------|-------|------------------|-------|------|------|--------------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|------|-------|---------------|------|---------------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|------|------|------------|------------------|------------------|---------|------|-------|----------------|--------|------------------|--------|------|------|
| Control Actas de transferencia Vigencia 2024     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Indicadores de desempeño – Actos administrativos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Total municipios                                 | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Total contratos                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Anexos Completos                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Contratos aprobados                              | 7 (40 municipios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Revisión Pendiente                               | 37 municipios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| En firma del beneficiario                        | 4 (14 municipios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |                                                  |                |                  |                     |                 |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| 8                                                | <div>Estado Disponibilidad por componente 2026</div> <div><p><b>Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026:</b></p><table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Saldo contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.105.747.133</td><td>84,38%</td><td>\$ 1.221.898.110</td><td>28,08%</td><td>\$ 333.945.992</td><td>7,68%</td><td>\$ 2.550.103.031</td><td>82,11%</td><td>\$ 226.220.664</td><td>\$ 18.283.288</td></tr><tr><td>Instalación nodos rubros mínima</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>100,00%</td><td>\$ 207.758.870</td><td>58,65%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 146.474.541</td><td>41,35%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 75.841.957</td><td>2,69%</td><td>\$ 7.480.325</td><td>0,27%</td><td></td><td></td><td>\$ 58.542.823</td><td>0,00%</td><td>\$ 1.518.561.983</td><td>\$ 1.215.405.837</td></tr><tr><td>Mantenimiento del Mpio.</td><td>\$ 9.401.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>100,00%</td><td>\$ 103.070.190</td><td>1,09%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.525.905.595</td><td>88,67%</td><td>\$ 451.295.874</td><td>28,23%</td><td>\$ 111.789.820</td><td>6,50%</td><td>\$ 962.820.101</td><td>63,10%</td><td>\$ 86.822.176</td><td>\$ 108.075.379</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.403.296.597</td><td>94,69%</td><td>\$ 453.048.154</td><td>31,25%</td><td>\$ 87.623.632</td><td>5,91%</td><td>\$ 852.624.811</td><td>60,76%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 78.874.469</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 122.024.700</td><td>58,58%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 122.024.700</td><td>58,58%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 86.295.245</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>100,00%</td><td>\$ 376.642.066</td><td>24,50%</td><td>\$ 125.547.362</td><td>8,17%</td><td>\$ 1.035.395.411</td><td>67,34%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>100,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 194.953.350</td><td>10,05%</td><td>\$ 1.745.772.272</td><td>89,95%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr></table><p><b><u>Horas de desarrollo - 85 horas - Valor contrato (\$109.425.005)</u></b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• En proceso de contratación.</li><li>• Comité de contratación 19/06/2026.</li><li>• Inicio de proceso el 22/06/2026.</li><li>• Fecha estimada de contrato: 8/07/2026.</li></ul><p>En relación con el <b>estado de disponibilidad por componente para la vigencia 2026</b>, se evidenció una situación de especial atención en materia presupuestal y de gestión contractual, destacándose los siguientes aspectos:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gestión de APU:</b> Se encuentra en proceso la revisión y aprobación de los <b>Análisis de Precios Unitarios (APU)</b>, requisito necesario para avanzar en el contrato por aproximadamente <b>\$1.518.561.983 millones</b> de pesos. Como estrategia presupuestal y contractual, se plantea distribuir proporcionalmente los valores entre los componentes de obra y suministro, con el propósito de no superar el <b>tope legal del 50 %</b> establecido para las modificaciones contractuales.</li><li>• <b>Puestos de trabajo para el CRUE:</b> Dentro de la propuesta actual de los APU, los puestos de trabajo destinados al <b>CRUE</b> fueron establecidos temporalmente en <b>cero (\$0)</b>, con el fin de mantener el valor del contrato dentro del presupuesto disponible de <b>\$1.518.561.983 millones</b> de</li></ul></div> | Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presupuestado                                | Comprometido     |                                                  | Pagado         |                  | Facturado por pagar |                 | Saldo contratos  |                  | En proceso de contratación | Disponible          | Valor                      | %                  | Valor         | %                         | Valor             | % | Valor | % | Instalación nodos | \$ 4.350.248.085 | \$ 4.105.747.133 | 84,38% | \$ 1.221.898.110 | 28,08% | \$ 333.945.992 | 7,68% | \$ 2.550.103.031 | 82,11% | \$ 226.220.664 | \$ 18.283.288 | Instalación nodos rubros mínima | \$ 354.233.411 | \$ 354.233.411,00 | 100,00% | \$ 207.758.870 | 58,65% | \$ 0 | 0,00% | \$ 146.474.541 | 41,35% | \$ 0 | \$ 0 | Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577 | \$ 75.841.957 | 2,69% | \$ 7.480.325 | 0,27% |  |  | \$ 58.542.823 | 0,00% | \$ 1.518.561.983 | \$ 1.215.405.837 | Mantenimiento del Mpio. | \$ 9.401.588.109 | \$ 9.460.588.109 | 100,00% | \$ 103.070.190 | 1,09% | \$ 0 | 0,00% | \$ 9.357.517.919 | 0,00% | \$ 0 | \$ 0 | Conectividad | \$ 1.720.803.150 | \$ 1.525.905.595 | 88,67% | \$ 451.295.874 | 28,23% | \$ 111.789.820 | 6,50% | \$ 962.820.101 | 63,10% | \$ 86.822.176 | \$ 108.075.379 | Personal Apoyo | \$ 1.481.971.066 | \$ 1.403.296.597 | 94,69% | \$ 453.048.154 | 31,25% | \$ 87.623.632 | 5,91% | \$ 852.624.811 | 60,76% | \$ 0 | \$ 78.874.469 | Implementaciones CCTV | \$ 208.319.945 | \$ 122.024.700 | 58,58% | \$ 0 | 0,00% | \$ 122.024.700 | 58,58% | \$ 0 | 0,00% | \$ 86.295.245 | \$ 0 | Mesa de ayuda | \$ 1.537.584.859 | \$ 1.537.584.859 | 100,00% | \$ 376.642.066 | 24,50% | \$ 125.547.362 | 8,17% | \$ 1.035.395.411 | 67,34% | \$ 0 | \$ 0 | Honorarios | \$ 1.940.725.622 | \$ 1.940.725.622 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 194.953.350 | 10,05% | \$ 1.745.772.272 | 89,95% | \$ 0 | \$ 0 |
| Componente                                       | Presupuestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Comprometido     |                                                  | Pagado         |                  | Facturado por pagar |                 | Saldo contratos  |                  |                            |                     | En proceso de contratación | Disponible         |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %                                            | Valor            | %                                                | Valor          | %                | Valor               | %               |                  |                  |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Instalación nodos                                | \$ 4.350.248.085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 4.105.747.133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84,38%                                       | \$ 1.221.898.110 | 28,08%                                           | \$ 333.945.992 | 7,68%            | \$ 2.550.103.031    | 82,11%          | \$ 226.220.664   | \$ 18.283.288    |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Instalación nodos rubros mínima                  | \$ 354.233.411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 354.233.411,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%                                      | \$ 207.758.870   | 58,65%                                           | \$ 0           | 0,00%            | \$ 146.474.541      | 41,35%          | \$ 0             | \$ 0             |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE | \$ 2.809.609.577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 75.841.957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,69%                                        | \$ 7.480.325     | 0,27%                                            |                |                  | \$ 58.542.823       | 0,00%           | \$ 1.518.561.983 | \$ 1.215.405.837 |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Mantenimiento del Mpio.                          | \$ 9.401.588.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 9.460.588.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                                      | \$ 103.070.190   | 1,09%                                            | \$ 0           | 0,00%            | \$ 9.357.517.919    | 0,00%           | \$ 0             | \$ 0             |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Conectividad                                     | \$ 1.720.803.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.525.905.595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88,67%                                       | \$ 451.295.874   | 28,23%                                           | \$ 111.789.820 | 6,50%            | \$ 962.820.101      | 63,10%          | \$ 86.822.176    | \$ 108.075.379   |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Personal Apoyo                                   | \$ 1.481.971.066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.403.296.597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,69%                                       | \$ 453.048.154   | 31,25%                                           | \$ 87.623.632  | 5,91%            | \$ 852.624.811      | 60,76%          | \$ 0             | \$ 78.874.469    |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Implementaciones CCTV                            | \$ 208.319.945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 122.024.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58,58%                                       | \$ 0             | 0,00%                                            | \$ 122.024.700 | 58,58%           | \$ 0                | 0,00%           | \$ 86.295.245    | \$ 0             |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Mesa de ayuda                                    | \$ 1.537.584.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.537.584.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                                      | \$ 376.642.066   | 24,50%                                           | \$ 125.547.362 | 8,17%            | \$ 1.035.395.411    | 67,34%          | \$ 0             | \$ 0             |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |
| Honorarios                                       | \$ 1.940.725.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.940.725.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                                      | \$ 0             | 0,00%                                            | \$ 194.953.350 | 10,05%           | \$ 1.745.772.272    | 89,95%          | \$ 0             | \$ 0             |                            |                     |                            |                    |               |                           |                   |   |       |   |                   |                  |                  |        |                  |        |                |       |                  |        |                |               |                                 |                |                   |         |                |        |      |       |                |        |      |      |                                                  |                  |               |       |              |       |  |  |               |       |                  |                  |                         |                  |                  |         |                |       |      |       |                  |       |      |      |              |                  |                  |        |                |        |                |       |                |        |               |                |                |                  |                  |        |                |        |               |       |                |        |      |               |                       |                |                |        |      |       |                |        |      |       |               |      |               |                  |                  |         |                |        |                |       |                  |        |      |      |            |                  |                  |         |      |       |                |        |                  |        |      |      |

|                                 |                                           | <p>pesos. Se indicó que estos equipos serían adquiridos posteriormente mediante un rubro específico destinado a suministros.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratos en proceso:</b> Se informó que hay cuatro contratos prioritarios, entre ellos el correspondiente al <b>mantenimiento locativo de nodos</b> y el relacionado con <b>horas de soporte para desarrollo</b>, fueron presentados ante el Comité de Contratación el <b>19 de junio</b> e iniciaron formalmente su trámite el <b>22 de junio</b>, estimándose como fecha de firma el <b>8 de julio</b>.</li><li>• <b>Horas de desarrollo:</b> Se proyecta la adquisición de <b>ochenta y cinco (85) horas de desarrollo</b> para el soporte del sistema ISS.</li><li>• <b>Urgencia en la ejecución:</b> El supervisor del contrato y director de Planeación y Administración de la Seguridad, <b>Antonio José Salazar López</b>, enfatizó la necesidad de <b>acelerar la ejecución de las inversiones</b>, teniendo en cuenta que ya se encuentra en curso el segundo semestre de la vigencia. Señaló que la ejecución financiera presenta actualmente niveles aproximados entre el <b>10 % y el 15 %</b>, mientras permanecen cerca de <b>\$18.000 millones por ejecutar durante los seis meses restantes</b>. En este sentido, resaltó la importancia de <b>fortalecer y agilizar la gestión contractual, priorizar las inversiones pendientes y adoptar las acciones necesarias para garantizar una adecuada ejecución de los recursos dentro de los tiempos establecidos</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |              |       |                     |               |                     |                |                            |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|------|-------|--------------|-------|----------------|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|------|-------|------|-------|------|------|------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------|-------|------------|-------|--------------|------|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|------|-------|-----------|-------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|------|---------------|-----------------------------|------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------------|------|---------------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|------|-------|---------------|--------|------|------|
| 9                               | Estado Disponibilidad por componente 2025 | <p>Respecto al estado de disponibilidad por componente de la vigencia 2025, se realizan las siguientes aclaraciones en relación con el presupuesto asignado y su ejecución, con el fin de garantizar la correcta utilización de los recursos, el cumplimiento de los tiempos establecidos y el adecuado cierre financiero de la vigencia.</p> <table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Saldo contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 399.710.390</td><td>\$ 92.988.384</td><td>23,44%</td><td>\$ 91.401.350</td><td>23,04%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 1.587.034</td><td>1,71%</td><td>\$ 303.722.012</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros mínima</td><td>\$ 80.252.722</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mptes</td><td>\$ 78.046.680</td><td>\$ 71.017.672</td><td>90,99%</td><td>\$ 70.904.522</td><td>90,85%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 113.150</td><td>0,00%</td><td>\$ 7.029.008</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 165.202.428</td><td>\$ 50.129.538</td><td>27,07%</td><td>\$ 50.112.854</td><td>27,06%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 16.864</td><td>0,03%</td><td>\$ 135.072.888</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 97.100.962</td><td>\$ 65.763.419</td><td>67,71%</td><td>\$ 34.501.790</td><td>35,62%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 31.161.629</td><td>47,39%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 31.368.543</td></tr><tr><td>Instalac Nuevos componentes</td><td>\$ 134.356</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 134.356</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 206.213.658</td><td>100,00%</td><td>\$ 202.796.927</td><td>68,46%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 83.416.731</td><td>31,54%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr></table> <p>a. <b>Nodos – \$157.077.721:</b> Estos recursos están destinados a la adquisición de dos (2) equipos Fortinet para los nodos Occidente y Oriente, bajo configuración de Alta Disponibilidad (HA). Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de estudio de mercado, con fecha prevista para la entrega de cotizaciones el 30 de junio de 2026.</p> <p>b. <b>Licenciamiento de Fortinet – Fase 1 y Fase 2:</b> Se cuenta con una disponibilidad presupuestal total de \$273.076.440, correspondiente a los saldos de los componentes de Instalación y Operación de Nodos (\$60.678.012), Mantenimiento (\$7.029.008), Conectividad (\$205.235.064) e Instalación de Nuevos Componentes (\$134.356). Estos recursos se encuentran discriminados entre \$202.914.264 correspondientes a la reserva de la vigencia 2025 y \$70.162.176 de la vigencia 2026, como se detalla a continuación.</p> | Componente | Presupuestado  | Comprometido |       | Pagado              |               | Facturado por pagar |                | Saldo contratos            |            | En proceso de contratación | Disponible | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Instalación nodos | \$ 399.710.390 | \$ 92.988.384 | 23,44% | \$ 91.401.350 | 23,04% | \$ 0 | 0,00% | \$ 1.587.034 | 1,71% | \$ 303.722.012 | \$ 0 | Instalación nodos-rubros mínima | \$ 80.252.722 | \$ 80.252.722 | 100,00% | \$ 80.252.722 | 100,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | \$ 0 | Mantenimiento 84 Mptes | \$ 78.046.680 | \$ 71.017.672 | 90,99% | \$ 70.904.522 | 90,85% | \$ 0 | 0,00% | \$ 113.150 | 0,00% | \$ 7.029.008 | \$ 0 | Conectividad | \$ 165.202.428 | \$ 50.129.538 | 27,07% | \$ 50.112.854 | 27,06% | \$ 0 | 0,00% | \$ 16.864 | 0,03% | \$ 135.072.888 | \$ 0 | Personal Apoyo | \$ 97.100.962 | \$ 65.763.419 | 67,71% | \$ 34.501.790 | 35,62% | \$ 0 | 0,00% | \$ 31.161.629 | 47,39% | \$ 0 | \$ 31.368.543 | Instalac Nuevos componentes | \$ 134.356 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 134.356 | \$ 0 | Mesa de ayuda | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | \$ 0 | Honorarios | \$ 296.213.658 | \$ 206.213.658 | 100,00% | \$ 202.796.927 | 68,46% | \$ 0 | 0,00% | \$ 83.416.731 | 31,54% | \$ 0 | \$ 0 |
| Componente                      | Presupuestado                             | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                | Pagado       |       | Facturado por pagar |               | Saldo contratos     |                | En proceso de contratación | Disponible |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
|                                 |                                           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %          | Valor          | %            | Valor | %                   | Valor         | %                   |                |                            |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Instalación nodos               | \$ 399.710.390                            | \$ 92.988.384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,44%     | \$ 91.401.350  | 23,04%       | \$ 0  | 0,00%               | \$ 1.587.034  | 1,71%               | \$ 303.722.012 | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Instalación nodos-rubros mínima | \$ 80.252.722                             | \$ 80.252.722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%    | \$ 80.252.722  | 100,00%      | \$ 0  | 0,00%               | \$ 0          | 0,00%               | \$ 0           | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Mantenimiento 84 Mptes          | \$ 78.046.680                             | \$ 71.017.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,99%     | \$ 70.904.522  | 90,85%       | \$ 0  | 0,00%               | \$ 113.150    | 0,00%               | \$ 7.029.008   | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Conectividad                    | \$ 165.202.428                            | \$ 50.129.538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27,07%     | \$ 50.112.854  | 27,06%       | \$ 0  | 0,00%               | \$ 16.864     | 0,03%               | \$ 135.072.888 | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Personal Apoyo                  | \$ 97.100.962                             | \$ 65.763.419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67,71%     | \$ 34.501.790  | 35,62%       | \$ 0  | 0,00%               | \$ 31.161.629 | 47,39%              | \$ 0           | \$ 31.368.543              |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Instalac Nuevos componentes     | \$ 134.356                                | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%      | \$ 0           | 0,00%        | \$ 0  | 0,00%               | \$ 0          | 0,00%               | \$ 134.356     | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Mesa de ayuda                   | \$ 0                                      | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%      | \$ 0           | 0,00%        | \$ 0  | 0,00%               | \$ 0          | 0,00%               | \$ 0           | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |
| Honorarios                      | \$ 296.213.658                            | \$ 206.213.658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00%    | \$ 202.796.927 | 68,46%       | \$ 0  | 0,00%               | \$ 83.416.731 | 31,54%              | \$ 0           | \$ 0                       |            |                            |            |       |   |       |   |       |   |       |   |                   |                |               |        |               |        |      |       |              |       |                |      |                                 |               |               |         |               |         |      |       |      |       |      |      |                        |               |               |        |               |        |      |       |            |       |              |      |              |                |               |        |               |        |      |       |           |       |                |      |                |               |               |        |               |        |      |       |               |        |      |               |                             |            |      |       |      |       |      |       |      |       |            |      |               |      |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |            |                |                |         |                |        |      |       |               |        |      |      |

| Saldos presupuesto - Gerenciamiento 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 (Reserva)            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL              |
| Instalación y operación de nodos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.678.012                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.678.012         |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.029.008                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.029.008          |
| Conectividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135.072.888               | 70.162.176                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205.235.064        |
| Personal apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  |
| Instalación nuevos componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134.356                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134.356            |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>202.914.264</b>        | <b>70.162.176</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>273.076.440</b> |
| <p>Los recursos serán destinados al <b>licenciamiento de Fortinet, Fase 1 y Fase 2</b>, actualmente en proceso de contratación. Se deja constancia de que la destinación de estos recursos y el proceso contractual cuentan con la <b>aprobación del supervisor del contrato, Antonio José Salazar López, director de Planeación y Administración de la Seguridad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (SSJYP) de la Gobernación de Antioquia</b>, de conformidad con las necesidades técnicas y operativas identificadas.</p> <p><b>c. Adquisición de teléfonos celulares CACOM 5:</b> El proceso se encuentra en <b>etapa de estudio de mercado</b>, con fecha de referencia del <b>19 de junio de 2026</b>, a partir de la cual se adelantan las gestiones correspondientes para determinar las condiciones y valores de la adquisición.</p> <p><b>d. Servidores:</b> Se informa que el <b>estudio de mercado ya fue realizado</b>. Actualmente, se encuentra pendiente el resultado de los estudios de mercado correspondientes a <b>Radios y Celular</b>, con el fin de realizar la <b>revisión y determinación del saldo presupuestal disponible</b> para continuar con el proceso de adquisición.</p> <p><b>e. Licencias faciales – \$243.044.000:</b> Se informa que el proceso de adquisición de las licencias faciales se encuentra en <b>proceso de contratación</b>, de acuerdo con el siguiente estado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Comité de Contratación:</b> realizado el <b>19 de junio de 2026</b>.</li> <li><b>Inicio del proceso contractual:</b> <b>22 de junio de 2026</b>.</li> <li><b>Fecha estimada de suscripción del contrato:</b> <b>8 de julio de 2026</b>.</li> </ol> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pendientes de pago</b> | No hay pagos pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mesa de Ayuda</b>      | En relación con las novedades reportadas a través de la mesa de ayuda, el líder de mesa, <b>Sebastián Metaute</b> , informa que durante el periodo evaluado se registraron un total de 109 casos, de los cuales 97 han sido cerrados satisfactoriamente y 12 permanecen pendientes de gestión. |                    |

Se informó que, del total de casos reportados, **veinticinco (25) correspondieron a situaciones relacionadas con conectividad**, de los cuales únicamente quedó **un (1) caso pendiente**, asociado a una intermitencia presentada en el municipio de **Giraldo**, donde se identificó una posible manipulación del equipo.

| Casos asociados a conectividad |                |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Casos abiertos                 | Casos Cerrados | Casos pendientes |
| 25                             | 24             | 1                |

- ✓ Apoyo en elecciones
- ✓ Corrección KEY en el municipio de Giraldo
- ✓ Instalación HA nodo departamental
- ✓ Fallo en Dashboard de SECUROS
- ✓ Saturación Red local Nodo.

En cuanto a las **correcciones y soporte específico**, se destacó la solución de la falla presentada en el municipio de **El Retiro**, relacionada con licencias que generaban intermitencia desde el año anterior. Se estableció que la situación obedecía a una **licencia provisional** solicitada para una inauguración, la cual no había sido actualizada oportunamente a su versión definitiva. Actualmente, se informó que **todas las licencias se encuentran configuradas a perpetuidad**, solucionando la situación presentada.

Asimismo, se brindó **soporte técnico durante la jornada electoral**, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos y de conectividad requeridos durante el desarrollo de la misma.

Respecto a la **sensibilización y gestión de tickets**, se viene adelantando un trabajo con los **nodos regionales y las alcaldías**, orientado a fortalecer la generación de **tickets formales** frente a las fallas recurrentes de las cámaras. Se busca mejorar la individualización de los incidentes, toda vez que en algunos casos los operadores reportan un **"municipio caído"** como un único incidente, aun cuando la afectación puede corresponder únicamente a una cámara, un enlace de comunicación o un servidor bloqueado. En este sentido, la **Mesa de Ayuda realizará la validación e individualización de cada caso**, con el propósito de facilitar el diagnóstico técnico, optimizar los tiempos de atención y mejorar el seguimiento de los incidentes.






En relación con el **estado de la red y la infraestructura**, se informó que el domingo se presentó un evento de **saturación de la red**, que afectó la velocidad de navegación y la visualización de cámaras de terceros. Como medida de mejora, se solicitó la **migración de equipos hacia una mayor capacidad** y se proyecta realizar una **segmentación de la red**, con el objetivo de evitar que una falla individual, como la de un switch, genere afectaciones sobre toda la cadena de comunicación.

Finalmente, se informó que fue solicitada al **área de Conectividad** la gestión de los **módulos requeridos para el mantenimiento de la red**, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura y garantizar la continuidad y estabilidad de los servicios.

#### Compromisos Acordados

| No. | Compromiso                                                 | Responsable                           | Fecha               | Resultado Esperado |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | Reunión V+ y SSJyP para definir atención de mantenimientos | Alexander Morales<br>Director técnico | 30 de junio de 2026 |                    |

| Documentos Anexos al Acta |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| No.                       | Nombre del documento                                                |
| 1                         | Asistencia_Comite_Seguimiento_26-06-2026 -- G2                      |
| 2                         | Comite_Tecnico_26-06-2026 -- G2                                     |
| Proyectado por:           | Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa             |
| Revisó y Aprobó:          | Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI |

| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |               | LISTADO ASISTENCIA           |            |                                       | Código: FO-M1-P7-001                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: 26 junio de 2026                                                                                                                  |               | HORA: 10:44 A.M.             |            | LUGAR EVENTO: Nodo Departamental      |                                                                                    |
| ASUNTO: Comité de Seguimiento de G2                                                                                                      |               | DEPENDENCIA RESPONSABLE: V + |            |                                       |                                                                                    |
| NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS                                                                                                             | CÉDULA        | CARGO/DEPENDENCIA            | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO                    | FIRMA                                                                              |
| Tomas Sierra                                                                                                                             | 49519400      | coord. Nodos                 | 31836243   | Nodos+Seguridad@                      |    |
| Sergio Andres Velaz Upegui                                                                                                               | 8.556.766     | Coordinador Mesa V+          | 3003536119 | Coordinacion_mesas@valormas.gov.co    |    |
| Carlos Arturo Correa Correa                                                                                                              | 8431061       | Lidero Mesas V+              | +310404456 | carlos.correa@valormas.gov.co         |    |
| Richard Uribe Camargo                                                                                                                    | 21692842      | Sup. Juridico                | 301232211  | juridico.uribe@valormas.gov.co        |    |
| John Felipe Zuluaga G.                                                                                                                   | 1.045.021.454 | Juridico AS                  | 3113701264 | juridico.g2@antioquiag.gov.co         | J.F.Z.G.                                                                           |
| Alexander Nolasco G.                                                                                                                     | 1676126177    | Dir. Rec. AS                 | 31111145   | alexhrg@antioquiag.gov.co             |    |
| Giamari Saeed Barce                                                                                                                      | 8604266       | coordinador SSTJP            | 3125366816 | giamari@antioquiag.gov.co             |   |
| Carlos Flauto Prieto E.                                                                                                                  | 91522343      | coordinador Valor+           | 316733004  | carlos.prieto@valormas.gov.co         |  |
| Yury Andrea Botero Linares                                                                                                               | 1042040433    | Contratista                  | 3006740685 | yabel92@gmail.com                     |  |
| Kristian Martinez                                                                                                                        | 1037707010    | Chetel/ SOSP.                | 310324111  | kristian.perez@antioquiag.gov.co      | Kristian                                                                           |
| Oscar Alejo Lopez R.                                                                                                                     | 71371308      | Ingeniero ASSTJP             | 3007858860 | Ingeniero.62@antioquiag.gov.co        |  |
| Antonio Salazar Lopez                                                                                                                    | 98528751      | Dir. Planeac. Jey            | 3105011594 | antonio.jey.salazar@antioquiag.gov.co |  |
| CRISTIAN ANTONIO SALAZAR                                                                                                                 | 90717370      | COORDINADOR VALOR +          | 3014003203 | CRISTIAN.CASTRO@valormas.gov.co       |  |
| David Ceballos                                                                                                                           | 98691771      | Coordinador                  | 3001112009 | David.Ceballos@valormas.gov.co        |  |
| Juan I David Boleiro G.                                                                                                                  | 3391516       | apoyo/cps                    | 3014210261 | juan.boleiro@valormas.gov.co          |  |

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.



**LISTADO ASISTENCIA**

Código: FO-M1-P7-001

Version: 03

**Fecha de aprobación:** 04/02/2025

FECHA: 26 junho de 2026

HORA: 10:44 a.m

LUGAR EVENTO: *Nodo departamental*

ASUNTO: Comité de Seguimiento Co2.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Y. +

N°ACTA: 22

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1501 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

## CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como revisor fiscal de la **EMPRESA VALOR + S.A.S** con NIT **900.969.726-2**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el periodo de los últimos (6) meses así:

- Desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2026.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:

- Se verificaron los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los pagos realizados entre enero a Junio de 2026. Se adjuntan los documentos que soportan dichos pagos, y los cuales se detallan a continuación:

| SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 2026 |                |               |               |                      |            |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| PERIODO                              | PENSION        | SALUD         | ARL           | APORTES PARAFISCALES | FECHA PAGO |
| ENERO                                | \$ 272.695.100 | \$ 72.280.400 | \$ 10.600.100 | \$ 71.428.800        | 6/02/26    |
| FEBRERO                              | \$ 303.541.400 | \$ 79.160.700 | \$ 11.641.300 | \$ 76.204.600        | 5/03/26    |
| MARZO                                | \$ 293.403.500 | \$ 77.202.900 | \$ 11.296.700 | \$ 73.135.500        | 14/04/26   |
| ABRIL                                | \$ 298.987.500 | \$ 78.531.500 | \$ 11.308.400 | \$ 74.698.000        | 8/05/26    |
| MAYO                                 | \$ 303.292.300 | \$ 79.395.700 | \$ 11.407.800 | \$ 76.225.400        | 4/06/26    |
| JUNIO                                | \$ 301.154.000 | \$ 79.124.800 | \$ 10.914.700 | \$ 76.381.500        | 6/07/26    |

- Con base en los literales y procedimientos mencionados anteriormente, informo que la entidad, durante los últimos seis meses comprendidos entre el 1 enero a 30 de junio de 2026, efectuó los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Este certificado e informe es para uso de la administración de la **EMPRESA VALOR + SAS**, en los cobros a realizar por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado

Se expide certificación a los **09** días del mes de **julio** de **2026**.

Cordialmente,

QUINTERO MONTOYA  
ALEJANDRO

Firmado digitalmente por  
QUINTERO MONTOYA  
ALEJANDRO  
Fecha: 2026.07.09 10:09:28 -05'00'

**ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA.**

Revisor Fiscal Designado

CC 15.443.136

TP 134379-T

Contacto. 604 5803040 - 3006290730

[gerencia@regsas.com](mailto:gerencia@regsas.com) - [alejoc26@hotmail.com](mailto:alejoc26@hotmail.com)



ESTA COPIA DE TARJETA PROFESIONAL SOLO ES VALIDA EL CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JUNIO 2026 - DE LA EMPRESA VALOR+ SAS.  
EXPEDIDO EL 09 DE JULIO DE 2026

QUINTERO  
MONTROYA  
ALEJANDRO

Firmado digitalmente por QUINTERO MONTROYA-ALEJANDRO fecha: 2026.07.09 18:09:51 -05'00'



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

C A R B O 4 E 5 0 F B 5 9 8 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO QUINTERO MONTROYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 15443136 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134379-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



| Información de la Planilla Pagada        |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9                 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.                 |
| Descripción                              | Pago de SuAporte            |
| Fecha                                    | 2026-07-06, 09:25:08 AM     |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | junio de 2026               |
| Periodo de Cotización Para Salud         | julio de 2026               |
| Empresa                                  | VALOR MAS SAS               |
| NIT                                      | NI 900969726                |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                         |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1083223266                  |
| Tipo de Planilla                         | E                           |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 455272303                   |
| Banco                                    | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor                                    | \$ 467.575.000              |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                    |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 149              | \$ 77.955.900  | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 192              | \$ 109.900.100 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 117              | \$ 91.821.000  | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 24               | \$ 18.056.100  | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3                | \$ 3.420.900   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 43               | \$ 5.411.900   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 13               | \$ 1.930.800   | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 1                | \$ 109.300     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 27               | \$ 3.551.200   | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 5                | \$ 466.000     | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS      | 10               | \$ 1.022.900   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 3                | \$ 215.200     | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042     | 1                | \$ 70.100      | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 388              | \$ 64.585.700  | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 1                | \$ 347.600     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 7                | \$ 1.414.100   | \$ 0                 |
| N800226175 | 14-25  | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES           | 499              | \$ 10.914.700  | \$ 0                 |
| N890900842 | CCF03  | COMFENALCOANTIOQUIACCF                  | 488              | \$ 75.276.800  | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN    | 1                | \$ 441.900     | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF                                    | 1                | \$ 662.800     | \$ 0                 |

SubTotales: \$ 467.575.000 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 467.575.000

