


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Jardín Botánico José Celestino Mutis</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 1 de 4	

No	6	INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN					
Subdirección Técnica Operativa					

FECHA			Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.									
DD	MM	AAAA										
7	10	2025	Secretario: Catalina Camacho									
			Lugar: Virtual									
Hora de Inicio: 4:00			a.m.		p.m.	X	Hora de Cierre: 5:00		a.m.		p.m.	X
Tema de reunión:			Comité Técnico Extraordinario Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.									
Grupo que se reúne:			Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP/Jardín Botánico de Bogotá - JBB									
Asistentes												
Nombre			Cargo				Firma					
Yon Alexsander Plazas Gómez			Profesional Universitario UAESP									
Maria Alejandra Valderrama Amezcua			Supervisora contrato de cerramiento									
Liseth Paola Piñeros Urrego			Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO									
Catalina Camacho Fandino			Coordinadora Convenios JBB - STO									
Orden del día (Describa brevemente los temas a tratar)												
1. Seguimiento al Convenio												
2. Varios												
Desarrollo de la reunión												
1. Seguimiento al Convenio. El comité fue convocado de manera extraordinaria para revisar los retrasos en la ejecución del contrato de cerramiento de los predios San Isidro y La Palmera y por ende, de las actividades pendientes de plantación del Convenio, además de presentar afectaciones sobre las plantaciones por ingreso de ganado (pisoteo). El profesional Yon Plazas (UAESP) informó que el contrato de cerramiento tiene acta del inicio el 7 de octubre, con un plazo de ejecución de 45 días, previendo finalizar el 19 de noviembre. La ingeniera												

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Jardín Botánico José Celestino Mutis</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 BOGOTÁ  JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 2 de 4	

Maria Alejandra Valderrama (supervisora del contrato) explicó que las actividades ya comenzaron con el desmantelamiento del cerramiento existente, priorizando la zona requerida por el Jardín Botánico para continuar las plantaciones. Indicó que el contratista tiene un rendimiento estimado de 30 metros lineales diarios y trabajará también los fines de semana para cumplir con los plazos.

La ingeniera Paola Piñeros (JBB) manifestó su preocupación por el avance del cerramiento, dado que las plantaciones ya establecidas en los polígonos 6, 7 y 8 del predio San Isidro se han visto afectadas por el ingreso de ganado. Reportó 1.500 árboles plantados en el polígono 6, de los cuales cerca de 40 individuos presentan afectaciones por pisoteo y herbivoría. Resaltó que el equipo del Jardín no puede continuar con nuevas plantaciones si no se garantiza la protección del material vegetal, ya que es contraproducente acorde a los lineamientos técnicos y de conservación.

Ante esta situación, se discutió la posibilidad de implementar un cerramiento provisional mientras avanza la obra principal, utilizando parte del alambre recuperado del desmonte. El guardabosques Félix de la UAESP realizará acompañamiento permanente en la zona para evitar nuevos ingresos de ganado.

El comité acordó priorizar el cerramiento sobre la margen de la quebrada, donde se presentan mayores afectaciones, con el fin de aislar los polígonos plantados y permitir la continuidad de las labores de restauración.

Así mismo, se programó una visita técnica conjunta para el viernes 10 de octubre, con participación de las áreas técnicas y sociales de ambas entidades, para revisar el avance del cerramiento, coordinar acciones en campo y articular con la comunidad y la corregidora local, dado que ya fue identificado el propietario del ganado que ingresa al predio.

Debido a la situación presentada se evalúa una prórroga al convenio de cuatro (4) meses, debido a que los retrasos por el cerramiento podrían impedir la ejecución total de las actividades de plantación y de mantenimiento a los 18.000 árboles proyectados.

Finalmente, se aprueba la prórroga No.1 del Convenio entre las partes participantes, Jardín Botánico y UAESP, por un plazo de 4 meses.

2. Varios.

- Convenio para el predio Buenos Aires:

El Jardín Botánico informó que ya cuenta con una versión preliminar de la propuesta técnica del convenio específico para la intervención en el predio Buenos Aires, la cual será compartida con la UAESP para su revisión.

La UAESP manifestó su interés en avanzar en la suscripción de este convenio antes del inicio de la Ley de Garantías prevista para noviembre. Se acordó programar una reunión técnica la semana siguiente para revisar los ajustes de la propuesta.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Jardín Botánico José Celestino Mutis</small>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 3 de 4	

- Liquidación Convenio Marco 009 de 2020.


La UAESP confirmó que el área jurídica ya realizó la primera revisión del acta de liquidación del convenio Marco 009, se remitirá al JBB una vez se surta este proceso interno en la UAESP.

- Actas y seguimiento administrativo:

Se recordó que el acta del comité anterior fue elaborada por la profesional María Elena Díaz y se encuentra pendiente de revisión y firma.

Se acordó que el acta del presente comité estará a cargo del Jardín Botánico, y que en adelante las reuniones serán convocadas por quien tenga la secretaría asignada.

Evidencias de la reunión:

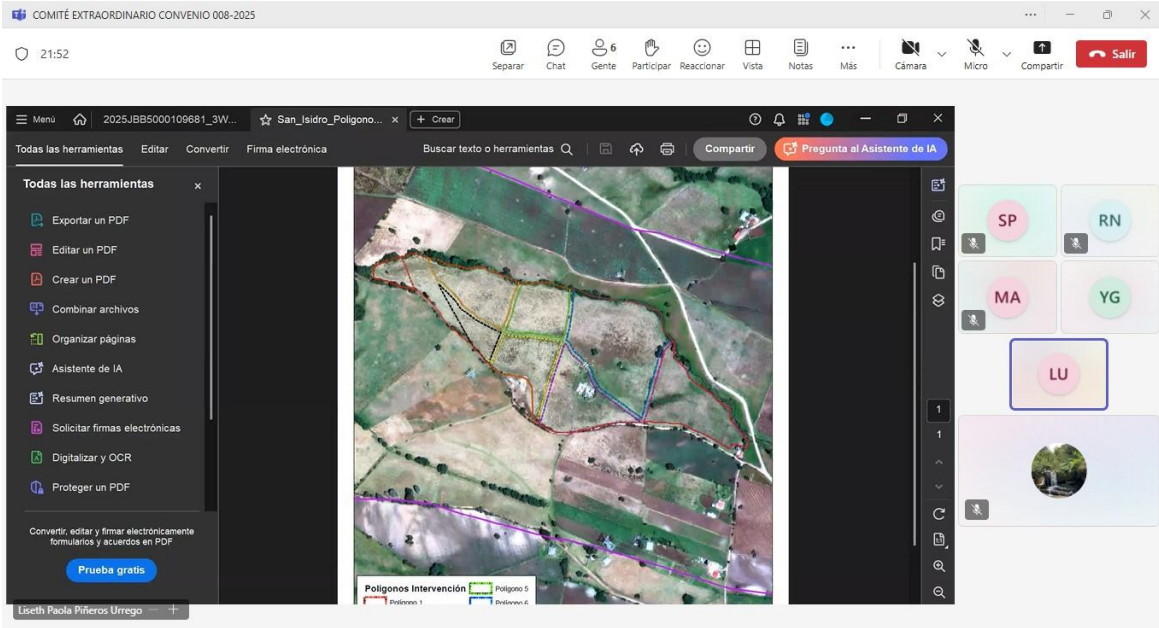

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Coordinar con el contratista el inicio del cerramiento en la margen riparia de la quebrada.	UAESP	10/10/2025
2. Evaluar alternativas de cerramiento provisional en polígonos 6, 7 y 8.	UAESP	10/10/2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE</p> <p>Jardín Botánico José Celestino Mutis</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
	DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
	Formato: Acta de Reunión				
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 4 de 4	

3. Visita a campo Predio San Isidro.	UAESP-JBB	10/10/2025
4. Radicar la intención de prórroga al Convenio 008-2025.	UAESP	15/10/2025
5. Reunión para el Convenio específico a suscribir del Predio Buenos Aires.	JBB-UAESP	24/10/2025
6. Remisión acta de comité No 5.	JBB-UAESP	15/10/2025
7. Remitir informe bimestral a la UAESP	JBB	16/10/2025

ELABORÓ: CATALINA CAMACHO FANDIÑO
