

	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	VERSIÓN	01	
	FORMATO	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO	AP-GJC-FR07	
			FECHA DE VIGENCIA		
DOCUMENTO CONTROLADO					


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COOPSERGMUN		CONCOLDI		UNDEITE		PROMEDIO
1	Suministro, fabricación, transporte e instalación de un Aula Autoportante con estructura metálica que puede ser removida, área construida de (20 m²), diseñada para uso institucional, educativo o comunitario, construida bajo sistema modular garantizando calidad, eficiencia y rapidez en su instalación. Estructura de Plataforma en perfil estructural calibre (2) mm o calibre 14, distribución de correas según distribución del módulo. Piso en eterboard de 1cm con Yumbolon y laminado SPC. Cubierta estructural en perfilería calibre 14 y correas de sujeción ubicadas cada 16", garantizando soporte adecuado para los revestimientos	4	\$ 81.112.500	\$ 324.450.000	\$ 74.932.500	\$ 299.730.000	\$ 75.705.000	\$ 302.820.000	\$ 309.000.000


	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	VERSIÓN	01	
	FORMATO	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO	AP-GJC-FR07	
			FECHA DE VIGENCIA		
DOCUMENTO CONTROLADO					

interior y exterior. Acabado en teja metálica arquitectónica en color según diseño enviado al instituto, sin traslapo, ofrece mayor impermeabilidad, mejor desempeño frente a filtraciones y un acabado estético moderno y uniforme. Revestimiento interior compuesto por tabla de pino de 1.2cm o 12mm de espesor. Aislante térmico de frescas entre la capa interna y externa de muros y cubierta. Techo interior en tabla machihembrado de (1.5) mm, flotante con sujeción a una sola pestaña. Incluye puertas en metal resistente a exteriores, ventanearía completa en madera y perfilería según diseño (bisagras, chapas, anijas, vidrio de 5mm mínimo y pisavidrios). Incluye red eléctrica y accesorios como								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	VERSIÓN	01	
	FORMATO	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO	AP-GJC-FR07	
			FECHA DE VIGENCIA		
DOCUMENTO CONTROLADO					

	paneles de luz, tomas corriente y switchs acorde a la relación espacio y uso de kiosko.							

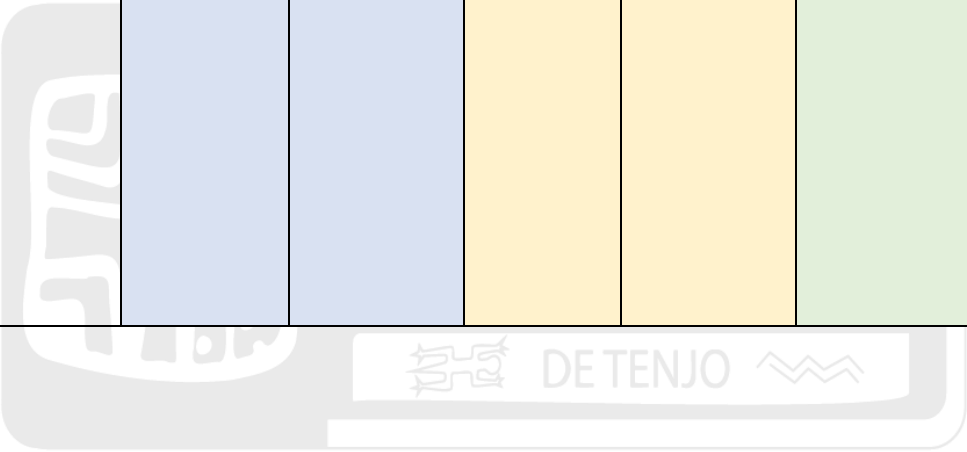

	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	VERSIÓN	01	
	FORMATO	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO	AP-GJC-FR07	
			FECHA DE VIGENCIA		
DOCUMENTO CONTROLADO					

2	Suministro, fabricación, transporte e instalación de Kiosko turístico de 3mt2, para PIT (Punto de información turísticas). Plataforma fabricada en perfilera estructural calibre 18, diseñada para brindar estabilidad y resistencia a la estructura. Piso, paredes y techo, contruidos en madera de pino, utilizando tabla de 33 mm de espesor y tabla de pino de 1" x 10", según el diseño y requerimientos del módulo. Sistema eléctrico básico con panel solar de baja potencia, diseñado para alimentar iluminación de 9 W. El módulo cuenta con un eje estructural para sistema de remolque, permitiendo su traslado mediante vehículo adecuado.	1	\$ 19.828.506,00	\$ 19.828.506,00	\$ 18.025.915,00	\$ 18.025.915,00	\$ 18.927.210,00	\$ 18.927.210,00	\$ 18.927.210,00
---	--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	VERSIÓN	01	
	FORMATO	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO	AP-GJC-FR07	
			FECHA DE VIGENCIA		
DOCUMENTO CONTROLADO					

	TOTAL		\$ 344.278.506,00		\$ 317.755.915,00		\$ 321.747.210,00	\$ 327.927.210,00
--	-------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------


DIANA CAROLINA ROJAS GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL IMCTT

Acción	Nombre y Cargo	Firma
Proyectó	Sebastián Castillo— apoyo financiero Contratista	
Revisó:	Sebastián Ballesteros-- Tesorero	
Aprobó:	Diana Carolina Rojas – Directora general	
